კალენდარული გეგმა **T=6** თვე

	სამუშაოების დასახელება	დღე	1-ი თ ვ ე						2-ი თ ვ ე						3-ი თ ვ ე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა ხის ღობით	2																		
2	დროებითი შენობების განთავსება შიდა ეზოში	3																		
3	არსებული მაგისტრალური კომუნიკაციების გამორთვა და დემონტაჟი/საჭიროების შემთხვევაში/	2																		
	ძირითადი პერიოდის სადემონტაჟო სამუშაოები																			
1	მონოლითური რკინაბეტონის კონსტრუქციების დაშლა და გატანა	83																		
2	მიწის სამუშაოები და საძირკვლის ამოღება																			
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	85																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	90																		

კალენდარული გეგმა/გაგრძელება/

	სამუშაოების დასახელება	დღე	4-ი თ ვ ე						5-ი თ ვ ე						6-ი თ ვ ე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სადემონტაჟო სამუშაოები																			
1	მონოლითური რკინაბეტონის კონსტრუქციების დაშლა და გატანა	30																		
2	მიწის სამუშაოები და საძირკვლის ამოღება																			
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	90																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	90																		

დაამუშავა ბ. გოგოლაური

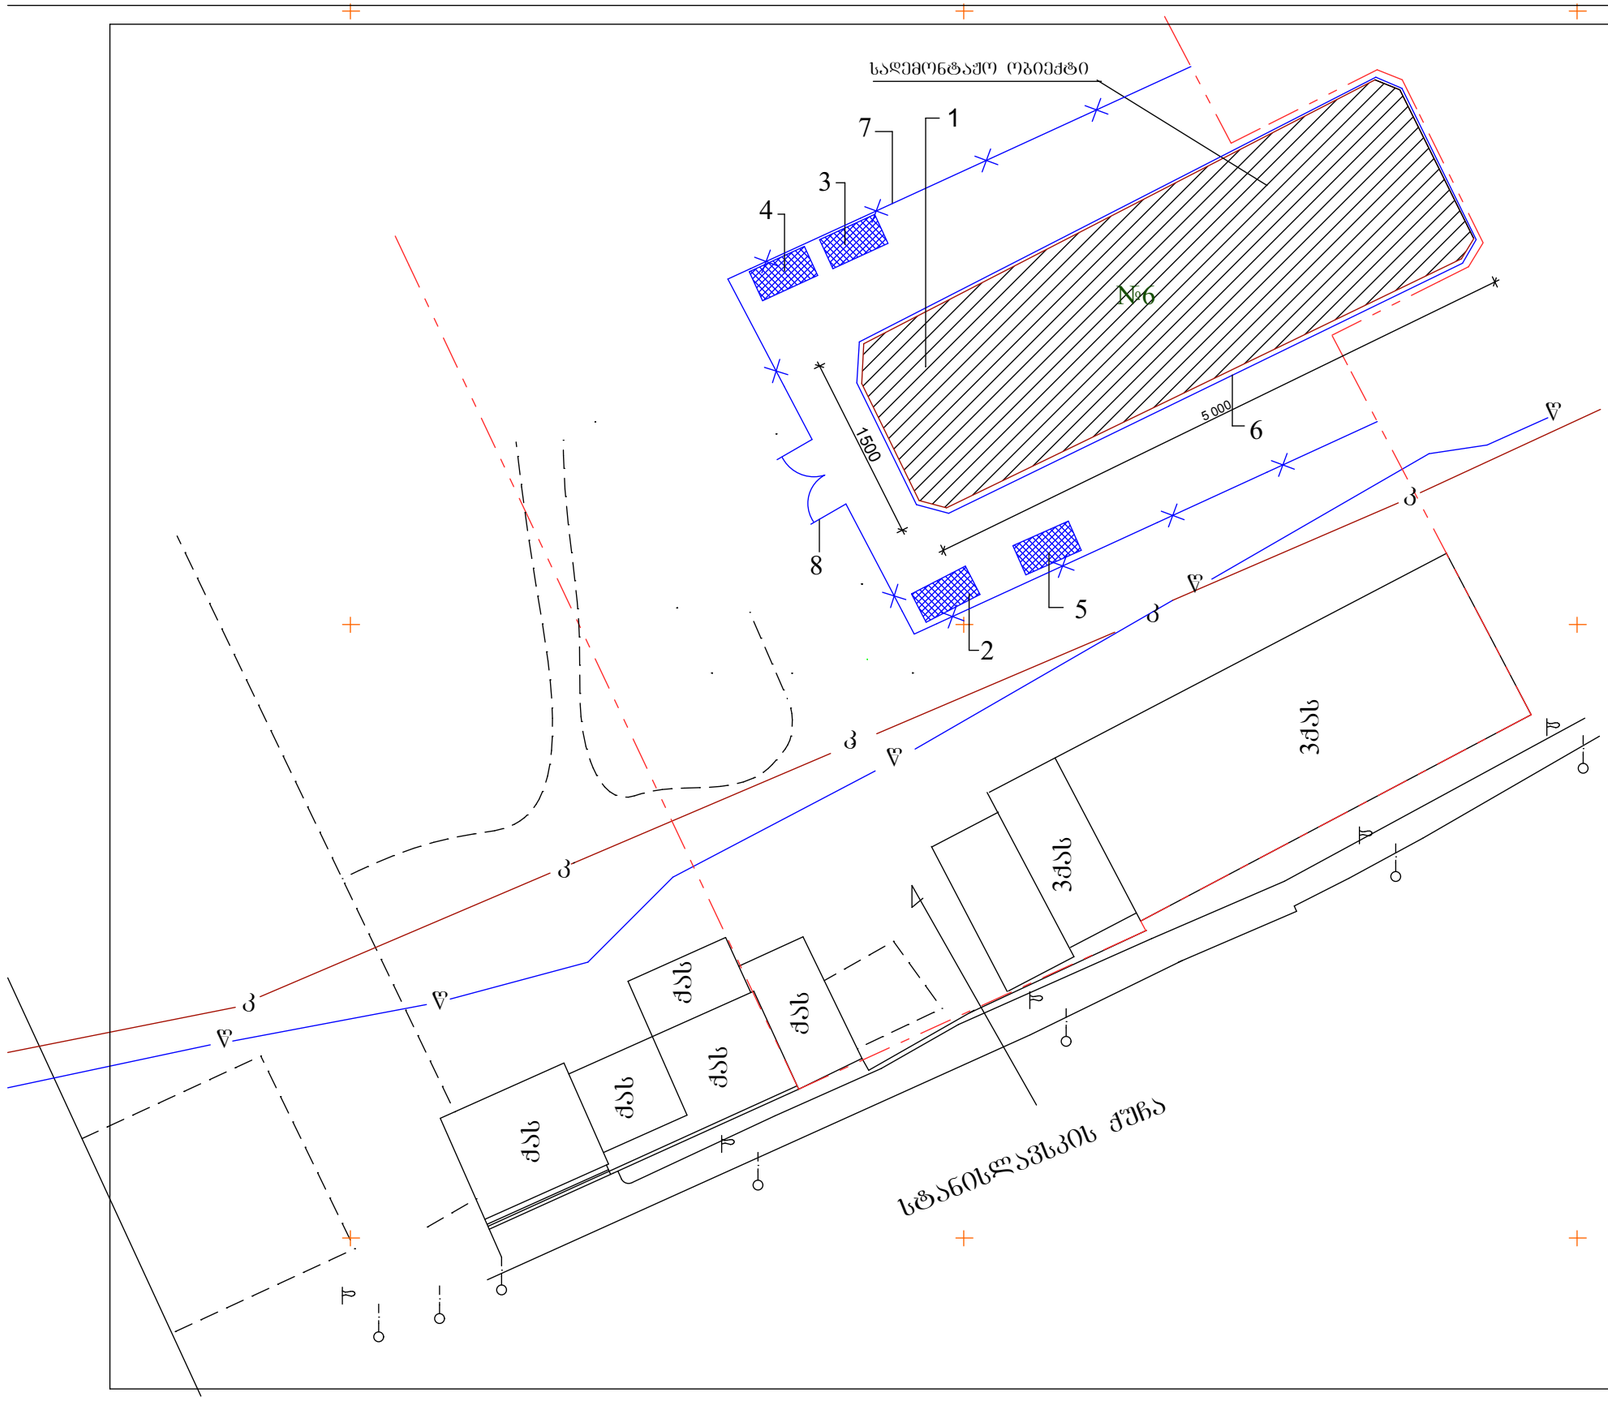
სადემონტაჟო ობიექტი
№6
1
2
3
4
5
6
7
8
1500
5 000
ელ
ელ
ელ

სადემონტაჟო სამუშაოები

I სადემონტაჟო შენობა №6 მდებარეობს ქ. თბილისში, სტანისლავსკის ქ. №12-ში (ს. კ. 01.13.05.003.063)

შენობა არის 20 მ.-ის სიმაღლის, სახურავის გარეშე, მონოლითური რკინაბეტონის კედლებით.

II სამშენებლო ორგანიზაცია ამუშავებს სამუშაოთა წარმოების პროექტს. ამ პროექტის შედგენა უნდა ხდებოდეს მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად.

მოსამზადებელ პერიოდში უნდა მოხდეს:

1. უცხო ხალხის გაყვანა სამშენებლო ტერიტორიიდან;
2. გარე და შიდა ქსელების გამორთვა.;
3. დროებითი შენობების დადგმა ეზოში და დროებითი <u>ხის ღობის</u> დაყენება;
4. არსებული ტერიტორიის ქსელებიდან სამშენებლო მოედნის უზრუნველყოფა დროებითი წყლით და ენერგიით;
5. აქტის შედგენა მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაობის შესახებ.

III სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელება უნდა მოხდეს ზემოდან ქვემოთ მხოლოდ ხელით და სათანადო კომისიის დასწრებით. სამუშაოების დაწყებამდე გათვალისწინებული უნდა იყოს დროებითი საინვენტარო ხარაჩოების დაყენება._

<u>აკრძალულია:</u> სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელება რამოდენიმე უბნის ერთად.

სამუშოების დროს უნდა იყოს გათვალისწინებული:

–კონსტრუქციის დროებითი გამაგრება, მუშების სათანადო ინსტრუქტაჟი და უზრუნველყოფა სპეციალური ქამრებით და სათვალეებით,

– ნაგვის გატანა სპეციალური ბუნკერის საშუალებით,

– აქტის შედგენა ძირითადი პერიოდის სამუშაოების შესახებ,

– ავარიული სიტუაციის შემთხვევაში უნდა მოხდეს სამუშაოების შეჩერება და ყველა სადემონტაჟო კონსტრუქციების გამაგრება. ყველა საშიში ადგილი უნდა იყოს შემოღობილი და უზრუნველყოფილი სათანადო განათებით ღამის საათებში;

– სამშენებლო ნაგავი დროულად უნდა იქნას გატანილი.

IV საძირკვლის ამოღება და მონოლითური ნაწილების დაშლა მოხდეს საკომპრესორო დანადგარის საშუალებით. სამშენებლო მოედანზე უნდა იყოს გათვალისწინებული დემონტირებული ნაწილების მოედანი და გათვალისწინებული დროული გატანა ავტოტრანსპორტით.

VI ვინაიდან მშენებლობის ხანგრძლივობა არ განისაზღვრება **СниП** 1.04.03-85 ხანგრძლივობა პირობითად მივიღოთ 6 თვე.

VII ყველა სამუშაოს განხორციელება მოხდეს საქართველოს მთავრობის 2007წ 28 მარტის №62 დადგენილების –"მშენებლობის უსაფრთხოების წესები"-ს მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

მანქანა-მექანიზმების უწყისი

N	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	ერთ გან.	რ-ბა
1	საინვენტარო ხარაჩოები	-	-
2	მიმღები ნაგვის ბუნკერი	ც	1
3	საკომპრესორო დანადგარი	ც	1
4	სანგრევი ჩაქუჩები	ც	2
5	ნიჩაბი	ც	4
6	ელექტროსახერხი	ც	2
7	სპეცტრანსპორტი	ც	4
