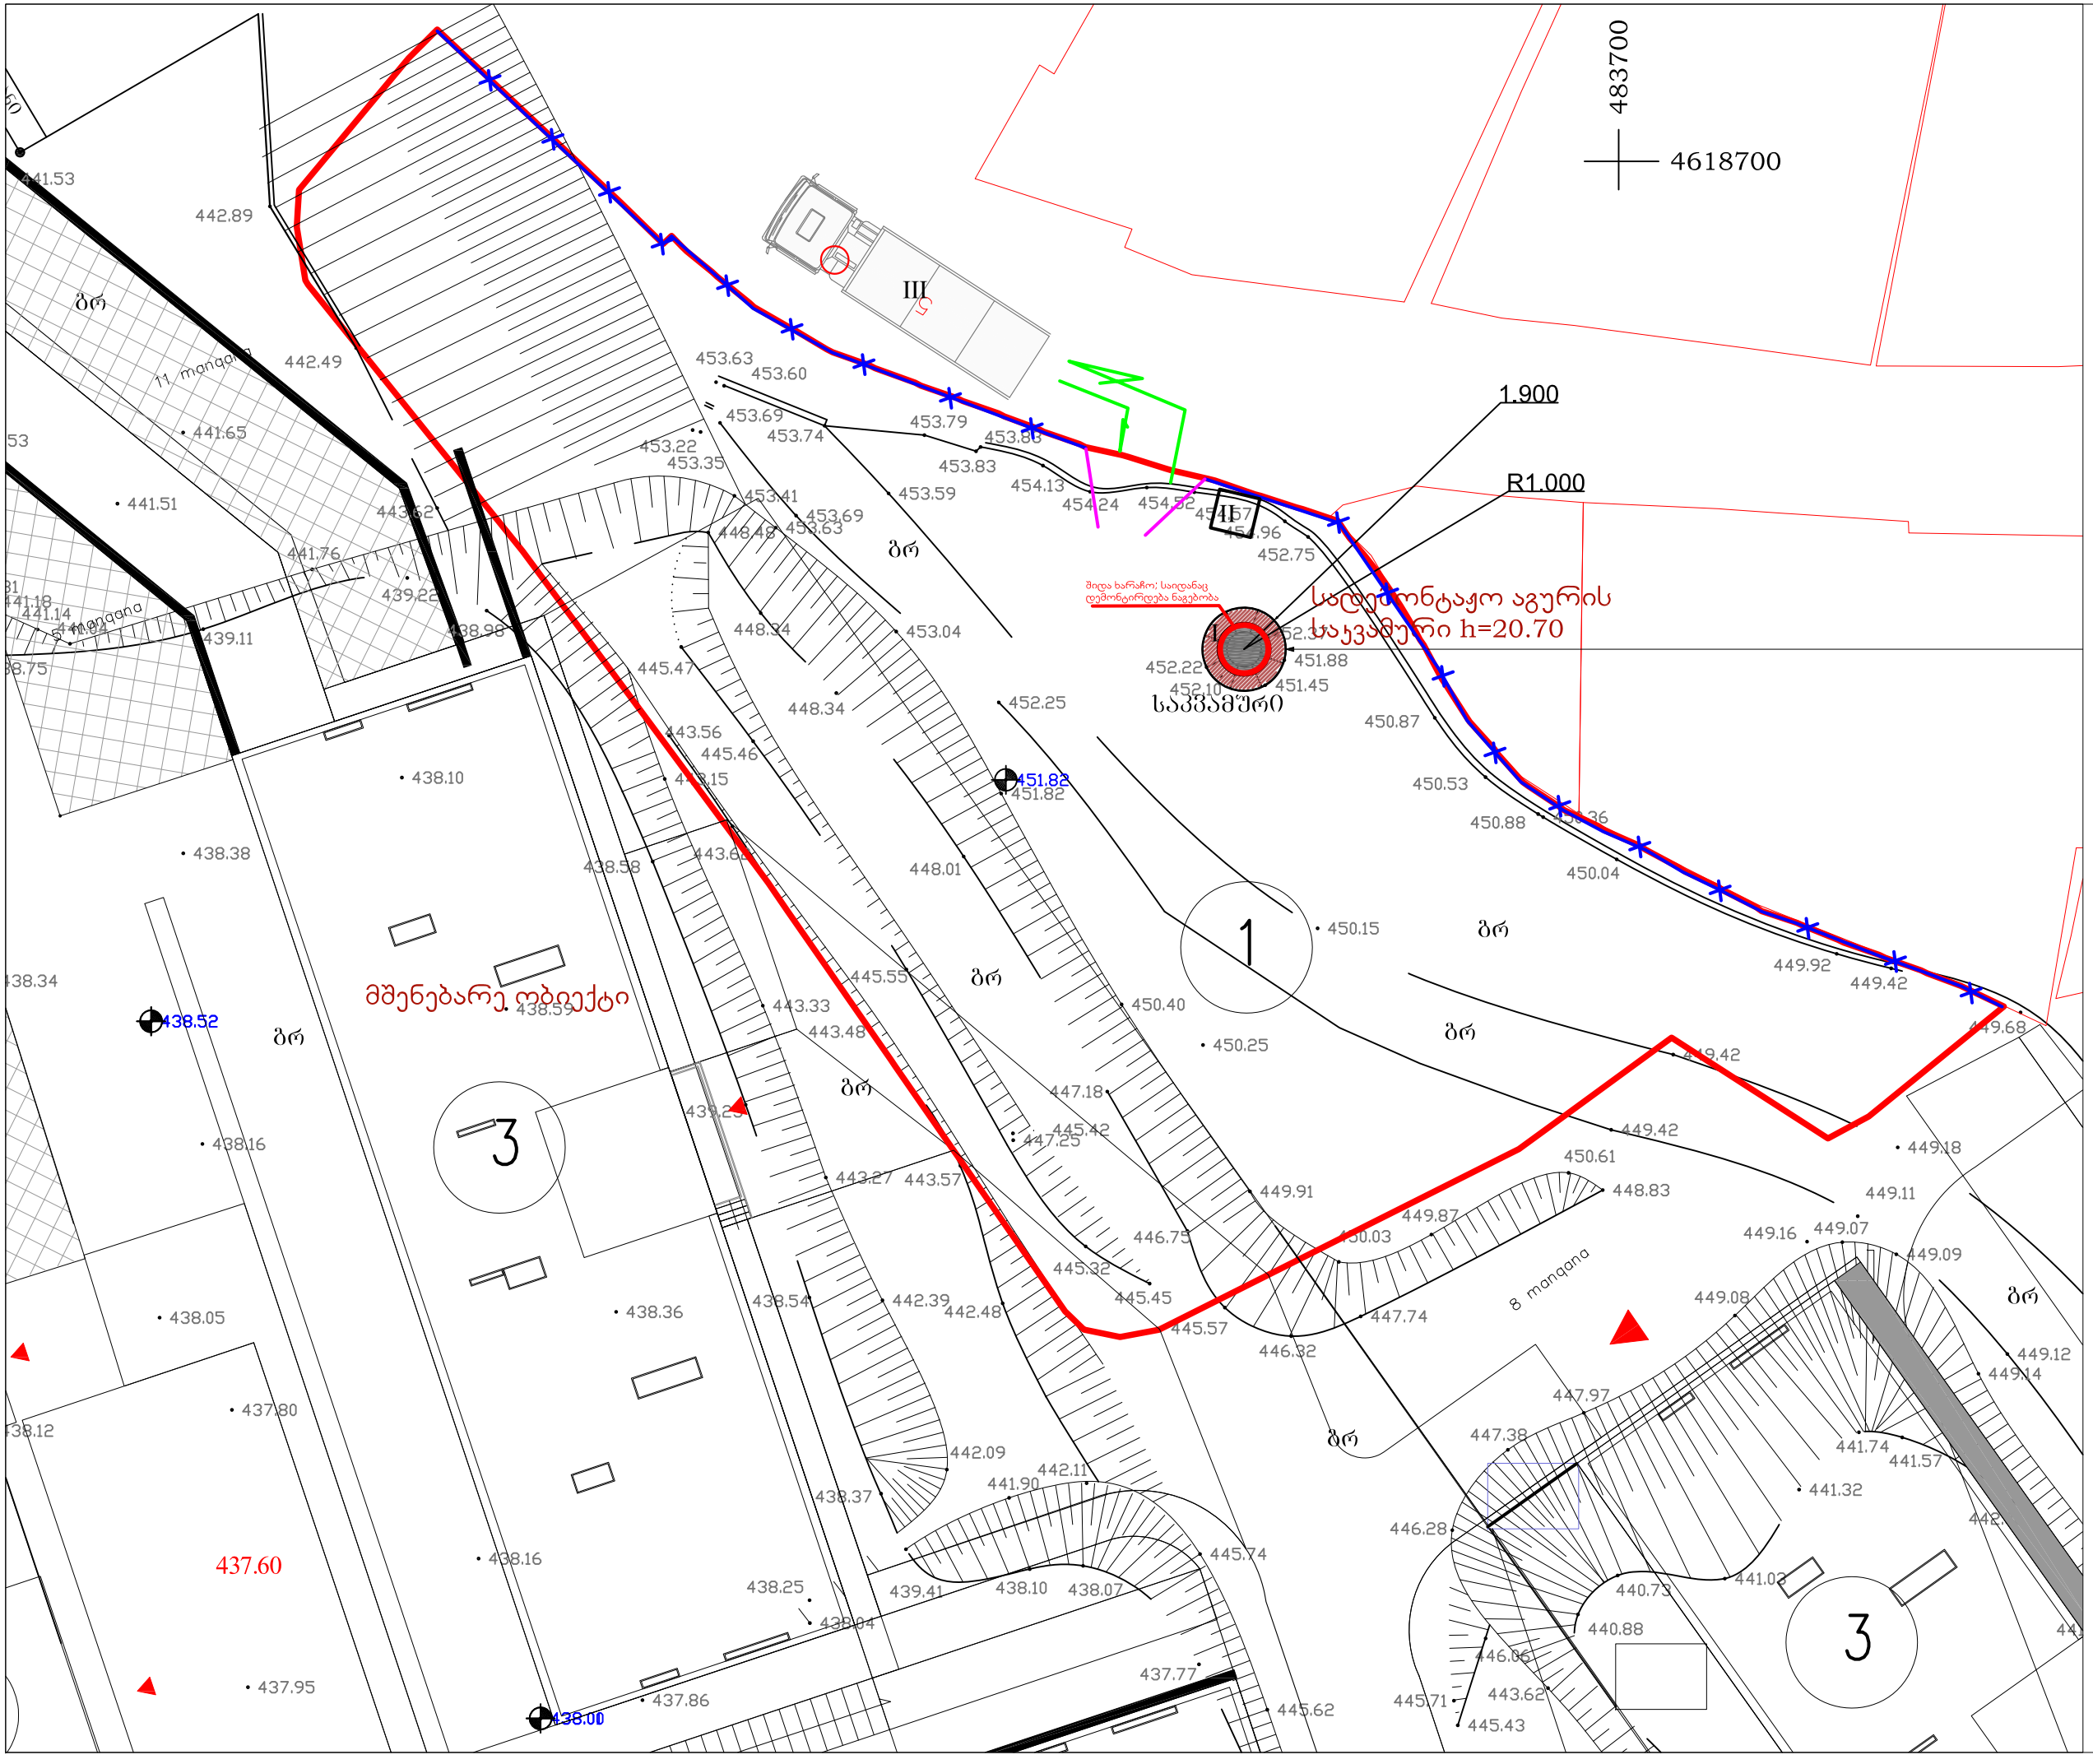

შეთანხმებულია ქ. თბილისის არქიტექტურის სამსახური

პირობითი აღნიშვნები:

- სპეროექტო ტერიტორია (სპეროექტო ტერიტორიის მითული საზღვარი)
- დროებითი სამშენებლო ღობე
- დროებითი სამშენებლო ავტოჯიხვარი

ექსპლიკაცია:

I. სადემონტაჟო აგურის საკვამური
II. სადარაჯო ჯიხური
III. ავტოთვითმცლელი

დემონტაჟის ორგანიზაციის პროექტი		
ქ. თბილისში, ქურდიანის ქუჩაზე (ს.კ 01.16.02.038.028.) არსებული საკვამურის დემონტაჟის ორგანიზაციის პროექტი და ტერიტორიის გასუფთავება		
პროექტის მთავარი არქიტექტორი		ი.შარაბიძე
დაამუშავა		ნ. ქარქაშაძე
მასშტაბი	ფურცელი	თარიღი
დემონტაჟის ორგანიზაციის პროექტი	ზოკ-1	20.09.2015

ქ. თბილისში, ქურდიანის ქუჩაზე (ს.კ 01.16.02.038.028.) არსებული საკვამურის დემონტაჟის ორგანიზაციის პროექტი და ტერიტორიის გასუფთავება

დემონტაჟის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	დემონტაჟის ხანგრ. კვირეებში	კვირეების რაოდენობა დემონტაჟის პერიოდების მიხედვით			
			I კვირა	II კვირა	III კვირა	IV კვირა
1	2	3	4	5	6	7
1	მოსამზადებელი სამუშაოები: მისასვლელი გზის; შიდა ხარაჩოებისა და ნაგავგამტარი მილის მოწყობა და ა. შ.	1				
2	არსებული აგურით ამოშენებული საკვამურის დემონტაჟი და გატანა სამშენებლო მოედნიდან	2				
3	ტერიტორიის დასუფთავება და მომზადება ახალი მშენებლობისათვის	1				

1 შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 4 კვირის პერიოდში. მოპ-1

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.
