ჩასატარებელ სამუშაოთა კალენდარული გეგმა-გრაფიკი - 2012-2013 წ.

№	სამუშაოს დასახელება	1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე			6 თვე			7
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																			
2	შასადზე ხარაჩოების მონტაჟი																			
3	დროებითი ხის ღობის მონტაჟი																			
5	შასადიდან არსებული სადებავის მოცილება, და შასადის დამუშავება სამღებრო სამუშაოებისათვის																			
5	სამღებრო სამუშაოები																			
6	ხარაჩოებისა და დროებითი ხის ღობის დემონტაჟი																			
7	კარზე ნალექებისაგან დამცავი გადახურვის მოწყობა																			
8	სამშენებლო ნაგვის გატანა და მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგება																			

შენიშვნები

პროექტის სახელწოდება:

ტურბინების და ნიჟარას ქონის შორის მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები

სტადია	პროექტი	
წარდგენილი	წარდგენილი	
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	გ.გენდლიანი	
არქიტექტორი	ნ.ნასარიძე	
კონსტრუქტორი		
შესრულა		

საპროექტო ლოგო	მისამართი
BIJI ARCHITECTURE	ქ. თბილისი შარტავას 14ა TEL: 895 55-35-74 899 75-28-88

მასშტაბი	1:100	
თარიღი		
სტადია	წარდგენილი	წარდგენები
პროექტი	ა-01	

ფორმატი A-3 | თბილისი 2011 | დანართი № | შპილის სახელი

ექსპლიკაცია:

პირობითი ნიშნები:

- ნაკვეთის საზღვარი
- ჭრილის ხაზი
- ექსპლიკაციის ნუმერაცია
- არქიტექტურული ნიშნული
- განაშენიანების რეგულირების ხაზი

სარეაბილიტაციო სამუშაოების ორგანიზაციის გეგმა

მ 1:500

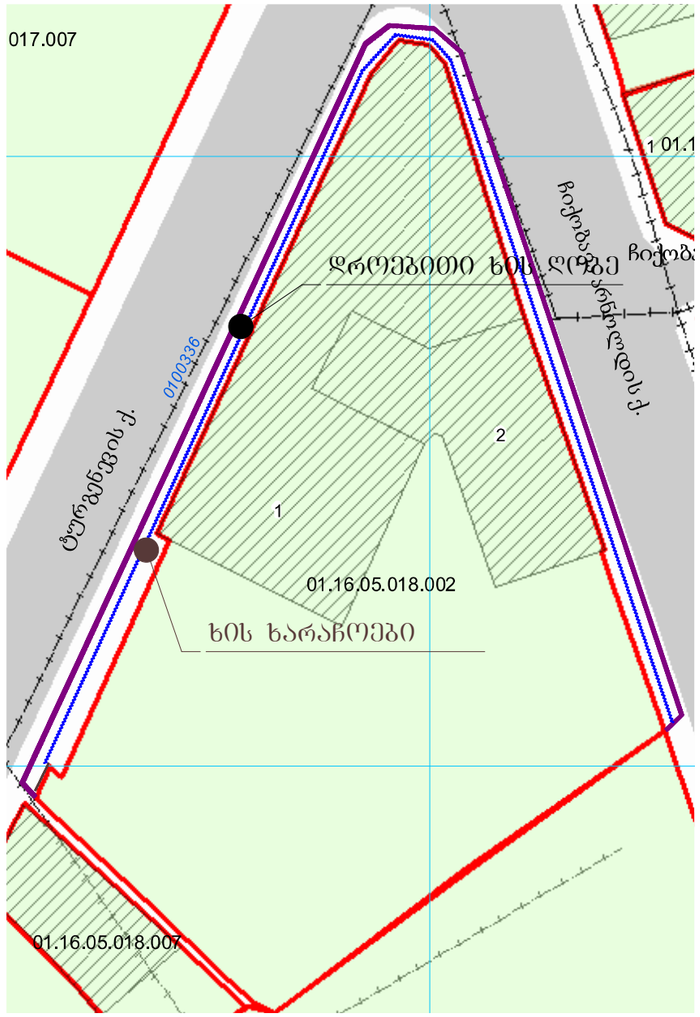

განმარტებითი ბარათი

მომუშავეთა შრომის უსაფრთხოების ღონისძიებები უნდა იქნეს დაცული სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოთა წარმოების ძველა ეტაპზე თანახმად სნდაწ III-4-80 უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში და სხვა ნორმატიულ-საკანონმდებლო დოკუმენტების მითითების შესაბამისობით.

მათგან ყურადღება მახვილდება შემდეგზე :

ადვილად აალებადი სამღებრო, საიზოლაციო და სხვა მასალების , აბრეთვე მომწამლავი ნივთიერებების დღიური რაოდენობა სამშენებლო სამუშაოთა წარმოების ზონაში არ უნდა აღემატებოდეს იმავე დღიურ მოთხოვნილებას. საჰიდროიზოლაციო სამუშაოთა შესრულებისას, წასმისას და ზოგიერთ სხვა სამუშაოზე მუშები უნდა იქნებოდნენ სპეცტანსაცმელს, რესპირატორებსა და თავსაბურავებს. მასალებისა და ნაკეთობების დასაწყობება უნდა მოხდეს მათზე ტექნოლოგიური მოთხოვნილებების პიროგათა გათვალისწინებით: ამავე დროს ისინი უნდა დაეწყოს მოსწორებულ ადილზე, რომ მათი მოცურება არ მოხდეს. საბათქაშო და მოსახვითი სამუშაოების პერიოდში შასადებს საჭიროა ჩამოეშაროს შარდა,რათა ამ შემთხვევაში არ მოხდეს მტვრის გაბნევა სელიტებულ ზონაში.

ზემოთ მითითებული დებულებებიდან გამომდინარე მშენებლობა უნდა განხორციელდეს ბუნების დაცვითი და ჰაერის დაბინძურების საწინააღმდეგო ღონისძიებების დაცვით მოქმედი საკანონმდებლო აქტებისა და ნორმატიული დოკუმენტების შესაბამისობით.

დაუშვებელია არსებული საკანალიზაციო ჭებში ბეტონის და ხსნარის ნარჩენების ჩარეცხვა ან მათი დანაბვიანება სამშენებლო ნაბავით.

შრომატი A-3	თბილისი 2011	
	ნაკვეთი №	შაილის სახელი

ექსპლიკაცია:

პირობითი ნიშნები:

- ნაკვეთის საზღვარი
- ჭრილის ხაზი
- ექსპლიკაციის ნუმერაცია
- არქიტექტურული ნიშული
- განაშენიანების რეგულირების ხაზი

შენიშვნები

პროექტის სახელწოდება:

ტერიტორიის და ნიშნულის ჭრილის შრომის მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის სამუშაოები

სტადია	პროექტი	
შეთანხმება		
დირექტორი		
არქიტექტორი		
კონსტრუქტორი		
შესრულა		

საპროექტო ლოგო	მისამართი
BIJI ARCHITECTURE BIJI ARCHITECTURE	ქ. თბილისი შარტავას 14ა TEL: 895 55-35-74 899 75-28-88

მასშტაბი	1:100	
თარიღი		
სტადია	შეთანხმება	შეთანხმება
პროექტი	ა-01	
