სარეკლამო აბრის ცვლილების სამუშაოები

განმარტებითი ბარათი

1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია СниП 3.01.01-85 თანახმად შემოკლებულ ვარიანტში.

სარეკლამო აბრა უნდა შეიცვალოს ქ. თბილისში, კოსტავას ქუჩა #27-ში მდებარე შენობის ფასადზე. ვერის პარკის მთავარი შესასვლელის მხარეს.

კედელი აშენებულია აგურით, სართულშუა გადახურვები მოწყობილია ხის კოჭებზე. სახურავი დახურულია თუნუქის ფურცლებით.

ტექნიკურ - ეკონომიკური მაჩვენებლები:

- მიწის ნაკვეთის ფართი ---- 458,00 მ²
- შესაცვლელი სარეკლამო აბრის გაბარიტებია:

სიმაღლე -- 12,1 მ.; სიგანე -- 19,7 მ.

2. სამშენებლო ორგანიზაცია ამუშავებს სამუშაოთა წარმოების პროექტს. ამ პროექტის შედგენა უნდა ხდებოდეს მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში მიღებული გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

ფეხმავალთა უსაფრთხოების მიზნითუნდა მოხდეს დროებითი უსაფრთხოების ლენტების მოწყობა.

3. სარეკლამო აბრა დამაგრებულია ლითონის კარკასზე. უნდა განხორციელდეს სარეკლამო აბრის ექსტერიერის ცვლილება იგივე ზომებში.

აღნიშნული სამუშაოები არ ითვალისწინებს არც შენობის კედელზე და არც სარეკლამო აბრის კონსტრუქციაზე რაიმე სამუშაოებს, მხოლოდ სამაგრებიდან მოიხსნება და კვლავ არსებული სამაგრებით დამაგრდება ახალი აბრა.

4. მშენებლობის ხანგრძლივობა СниП 3.01.01-85 თანახმად, განისაზღვრა 30 დღე.

5. სამუშაოების განხორციელება მოხდეს საქართველოს მთავრობის 2007 წ. 28 მარტის #62 დადგენილების მიხედვით - „მშენებლობის უსაფრთხოების წესები“.

მანქანა - მექანიზმების უწყისი

#	დასახელება	ერთეულის განზომილება	რაოდენობა
1	ამწე-კალათა	ცალი	1

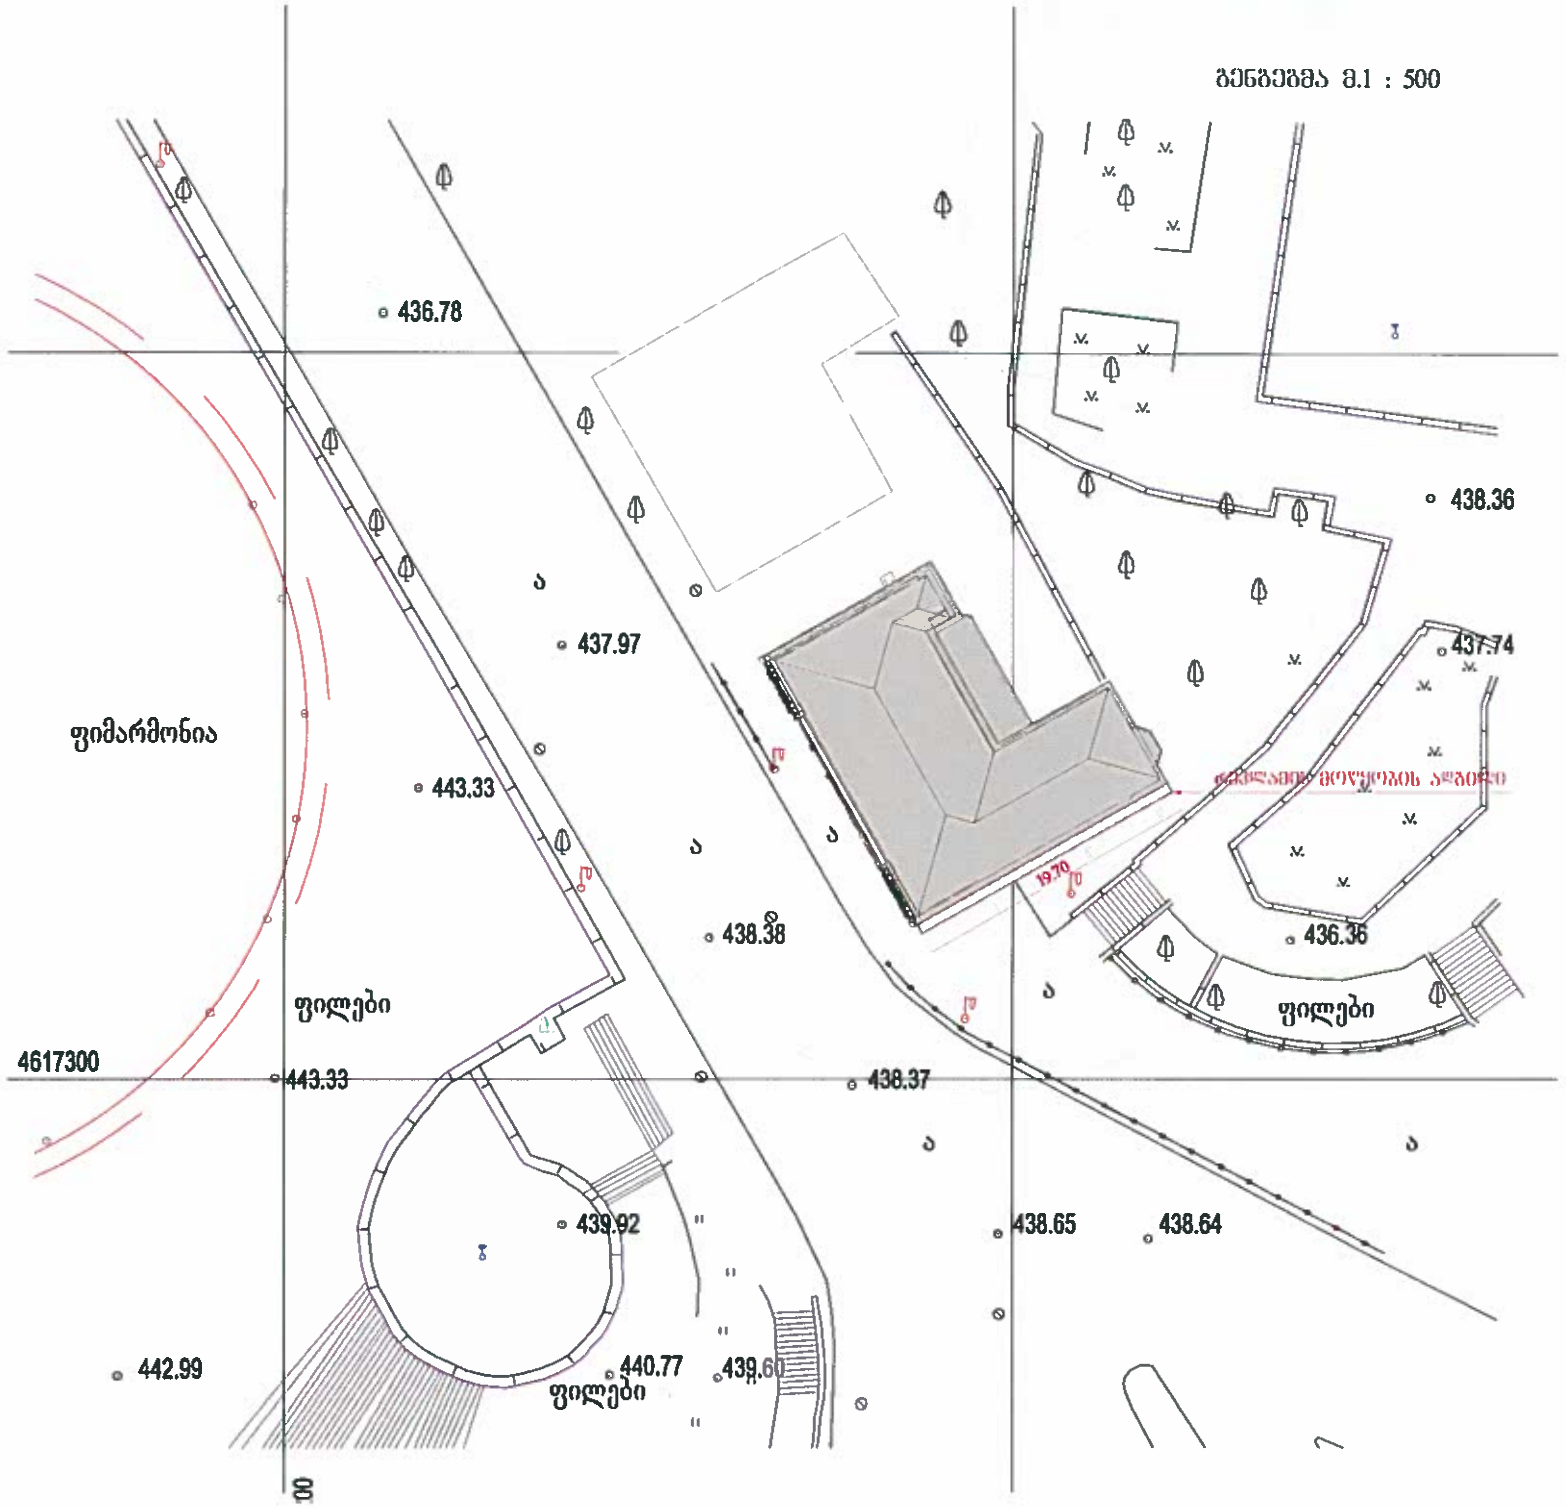
ბენზეშმა მ.1 : 500
436.78
437.97
443.33
438.38
438.36
437.74
436.36
438.37
439.92
438.65
438.64
442.99
440.77
439.60
ფიმარმონია
ფილები
ფილები
4617300
1970

კალენდარული გეგმა T=30 დღე

№	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე					
			5	10	15	20	25	30
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	5	———					
2	სარეკლამო აბრის ექსტერიერის ცვლილება	20		———	———	———	———	
3	სამშენებლო ნაგვის გატანა	4					———	———
4	ტერიტორიის დასუფთავება	2						———

დაამუშავა /გ.რუსაძე/
