მ შ ე ნ ე ბ ლ ო ბ ი ს დ ღ ი უ რ ი გ რ ა ფ ი კ ი

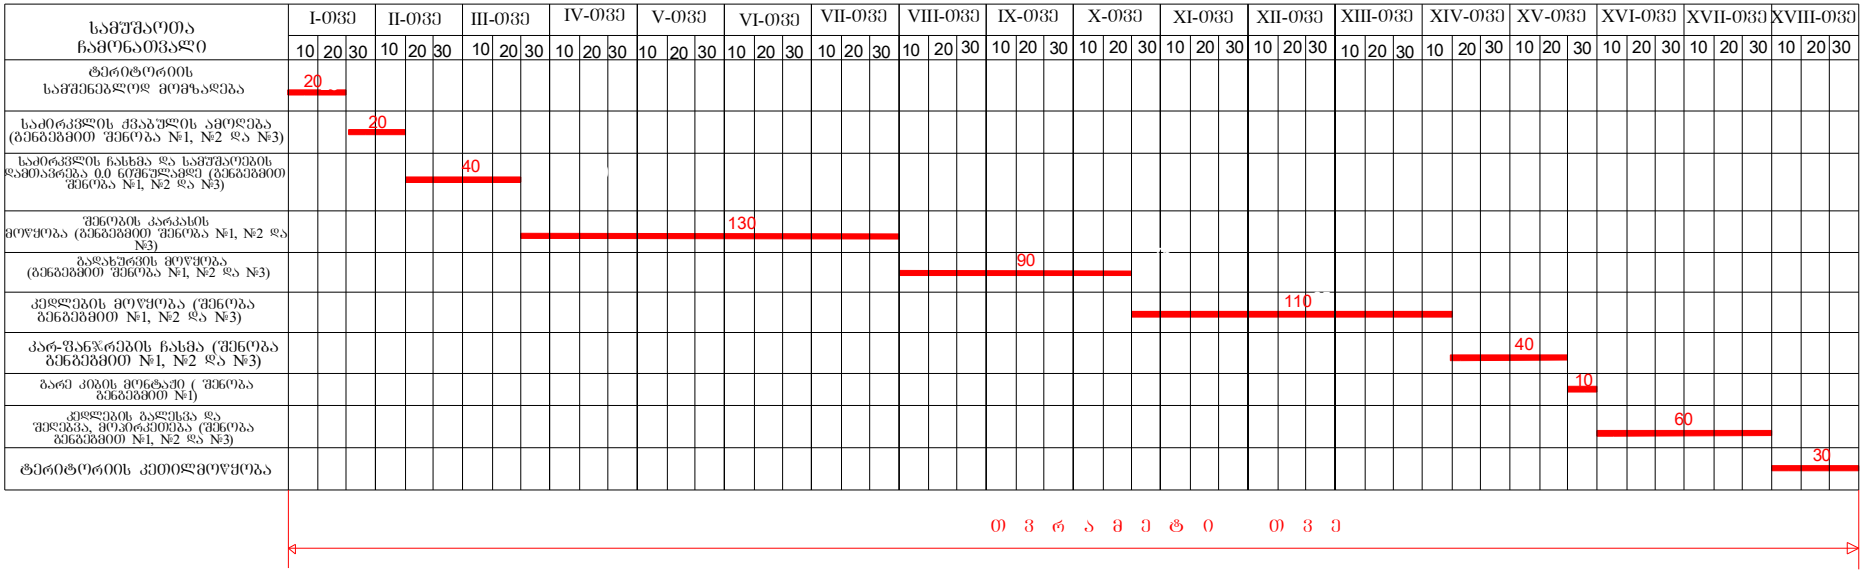

განმარტებითი ბარათი

1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია სამშენებლო ნორმებისა და წესების 3.01.01-85 -ის თანახმად და სან. სსრ სახმშენის 1986 წლის 11 დეკემბრის დადგენილების შესაბამისად შემოკლებულ ვარიანტში.
2. საპროექტო ობიექტი საწყობი
3. საპროექტო ობიექტის ხანგრძლივობა განისაზღვრება სამშენებლო ნორმებისა და წესების 1.04.03-85 გვ.479 ა-3-ის თანახმად. T=16 თვე საღაც 0,5 თვე მოსამზადებელი კერიოდის ხანგრძლივობაა. სეისმური კოეფიციენტის მიხედვით T=16X1,15=18 თვე.
4. მოსამზადებელ კერიოდში უნდა განხორციელდეს სამშენებლო მოედნის ზრუნველყოფა წყლით და ელერგიით არსებულ ქსელებიდან.
5. ბრუნტის დამუშავების დროს დამუშავებული მოცულობა უნდა იძახს ბატანილი მთლიანად და შემოტანილი უკუ ჩაყრისათვის.
6. სამშენებლო სამუშაოებისათვის მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტით გათვალისწინებულია საწვეელა და ბეტონის ტუმბო.
7. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში მომუშავეთა შრომის უსაფრთხოების და სანიტარულ კოზიენური მომსახურების საკითხებზე მთავარ წყაროდ წარმოდგენილია სამშენებლო ნორმების და წესების III-4-80 უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში.

დირექტორი		გ. ჩიტაიშვილი	შ.პ.ს. საბანკო ჯგუფი	დამკვეთი	შ.პ.ს. „ნიუ ლაინ ჯორჯია"
შესასრულა		ცოტაძე		ობიექტი	სასაწყობე შენობა ნაგებობა
				ობიექტის მისამართი	ქ. თბილისი, გამზირი სარაჯიშვილი №106
			ნაწილი: სამშენებლო		თარიღი: 03.03.2017
			მშენებლობის დღიური გრაფიკი	ლიტ.	შურც.	რაოდ.	მასშ.
				მ. ტ			
