მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

დაამუშავა: ბ. გოგოლაური



ქ. თბილისი 2017 წ.

შინაარსი

ა/ განმარტებითი ბარათი;

ბ/ კალენდარული გეგმა

გ/ გრაფიკული ნაწილი:
-ნახაზი მო-1----“სამშენებლო გენგეგმა”

ა/ განმარტებითი ბარათი

1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია СниП 3.01.01-85 თანახმად.
საპროექტო ობიექტი---- შპს "კინოქალაქის" ტერიტორიაზე ორი პატარა ჯიხურის ტიპის ნაგებობის შემოტანა და მონტაჟი. გეგმაში შენობის ზომები:
-შენობა №1 /იხილე ნახაზი მო-1/--4.00x2.85მ;
-შენობა №2 /იხილე ნახაზი მო-2---2.00x2.00მ.
ორივე შენობა ერთსართულიანი ნაგებობაა, რომელიც დაპროექტებულია ალუმინის პანელებისაგან.

2. საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა არ განისაზღვრება СниП 1.04.03-85 თანახმად მცირე მოცულობის გამო და პირობითად მიღებულია **2.0 თვე.**
<u>მოსამზადებელ პერიოდში უნდა მოხდეს</u>:
-სამშენებლო ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი ფარებით;
-არსებული მოქმედი მიწისქვეშა ქსელების დაზუსტება;
-ნაგებობების საპროექტო ქსელების გაყვანა;
-სამშენებლო მოედნის უზრუნველყოფა დროებითი წყლით და ენერგიით საპროექტო ქსელებიდან;
-დროებითი "ნაგებობების" განლაგება უსაფრთხო ზონაში.

3. წინამდებარე პროექტი ითვალისწინებს: ნაგებობების დამზადებას, შემოტანას და გამზადებულ ბეტონის საფარზე მონტაჟს. ჯიხურების დატვირთვა-გადმოტვირთვა მოხდეს საავტომობილო ამწის საშუალებით.

4. ყველა სამუშაოს განხორციელება მოხდეს საქართველოს მთავრობის <u>2007წ 28 მარტის №62 დადგენილების –</u>
<u>"მშენებლობის უსაფრთხოების წესები"-ს</u> მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

5. წინამდებარე განმარტებითი ბარათი იხილე ნახ მო-1 ერთად.

საავტომობილო ამწე KC-3575A-ის ტექნიკური დახასიათება

1 ისრის სიგრძე----------9.50მ
2 ისრის შვერა----------2.85-8.6მ
3 ტვირთამწეობა----------2.00-10.00ტნ
4 აწევის სიმაღლე----------10.30-1.50მ

ბ/ კალენდარული გეგმა T=2.00თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე											
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30						
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	10																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ნაგებობა №1 და №2 გამზადება ალუმინის პანელებისაგან	30																		
2	სამშენებლო მოედანზე ბეტონის საფუძვლის მოწყობა	30																		
3	ნაგებობა №1 და №2 მონტაჟი ადგილზე	10																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

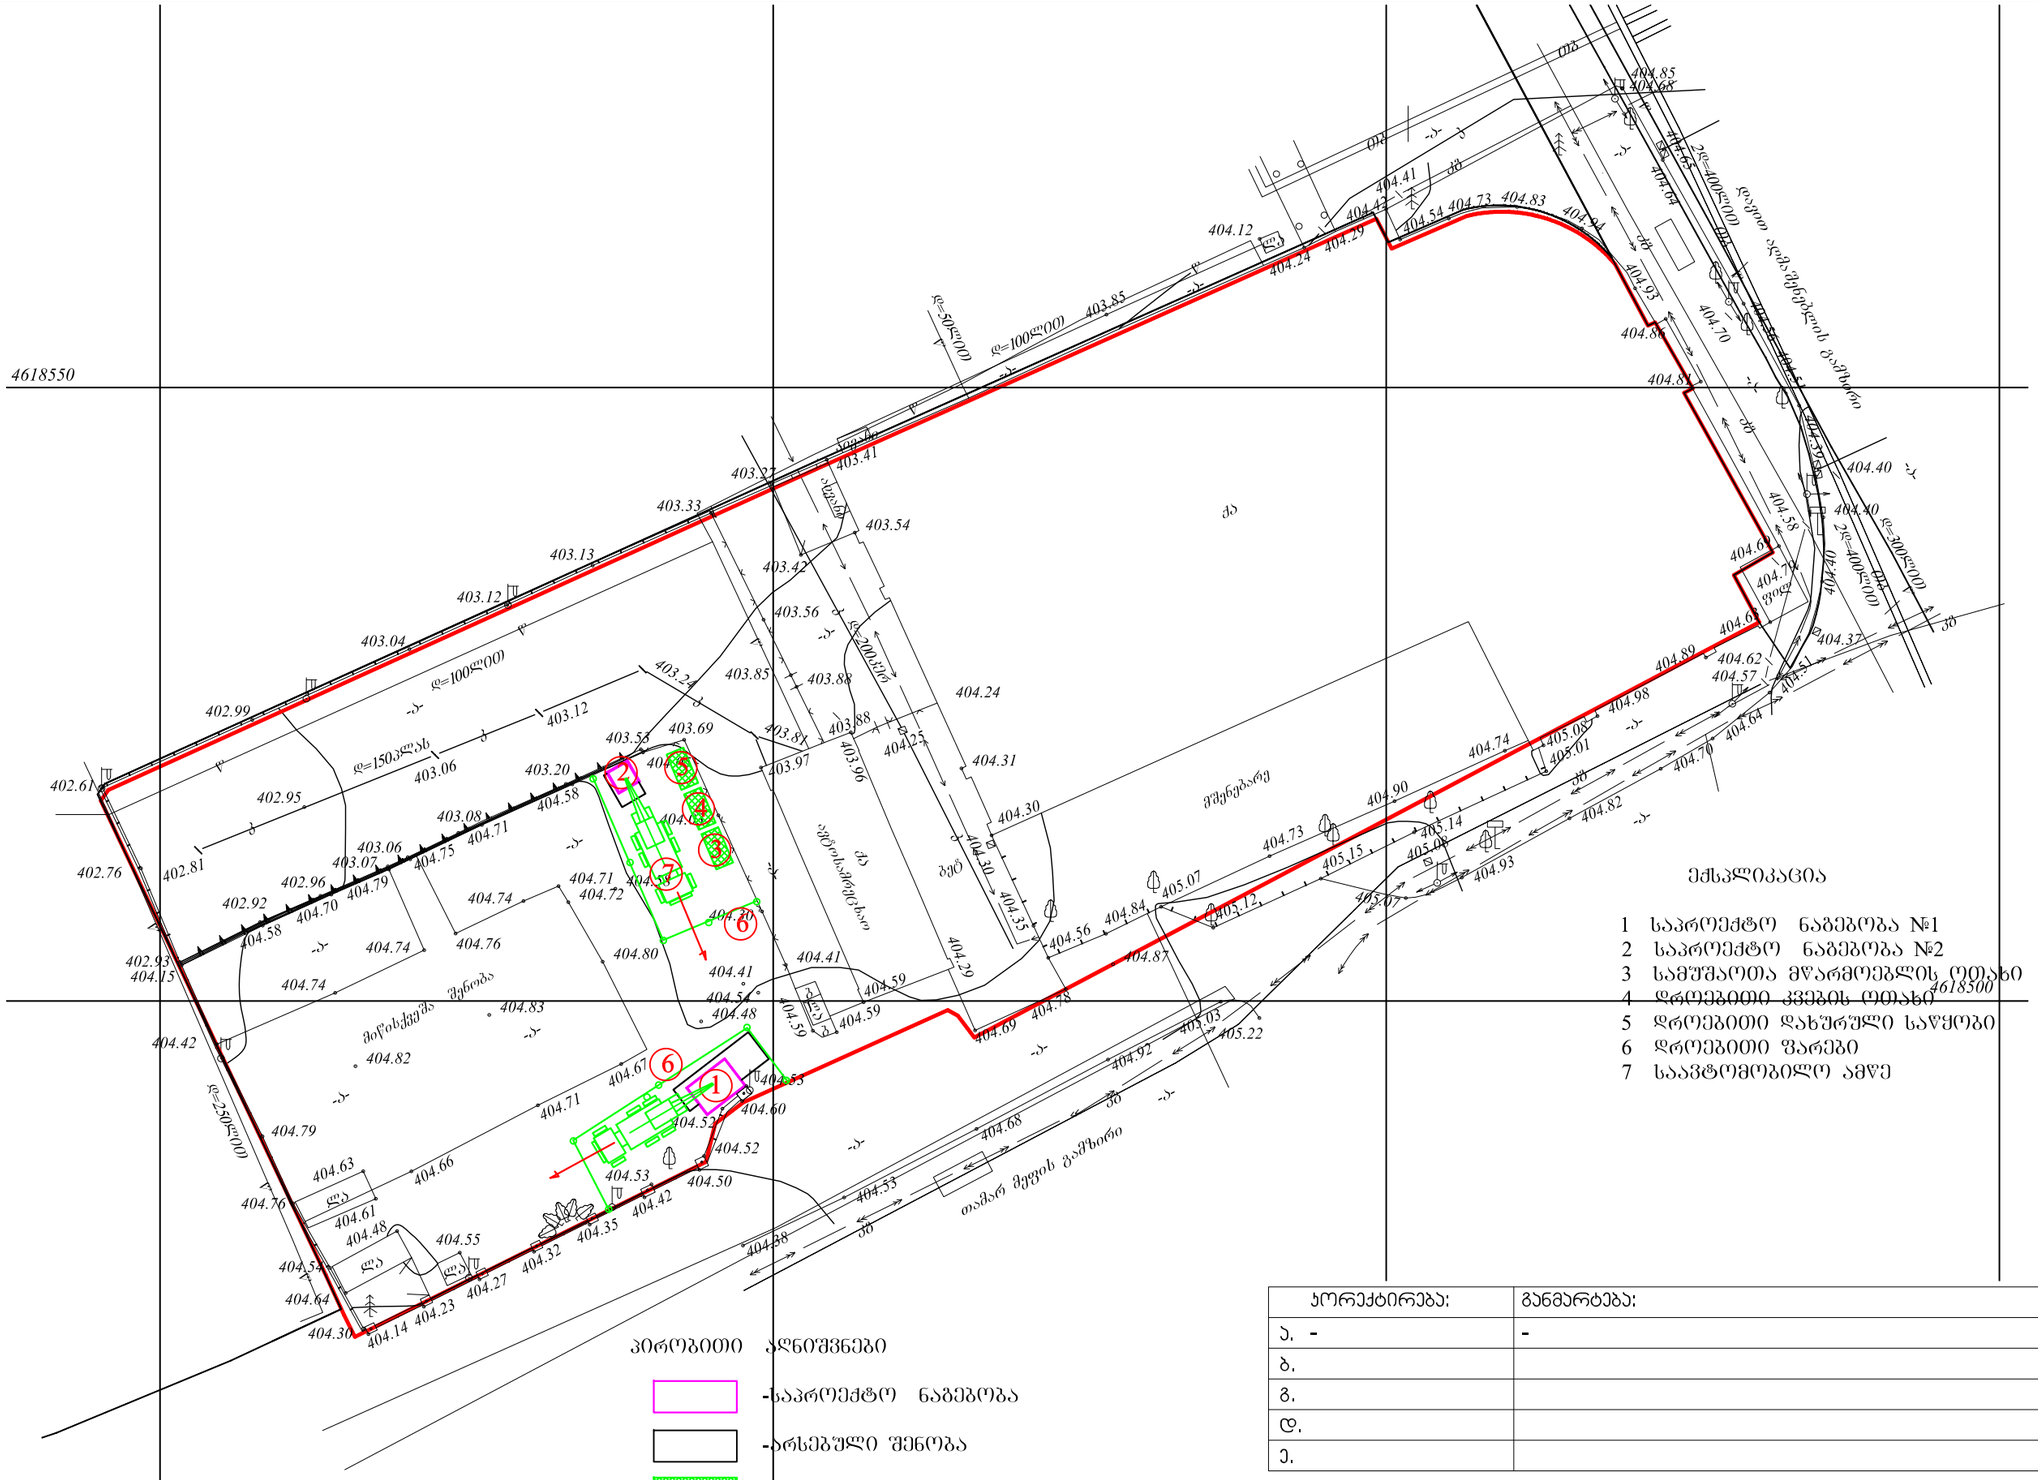
4618550
4618500
ქ. დავით აღმაშენებლის გამზირი
ფიცრის ქარხანა
ზეინკლის სახელოსნო
ავტოსადგომი
ოთარ მეფის გამზირი
ლა
ლა
ლა
