სარეკლამო აბრის მოწყობის სამუშაოები

განმარტებითი ბარათი

1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია СниП 3.01.01-85 თანახმად შემოკლებულ ვარიანტში.

სარეკლამო აბრა უნდა მოეწყოს ქ. თბილისში, ლეონიძის ქუჩის #2-ში მდებარე შენობის ფასადზე.

კედელი აშენებულია აგურით, სართულშუა გადახურვები წარმოადგენს რკ/ბეტონის ფილას.

ტექნიკურ - ეკონომიკური მაჩვენებლები:

- მიწის ნაკვეთის ფართი ---- 1009,00 მ^2
- მოსაწყობი სარეკლამო აბრის გაბარიტებია:

სიმაღლე -- 9,6 მ.; სიგანე -- 1,68 მ.

2. სამშენებლო ორგანიზაცია ამუშავებს სამუშაოთა წარმოების პროექტს. ამ პროექტის შედგენა უნდა ხდებოდეს მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში მიღებული გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

ფეხმავალთა უსაფრთხოების მიზნით უნდა მოხდეს დროებითი უსაფრთხოების ლენტების მოწყობა.

3. სარეკლამო აბრა დამაგრებულია ლითონის კარკასზე. რომლის მიმაგრება კედელზე უნდა განხორციელდეს წინასწარ მოწყობილ სამაგრებზე.

აღნიშნული სამუშაოები ითვალისწინებს შენობის კედელზე სამაგრების მოწყობას და მასზე სარეკლამო აბრის დამაგრებას.

4. მშენებლობის ხანგრძლივობა СниП 3.01.01-85 თანახმად, განისაზღვრა 15 დღე.

მანქანა - მექანიზმების უწყისი

#	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	ერთეულის განზომილება	რაოდენობა
1	ამწე-კალათა	ცალი	1

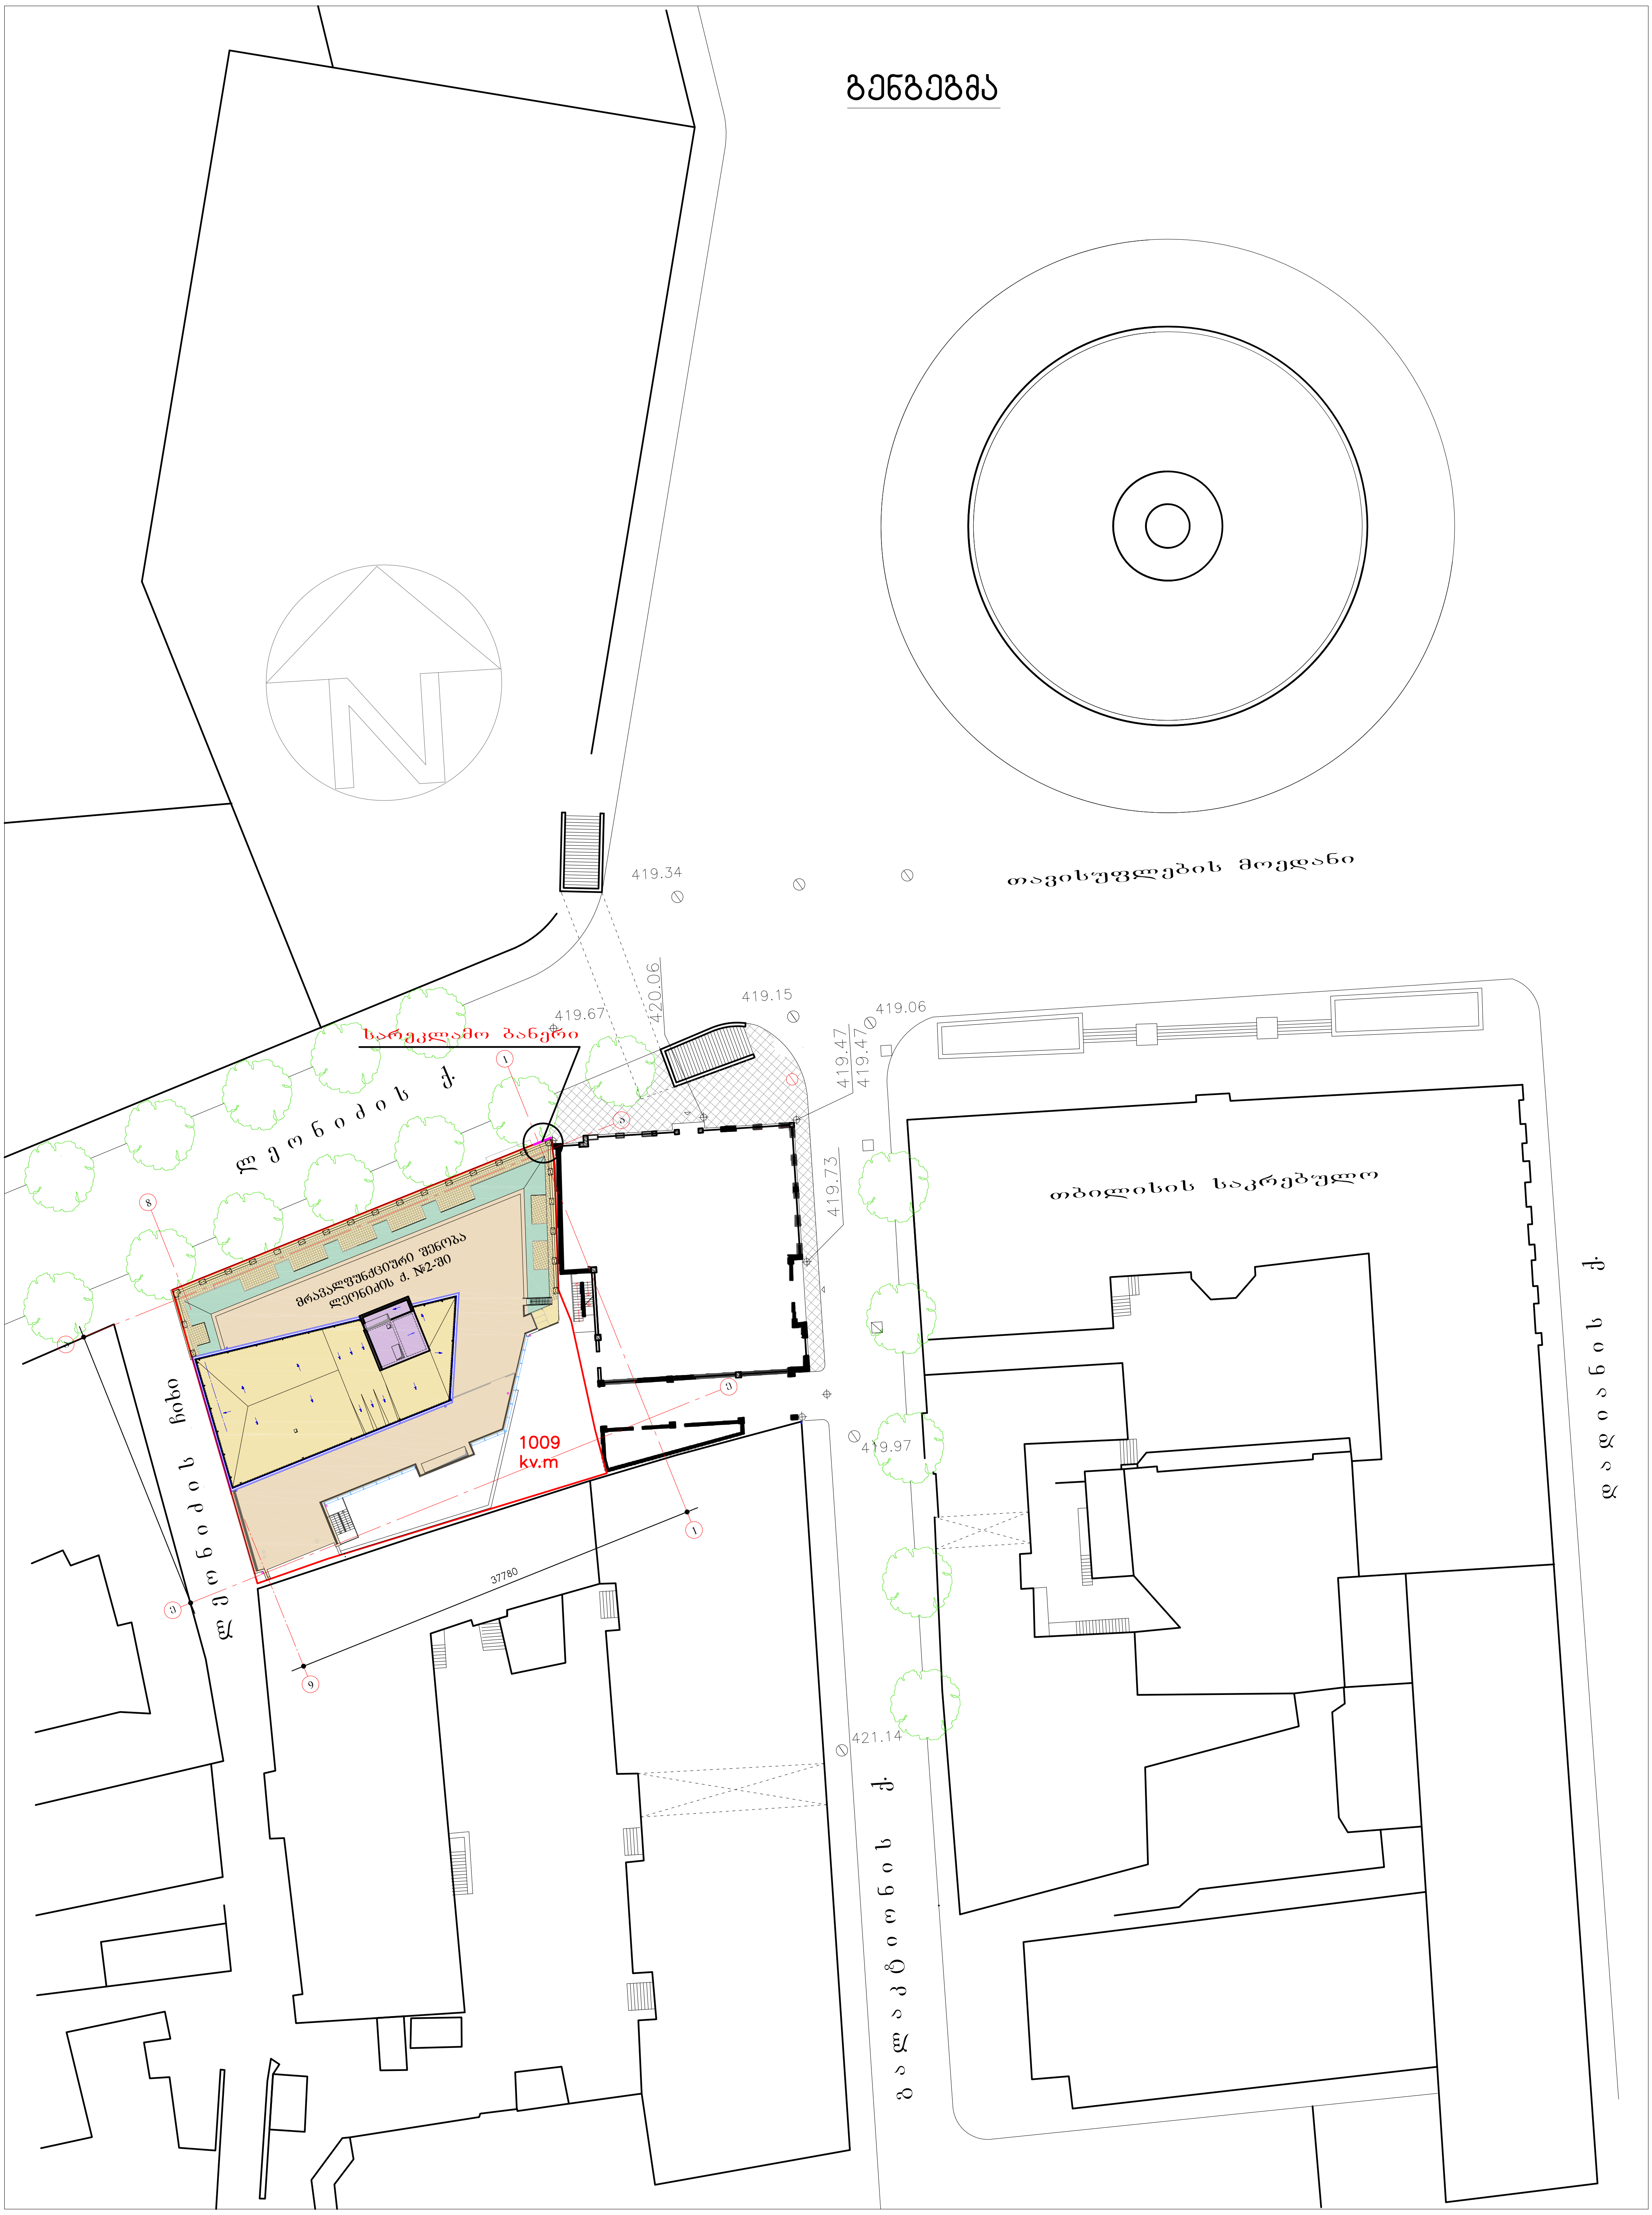

გენგეგმა
თავისუფლების მოედანი
სარეკლამო ბანერი
ლეონიძის ქ.
მრავალფუნქციური შენობა ლეონიძის ქ. №2-ში
1009 kv.m
თბილისის საკრებულო
ლეონიძის ჩიხი
გალაკტიონის ქ.
დადიანის ქ.
419.34
420.06
419.15
419.06
419.67
419.47
419.47
419.73
419.97
421.14
37780

კალენდარული გეგმა T=15 დღე

№	სამუშაოს დასახელება	დღე	5	10	15	20	25	30
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	5	—					
2	სარეკლამო აბრის და სამაგრების მოწყობა	8		—	—			
3	ტერიტორიის დასუფთავება	1			-			
4	ნაგვის გატანა	1			-			

დაამუშავა /ე. ხუროძე/
