გენგეგმა მ.1:500

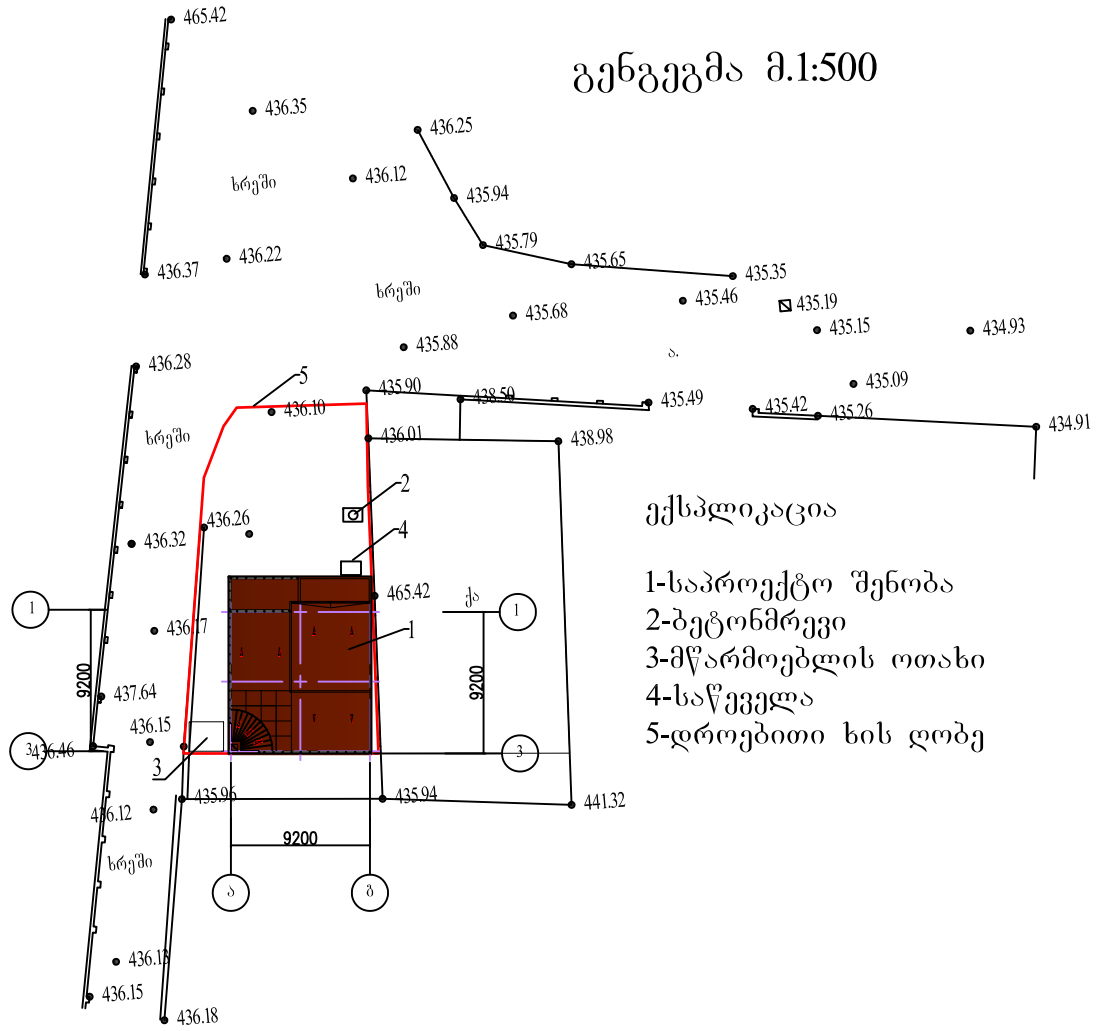

ექსპლიკაცია

1-საპროექტო შენობა
2-ბეტონმრევი
3-მწარმოებლის ოთახი
4-საწვეველა
5-დროებითი ხის ღობე

სამონტაჟო სქემა

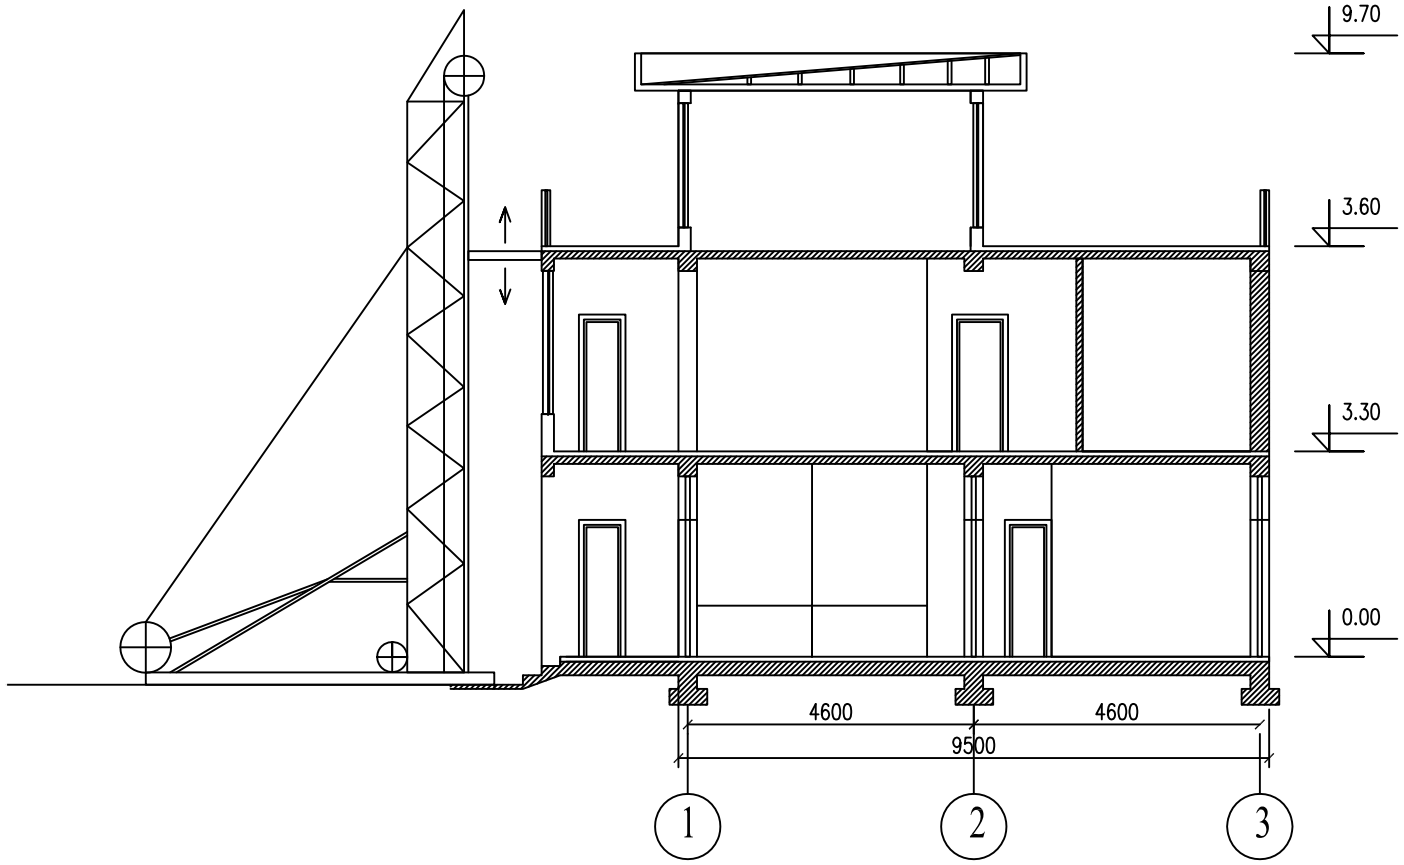

ტპ-3ა ტექნიკური დახასიათება

1. ტვირთამწეობა – 320 კგ.
2. აწევის სიმაღლე – 9 მ.
3. აწევის სიჩქარე – 0.5 მ/წ
4. ბაზის ზომა:
   სიგრძე – 1.5 მ.
   სიგანე – 0.9

სარტებითი ბარათი

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია შემოკლებულ ვრიანტში.
პროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება სამშენებლო ნორმების და წესების – СНИП-1.04.03-85 (გვ. 489 ვ. 3) ხედვით T=8თვე. სადაც I თვე – მოსამზადებელი პერიოდის ნგრძლივობა. სეისმური კოეფიციენტის მიხედვით T=8X1.1=9.0 თვე.
ოსამზადებელ პერიოდში უნდა განხორციელდეს შემდეგი სამუშაოები – როებითი შენობების დაყენება, ნაგვის გატანა, საპროექტო ქსელების ყვანა, სამშენებლო მოედნის უზრუნველყოფა დროებითი ენერგიით და ლით საპროექტო ქსელებიდან.
ბულის დამუშავების დროს გრუნტი უნდა იქნას გატანილი და ემოტანილი უკუ ჩაყრისათვის. არსებულ ქსელებთან გრუნტი უნდა ამუშავდეს ხელით.
მონტაჟო სამუშაოებისათვის უნდა იქნას გათვალისწინებული სამშენებლო საწვეველა ТП-3А (С-598).
მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში მომუშავეთა შრომის საფრთხოების და სანიტარულ-ჰიგიენური მომსახურების საკითხებზე ოვარ წყაროდ წარმოდგენილია სამშენებლო ნორმების და წესების НИП-III-4-80* «უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში».

შემსრულებელი: ინდმეწარმე ლევან ენუქიძე			დამკვეთი: ამირან ჭადაძე		დაკვეთა №4/2012	
ხელმძღვანელი	ლ.ენუქიძე		საოფისე შენობა დავით აღმაშენებლის ხეივნის მე-12კმ. ნაკვეთი №14///598	სტადია	ფურც.	სულ
ავტორი	ო.ენუქიძე			პრ-ტი	მო-1	2
პრ.მთ.არქ.	ო.ენუქიძე					
დაამუშავა	გ.ჟორჟოლიანი		სამშენებლო გენგეგმა და სამონტაჟო სქემა	თბილისი 2012წ.		

მშენებლობის დღიური გრაფიკი

№	სამუშაოების დასახელება	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	ტერიტორიის მოსამზადებელი სამუშაოები-წყლის და ელექტრო მომარაგება, შემოღობვა.	10																										
2	შენობის დაკვალვა, საძირკვლის გრუნტის ამოღება გატანა.		20																									
3	საძირკვლისა და რანდკოჭების მოწყობა					30																						
4	ნულოვანი ციკლის დასრულება						10																					
5	რკ/ბეტონის კოლონებისა და რიგელების მოწყობა								40																			
6	რკ/ბეტონის გადახურვებისა და კიბის მოწყობა											40																
7	გარე და შიდა კედლებისა და ტიხრების წყობა														30													
8	კიბისა და ტერასის მეტალის მოაჯირების მონტაჟი																	30										
9	სანტექნიკური და ელტექნიკური სამუშაოების მონტაჟი																	20										
10	გარე და შიდა კედლების ლესვა																				40							
11	იგივე კედლების სამალიარო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																							40				
12	ტერიტორიის გასუფთავება და კეთილმოწყობა																										20	

შემსრულებელი: ინდმეწარმე ლევან ენუქიძე			დამკვეთი: ამირან ჭადაძე	დაკვეთა №4/2012		
ხელმძღვანელი	ლ.ენუქიძე		საოფისე შენობა დავით აღმაშენებლის ხეივნის მე-12კმ. ნაკვეთი №14///598	სტადია	ფურც.	სულ
ავტორი	ო.ენუქიძე			პრ-ტი	მო-2	2
პრ.მთ.არქ.	ო.ენუქიძე					
დაამუშავა	გ.ჟორჟოლიანი		მშენებლობის დღიური გრაფიკი	თბილისი 2012წ.		
