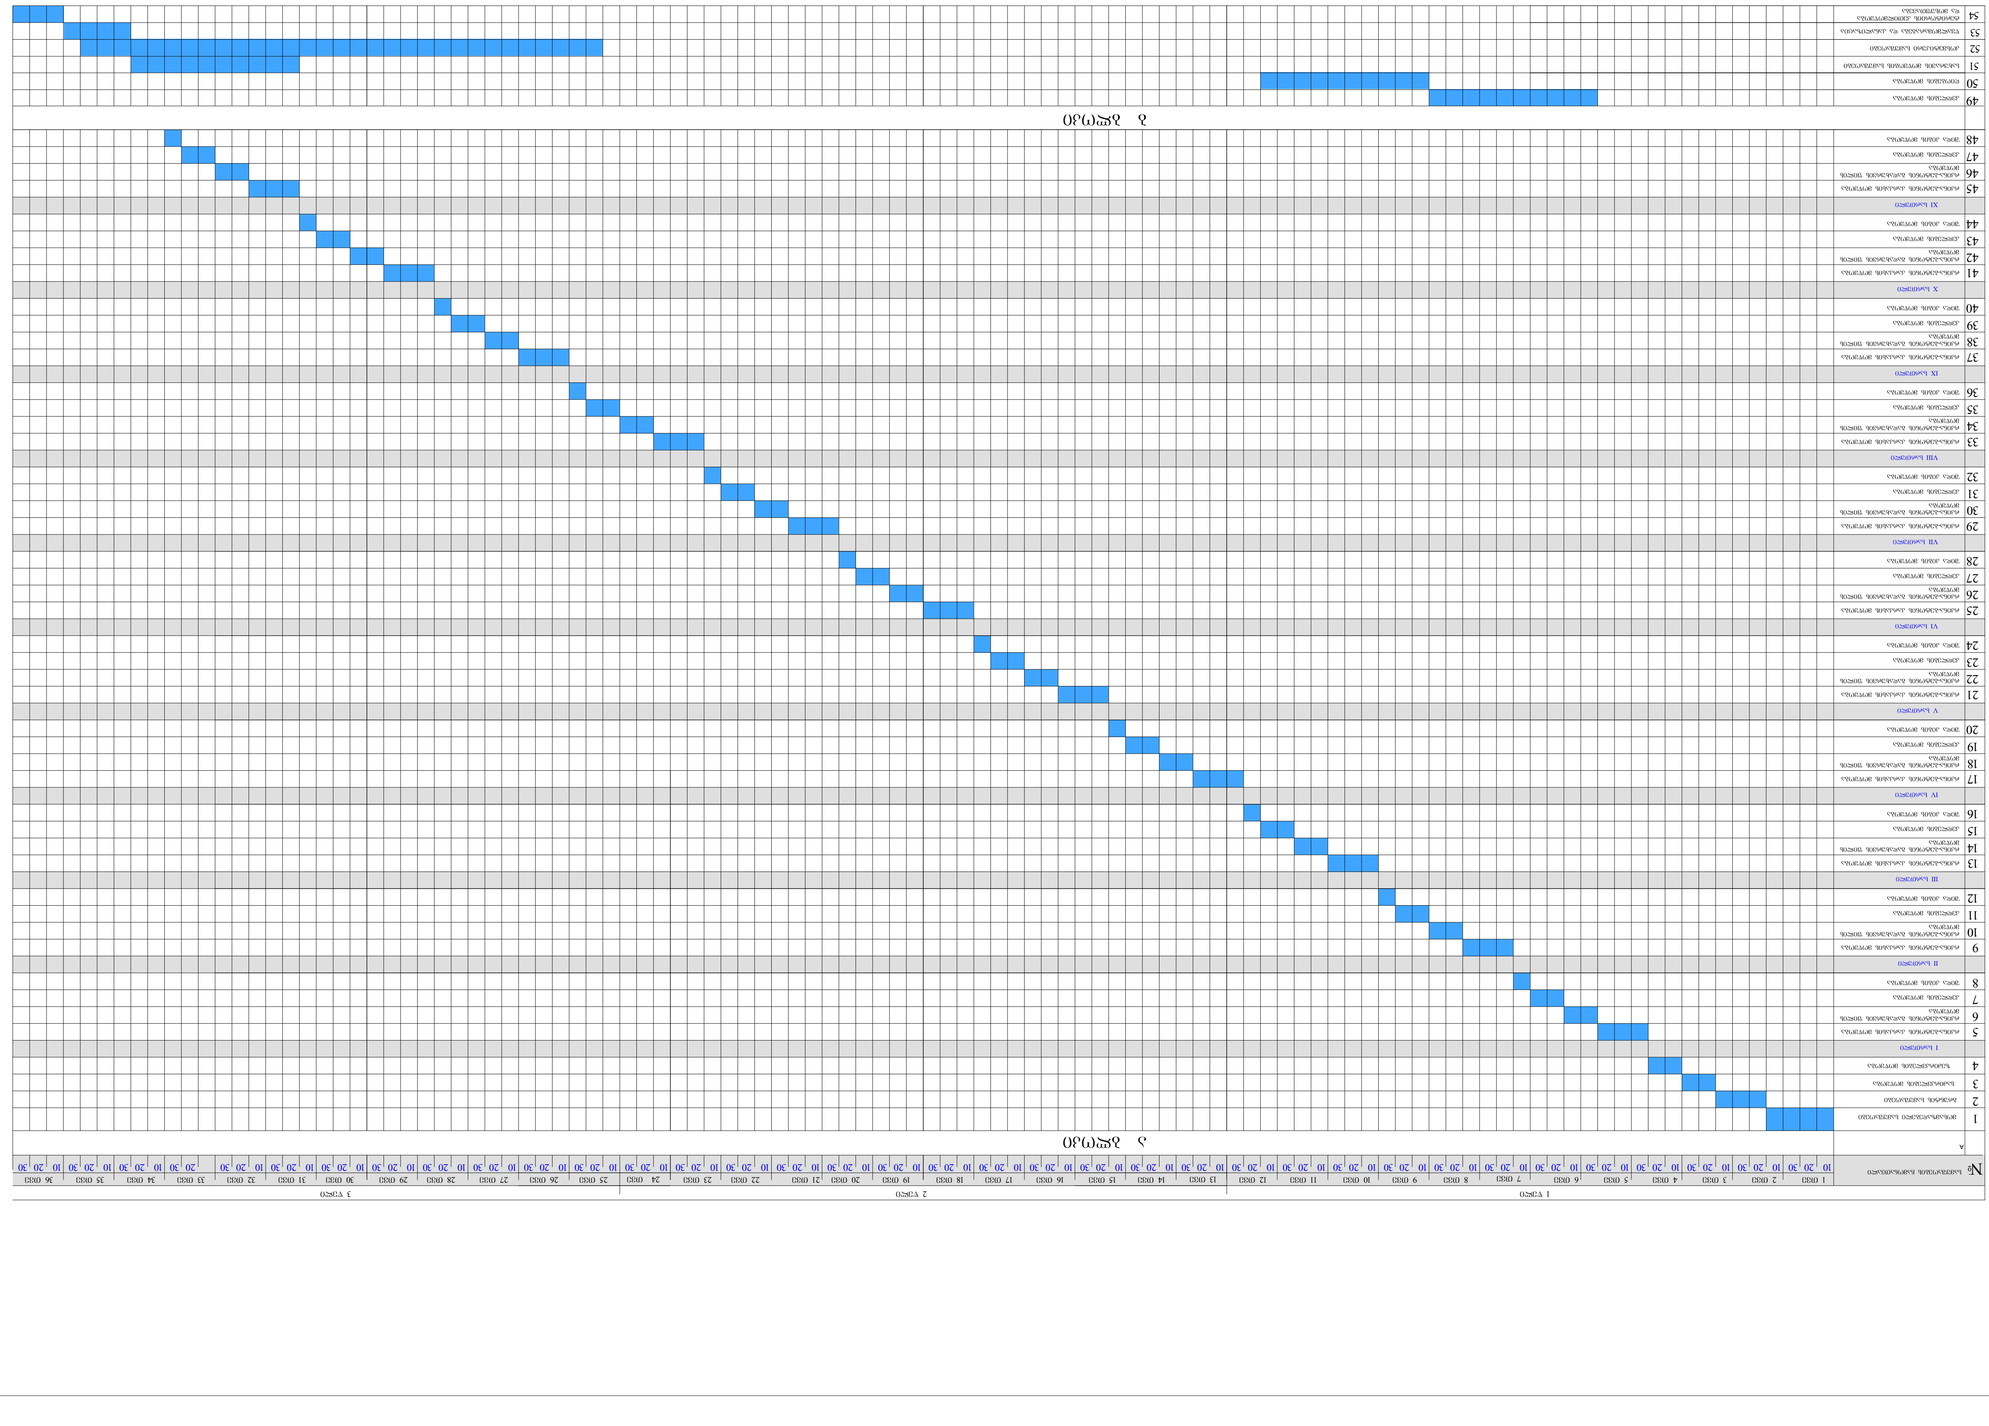

მასშტაბი ფურცელი

თარიღი

ნახაზის

დასახელება

ობიექტის

მისამართი

12.12.2016

1:100

დამკვეთი მანანა დემურაშვილი

ქ.თბილისი. დიღომი
დირექტორი

არქიტექტორი გურამ

ჟორჟოლიანი

A-1

შპს `ნიუ პოინტ~ თბილისი, საბურთალოს ქ. 44

Ltd `New პოინტ~ საბურტალოს 44 სტ. თბილისი, Georgia, 0160

(+99532) 2945808; 557 704433,

www.newpoint.ge info@newpoint.ge

გ. კირკიტაძე

1 თვე 2 თვე 3 თვე 4 თვე 5 თვე
სამუშაოების ჩამონათვალი

6 თვე

10 20 30

გრუნტის სამუშაოები

საძირკვლების მოწყობა

ზეძირკვლების მოწყობა

1

2

3

4

I სართული
რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა

რკინა-ბეტონის გადახურვის ფილის

მოწყობა
5

6

7

8 თვე 9 თვე 10 თვე 11 თვე 12 თვე

სახურავის მოწყობის სამუშაოები

კოსმეტიკური სამუშაოები

წყალმომარაგება და კანალიზაცია

ტერიტორიის კეთილმოწყობა

და მოსუფთავება

13 თვე 14 თვე

მოსამზადებელი სამუშაოები

16 თვე 17 თვე 18 თვე

51

52

53

54

7 თვე

10 30 20 30 10 30 20 10 30 20 10 30 20 10 30 20 10 30 20 10 30 20 10 30 20 10 30 20 10 30 20 10 30 20 10 30 20 10 30 20 10 30 20 10 30 20 10 30 20 10 20

კედლების მოწყობა

შიდა კიბის მოწყობა

10 20 30 10 20 30 10 20 30

19 თვე 21 თვე 20 თვე

10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30

22 თვე 23 თვე 24 თვე 26 თვე 27 თვე 29 თვე 28 თვე

10 20 30 10 20 30 10 20 30

30 თვე 32 თვე 33 თვე 34 თვე 35 თვე 36 თვე 31 თვე

20 30 30 10 30 20 10 30 20 10 20

8

II სართული
რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა

რკინა-ბეტონის გადახურვის ფილის

მოწყობა
9

10

11 კედლების მოწყობა

12 შიდა კიბის მოწყობა

III სართული
რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა

რკინა-ბეტონის გადახურვის ფილის

მოწყობა
13

14

15 კედლების მოწყობა

16 შიდა კიბის მოწყობა

IV სართული

რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა

რკინა-ბეტონის გადახურვის ფილის

მოწყობა
17

18

19 კედლების მოწყობა

20 შიდა კიბის მოწყობა

V სართული
რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა

რკინა-ბეტონის გადახურვის ფილის

მოწყობა
21

22

23 კედლების მოწყობა

24 შიდა კიბის მოწყობა

VI სართული

რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა

რკინა-ბეტონის გადახურვის ფილის

მოწყობა
25

26

27 კედლების მოწყობა

28 შიდა კიბის მოწყობა

VII სართული

რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა

რკინა-ბეტონის გადახურვის ფილის

მოწყობა
29

30

31 კედლების მოწყობა

32 შიდა კიბის მოწყობა

VIII სართული

რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა

რკინა-ბეტონის გადახურვის ფილის

მოწყობა
33

34

35 კედლების მოწყობა

36 შიდა კიბის მოწყობა

IX სართული

რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა

რკინა-ბეტონის გადახურვის ფილის

მოწყობა
37

38

39 კედლების მოწყობა

40 შიდა კიბის მოწყობა

X სართული
რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა

რკინა-ბეტონის გადახურვის ფილის

მოწყობა
41

42

43 კედლების მოწყობა

44 შიდა კიბის მოწყობა

XI სართული

რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა

რკინა-ბეტონის გადახურვის ფილის

მოწყობა
45

46

47 კედლების მოწყობა

48 შიდა კიბის მოწყობა

15 თვე 25 თვე
1 წელი 2 წელი 3 წელი

A Aa ბლოკი

Ab ბლოკი

კედლების მოწყობა

ღიობების მოწყობა

49

50

კალენდარული გეგმა
