მშენებლობის დღიური გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
ტერიტორიის დაკვალვა და შემოღობვა	5																																			
სამრკვლის ქვეშ მიწის ამოღება				85																																
შენობის შუძის მოწყობა										70																										
ნულოვანი ციკლის დასრულება													70																							
შენობის ლითონის კარკასის მოწყობა																									140											
შენობის გადახურვის დასრულება																										120										
კედლების მოწყობა																												90								
კედლების შეღებვა																													80							
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																	60			

დირექტორი	ა. კინწურაშვილი		ქ. თბილისი,დ. აღმაშენებლის ხეივანი №6. აეროსერვისის შენობა	EMPIRE ARCHITECTURE
პროექტის ავტორი	ა. კინწურაშვილი		მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი	
შეხრული	დ.ზამბახიძე		მშენებლობის დღიური გრაფიკი	სტადია: მ.პ. / ფურცელი: 1 / თარიღი: 2012 წ.

სამშენებლო გენგეგმა მ. 1:500

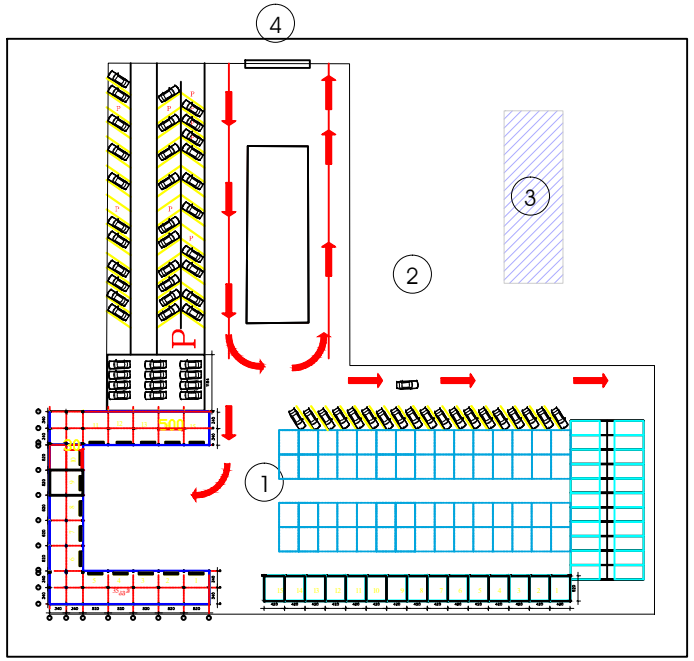

pirobiTi aRniSvna

1.samSeneblo ubani
2.droebiTi gzebi

3.sawyobi
2.obieqtze Sesasvleli

სამონტაჟო სქემა მ. 1:200

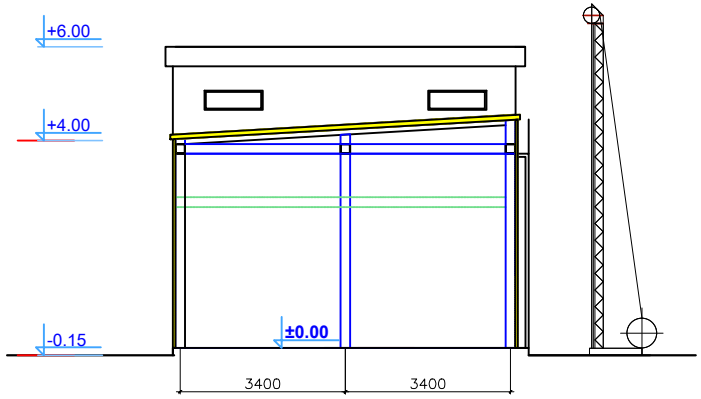

TP-3A ტექნიკური დახასიათება

1.	ტვირთამწეობა	320 კგ.
2.	აწევის სიმაღლე	8 მ.
3.	აწევის სიჩქარე	0.5 მ/წმ.
4.	ბაზის ზომები:	
	სიგრძე	1.5 მ.
	სიგანე	0.5 მ.

განმარტებითი ბარათი

1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია შემოკლებულ ვარიანტში.
2. საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება სამშენებლო ნორმებისა და წესების -СНИП-1.04.03-85(გვ.479 ბ.4) მიხედვით თ=12 თვე, სადაც 1 თვე მოსამზადებელი პერიოდის ხანგრძლივობაა.
სეისმური კოეფიციენტის მიხედვით თ=12*1.1=13 თვე.
3. მოსამზადებელ პერიოდში უნდა განხორციელდეს შემდეგი სამუშაოები - დროებითი შენობის დადგმა, ნაგვის გატანა, საპროექტო ქსელების გაყვანა, სამშენებლო მოედნის უზრუნველყოფა დროებითი ენერგიითა და წყლით საპროექტო ქსელებიდან.
4. ქვაბულის დამუშავების დროს გრუნტი უნდა იქნეს გატანილი და შეთოტანილი უკუჩაყრისათვის. არსებულ ქსელებთან გრუნტი უნდა დამუშავდეს ხელით.
5. სამონტაჟო სამუშაოებისათვის უნდა იქნას გათვალისწინებული სამშენებლო საწევარა თ -3 (ჩ-598).
6. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში მომუშავეთა შორის უსაფრთხოების და სანიტარულ-ჰიგიენური მომსახურების საკითხებზე მთავარ წყაროდ წარმოდგენილია სამშენებლო ნორმებისა და წესებისСНИП-III-4-80* "უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში"

დირექტორი	ბ. კინწურაშვილი		ქ. თბილისში,დ. აღმაშენებლის ხეივანი №6. აუტოსერვისის შენობა	EMPIRE ARCHITECTURE
პროექტის ავტორი	ბ. კინწურაშვილი		მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი	
შეასრულა	დ.ზამბახიძე			
			სამშენებლო გენგეგმა, სამონტაჟო სქემა	სტადია: მ.პ. / გვერდი: 2 / თარიღი: 2012 წ.
