სამშენებლო გენგეგმა მ. 1:500

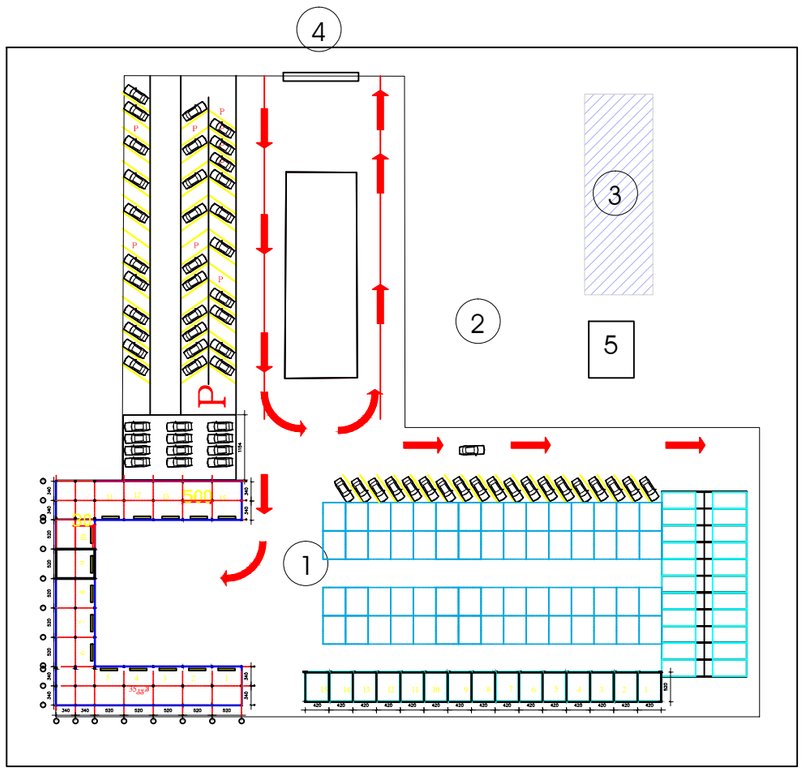

პირობითი აღნიშვნა

1.სამშენებლო უბანი
2.დროებითი გზები
3.საწყობი
4.ობიექტზე შესასვლელი
4.არსებული სადემონტაჟო დაცვის ჯიხური

სამონტაჟო სქემა მ. 1:200

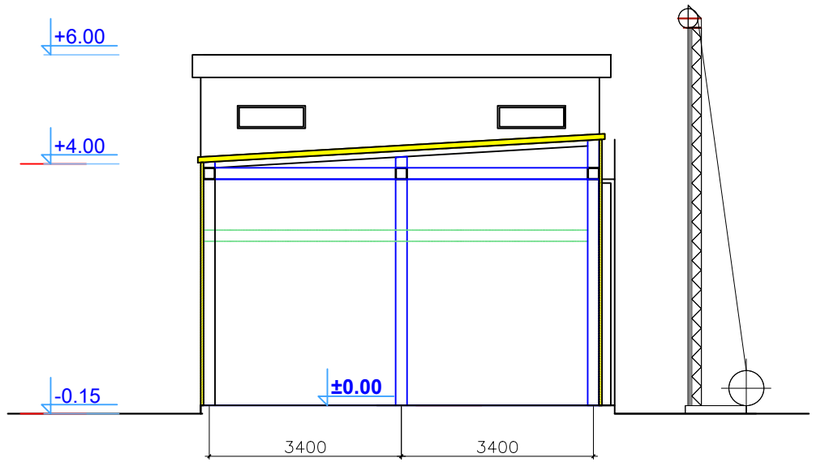

TP-3A ტექნიკური დახასიათება

1. ტვირთამწეობა	320 კგ.
2. აწევის სიმაღლე	8 მ.
3. აწევის სიჩქარე	0.5 მ/წმ.
4. ბაზის ზომები:	
სიგრძე	1.5 მ.
სიგანე	0.5 მ.

განმარტებითი ბარათი

1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია შემოკლებულ ვარიანტში.
2. საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება სამშენებლო ნორმებისა და წესების – СНИП–1.04.03–85(გვ.479 პ.4) მიხედვით T=12 თვე, სადაც 1 თვე მოსამზადებელი პერიოდის ხანგრძლივობაა.
სეისმური კოეფიციენტის მიხედვით T=12*1.1=13 თვე.
3. მოსამზადებელ პერიოდში უნდა განხორციელდეს შემდეგი სამუშაოები –არსებული დაცვის ჯიხურის დემონტაჟი, დროებითი შენობის დადგმა, ნაგვის გატანა, საპროექტო ქსელების გაყვანა, სამშენებლო მოედნის უზრუნველყოფა დროებითი ენერგიითა და წყლით საპროექტო ქსელებიდან.
4. ქვაბულის დამუშავების დროს გრუნტი უნდა იქნეს გატანილი და შემოტანილი უკუჩაყრისათვის. არსებულ ქსელებთან გრუნტი უნდა დამუშავდეს ხელით.
5. სამონტაჟო სამუშაოებისათვის უნდა იქნას გათვალისწინებული სამშენებლო საწევი ელა TP–3A(C–598).
6. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში მომუშავეთა შორის უსაფრთხოების და სანიტარულ–ჰიგიენური მომსახურების საკითხებზე მთავარ წყაროდ წარმოდგენილია სამშენებლო ნორმებისა და წესების СНИП–III–4–80* "უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში"

პროექტის ავტორი	ბ. კინწურაშვილი		შპს "ევროპული განვითარების ხელოვნი №6. ავტოსერვისის შპს"		
შესრულა	ლ.ხამბახიძე		მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი		EMPIRE ARCHITECTURE
			სამშენებლო გენგეგმა, სამონტაჟო სქემა	სტადია	ფურცელი	თარიღი
				მ.პ.	2	2012 წ.

მშენებლობის დღიური გრაფიკი

	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
I რიგის სამუშაოები	ტერიტორიის დაკვალვა და შემოღობვა	5																																			
	არსებული დაცვის ჯიხურის სახურავის დემონტაჟი		2																																		
	არსებული დაცვის ჯიხურის კედლების დემონტაჟი		3																																		
	არსებული დაცვის ჯიხურის საძირკვლების დემონტაჟი		2																																		
	ბალასტის დაჭრა და ტერიტორიის მოსწორება		3																																		
II რიგის სამუშაოები	ძირითადი ნაგებობის საძირკველის ქვეშ მიწის ამოღება					85																															
	შენობის წუძის მოწყობა										70																										
	ნულოვანი ციკლის დასრულება													70																								
	შენობის ლითონის კარკასის მოწყობა																									140											
	შენობის გალახვრის დასრულება																										120										
	კედლების მოწყობა																												90								
	კედლების შეღებვა																													80							
	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																60				

დირექტორი	ა. კინწურაშვილი		ქ. თბილისი,დ. აღმაშენებლის ხეივანი №6. აეროსერვისის შენობა	
პროექტის ავტორი	ა. კინწურაშვილი		მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი	EMPIRE ARCHITECTURE
შეხრული	დ.ზამბახიძე			
			მშენებლობის დღიური გრაფიკი	სტადია: მ.პ. / ფურცელი: 1 / თარიღი: 2012 წ.
