განმარტებითი ბარათი

1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია შემოკლებულ ვარიანტში
2. საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება სამშენებლო ნორმების და წესების - СНИП-1,04,03 ю-85 (გვ.479 პ.4) მიხედვით -3 თვე სადაც 0.3 თვე მოსამზადებელი პერიოდის ხანგრძლივობაა. სეისმური კოეფიციენტის მიხედვით T=10x1,1=6 თვე.
3. მოსამზადებელ პერიოდში უნდა განხორციელდეს შემდეგი სამუშაოები: არსებული დახლების დემონტაჟი ტექნიკური საწყობის მომზადება, ნაგვის გატანა, საპროექტო ქსელების გაყვანა, სამშენებლო მოედნის უზრუნველყოფა დროებითი ენერგიით და წყლით არსებული ქსელებიდან.
4. საპროექტო ობიექტის ტერიტორიის დამუშავების დროს ნაწილობრივ გრუნტი უნდა დამუშავდეს ხელით.
5. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში მომუშავეთა შორის უსაფრთხოების და სანიტარულ-ჰიგიენური მომსახურეობის საკითხებზე მთავარ წყაროდ წარმოდგენილია საამშენებლო ნორმების და წესების СНИП-III-4-80* "უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში".

ექსკავატორ-დამტვირთველი

მარკა – 4cx Sitemaster

ძრავის სიმძლავრე – 100 ცხ.ძ.

საექსპლოატაციო მასა – 8660 კგ.

ცაცხვისა და მტვირთავის ტევადობა – 1.2 მ3

ამოღების მაქსიმალური სიღრმე – 5.53მ.

P.S.
დამატებითი საჭიროების ტექნიკა, ტვირთის გადაადგილება და მასალის მოწოდების სატრანსპორტო საშუალებები პირობების გათვალისწინებით

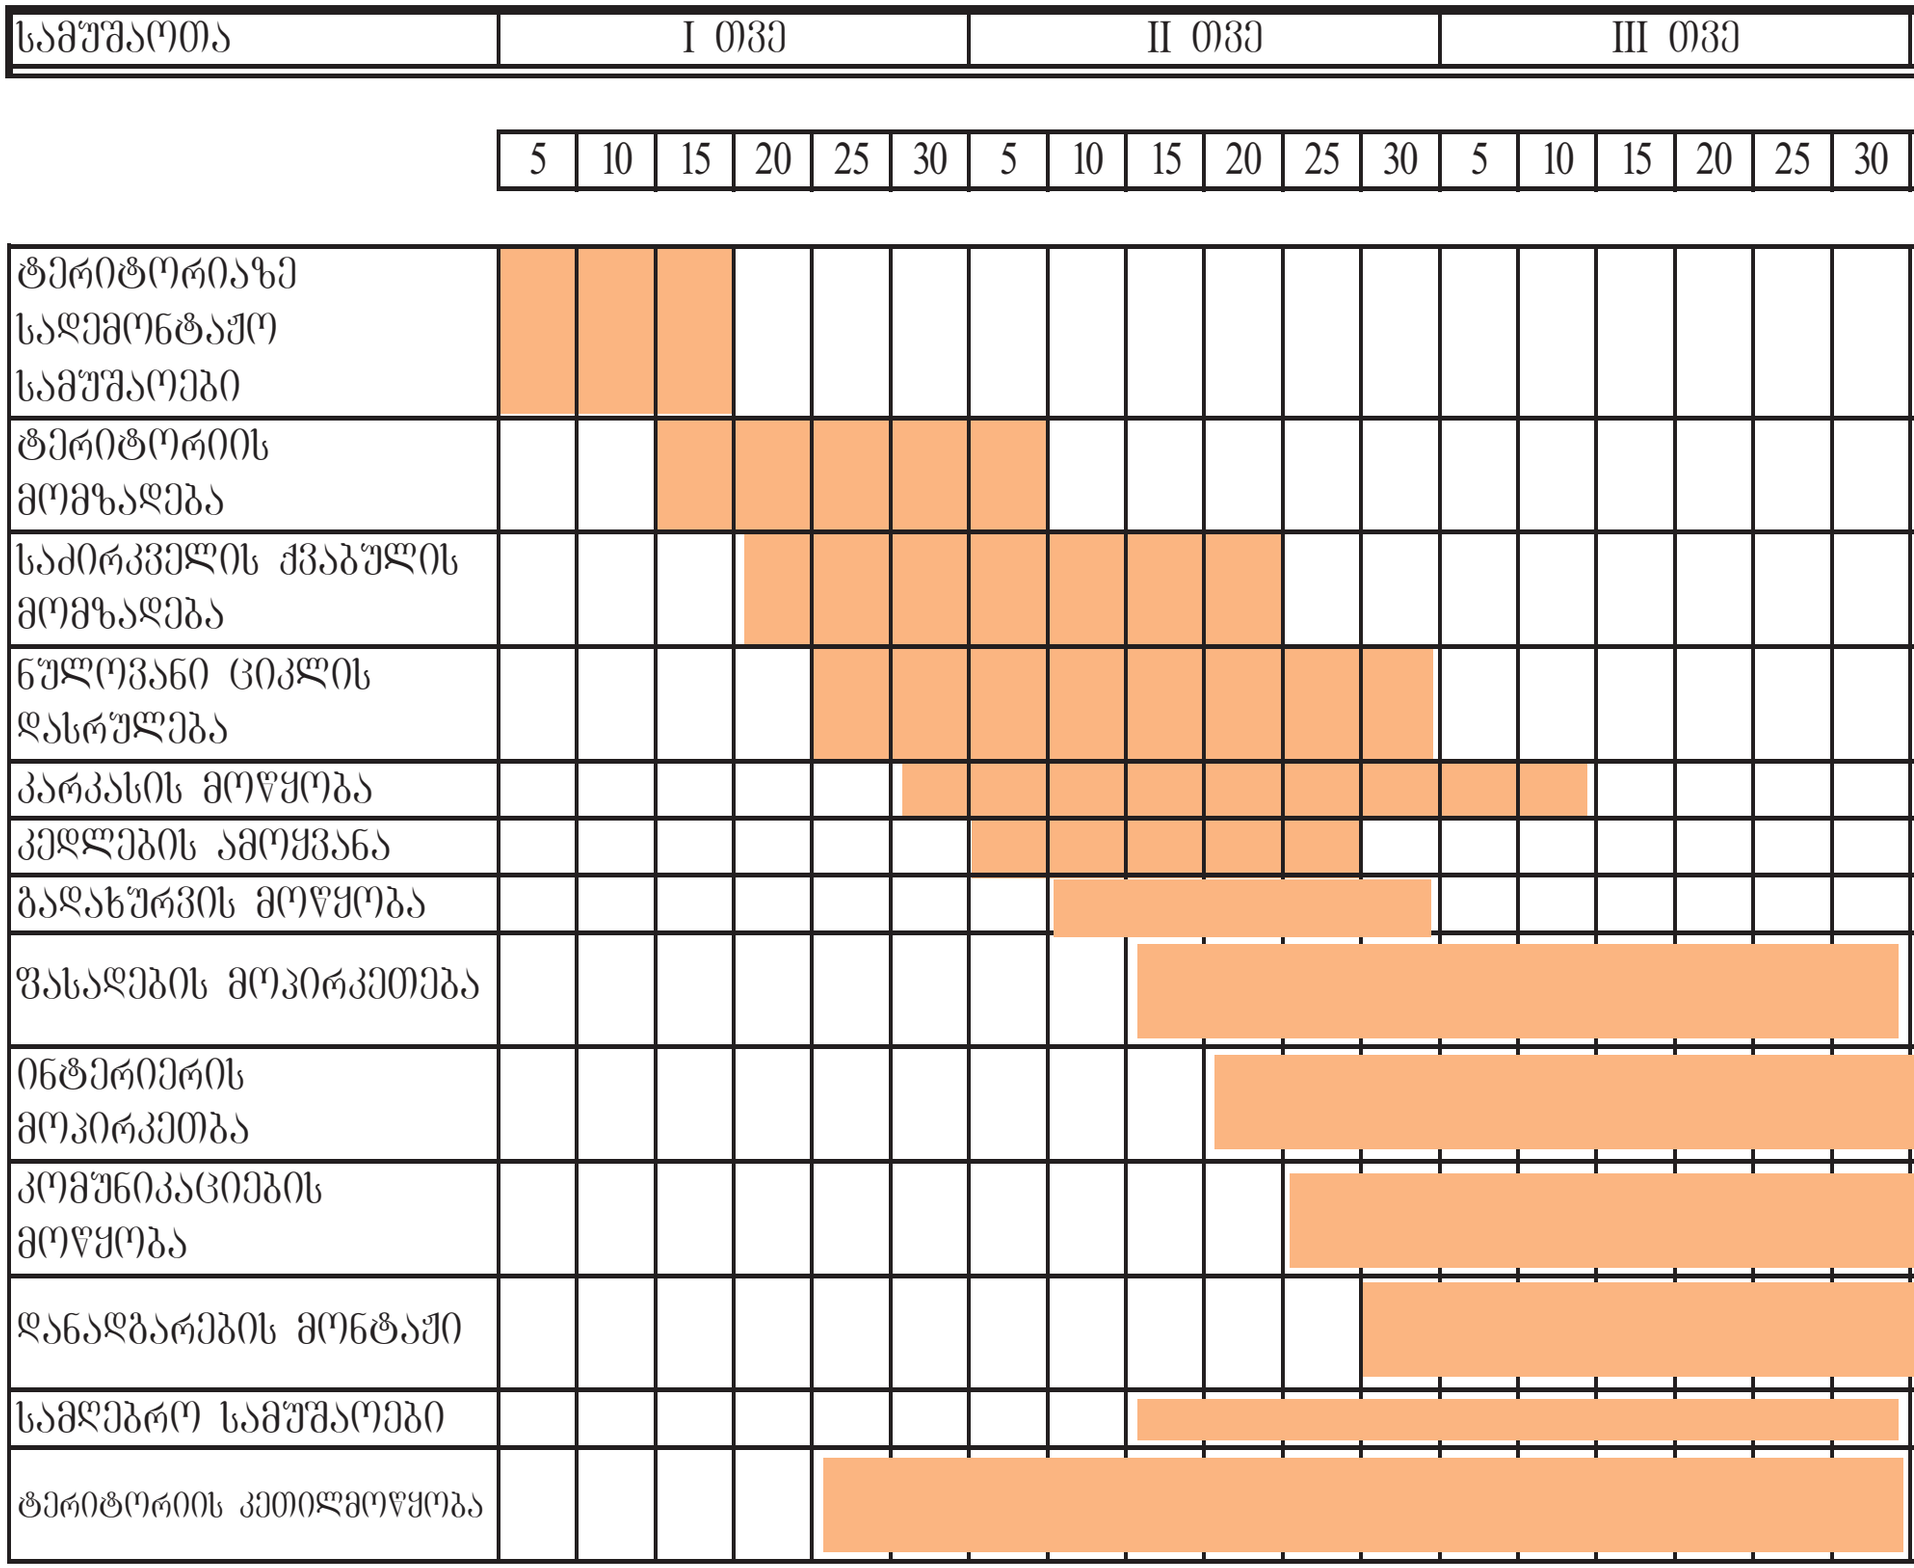
სამუშაოთა
I თვე
II თვე
III თვე
5
10
15
20
25
30
5
10
15
20
25
30
5
10
15
20
25
30
ტერიტორიაზე სადემონტაჟო სამუშაოები
ტერიტორიის მომზადება
საძირკვლის ქვაბულის მომზადება
ნულოვანი ციკლის დასრულება
კარკასის მოწყობა
კედლების ამოყვანა
გადახურვის მოწყობა
ფასადების მოპირკეთება
ინტერიერის მოპირკეთება
კომუნიკაციების მოწყობა
დანადგარების მონტაჟი
სამღებრო სამუშაოები
ტერიტორიის კეთილმოწყობა
