მშენებლობის დღიური გრაფიკი

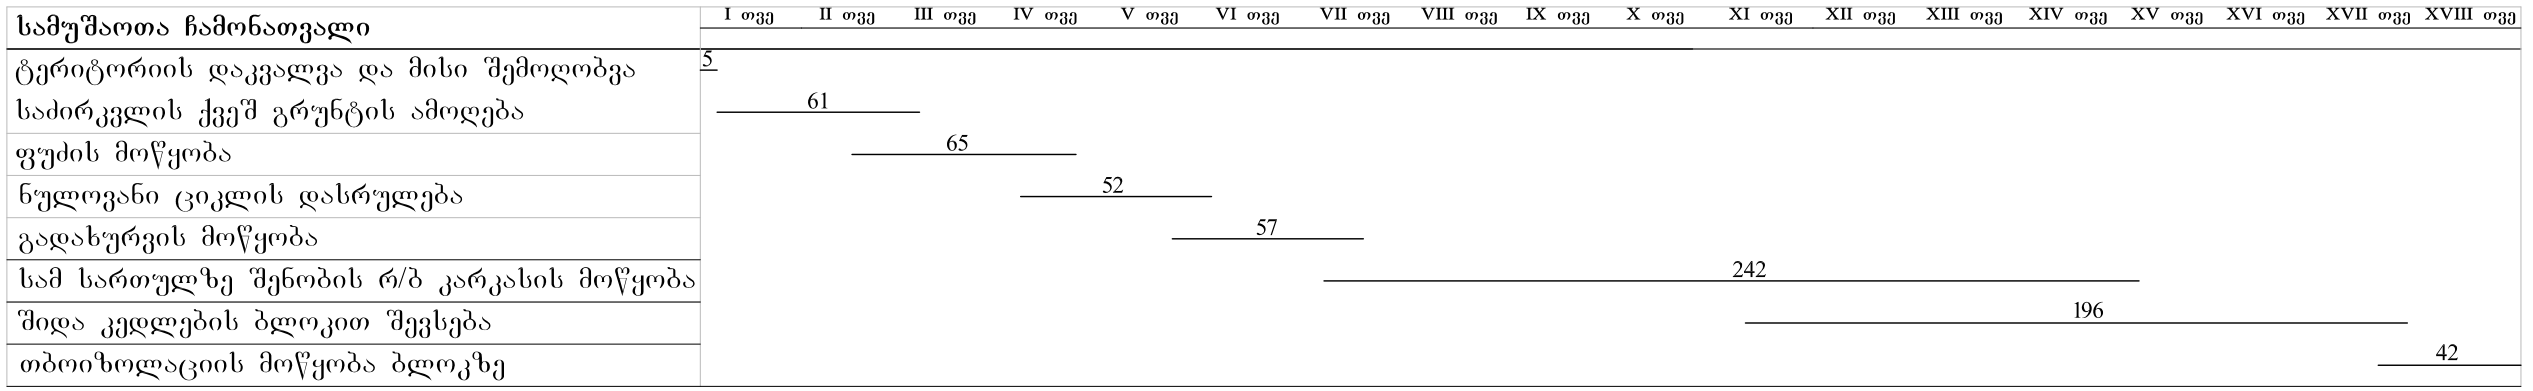

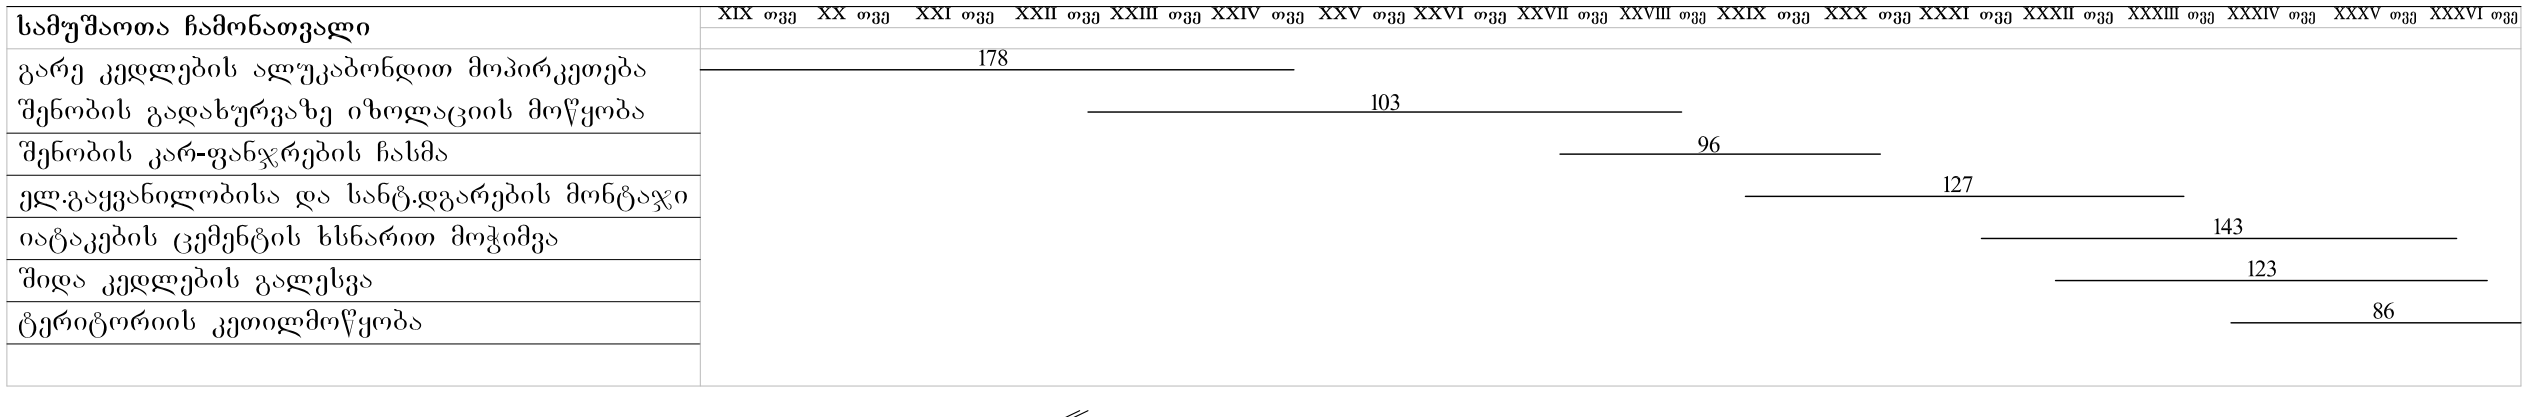

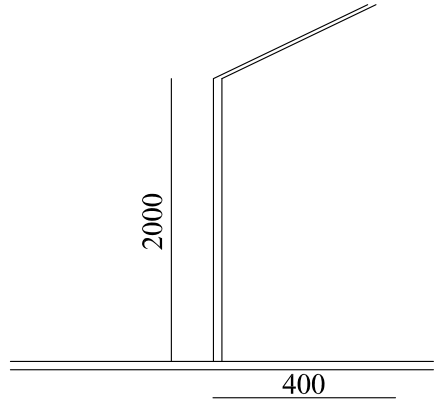

ექსკავატორი 30-4312

ჩამჩის მოცულობა.....1/0.4 მ3
ჩამჩის სიგანე.....1,65/0.65 მ
თხრის მაქსიმ. ჩაღემავება.....6.7/5.8 მ
დატვირთვის მაქსიმ. სიმაღლე.....5.0/6.18 მ

მუშაობის მაქ. რადიუსი

გათხრის.....6.9/10.16 მ
დატვირთვის.....6.9/10.16 მ

დაკვალვა..... 5 დღე
ფუძის მოწყობა..... 65დღე
ნულოვანი ციკლის დასრულება..... 52დღე
გადახურვის მოწყობა..... 57დღე
სამ სართულამდე რ/ბ კარკა.მოწყობა.....242დღე
სამშენებლო სამუშაოების დასრულება..... 21დღე

ი.მ. მაკა ღუღუნიშვილი			ქ.თბილისი, გზატკეცილი კახეთის, ხილბოსტნეული ბაზის მიმდებარედ, (ნაკვ.03/026) **სავაჭრო საოფისე ობიექტი**			
პრ.მთ.არქ.	ქ. ღუღუნიშვილი	მ.ღუღუნიშვილი	მშენებლობის ორგანიზაცია	2020 წელი		
			მშენებლობის დღიური გრაფიკი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მასშტაბი
შეასრულა	ქ. ღუღუნიშვილი	მ.ღუღუნიშვილი				
შეამოწმა	ქ. ღუღუნიშვილი	მ.ღუღუნიშვილი		მ/პრ	ა-		1:
