# დარჩენილი სამუშაოების გრაფიკი

| | სამუშაოთა ჩამონათვალი | 1 თვე | 2 თვე | 3 თვე | 4 თვე | 5 თვე | 6 თვე | 7 თვე | 8 თვე | 9 თვე | 10 თვე | 11 თვე | 12 თვე | 13 თვე | 14 თვე | 15 თვე | 16 თვე | 17 თვე | 18 თვე | 19 თვე | 20 თვე | 21 თვე | 22 თვე | 23 თვე | 24 თვე |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | დემონტაჟი (26,2მ²) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | სადემონტაჟო ნაწილის მიწით ამოვსება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | "ა" ღერძზე კედლის ამოჭვანა, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ამოჭვანილი კედლის ლესვა, ღებვა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ტერიტორიისგან სამშენებლო ნაგვის გატანა და კეთილმოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |




| | | | |
|---|---|---|---|
| LINE GEORGIA | დამკვეთი | მარიანა მამაჯანოვი | |
| ქალაქი თბილისი, ქუჩა ბ. აბესაძის №7 | არქიტექტორი | ბ. ხომერიკი | |
| | დირექტორი | ე. პატაშური | |

# მშენებლობის ორგანიზების პროექტი

## საპროექტო შენობა გენ-გეგმაზე

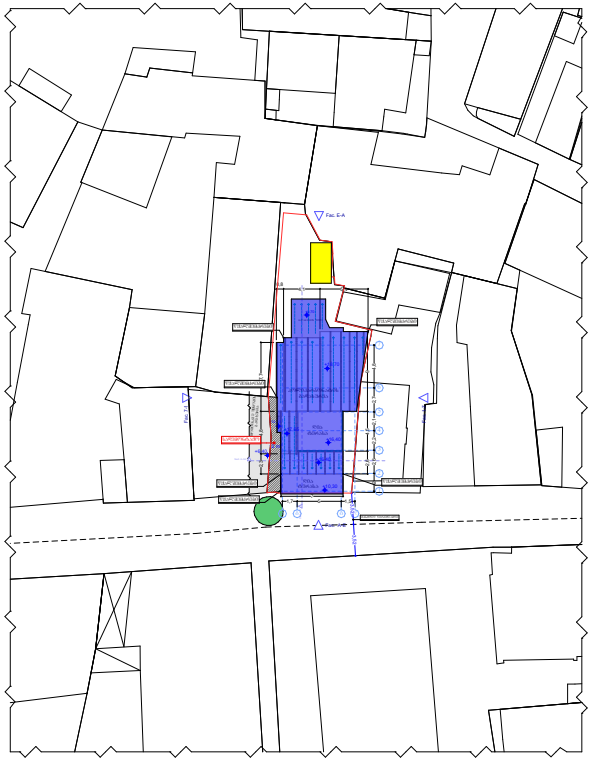

## ს ა მ ო ნ ტ აჟ ო ს ქ ე მ ა

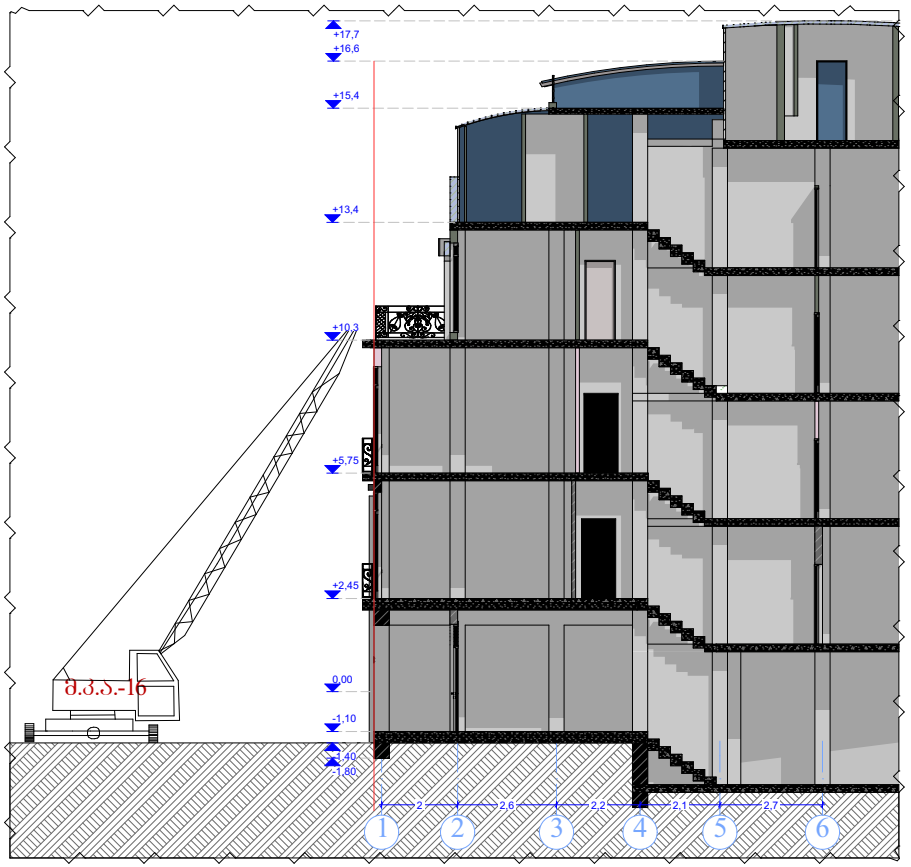


## ა პ რ ო ბ ი თ ი ა ღ ნ ი შ ვ ნ ე ბ ი:

- საპროექტო შენობა
- დროებითი თუნუქის ღობე
- დროებითი შენობა
- ბეტონმრევი: მ.კ.ა.-16

## ტექნიკური დახასიათება

| ისრის შვერა | ტვირთამწეობა ტ საქრდენებზე შსაქრდენით ტ. | ტ. | კავის აწევის სიმაღლე „მ„ |
|---|---|---|---|
| | ისრის სიგრძე 15მ | | |
| 5.0 | 11.50 | 3.20 | 15.20 |
| 7.0 | 6.60 | 1.60 | 14.70 |
| 10.0 | 3.90 | 1.00 | 13.00 |
| 12.00 | 2.80 | 0.90 | 11.50 |
| 15.00 | 2.00 | 0.30 | 8.00 |

1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია შემოკლებულ ვარიანტში.
2. საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგძლივობა განისაზღვრება საამშენებლო ნორმების და წესების- CN 1.04.03-85 გვ 237ა-ის მიხედვით T =20თვე სადაც 1 თვე- მოსამზადებელი პერიოდის ხანგძლივობაა. ხოლო ერთი თვე ტერიტორიის დასუფთავებისათვისა გათვლილი ჯამში სულ T =24 თვეს
3. მოსამზადებელ პერიოდში უნდა განხორციელდეს შემდეგი სამუშაოები: დროებითი შენობის დაყენება, საპროექტო ძსელების გაყვანა, სამშენებლო მოედნის უზრუნველყოფა დროებითი ენერგიით და წყლით საპროექტო ძსელებიდან.
4. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტით გათვალისწინებულია საავტომობილო ამწე მ.კ.ა.-16 და ბეტონმრევი.
5. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში მომუშავეთა შრომის უსაფრთხოების და სანიტარულ–ჰიგიენური მომსახურების საკითხებზე მთავარ წყაროთ წარმოდგენილია საამშენებლო ნორმების და წესების CN III-4-80 უსაფრთხოების ტექნიკა.

| ფორმატი A-4 | თარიღი. 2020 | პირობითი ნიშნები: | თანამდებობა | გვარი | ხელმოწერა | დაკვეთი: | მოქ: მარიანა მამაჯანოვი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| შემსრულებელი: | | საპროექტო საზღვარი | დირექტორი | ე.პატარაშვილი | | მისამართი: | ქალაქი თბილისი, ქუჩა ბ. აბესაძე, №7. |
| | | ბორდიუსის ზაზი | მთ. არქ | გ.ხუციშვილი | | პროექტის სახელწოდება: სანიტარული | |
| | | საპროექტო ნიშნულები | პრ. მთ. კონსტრ. | ლ.გვასალია | | მასშტაბი | მშენებლობის ორგანიზება |
| შენიშვნები: | | არსებული ნიშნულები | დაპროექტება | გ.ხუციშვილი | | სტადია პროექტი | |
| | | | | | | შეთანხმება | |
