LABORATORY OF ARCHITECTURE #3

პროექტის დასახელება

მიკაელ წინამძღვრიშვილის ხელოვნების მუზეუმის N5

ეტაპი

მშენებლობის ორგანიზაციული პროექტი

1. ზოგადი ინფორმაცია დაგეგმარების ტერიტორიის ადრინდელი ისტორიული ნაშენების, რეკონსტრუქციის ობიექტების ან ტერიტორიის ნაწილების შესახებ ინფორმაციის ანალიზის შედეგები
2. ინფორმაცია სამშენებლო ნედლეულის მოწყობის ტერიტორიების, ობიექტების ადგილმდებარეობის შესახებ
3. ინფორმაცია გამოსაყენებელი ტექნიკური საშუალებების, მათ შორის ტრანსპორტირების საშუალებების შესახებ
4. ზოგადი ინფორმაცია სამშენებლო ტერიტორიის ორგანიზაციის შესახებ, მათ შორის ინფორმაცია ტერიტორიის ზონირების, ტერიტორიის ღობით შემოზღუდვის, დროებითი შენობა-ნაგებობების, მანქანა-მექანიზმების განთავსების, ტრანსპორტირების, ელექტრომომარაგების, წყალმომარაგების, სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემების, ნარჩენების მართვის, ტერიტორიის გარე განათების, ასევე ტერიტორიის ინჟინრული მოწყობის შესახებ
5. ინფორმაცია მშენებლობის ორგანიზაციის თანმიმდევრობის შესახებ, მათ შორის ინფორმაცია ტერიტორიის მოსამზადებელი სამუშაოების, ძირითადი სამშენებლო სამუშაოების, ტერიტორიის საბოლოო დასრულების შესახებ
6. ინფორმაცია სამშენებლო მოედანზე ადამიანური რესურსების მოთხოვნის შესახებ
7. ინფორმაცია სამშენებლო მოედანზე შრომის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ღონისძიებების შესახებ
8. ინფორმაცია გარემოზე ზემოქმედების შესახებ

პროექტის ფაზა

ნაგებობის დასახელება

ა ბლოკი
საკვებმომწოდებელი

ბლოკის ნიშნული -8.33

მასშტაბი	1:100
ფასადის ნიშნული	11.30მეტრი
პროექტირების	0.03შეკვრა
პროექტირების	3.03მეტრკვ
პროექტირების	01.03მეტრე
პროექტირების	0.3მეტრე
პროექტირების	0.1მეტრე

შეიცვალა	11.11.20	ფურცელი	#0
ბლოკი	ბლოკის		A-100_#1
000	000		

LABORATORY OF ARCHITECTURE #3

პროექტის დასახელება

მრავალფუნქციური საავადმყოფოს ტერიტორიის N5

ნახაზის სახელი

გენერალური გეგმა

ნახაზის ექსპლიკაცია

1. ...ტერიტორიაზე გათვალისწინებულია ავტომობილების პარკინგი. მანქანების ჩასვლა-გასვლა მოეწყობა ქალაქის ქუჩებიდან.
2. ...ტერიტორიის დაგეგმარება მოხდა მიწის ფართობის ოპტიმალური გამოყენების პრინციპით.
3. ...ტერიტორიის ვერტიკალური დაგეგმარება მოხდა ადგილის რელიეფის გათვალისწინებით.
4. ...ტერიტორიის ასფალტით დაფარული ფართობები ეფუძნება ინჟინერ-გეოლოგიური კვლევების შედეგებს.
5. ...ტერიტორიის ასფალტით დაფარული ფართობების ნაწილი გამოყენებულია ხანძარსაწინააღმდეგო ავტომობილების მოძრაობისთვის.
6. ...ტერიტორიის ასფალტით დაფარული ფართობების ნაწილი გამოყენებულია ტროტუარების მოსაწყობად.
7. ...ტერიტორიის ასფალტით დაფარული ფართობების ნაწილი გამოყენებულია ავტომობილების პარკინგისთვის.
8. ...ტერიტორიის ასფალტით დაფარული ფართობების ნაწილი გამოყენებულია ტროტუარების მოსაწყობად.
9. ...ტერიტორიის ასფალტით დაფარული ფართობების ნაწილი გამოყენებულია ავტომობილების პარკინგისთვის.
10. ...ტერიტორიის ასფალტით დაფარული ფართობების ნაწილი გამოყენებულია ტროტუარების მოსაწყობად.
11. ...ტერიტორიის ასფალტით დაფარული ფართობების ნაწილი გამოყენებულია ავტომობილების პარკინგისთვის.
12. ...ტერიტორიის ასფალტით დაფარული ფართობების ნაწილი გამოყენებულია ტროტუარების მოსაწყობად.
13. ...ტერიტორიის ასფალტით დაფარული ფართობების ნაწილი გამოყენებულია ავტომობილების პარკინგისთვის.
14. ...ტერიტორიის ასფალტით დაფარული ფართობების ნაწილი გამოყენებულია ტროტუარების მოსაწყობად.
15. ...ტერიტორიის ასფალტით დაფარული ფართობების ნაწილი გამოყენებულია ავტომობილების პარკინგისთვის.
16. ...ტერიტორიის ასფალტით დაფარული ფართობების ნაწილი გამოყენებულია ტროტუარების მოსაწყობად.
17. ...ტერიტორიის ასფალტით დაფარული ფართობების ნაწილი გამოყენებულია ავტომობილების პარკინგისთვის.

პროექტის ფერადი

ნახაზის დასახელება

ა ბლოკი
საავადმყოფო

ნახაზ ნიშნულზე +0.43

მასშტაბი	1:100
პროექტირება	0.პირველი
პროექტირება	0.მეორე
პროექტირება	0.მესამე
პროექტირება	0.მეოთხე
პროექტირება	0.ბოლო
პროექტირება	0.ბოლო
შესრულების	11.11.25

ნახაზის	ნომერი
000	000

ფაილის

A-101_A



LABORATORY OF ARCHITECTURE #3

პროექტის დასახელება

მრავალპროფილიანი საავადმყოფო ქუთაისის N5

ექსპლიკაცია


შენიშვნები და სიმბოლოები

პროექტის ფოტო

ნახაზის დასახელება

ა ბლოკი
საავადმყოფო
გეგმა ნიშნულზე +0.37

მასშტაბი	1:100
მთ.არქიტექტორი	ი.აბამიძე
არქიტექტორი	დ.შაფაქიძე
არქიტექტორი	ჯ.მაისურაძე
არქიტექტორი	თ.ტაბოვა
არქიტექტორი	ლ.შონია
არქიტექტორი	ტ.კოიავა
თარიღი 11.11.20	ფურცელი A0
შე.ნომ. 000 / ვერსია 000	A-102_A

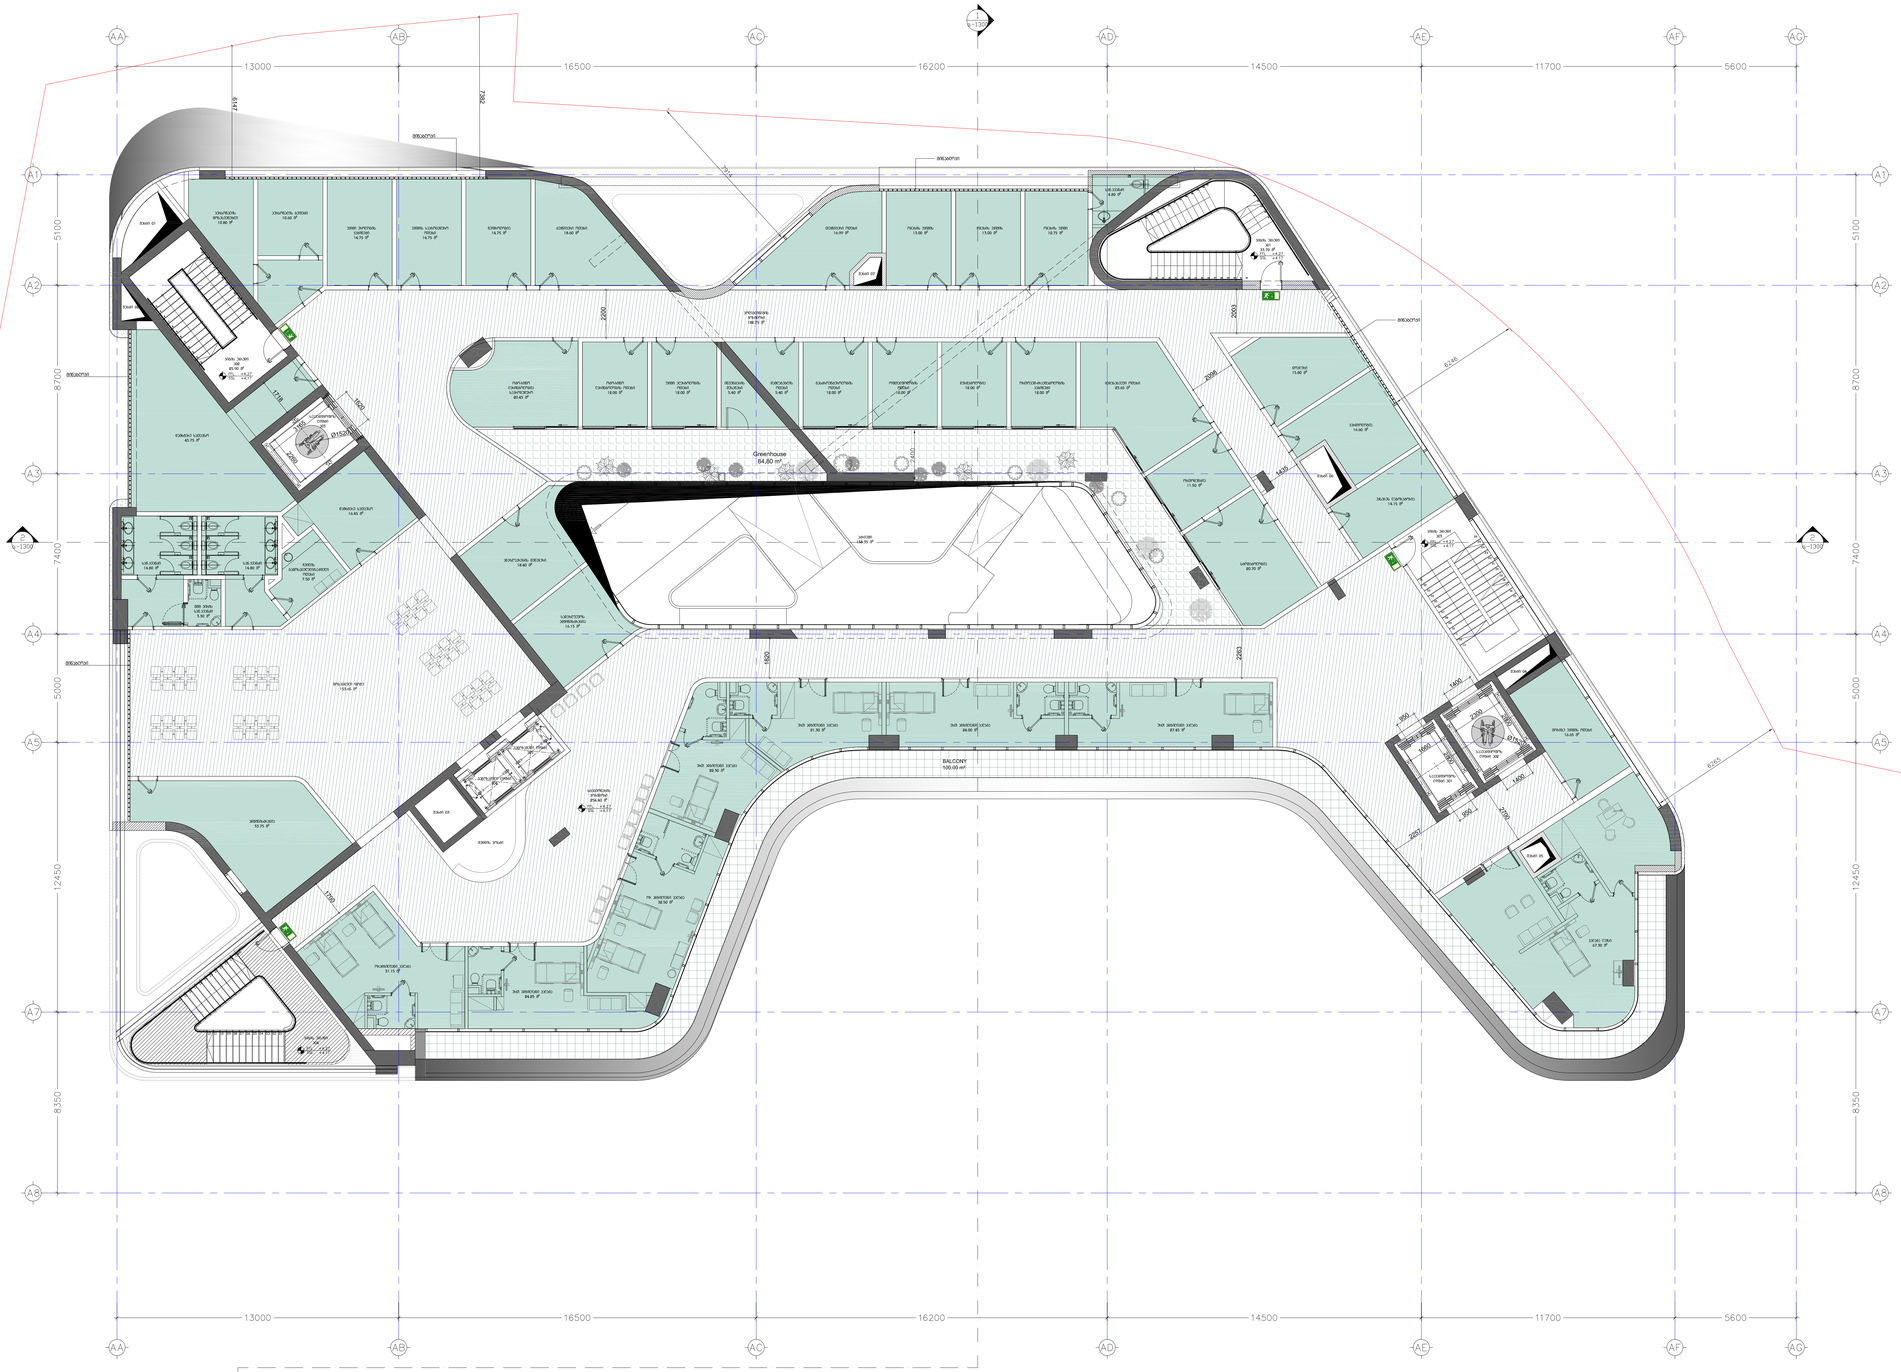

LABORATORY OF ARCHITECTURE #3


პროექტის დასახელება

მოკვეთილ ზედაპირზე განთავსებული ერთსართულიანი NS

ნახატის სათაური

მშენებლობის ეტაპები

1. ტერიტორიის გაწმენდა ხე-ხეების ფესვებისაგან, ნაგვისა და ნარჩენებისაგან. ტერიტორიის ნიშნულების გადატანა ბუნებაში. ტერიტორიის შემოღობვა.
2. ტერიტორიის ნიშნულების შეტანილი ნიშნულის გათვალისწინებით დაგეგმარება და ვერტიკალური ათვისება.
3. ტერიტორიის ნიშნულების შეტანილი ნიშნულის გათვალისწინებით დაგეგმარება და ვერტიკალური ათვისება.
4. ნაგებობის საძირკვლის მოწყობა მონოლითური ბეტონის ფილის სახით. ნაგებობის საძირკვლის ქვეშ ბეტონის მომზადების ფენის მოწყობა 100 მმ სისქით.
5. ნაგებობის ფუნდამენტების მოწყობა მონოლითური ბეტონით. ფუნდამენტების არმატურა. ბალიშებზე ბეტონის მომზადების ფენის მოწყობა 100 მმ სისქით. ფუნდამენტების ქვეშ ბეტონის მომზადების ფენის მოწყობა 100 მმ სისქით. ფუნდამენტების ქვეშ ბეტონის მომზადების ფენის მოწყობა 100 მმ სისქით.
6. ნაგებობის ფილა-დანის არმატურა. ფილა-დანის ბეტონირება. ფილა-დანის ბეტონირება. ფილა-დანის ბეტონირება



LABORATORY OF ARCHITECTURE #3

პროექტის დასახელება

მრავალპროფილური საავადმყოფო ჭავჭავაძის N5

ექსპლიკაცია

შენიშვნები და სიმბოლოები

პროექტის ფოტო

ნახაზის დასახელება


ა ბლოკი

საავადმყოფო

გეგმა ნიშნულზე +8.17

მასშტაბი	1:100
მთ.არქიტექტორი	ი.აბაშიძე
არქიტექტორი	დ.შაფაქიძე
არქიტექტორი	ჯ.მაისურაძე
არქიტექტორი	თ.ტეხოვა
არქიტექტორი	ლ.შონია
არქიტექტორი	ტ.ქორიავა

თარიღი	11.11.20	ფურცელი	A0
გვ.რაოდ.	გვერდი	A-104_A	
000	000		



LABORATORY OF ARCHITECTURE #3

პროექტის დასახელება

მრავალპროფილური საავადმყოფო
ჭავჭავაძის N5

ექსპლიკაცია

შენიშვნები და სიმბოლოები

1. ა ბლოკის ღიობების დიდ ნაწილს ფარავდა ტექსტილის თეთრი ფერის შუქგამტარი მემბრანა, რაც განახლებული პროექტის ფარგლებში შეცვლილია პერფორირებული ფიბრობეტონის პანელებით.
2. ა ბლოკის სახურავზე შეცვლილია მრუდხაზოვანი ელემენტების მოხაზულობა და გაუქმებულია აუზები.
3. ბ ბლოკის განახლებული ვარიანტის მიხედვით, აქამდე არსებული ლიფტები შეცვლილია საფეხმავლო პანდუსით, რომელიც შესასვლელის ნიშნულამდე (+2.5) წარმოადგენს შშმ პირებისავის განკუთვნილ სტანდარტს.
4. შეიცვალა საბავშო სათამაშო მოედნის ლანდშაფტური გადაწყვეტის პრინციპი, ნაცვლად რთული რელიეფური სტრუქტურისა ჩამოყალიბდა ერთდონიანი სათამაშო სივრცე მცირე ამფითეატრით. საბაშო მოედანს დაემატა ქვედა ნიშნულიდან (მომიჯნავე სახლის ეზოს დონე) ასასვლელი კიბე, ხოლო მიწისქვეშა ნაწილში, წვიმის წყლის შემგროვებელი რეზერვუარი და დამლაგებლის ინვენტარის შესანახი საკუჭნაო.
5. ა ბლოკში, ისევე ყველა ნიშნულზე შეიცვალა ოთახების დანაწილება და ფუნქციონალური დანიშნულება, რაც გამოწვეულია ლიფტისა და კიბის უჯრედების განთავსების ადგილის ცვლილებით. აღნიშნული კონფიგურაცია აკმაყოფილებს საგანგებო სიტუაციების დეპარტამენტის მოთხოვნებს, (დამატებით ფაილად გაწვდით ნორმებს რითაც ვიხელმძღვანელეთ)
6. -8.33 ნიშნულზე, ა ბლოკში, შეიცვალა A8-A1 ღერძებს შორის ფასადი. ნაცვლად კედლისა გაჩნდა სამზარეულოს მომარაგების ავტომობილების შესასვლელი.
7. -8.33 ნიშნულზე ა ბლოკში შიგა ეზოს ნაწილი AC,AE-A4,A3 ღერძებში შეივსო სასარგებლო ფართობით.
8. ბ ბლოკის ფარგლებში შეიცვალა შიგა ლიფტის განთავსების ადგილი და მისი ფორმა.
9. ცვლილება შეეხო მიწისქვეშა დარბაზებში გამანაწილებელ ვესტიბიულს. მთლიანად მოიხსნა სართულშორისი ბაქანი, რომელიც წინა ვარიანტშია არსებული ლიფტების ტექნიკურ სივრცეს წარმოადგენდა. შეიცვალა მოცემული ფრაგმენტის მზიდი ელემენტების კონფიგურაცია, ნაცვლად რამდენიმე მრგვალი კოლონისა გაჩნდა ორი პილონი. ღერძები და ნიშნული
10. შეიცვალა ბ ბლოკის სახანძრო გასაქცევი კიბის გარეთ გამოსასვლელი. ნაცვლად ავტომატურად ამღები კარისა, მოეწყო ტამბური, მასალად გამოყენებული იქნება მსუბუქი ლითონის კარკასი და მინა-პაკეტი

პროექტის ფოტო

ნახაზის დასახელება

ა ბლოკი
საავადმყოფო
სახურავის გეგმა

მასშტაბი	1:100
მთ.არქიტექტორი	ი.აბაშიძე
არქიტექტორი	დ.შაფაქიძე
არქიტექტორი	ჯ.მაისურაძე
არქიტექტორი	თ.ტეხოვა
არქიტექტორი	ლ.შონია
არქიტექტორი	ტ.ქოიავა


თარიღი 11.11.20		ფურცელი A0
გვ.რაოდ.	გვერდი	A-105_A
000	000	

LABORATORY OF ARCHITECTURE #3

პროექტის დასახელება

მოპირპირე ტერიტორიის ხაზგასმული ლანდშაფტური N5

ნახატის სათაური

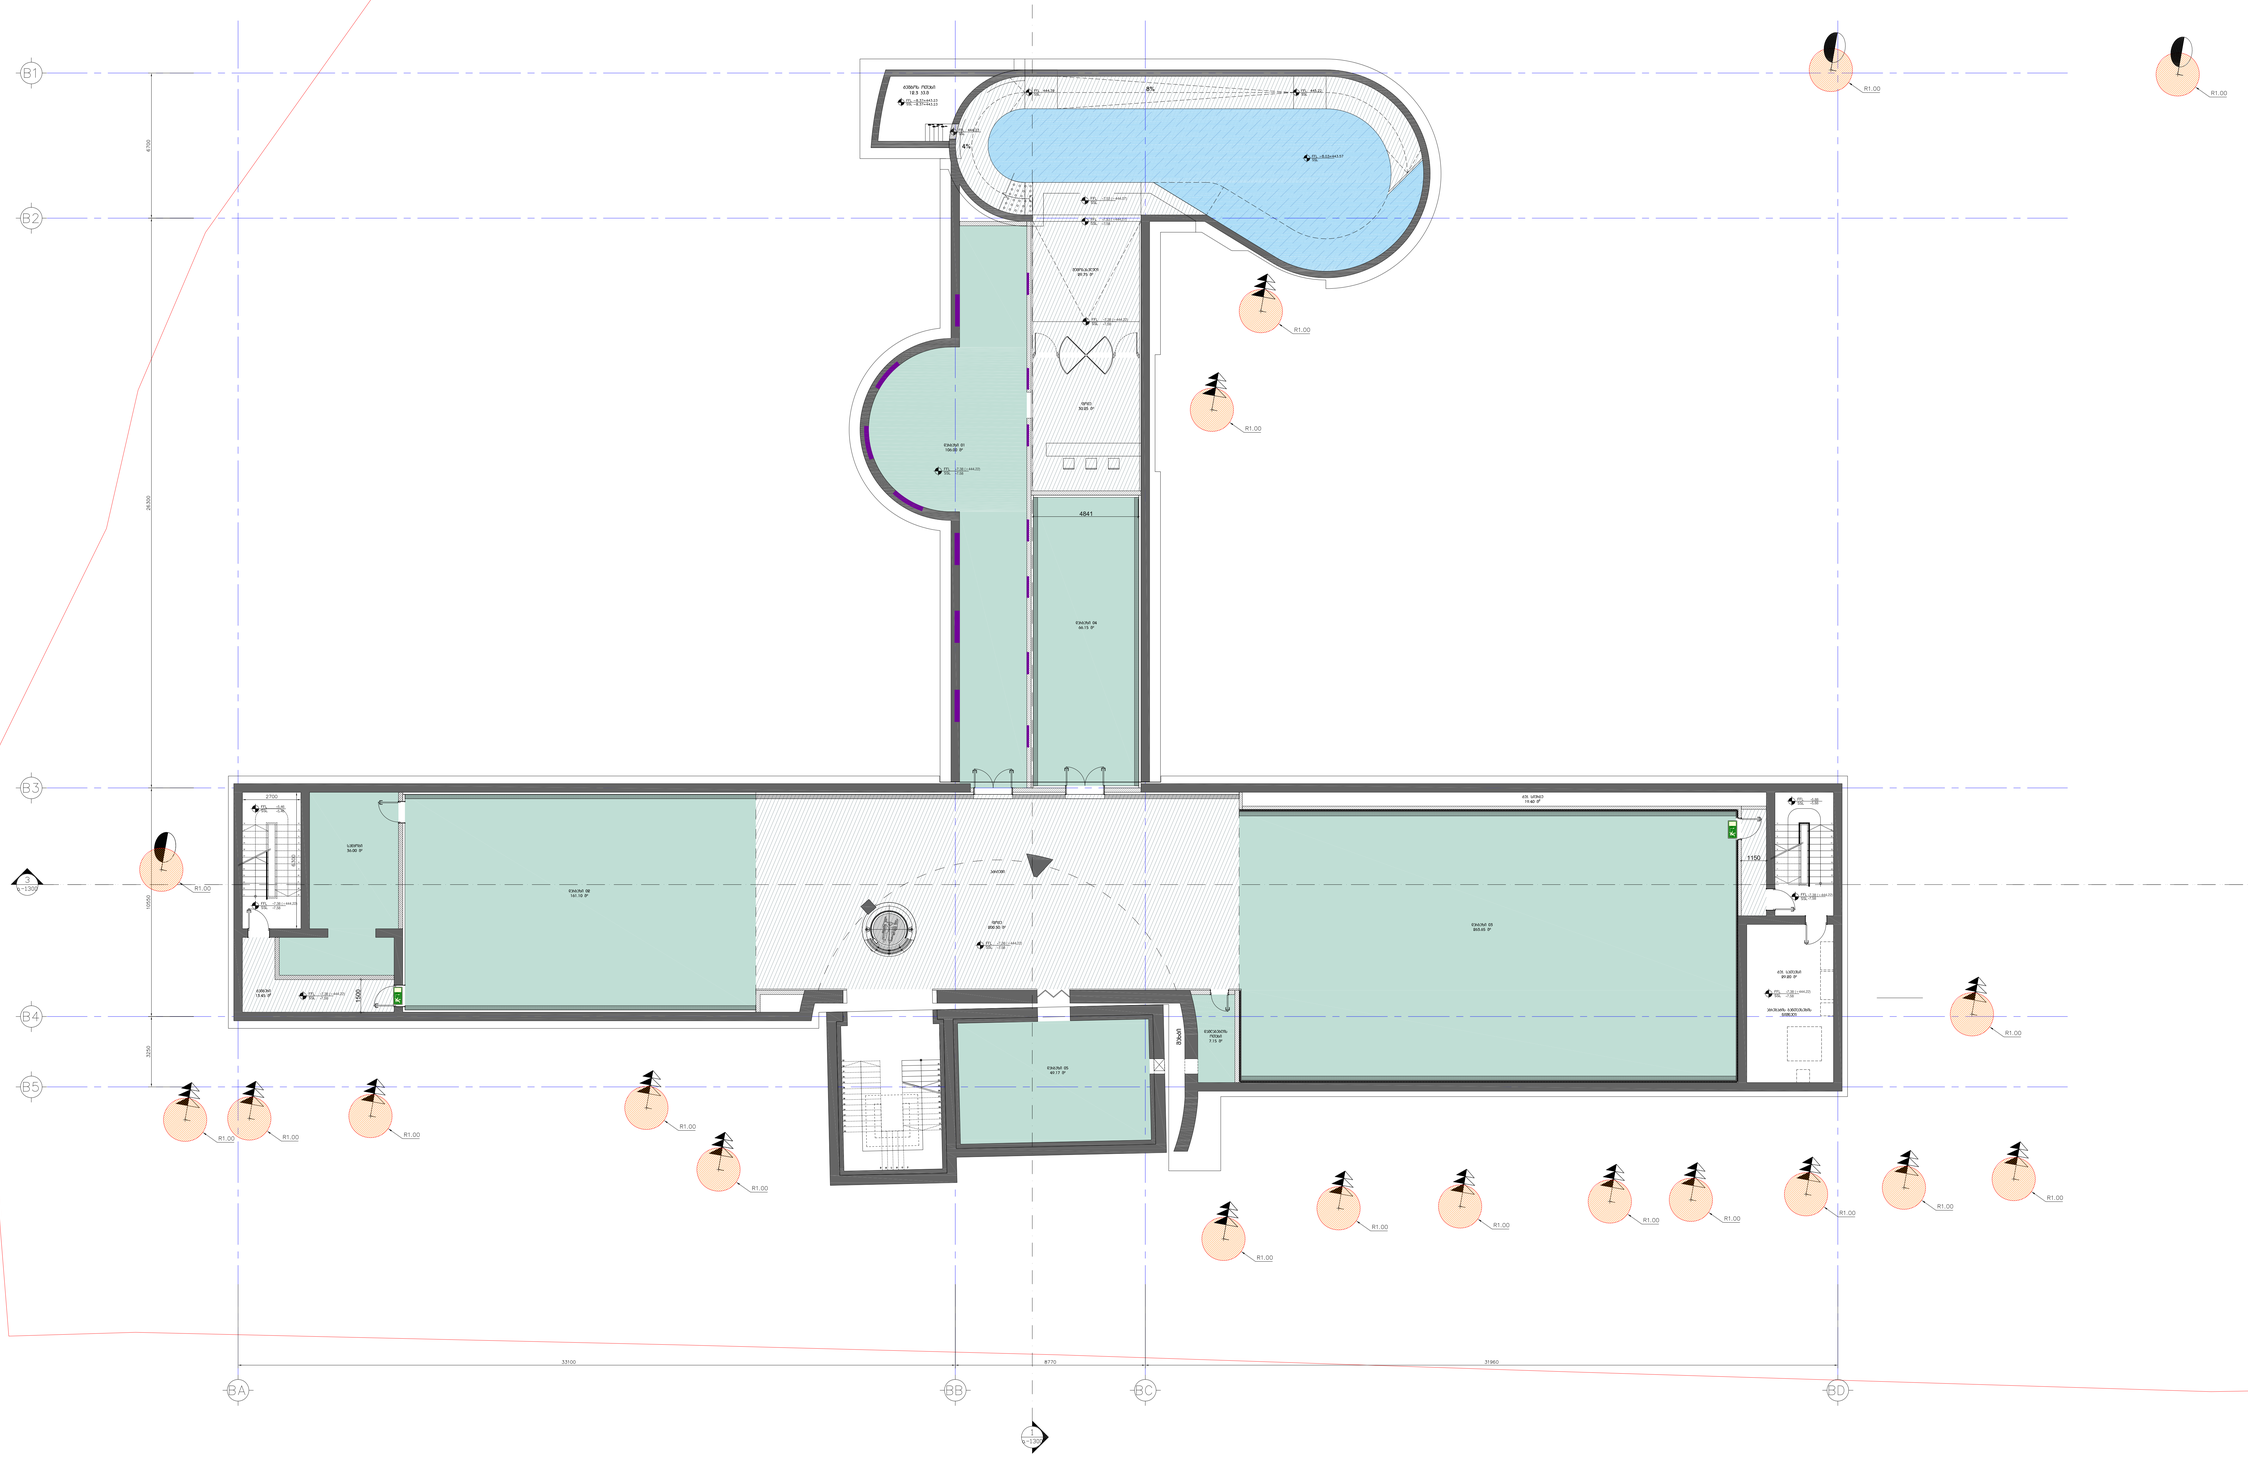

ტექნიკური ინფორმაცია

1. ...ინტერპრეტირებული ლანდშაფტური ტერიტორიის ორგანიზაციის შესაბამისად შემუშავებული ლანდშაფტური პროექტის განსაზღვრული ნაწილების ტექნიკური ინფორმაციის ელემენტები.

2. ...ნარჩენების მართვის შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა დაცვით განხორციელდება ...ნარჩენების მართვა. ...ნარჩენების მართვის ნაგავსაყრელზე ...ნარჩენების ტრანსპორტირება ...ნარჩენების მართვის ნაგავსაყრელზე ...ნარჩენების მართვის ნაგავსაყრელზე ...ნარჩენების მართვის ნაგავსაყრელზე

LABORATORY OF ARCHITECTURE #3

პროექტის დასახელება

მოსაწყობი ტერიტორიის ეკოლოგიზირებული რეკონსტრუქცია N5

ეტაპი

მშენებლობა და სამონტაჟო ნაწილი

1. ... ინსტალაციების დაგეგმარების და განლაგების ... ნორმების შესაბამისად.
2. ... ინსტალაციების მოწყობა ... ნორმების შესაბამისად.
3. ... ინსტალაციების ... ნორმების შესაბამისად.
4. ... ინსტალაციების ... ნორმების შესაბამისად.
5. ... ინსტალაციების ... ნორმების შესაბამისად.
6. ... ინსტალაციების ... ნორმების შესაბამისად.
7. ... ინსტალაციების ... ნორმების შესაბამისად.
8. ... ინსტალაციების ... ნორმების შესაბამისად.

- ... ნორმების შესაბამისად

პროექტის ფურცელი


ნაგებობის დასახელება

ბ ბლოკი
საპრეპარირებასთან სივრცე

ნაგებობის ფრაგმენტი -0.08

მასშტაბი	1:100
მომსახურებების	ს.ელექტრო
პროექტირების	მ.მელიქიშვილი
პროექტირების	ა.მაისურაძე
პროექტირების	მ.ლაზარეშვილი
პროექტირების	ლ.ბერიძე
პროექტირების	ა.ბოლქვაძე

თარიღი	11.11.25	ფურცლის	#0
პროექტი	ეტაპი		A-101_B
000	000		



LABORATORY OF ARCHITECTURE #3

პროექტის დასახელება

მრავალპროფილიანი საავადმყოფო ჭავჭავაძის N5

ექსპლიკაცია

შენიშვნები და სიმბოლოები


პროექტის ფოტო

ნახაზის დასახელება

ბ ბლოკი
სარეაბილიტაციო სივრცე
გეგმა ნიშნულზე +2.03

მასშტაბი	1:100
მთ.არქიტექტორი	ი.აბაშიძე
არქიტექტორი	დ.შაფაქიძე
არქიტექტორი	ჯ.მაისურაძე
არქიტექტორი	თ.ტეხოვა
არქიტექტორი	ლ.შონია
არქიტექტორი	ტ.ქოიავა

თარიღი	11.11.20	ფურცელი	A0
გვ.რაოდ.	გვერდი	A-102_B	
000	000		

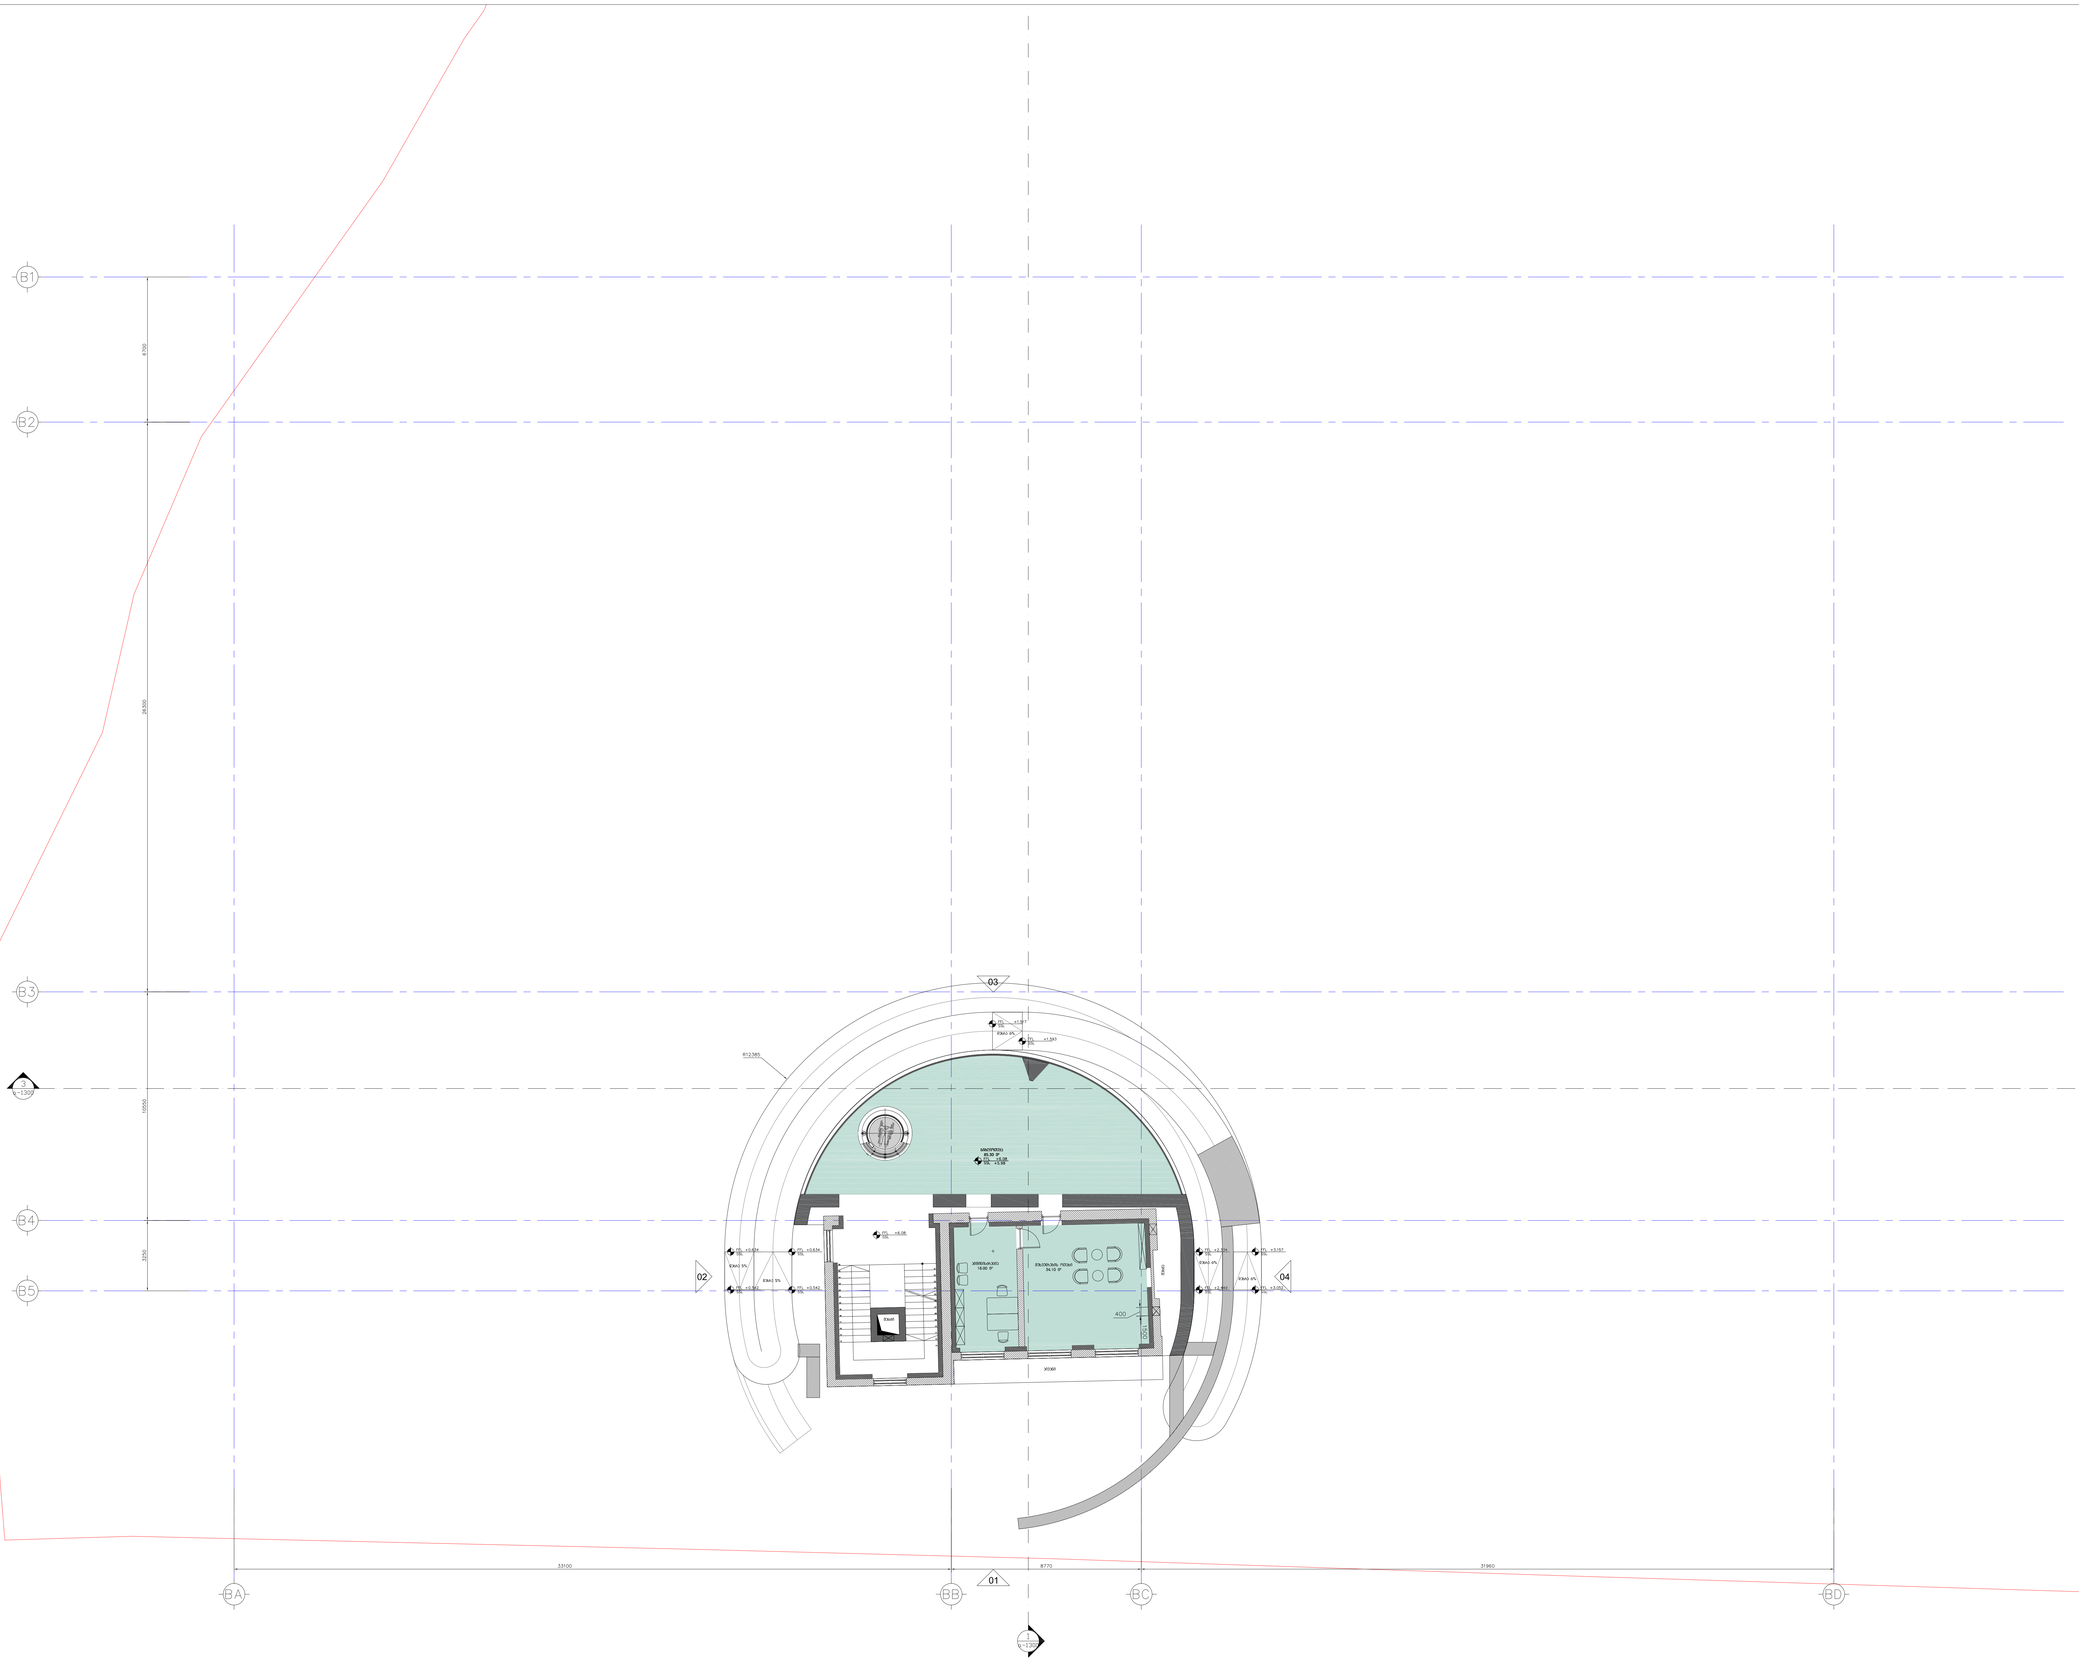

LABORATORY OF ARCHITECTURE #3

პროექტის დასახელება

მოკვეთილ ზედაპირიან ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლი N5

ნახაზის დასახელება

გეგმები და ჭრილები

გეგმები და ჭრილები

1. ----ნახაზი გამოსახულია დაგეგმარების ელემენტების ოპტიმალური შესაბამისობით, შეტანილია ცვლილებები ადგილობრივი ტოპოგრაფიული პირობების გათვალისწინებით.
2. ----ნახაზის სრულყოფილი შესაბამისობა დაშვებულია მხოლოდ ფასადების და ცოკოლების ნაწილში.
3. ----ნახაზის ზომები მოცემულია მილიმეტრებში, ფარდობითი ნიშნულები მეტრებში, ნიშნულები მოცემულია ოფიციალური ნიშნულების მიმართ.
4. ----ნახაზის ზომები ზუსტდება ადგილზე სამშენებლო სამუშაოების წარმოების პროცესში.
5. ----ნახაზში მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება ტოპოგრაფიულ გეგმას, რომელიც შედგენილია ტოპოგრაფიული აზომვების საფუძველზე. ტოპოგრაფიული აზომვების ზუსტი ადგილმდებარეობა ნახაზზე ვერ ასახულა, ვინაიდან ისინი ნახაზის მასშტაბში ძალიან მცირე სიდიდეებით გამოისახებოდა.
6. ----ნახაზში მოცემულია ნიშნულები მხოლოდ ნაგებობის ძირითადი ელემენტებისთვის, ნიშნულები ნაგებობის დანარჩენ ელემენტებზე იხილეთ სამშენებლო ნახაზებზე.
7. ----ნახაზში მოცემულია ზედაპირების ფერდობების მაჩვენებლები.
8. ----ნახაზში მოცემული ნიშნულები მოცემულია მეტრებში, ნიშნულების სიზუსტე 0.01 მ.
9. ----ნახაზში მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება ტოპოგრაფიულ გეგმას, რომელიც შედგენილია ტოპოგრაფიული აზომვების საფუძველზე. ტოპოგრაფიული აზომვების ზუსტი ადგილმდებარეობა ნახაზზე ვერ ასახულა, ვინაიდან ისინი ნახაზის მასშტაბში ძალიან მცირე სიდიდეებით გამოისახებოდა.

- ყველა საკონსტრუქციო ელემენტის ზომების დაზუსტება შესაძლებელია მხოლოდ სამუშაო ნახაზების მიხედვით.

პროექტის ფაზა


ნახაზის დასახელება

ბ ბლოკი
საპროექტიგებიო სივრცე

ნიშნულ ±0.08

მასშტაბი	1:100
ფორმატი	A3
პროექტირება	2025
პროექტირება	2025
პროექტირება	2025
პროექტირება	2025
პროექტირება	2025

თარიღი	11.11.25	ფურცელი #0
ბაზისური	ბეტონი	A-103_B
000	000	



LABORATORY OF
ARCHITECTURE #3

პროექტის დასახელება

მრავალპროფილური საავადმყოფო
ჭავჭავაძის N5

ექსპლიკაცია

შენიშვნები და სიმბოლოები

* ყველა საკოორდინაციო ღერძის ნიშნული აღებულია ღერძის ცენტრიდან

პროექტის ფოტო

ნახაზის დასახელება

ბ ბლოკი
სარეაბილიტაციო სივრცე
გეგმა ნიშნულზე +10.13

მასშტაბი	1:100
მთ.არქიტექტორი	ი.აბაშიძე
არქიტექტორი	დ.შაფაქიძე
არქიტექტორი	ჯ.მაისურაძე
არქიტექტორი	თ.ტეხოვა
არქიტექტორი	ლ.შონია
არქიტექტორი	ტ.კოიავა

თარიღი	11.11.20	ფურცელი	A0
გვ.რაოდ.	გვერდი	A-104_B	
000	000		

LABORATORY OF
ARCHITECTURE #3

პროექტის დასახელება

მიწისქვეშა ნაგებობის ტექნიკური ექსპლუატაციის შენობა N5

ეზოს პერსპექტივა

მშენებლობის ეტაპები

1. ტერიტორიის დაცვის ორგანიზაციული ღონისძიებების გატარება, მშენებლობის დაწყებამდე ტერიტორიის შემოღობვა.
2. ტერიტორიის მოსწორება მოცულობის გათვალისწინებით.
3. ჩამოსაცლელი ტერიტორიის მოცულობის განსაზღვრა ინჟინერ-გეოდეზიური სამსახურის მიერ, ტერიტორიის ნიშნულების გადატანა ადგილზე.
4. ნაყოფიერი ფენის ამოღება მშენებლობის ტერიტორიის ფარგლებში, ნაყოფიერი ფენის დროებითი დასაწყობება ტერიტორიის ნაკვეთის ფარგლებში, ნაყოფიერი ფენის ამოღების მოცულობის განსაზღვრა ინჟინერ-გეოდეზიური სამსახურის მიერ.
5. ტერიტორიის დეტალური მოსწორება ინჟინერ-გეოდეზიური სამსახურის მიერ, ტერიტორიის ნიშნულების გადატანა ადგილზე.
6. ნაყოფიერი ფენის დაბრუნება ტერიტორიის ნაკვეთის ფარგლებში.
7. ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

მშენებლობის ეტაპები

1. ტერიტორიის დაცვის ორგანიზაციული ღონისძიებების გატარება, მშენებლობის დაწყებამდე ტერიტორიის შემოღობვა.
2. ტერიტორიის მოსწორება მოცულობის გათვალისწინებით.
3. ჩამოსაცლელი ტერიტორიის მოცულობის განსაზღვრა ინჟინერ-გეოდეზიური სამსახურის მიერ, ტერიტორიის ნიშნულების გადატანა ადგილზე.
4. ნაყოფიერი ფენის ამოღება მშენებლობის ტერიტორიის ფარგლებში, ნაყოფიერი ფენის დროებითი დასაწყობება ტერიტორიის ნაკვეთის ფარგლებში, ნაყოფიერი ფენის ამოღების მოცულობის განსაზღვრა ინჟინერ-გეოდეზიური სამსახურის მიერ.
5. ტერიტორიის დეტალური მოსწორება ინჟინერ-გეოდეზიური სამსახურის მიერ, ტერიტორიის ნიშნულების გადატანა ადგილზე.
6. ნაყოფიერი ფენის დაბრუნება ტერიტორიის ნაკვეთის ფარგლებში.
7. ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

- ყველა საინჟინრო-ტექნიკური ღონისძიება განხორციელდეს პროექტის შესაბამისად და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შემდეგ.

პროექტის ფერადი


ნახაზის დასახელება


გ ბლოკი
სპორტმოედებისთვის სივრცე

ნიშნული +16.80


მასშტაბი	1:100
შეს.პროექტირების	0.30.2019წ
პროექტირების	0.12.2019წ
პროექტირების	3.03.ზ.2020
პროექტირების	01.03.2021
პროექტირების	0.2.2021
პროექტირების	0.3.2021

ნახაზის	11.11.დ0	ფურცელი N0
ნახაზის	ნაკვეთი	N-105_8
000	000	

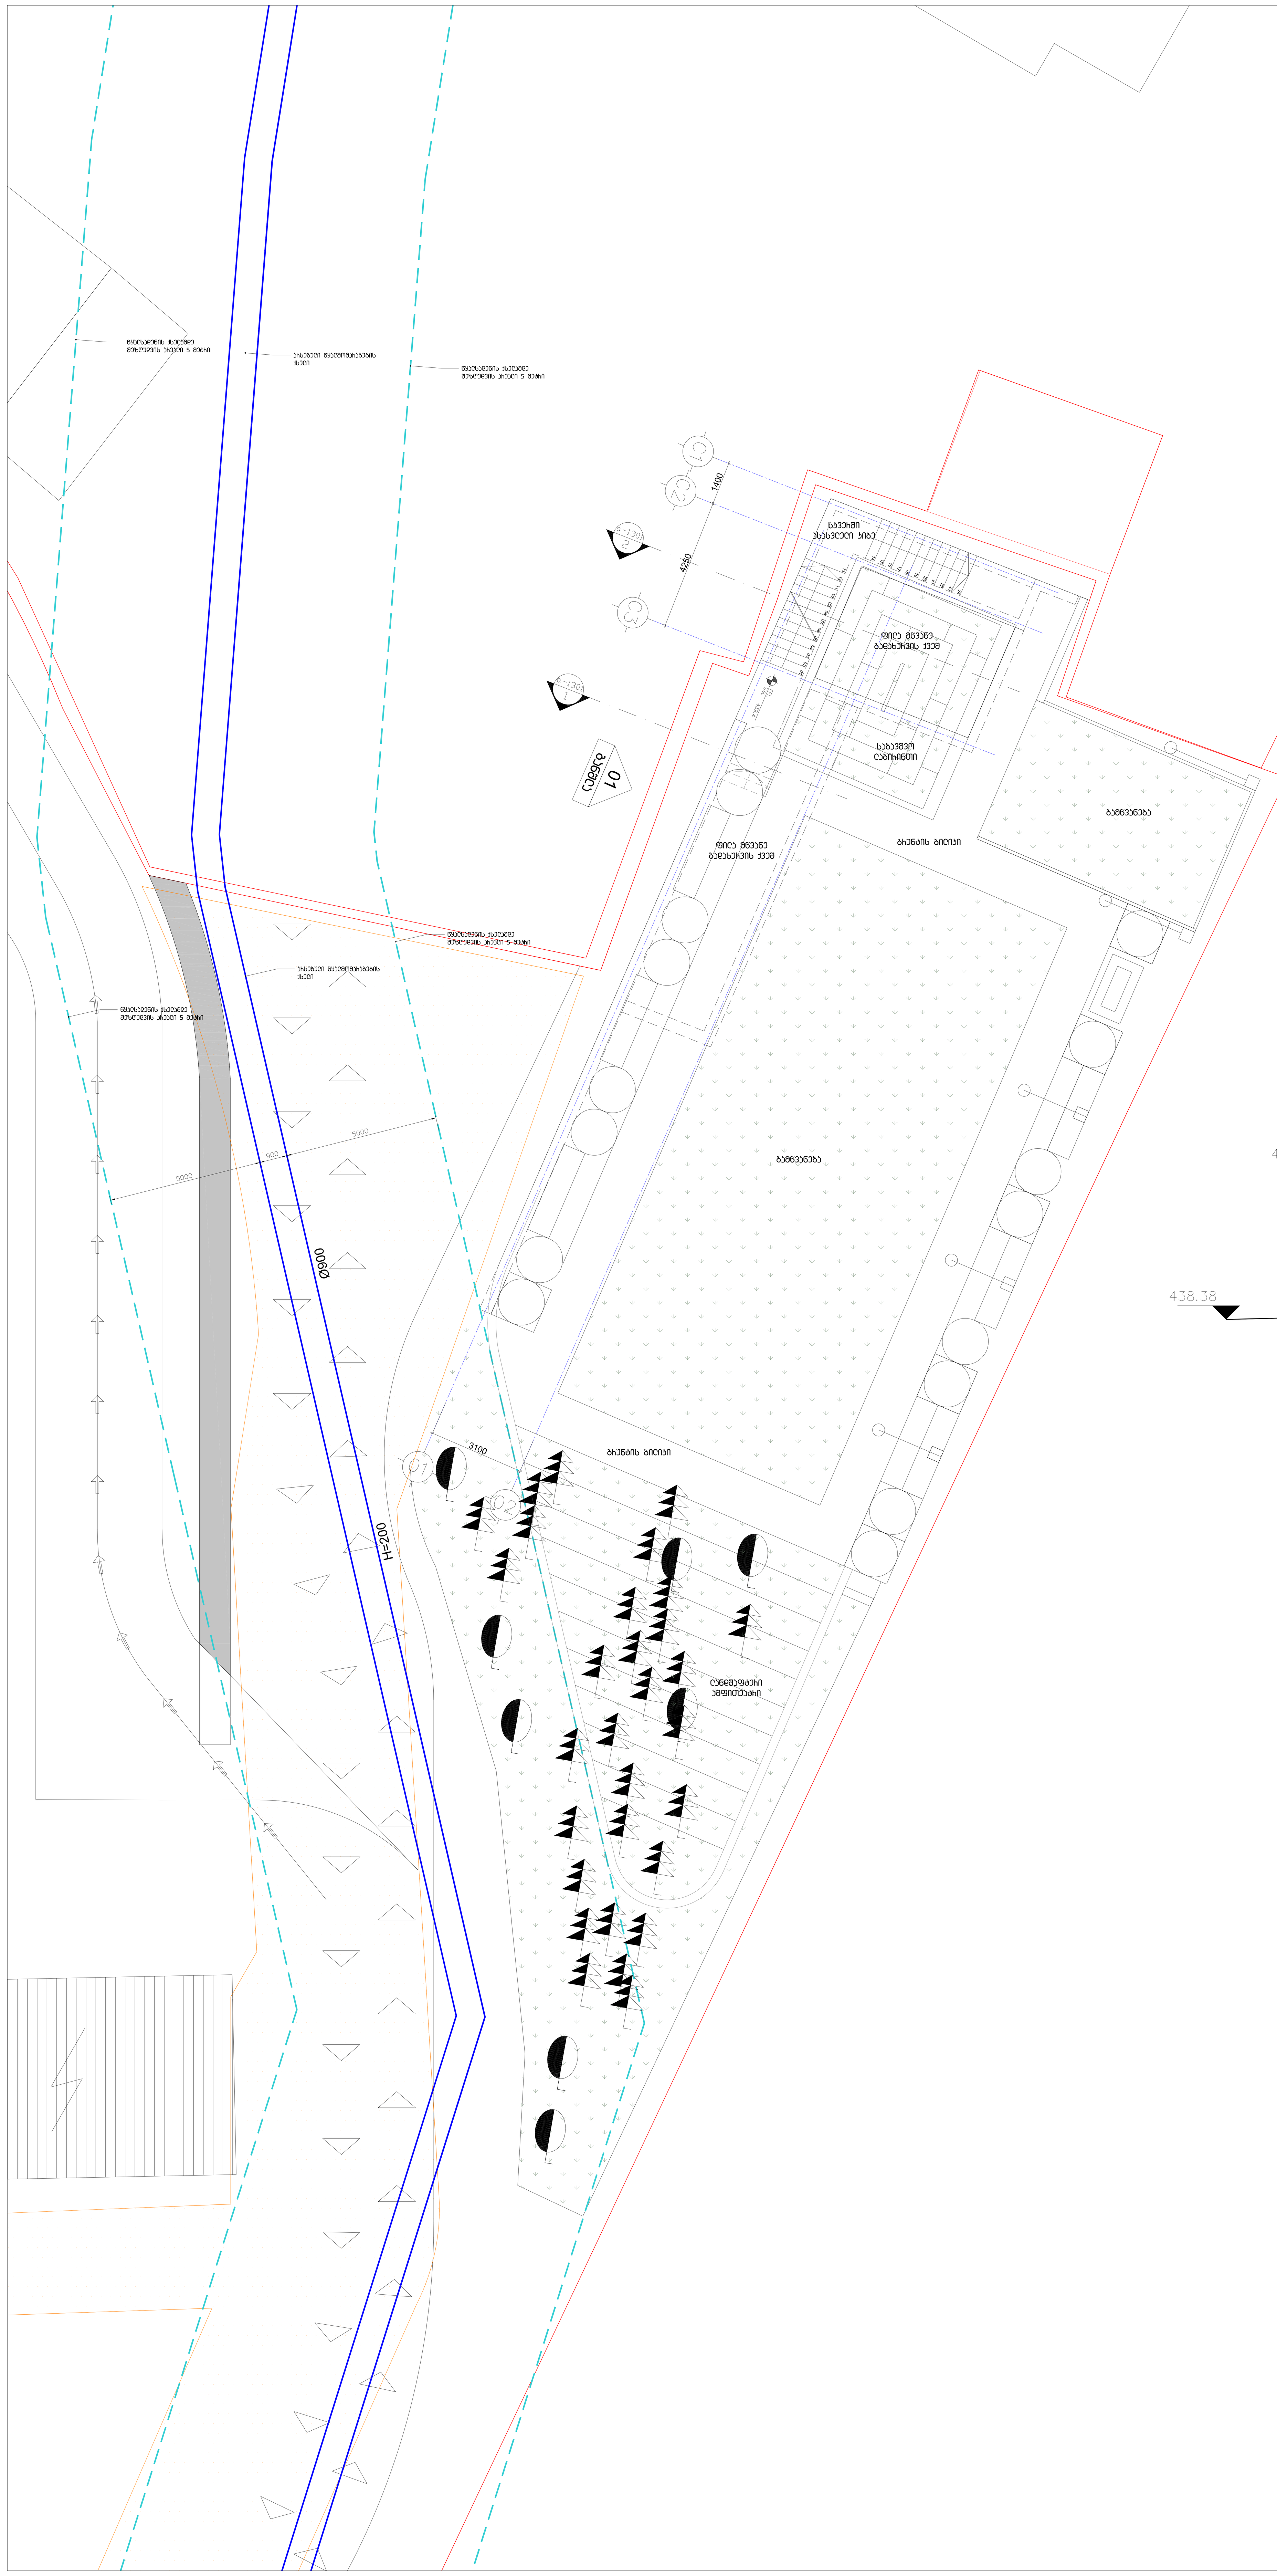


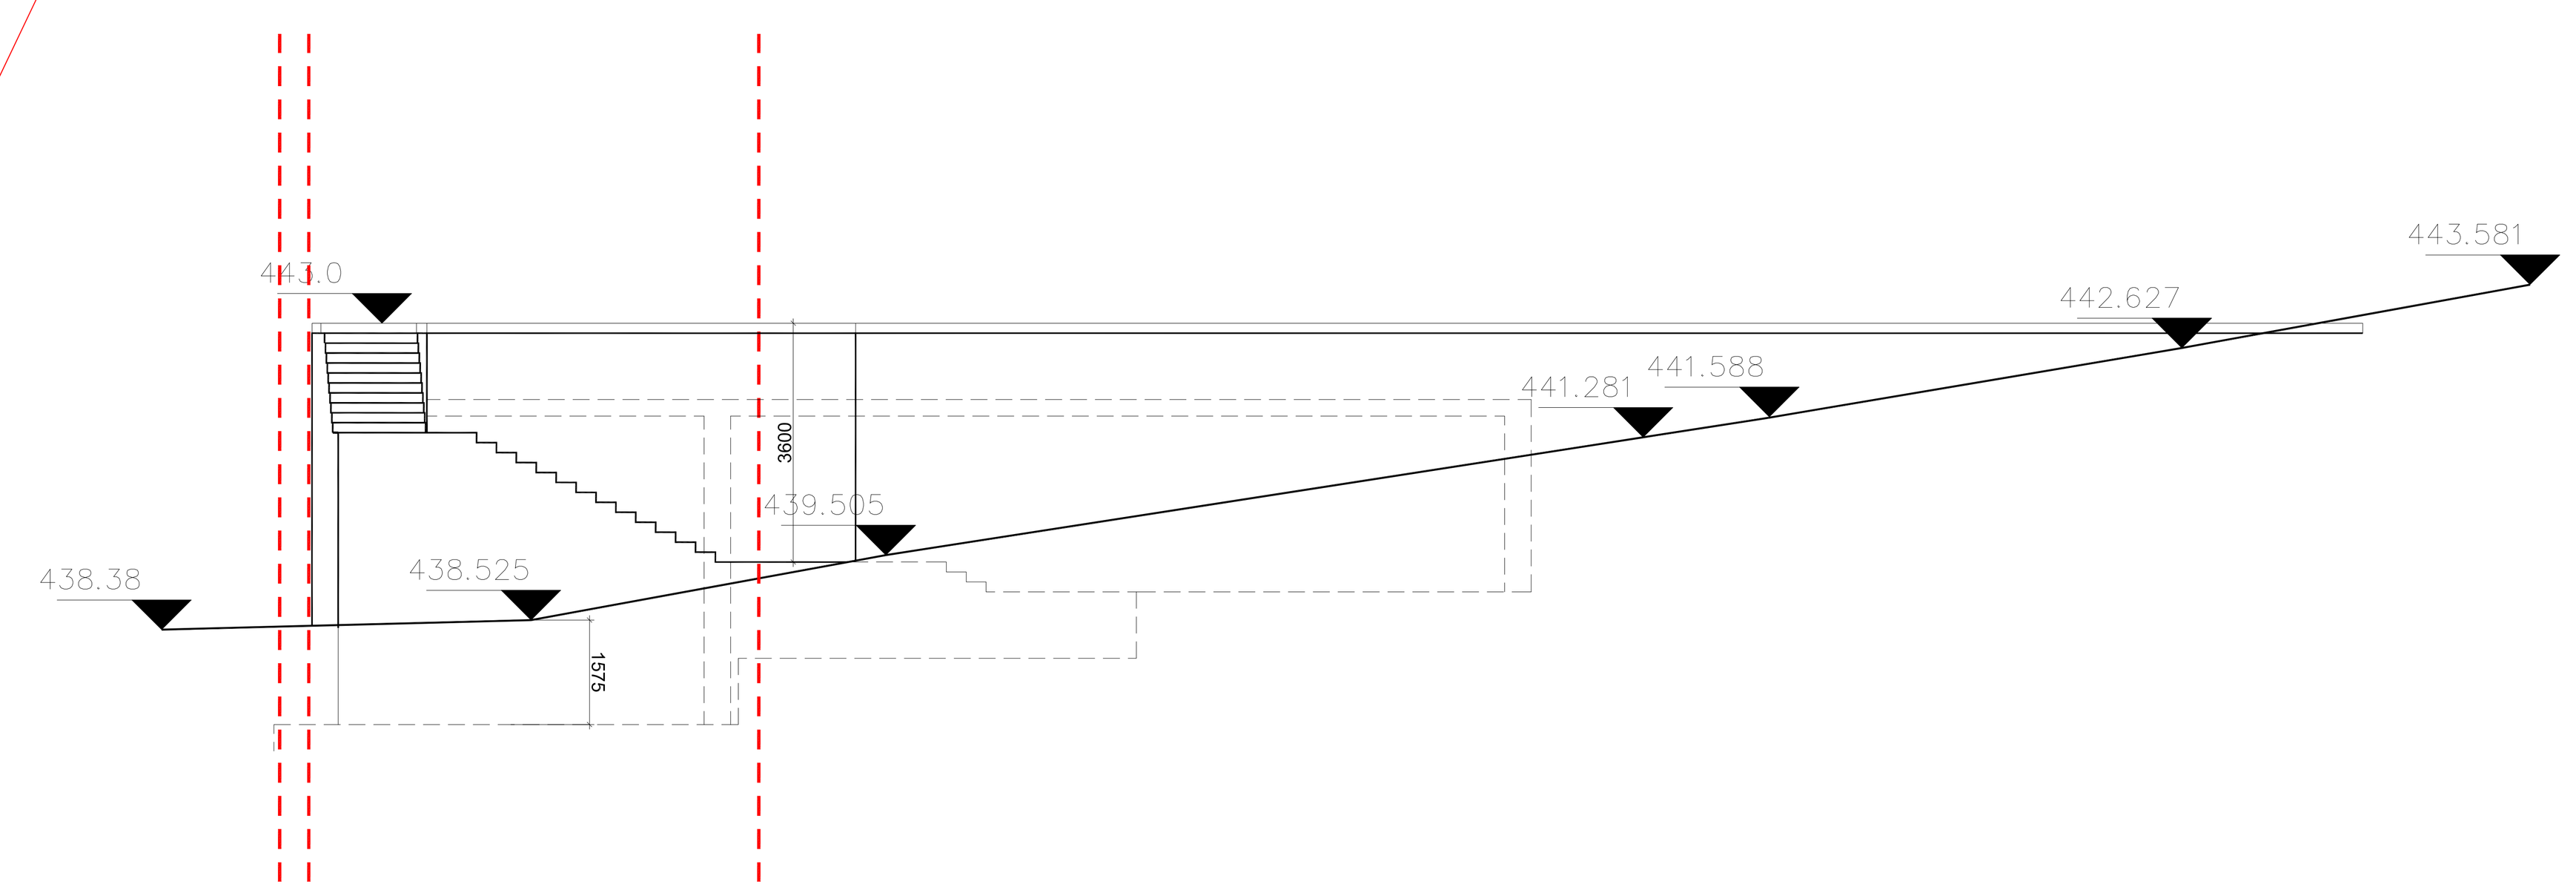

განშლა 01

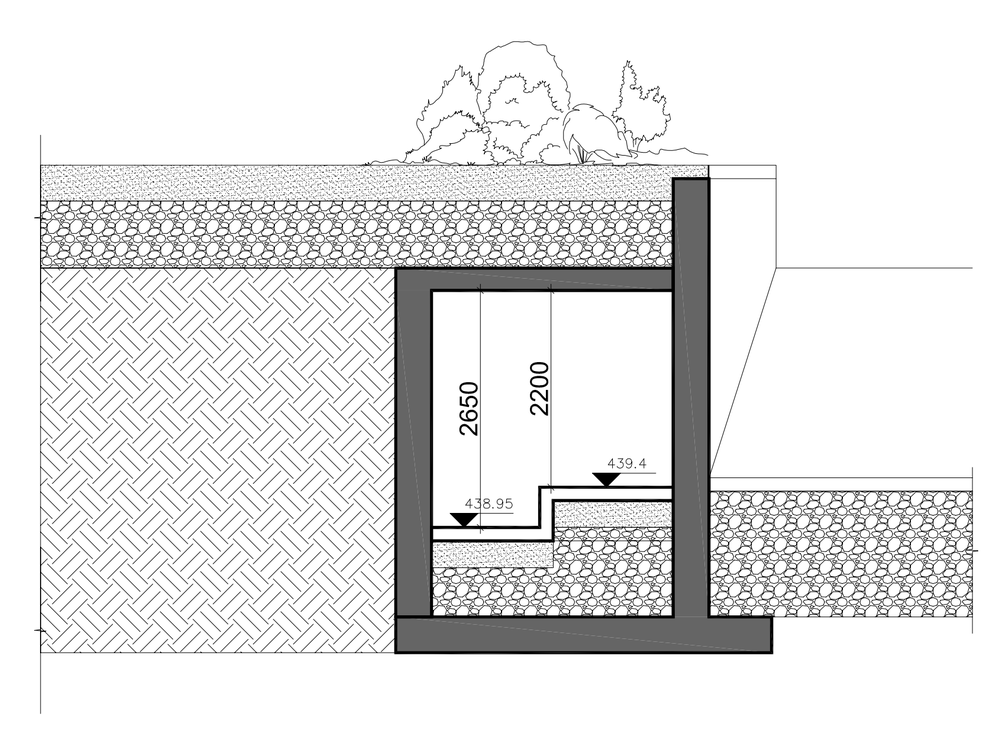

ჭრილი 1

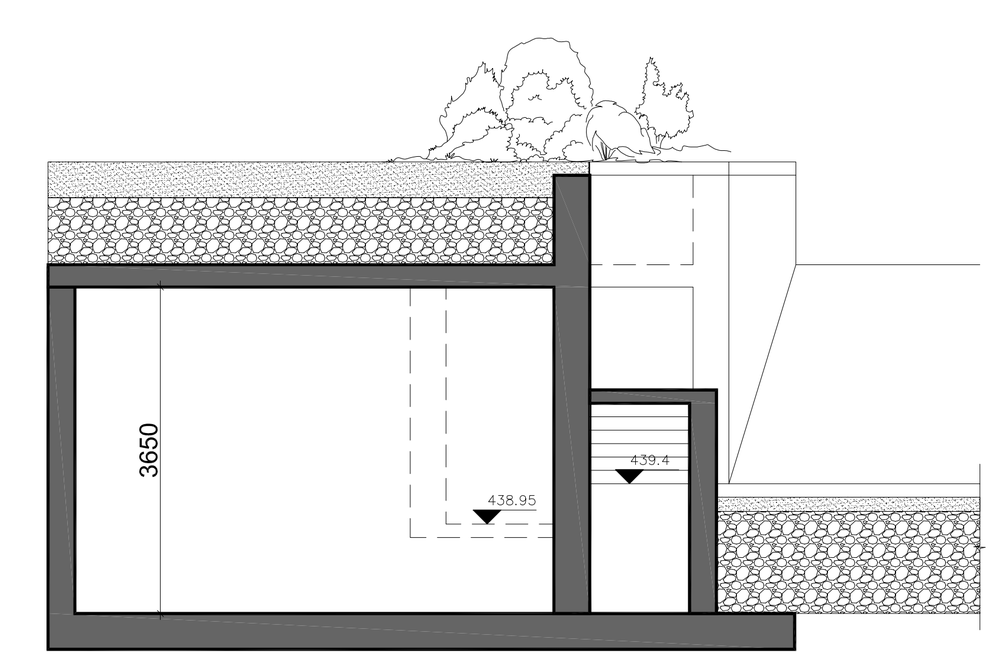

ჭრილი 2







LABORATORY OF ARCHITECTURE #3

პროექტის დასახელება

მრავალპროფილური საავადმყოფო ჭავჭავაძის N5

ექსპლიკაცია

შენიშვნები და სიმბოლოები

1. ა ბლოკის ღიობების დიდ ნაწილს ფარავდა ტექსტილის თეთრი ფერის შუქგამტარი მემბრანა, რაც განახლებული პროექტის ფარგლებში შეცვლილია პერფორირებული ფიბრობეტონის პანელებით.
2. ა ბლოკის სახურავზე შეცვლილია მრუდხაზოვანი ელემენტების მოხაზულობა და გაუქმებულია აუზები.
3. ბ ბლოკის განახლებული ვარიანტის მიხედვით, აქამდე არსებული ლიფტები შეცვლილია საფეხმავლო პანდუსით, რომელიც შესასვლელის ნიშნულამდე (+2.5) წარმოადგენს შშმ პირებისავის განკუთვნილ სტანდარტს.
4. შეიცვალა საბავშო სათამაშო მოედნის ლანდშაფტური გადაწყვეტის პრინციპი, ნაცვლად რთული რელიეფური სტრუქტურისა ჩამოყალიბდა ერთდონიანი სათამაშო სივრცე მცირე ამფითეატრით. საბაშო მოედანს დაემატა ქვედა ნიშნულიდან (მომიჯნავე სახლის ეზოს დონე) ასასვლელი კიბე, ხოლო მიწისქვეშა ნაწილში, წვიმის წყლის შემგროვებელი რეზერვუარი და დამლაგებლის ინვენტარის შესანახი საკუჭნაო.
5. ა ბლოკში, ისევე ყველა ნიშნულზე შეიცვალა ოთახების დანაწილება და ფუნქციონალური დანიშნულება, რაც გამოწვეულია ლიფტისა და კიბის უჯრედების განთავსების ადგილის ცვლილებით. აღნიშნული კონფიგურაცია აკმაყოფილებს საგანგებო სიტუაციების დეპარტამენტის მოთხოვნებს, (დამატებით ფაილად გაწვდით ნორმებს რითაც ვიხელმძღვანელეთ)
6. -8.33 ნიშნულზე, ა ბლოკში, შეიცვალა A8-A1 ღერძებს შორის ფასადი. ნაცვლად კედლისა გაჩნდა სამზარეულოს მომარაგების ავტომობილების შესასვლელი.
7. -8.33 ნიშნულზე ა ბლოკში შიგა ეზოს ნაწილი AC,AE-A4,A3 ღერძებში შეივსო სასარგებლო ფართობით.
8. ბ ბლოკის ფარგლებში შეიცვალა შიგა ლიფტის განთავსების ადგილი და მისი ფორმა.
9. ცვლილება შეეხო მიწისქვეშა დარბაზებში გამანაწილებელ ვესტიბიულს. მთლიანად მოიხსნა სართულშორისი ბაქანი, რომელიც წინა ვარიანტშია არსებული ლიფტების ტექნიკურ სივრცეს წარმოადგენდა. შეიცვალა მოცემული ფრაგმენტის მზიდი ელემენტების კონფიგურაცია, ნაცვლად რამდენიმე მრგვალი კოლონისა გაჩნდა ორი პილონი. ღერძები და ნიშნული
10. შეიცვალა ბ ბლოკის სახანძრო გასაქცევი კიბის გარეთ გამოსასვლელი. ნაცვლად ავტომატურად ამღები კარისა, მოეწყო ტამბური, მასალად გამოყენებული იქნება მსუბუქი ლითონის კარკასი და მინა-პაკეტი

* ყველა საკომუნიკაციო ღიობის ნიშნული აღებულია ღიობის ცენტრიდან

პროექტის ფოტო

ნახაზის დასახელება

საბავშვო სათამაშო მოედანი

მასშტაბი	1:100
მთ.არქიტექტორი	ი.აბაშიძე
არქიტექტორი	დ.შაფაქიძე
არქიტექტორი	ჯ.მაისურაძე
არქიტექტორი	თ.ტეხოვა
არქიტექტორი	ლ.შონია
არქიტექტორი	ტ.ქოიავა

თარიღი	11.11.20	ფურცელი	A0
გვ.რაოდ.	გვერდი	A-106	
000	000		
