შ.პ.ს „ ქორ“ არქიტექტურა და
სანებართვო სერვისები
LTD "CORE" Architecture and
permition services

არქიტექტურა და სანებართვო სერვისები

მის: თბილისი,ზ.ფალიაშვილის #33ა tel: (+995 596 84 00 01) core.org.ge@gmail.com www. core.org.ge

მშენებლობის ორგანიზების პროექტი

ქ.თბილისი, კრწანისის I ჩიხი №2ბ საკ.კოდით: 01.18.06.018.104. შპს „პილარ ჯგუფი კრწანისი“-ს საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე არქიტექტურული და კონსტრუქციული პროექტით გათვალისწინებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ორგანიზების პროექტი.

ვამტკიცებ შ.პ.ს. „ქორ''- ის

დირექტორი„----------'' ნ.ქობალია

„--29---'' „-----12------'' 2020წ

არქიტექტურა და სანებართვო სერვისები

ქ.თბილისი, კრწანისის I ჩიხი №2ბ საკ.კოდით: 01.18.06.018.104. შპს „პილარ ჯგუფი კრწანისი''-ს საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე არქიტექტურული და კონსტრუქციული პროექტით გათვალისწინებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ორგანიზების პროექტი.

ქ. თბილისი

2020 წელი

შინაარსი

I განმარტებითი ბარათი

1. საერთო ნაწილი
2. სამშენებლო პირობების დახასიათება
3. სამშენებლო ობიექტის დახასიათება და ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები
4. სამშენებლო მოედნის ორგანიზაცია
5. სამუშაოთა წარმოების წესები და მეთოდები
6. მშენებლობის განხორციელების რიგითობა და ეტაპები
7. ხანგრძლივობის დადგენა
8. უსაფრთხოების ტექნიკა
9. გარემოს დაცვის ღონისძიებები

II ძირითადი სამშენებლო მანქანებისა და სატრანსპორტო საშუალებების მოთხოვნილებათა უწყისი.

III გამოყენებული ლიტერატურა

IV მშენებლობის წარმოების გრაფიკი

V ტოპოგებმაზე დატანილი დეტალები



I განმარტებითი ბარათი

1. საერთო ნაწილი

ა) მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტის დამუშავებას საწყისად დაედო შემდეგი მონაცემები:

– დავალება პროექტირებაზე;

– პროექტით მიღებული არქიტექტურული და კონსტრუქციული გადაწყვეტები;

– რაიონის სიტუაციური გეგმა;

- გეოდეზიური გეგმები და პროფილები;

- გეოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური გამოკვლევების მონაცემები;

ბ) მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი შესრულებულია საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილებით დამტკიცებული

მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების და ასევე ქალაქ

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილების

მოთხოვნების თანახმად, (გამოყენებული ლიტერატურა), აბრეთვე შესაბამის თავებში და ქვეთავებში.

2. მშენებლობის პირობების დახასიათება

საპროექტო ობიექტის გამიზნული ტერიტორია მდებარეობს ქალაქი თბილისი კრწანისის I ჩიხი №2ბ საკ.კოდით: 01.18.06.018.104. საპროექტო ტერიტორია წარმოადგენს მართკუთხედის ფორმის მსგავს მიწის ნაკვეთს.

არსებულ მოედანზე, ხორციელდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა, რომელსაც გააჩნია სარდაფის სართული.

3. სამშენებლო ობიექტის დახასიათება და ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები.

საპროექტო შენობა წარმოადგენს როგორც კონსტრუქციული ისე არქიტექტურული თვალსაზრისით მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლს, რომელსაც გააჩნია სარდაფისთვის გაკუთვნილი სართული. გეომეტრიული თვალსაზრისით შენობა მართივი კონფიგურაციის მართკუთხა ფორმისაა (ზომით ღერძებში 25.45X19.55 მ.), სართულშუა ფილებს შორის სიმაღლე შეადგენს 3.00 მეტრს (ფილის ზედაპირიდან მეორე ფილის ზედაპირამდე.) შენობის დასრულების შემდეგ მაქსიმალური სიმაღლე +0,000 ნიშნულიდან იქნება +24 მ. შენობას გააჩნია ერთი სადარბაზო. სართულებს შორის კავშირი ხდება კიბეებისა და ლიფტის საშუალებით.



საპროექტო შენობის კონსტრუქციული მახასიათებლები:

საძირკვლები: - საპროექტო შენობის საძირკვლად წარმოდგენილია მონოლითური რკინა-ბეტონის ხიმინჯოვანი ტიპის საძირკველი.

რიგელები და სვეტები: - შენობის მზიდ ელემენტებს წარმოადგენს მონოლითური სივრცითი კარკასით შემდგარი მონოლითური რკინა-ბეტონის სვეტების მეშვეობით (მონოლითური სვეტების ზომებია 40X40სმ; 40X60სმ;), რომლებიც ერთმანეთთან დაკავშირებულია მონოლითური რკინა-ბეტონის რიგელების მეშვეობით (მონოლითური რიგელების ზომებია 60X40 სმ), რომელიც უზრუნველყოფს საპროექტო შენობის მდგრადობა-საიმედოობას და სეისმო მედეგობას.

გადახურვის ფილები - სართულშუა გადახურვები შესრულდება მონოლითური რკინა-ბეტონის 20სმ-იანი ფილების მეშვეობით.

კარკასის შემავსებელი: - მონოლითური სივრცითი კარკასი შეივსება სამშენებლო მსუბუქი ბლოკით ნაშენი კედლებით (გარე პერიმეტრზე გაუკეთდება 400X200X400 სმ, ხოლო შიდა ტიხრებად გამოყენებული იქნება 200X200X400 სმ.)

სართულებსშორის კავშირი: საცხოვრებელი სართულები ერთმანეთთან დაუკავშირდება მონოლითური რკინა-ბეტონის კიბისა და ლიფტის მეშვეობით.

შენობის გადახურვა: საპროექტო შენობას გააჩნია რთული კონფიგურაციის ორძანობიანი რკინაბეტონის ფილის გადახურვა.

ზრუნველყოფა: ელ.ენერგიის და საინჟინრო კომუნიკაციები სამშენებლო მოედანზე შეყვანილი არ არის.

4. სამშენებლო მოედნის ორგანიზაცია

ა) სამშენებლო მოედნის ორგანიზაცია გულისხმობს სამშენებლო წარმოების მომზადებას საინჟინრო თვალსაზრისით.

ბ) სამუშაოების დაწყების წინ სპეციალისტების მიერ სრულდება ტოპო–გეოდეზიური სამუშაოები შენობის მიბმითა და ღერძების დაკვალვით.

გ) სამშენებლო – სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოებისას აუცილებელია უსაფრთხოების და ხანძარ საწინააღმდეგო ღონისძიებების დაცვა. ამ მიზნით მუშა-მოსამსახურეებზე უნდა ჩატარდეს ინსტრუქტაჟი გამოცდების ჩატარებით.



5. სამუშაოთა წარმოების წესები და მეთოდები

მოცემული სამშენებლო სამუშაოები იყოფა ორ რიგად – მოსამზადებელი სამუშაოები და ძირითადი სამშენებლო სამუშაობი;

მოსამზადებელი სამუშაოების ციკლი იწყება - სამშენებლო მოედნის მოწესრიგებით:

1. ტერიტორიაზე შესასვლელში შესაბამისი გამართხილებელი ბანერების გაკვრა; სამუშაოთა მწარმოებლის დროებითი ღობის (ჩვენს შემთხვევაში არსებული სამშენებლო ტერიტორია უკვე შემოღობილია კაპიტალური სამშენებლო ბლოკის წყობით ნაშენი ღობით, რომელიც შესასრულებს იმავე ფუნქციას რასაც ასრულებს ხოლმე დროებითი უსაფრთხოების ღობე) და ჯიხურის მონტაჟი, სამშენებლო მასალის დასაწყობება, ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარებით;

2. დროებითი წყლის გადამყვანების და კანალიზაციის მოწყობა, დროებითი ელ. მომარაგების მოწყობა.

3. საპროექტო შენობის გეოდეზიური დაკვალვა.

ძირითადი სამშენებლო სამუშაოები ითვალისწინებს შემდგომ მუშა-პროცესს. კერძოდ:

1. მიწის სამუშაოების დაწყება.

2. რკ/ბეტონის სამუშაოები – საპროექტო შენობის ფუძე-საძირკვლების და ძირითადი კარკასის მოწყობა;

3. არამზიდი კონსტრუქციების აშენება, საინჟინრო კომუნიკაციების მონტაჟი;

4. სახურავის მოწყობა, შენობის კედლების შევსება-შეფუთვა შიდა და გარე სარემონტო სამუშაოები.

5. ტერიტორიის კეთილმოწყობა, სამშენებლო ნარჩენების გატანა;

შენიშვნა: – ყველა ფარული სამუშაოების დასრულება მოხდეს შესაბამისი აქტის შედგენით, საჭიროების შემთხვევაში მოხდეს ფარული სამუშაოების ფოტოფიქსაცია. აქტებზე ხელმომწერი მხარეები – დამკვეთი, მენარდე, ობიექტზე დამოუკიდებელი ზედამხედველი სუბიექტი;

ა) მოცემულ მშენებლობაზე ფარული სამუშაოების აქტები შედგეს შემდეგ ფარულ სამუშოებზე – მიწის სამუშაოების დასრულებისას, საძირკვლის კონსტრუქციების არმირებაზე მათ დაბეტონებამდე, საძირკვლის ჰიდროიზოლაციაზე, სვეტების, სართულშუა გადახურვის ფილებისა და რიგელების, მათი კვანძების, კონსტრუქციების არმირების დასრულებაზე მათ დაბეტონებამდე; აქტები იკინძება და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან.

ბ) სამუშაოთა წარმოების უწყვეტობისა და ტექნოლოგიების უზრუნველსაყოფად აუცილებელია სამშენებლო მოედნის აღჭურვა ცხრილში ჩამოთვლილი (II თავი) მანქანა – მექანიზმებით, ინსტრუმენტებითა და დანადგარებით.

გ) სამონტაჟო სამუშაოების პროცესში და საინჟინრო ქსელების გაყვანისას სამშენებლო ორგანიზაციამ უნდა განახორციელოს შენობისა და ნაგებობის გეომეტრიული პარამეტრების გეოდეზიური კონტროლი.

დ) მშენებლობის პროცესში სავალდებულოა ტიპიური ფორმების მიხედვით შედგეს სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი, სადაც აისახება ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი ეტაპობრივი ძმედება; ასევე ტექნიკური უსაფრთხოების და ტექნიკური ზედამხედველობის ჟურნალები.



6. მშენებლობის განხორციელების რიგითობა და ეტაპები

სამშენებლო სამუშაოების პროცესის წარმოების რიგითობის მიხედვით ობიექტზე განისაზღვრა შემდეგი სამშენებლო ეტაპები:

I რიგის სამუშაოები : 1. სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება/შემოღობვა;
2. შენობის ღერძების გეოდეზიური დაკვალვა; (ორივე ეტაპზე – 1 თვე).

II რიგის სამუშაოები: ძირითადი სამშენებლო სამუშაოებისთვის გამოიყო ცხრა ეტაპი, რომლებშიც გაერთიანდა ერთი სახის სამუშაოები:

1) მიწის სამუშაოები. (სამშენებლო ვადად განისაზღვრა 120 დღე)
2) საძირკვლის მოწყობა. (სამშენებლო ვადად განისაზღვრა 120 დღე)
3) კონსტრუქციული კარკასის მოწყობა.
(სამშენებლო ვადად განისაზღვრა 360 დღე).
4) გადახურვის მოწყობა. (სამშენებლო ვადად განისაზღვრა 90 დღე)
5) გარე კედლების მოწყობა. (სამშენებლო ვადად განისაზღვრა 90 დღე)
6) კარ-ფანჯრის, ვიტრაჟების მონტაჟი.
(სამშენებლო ვადად განისაზღვრა 90 დღე)
7) მოსაპირკეთებელი სამუშაოები.
(სამშენებლო ვადად განისაზღვრა 90 დღე)
8) ტერიტორიის კეთილმოწყობა
(სამუშაო ვადად განისაზღვრა 90 დღე)
9) სამუშაოების დასრულება.
(სამუშაო ვადად განისაზღვრა 30 დღე)

სულ დადგინდა 9 ერთეული ეტაპი.

შენიშვნა : სამშენებლო ეტაპებიის დასახელებები გადმოტანილი იქნა №57 დადგენილებაში მითითებული დასახელებების იდენტურად.

სულ დადგინდა ცხრა ერთეული ეტაპი.



7. მშენებლობის ხანგრძლივობის დადგენა

სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობისა და სამუშაოების წარმართვის თავლსაზრისით ობიექტის არსებული, არქიტექტურულ – მოცულობითი და კონსტრუქციული გადაწყვეტითი სირთულის მიხედვით მარტივი სირთულის კატეგორიისაა.

მშენებელობის ხანგრძლივობას ვადგენთ **T**=24 თვეს.

8. უსაფრთხოების ტექნიკა

ა) უცხო პირთა, აბრეთვე სამშენებლო ოპერაციებში დაუსაქმებელი მუშა-მომსახურეთა ყოფნა სამშენებლო მოედანზე დაუშვებელია.

ბ) მუშა–მომსახურე პერსონალს უნდა ჩაუტარდეს ინსტრუქტაჟი მშენებლობაზე უსაფრთხოების ტექნიკის უზრუნველყოფის საკითხებზე, ასევე ტარდება გამოცდაც.

გ) სამუშაოთა წარმოების უზრუნველყოფისათვის და ტექნოლოგიების უზრუნველსაყოფად ასევე აუცილებელია მშენებლობის აღჭურვა განმარტებით ბარათში მოცემული ცხრილის მიხედვით, მანქანა–მექანიზმებით, ინსტრუმენტებით და დანადგარებით.

დ) მომუშავეთა შორის უსაფრთხოების ღონისძიებები უნდა იყოს დაცული სამშენებლო – სამონტაჟო სამუშაოთა წარმოების ყველა ეტაპზე, თანახმად სნ და წ III – 4 – 80 (უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში) და სხვა ნორმატიულ – საკანონმდებლო დოკუმენტების მითითებების შესაბამისობით. მათგან ძირადღება მახვილდება შემდეგზე:

1. სამუშაო ადგილები მუშაობის პირობებისა და ტექნოლოგიურების გათვალისწინებით უზრუნველყოფილი უნდა იყოს კოლექტიური დაცვისა და სიგნალიზაციის საშუალებით.
2. ადვილად აალებადი სამღებრო, საიზოლაციო და სხვა მასალების აბრეთვე მომწამლავი ნივთიერებების დღიური რაოდენობა სამშენებლო სამუშაოზე წარმოების ზონაში არ უნდა აღემატებოდეს იმავე დღიური რაოდენობის მოთხოვნილებების შესაბამისობას.
3. მასალებისა და ნაკეთობების დასაწყობება უნდა მოხდეს მათზე ტექნოლოგიურ პირობათა გათვალისწინებით; ამავე დროს ისინი უნდა დაეწყოს მოსწორებულ ადგილზე, რომ მათი მოცურება არ მოხდეს.
4. ელექტრო უსაფრთხოების წესები ჩამოყალიბებულია სახსტანდარტში 12.1.0.13-88. ელექტრო კარადა უნდა იყოს ჩაკეტილ მდგომარეობაში. ელექტრო კაბელები, ელექტრო სადენები და მოწყობილობები კი იზოლირებული. გაშიშვლებული სადენების გამოყენება აკრძალულია.
5. იკრძალება ელექტრო ხელსაწყოების სხვა ადგილზე გადატანა მისი ელექტრო ქსელიდან გამორთვის გარეშე. სამუშაოთა შესრულების შემდეგ ელექტრო ხელსაწყოები სუფთავდება და მშრალად იწმინდება.



ა) მშენებლობის სამუშაოების დაწყება დაიშვება ქ. თბილისის მერიის ს.ს.ი.პ არქიტექტურის სამსახურის მიერ გაცემული ნებართვის შემდეგ. მშენებლობა აუცილებელია განხორციელდეს ბუნების დაცვით და ჰაერის გაბინძურების საწინააღმდეგო ღონისძიებების დაცვით.

ბ) გარემოს დაცვის სამსახურის ნებართვის გარეშე მშენებლობის სიახლოვეს იკრძალება მრავალწლიანი ხეებისა და ნარგავების მოჭრა ან განადგურება. (ამ შემთხვევაში შეხება არ ხდება).

გ) დაუშვებელია არსებულ საკანალიზაციო ჭებში და სხვა მილსადენებში ბეტონის და

სხვა ძიმიური ხსნარების ჩარეცხვა ან მათი დანაგვიანება სამშენებლო ნარჩენებით.

დ) საბათქაშო და მოსახვითი სამუშაოების შესრულებისას შასადებს ჩამოეშაროს შარდა, რათა არ მოხდეს მტვრის გაბნევა სელიტებულ ზონაში.

ე) მშენებლობის დამთავრების პერიოდში შენობიდან სამშენებლო ნაგვის ღიად ჩამოყრა დაუშვებელია, რათა ამ შემთხვევაშიც არ მოხვდეს მტვრის გაბნევა და სელიტებულ ზონაში. შენობა უნდა აღიჭურვოს ინვენტარული კონუსური ნაგავ გამტარებით. ნაგვის ჩამოცვლა კი მოხდეს შუშალოდ დახურულ ავტო-თვითმცლელი მანქანების ძარებში.



II – ძირითადი სამშენებლო მანქანებისა და სატრანსპორტო საშუალებების მოთხოვნილებათა უწყისი

№	დასახელება	მარკა	რაოდ.ცალი
1	ერთჩამჩიანი ექსკავატორი ბულდ. ფარით ჩამჩის მოცულობით 0.5მ^3		1
2	კოშკურა ამწე	ТП12	1
3	ბეტონის პომპა	М26	1
4	სიღრმითი ვიბრატორი	ს-3698	1
5	თვითმცლელი, ძარიანი და სპეცავტოტრანსპორტი სხვადასხვა სამშ. ტვირთის შემოსატანად.		2
6	თორკრედ-დანადგარი	ЭЗ-21	1
7	ავტობეტონ მრევი მიქსერი		1
8	გადასატანი კომპრესორი	სო-45	1
9	შესადუღებელი აბრეზატი	სო-48	1
10	ცემენტის ფენის მომასწორებელი აბრეზატი	სო-89	
11	შესალეს-მომასწორებელი აბრეზატი	სო-54	1
12	ელექტრო შესადუღებელი აპარატები	კომპ.	1
13	ავტოგენტური შედუღების დანადგარები	კომპ.	1
14	სამღებრო სადგური	ПСП-2	1
15	ლითონის სახარაჩო სექციები 50კვ.მ ფართზე		
16	ანევმატური ინსტრუმენტი: საბურღი, ხრახნდამჭერი და სხვა		
17	შხვადასხვა დანიშნულების ხელის მოწყობილობა-ინსტრუმენტები: ნიჩბები, ბრები, რომები, წერაქვები და სხვა.	კომპ.	3

შემსრულებელი: ---------- ვ.ბლიაძე

თანაავტორი: ---------- ნ.ქობალია



III გამოყენებული ლიტერატურა

СН И П III -4-80	Техника безопасности в строительстве
СН И П **3**-02-01-87	Земляные сооружения
СН И П **1-04-03-85**	Нормы проолжительности строительства и задела в строительстве предприатий зданий и сооружений
СН И П **3**-01-01-85	Организация строительного производства
СН И П **РН-73**	Расчетные нормативы



H=L/Y
27.00=10800:0,4
Y= 0.4

H=L/Y
24.45=9780:0,4
Y= 0.4

ჯოშკურა ამწე

დროებითი
უსაფრთხოების ღობე

ძარიანი სპეცტექნიკის
მოძრაობის სქემა

ღობე
2.00 მ

დროებითი სამუშაოთა
მწარმოებლის ოთახი
დროებითი
ღია საწყობი
დროებითი
დახურული საწყობი

5700 5550 3800 6100 4300
25450

1 1' 2 3 4 5

"CORE" LTD შპს "ქორე"
CORE
405384422
არქიტექტურა და მშენებლობა



დამკვეთის ან მშენებლის უფლებამოსილი პირი

ხელმოწერა: _____ პირადი ნომერი

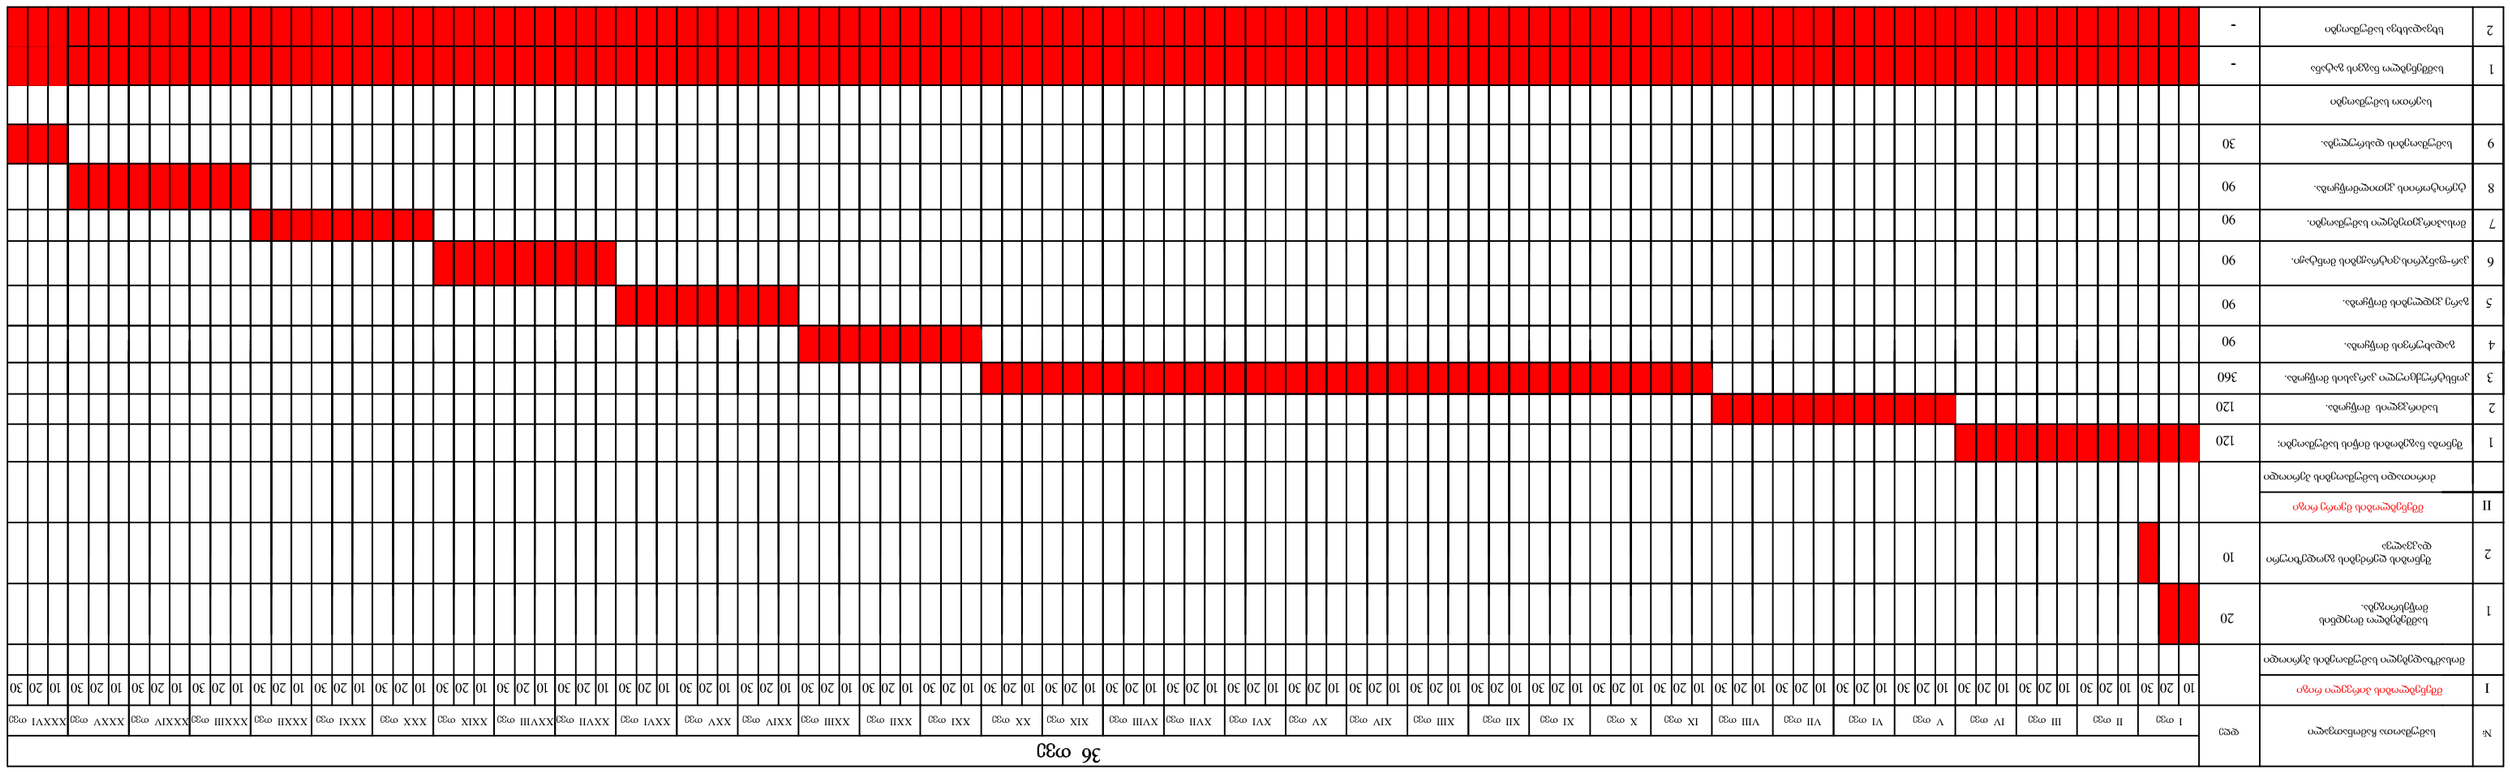
№
სამუშაოთა დასახელება
ფორ.
I
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 ფევ
2 ფევ
3 ფევ
4 ფევ
5 ფევ
6 ფევ
7 ფევ
8 ფევ
9 ფევ
10 ფევ
11 ფევ
12 ფევ
13 ფევ
14 ფევ
15 ფევ
16 ფევ
17 ფევ
18 ფევ
19 ფევ
20 ფევ
21 ფევ
22 ფევ
23 ფევ
24 ფევ
25 ფევ
26 ფევ
27 ფევ
28 ფევ
1 მარ
2 მარ
3 მარ
4 მარ
5 მარ
6 მარ
7 მარ
8 მარ
9 მარ
10 მარ
11 მარ
12 მარ
13 მარ
14 მარ
15 მარ
16 მარ
17 მარ
18 მარ
19 მარ
20 მარ
21 მარ
22 მარ
23 მარ
24 მარ
25 მარ
26 მარ
27 მარ
28 მარ
29 მარ
30 მარ
31 მარ
1 აპრ
2 აპრ
3 აპრ
4 აპრ
5 აპრ
6 აპრ
7 აპრ
8 აპრ
9 აპრ
10 აპრ
11 აპრ
12 აპრ
13 აპრ
14 აპრ
15 აპრ
16 აპრ
17 აპრ
18 აპრ
19 აპრ
20 აპრ
21 აპრ
22 აპრ
23 აპრ
24 აპრ
25 აპრ
26 აპრ
27 აპრ
28 აპრ
29 აპრ
30 აპრ
1 მაი
2 მაი
3 მაი
4 მაი
5 მაი
6 მაი
7 მაი
8 მაი
9 მაი
10 მაი
11 მაი
12 მაი
13 მაი
14 მაი
15 მაი
16 მაი
17 მაი
18 მაი
19 მაი
20 მაი
21 მაი
22 მაი
23 მაი
24 მაი
25 მაი
26 მაი
27 მაი
28 მაი
29 მაი
30 მაი
31 მაი
1 ივნ
2 ივნ
3 ივნ
4 ივნ
5 ივნ
6 ივნ
7 ივნ
8 ივნ
9 ივნ
10 ივნ
11 ივნ
12 ივნ
13 ივნ
14 ივნ
15 ივნ
16 ივნ
17 ივნ
18 ივნ
19 ივნ
20 ივნ
21 ივნ
22 ივნ
23 ივნ
24 ივნ
25 ივნ
26 ივნ
27 ივნ
28 ივნ
29 ივნ
30 ივნ
1 ივლ
2 ივლ
3 ივლ
4 ივლ
5 ივლ
6 ივლ
7 ივლ
8 ივლ
9 ივლ
10 ივლ
11 ივლ
12 ივლ
13 ივლ
14 ივლ
15 ივლ
16 ივლ
17 ივლ
18 ივლ
19 ივლ
20 ივლ
21 ივლ
22 ივლ
23 ივლ
24 ივლ
25 ივლ
26 ივლ
27 ივლ
28 ივლ
29 ივლ
30 ივლ
31 ივლ
1 აგვ
2 აგვ
3 აგვ
4 აგვ
5 აგვ
6 აგვ
7 აგვ
8 აგვ
9 აგვ
10 აგვ
11 აგვ
12 აგვ
13 აგვ
14 აგვ
15 აგვ
16 აგვ
17 აგვ
18 აგვ
19 აგვ
20 აგვ
21 აგვ
22 აგვ
23 აგვ
24 აგვ
25 აგვ
26 აგვ
27 აგვ
28 აგვ
29 აგვ
30 აგვ
31 აგვ
1 სექ
2 სექ
3 სექ
4 სექ
5 სექ
6 სექ
7 სექ
8 სექ
9 სექ
10 სექ
11 სექ
12 სექ
13 სექ
14 სექ
15 სექ
16 სექ
17 სექ
18 სექ
19 სექ
20 სექ
21 სექ
22 სექ
23 სექ
24 სექ
25 სექ
26 სექ
27 სექ
28 სექ
29 სექ
30 სექ
1 ოქტ
2 ოქტ
3 ოქტ
4 ოქტ
5 ოქტ
6 ოქტ
7 ოქტ
8 ოქტ
9 ოქტ
10 ოქტ
11 ოქტ
12 ოქტ
13 ოქტ
14 ოქტ
15 ოქტ
16 ოქტ
17 ოქტ
18 ოქტ
19 ოქტ
20 ოქტ
21 ოქტ
22 ოქტ
23 ოქტ
24 ოქტ
25 ოქტ
26 ოქტ
27 ოქტ
28 ოქტ
29 ოქტ
30 ოქტ
31 ოქტ
1 ნოე
2 ნოე
3 ნოე
4 ნოე
5 ნოე
6 ნოე
7 ნოე
8 ნოე
9 ნოე
10 ნოე
11 ნოე
12 ნოე
13 ნოე
14 ნოე
15 ნოე
16 ნოე
17 ნოე
18 ნოე
19 ნოე
20 ნოე
21 ნოე
22 ნოე
23 ნოე
24 ნოე
25 ნოე
26 ნოე
27 ნოე
28 ნოე
29 ნოე
30 ნოე
1 დეკ
2 დეკ
3 დეკ
4 დეკ
5 დეკ
6 დეკ
7 დეკ
8 დეკ
9 დეკ
10 დეკ
11 დეკ
12 დეკ
13 დეკ
14 დეკ
15 დეკ
16 დეკ
17 დეკ
18 დეკ
19 დეკ
20 დეკ
21 დეკ
22 დეკ
23 დეკ
24 დეკ
25 დეკ
26 დეკ
27 დეკ
28 დეკ
29 დეკ
30 დეკ
31 დეკ
1 იან
2 იან
3 იან
4 იან
5 იან
6 იან
7 იან
8 იან
9 იან
10 იან
11 იან
12 იან
13 იან
14 იან
15 იან
16 იან
17 იან
18 იან
19 იან
20 იან
21 იან
22 იან
23 იან
24 იან
25 იან
26 იან
27 იან
28 იან
29 იან
30 იან
31 იან
1 თებ
2 თებ
3 თებ
4 თებ
5 თებ
6 თებ
7 თებ
8 თებ
9 თებ
10 თებ
11 თებ
12 თებ
13 თებ
14 თებ
15 თებ
16 თებ
17 თებ
18 თებ
19 თებ
20 თებ
21 თებ
22 თებ
23 თებ
24 თებ
25 თებ
26 თებ
27 თებ
28 თებ
