

ნახაზი

ფასადი „ა-ვ„

ფასადი „ზ-ჶ„

ფასადი „1-5„

ფასადი „5-1„

ასაწყობი ელემენტების მარკირების სქემა

ასაწყობი ელემენტების მარკირება ხორციელდება ასოებით და ციფრებით. ასოები აღნიშნავს სართულის ნომერს, ციფრები — ელემენტის რიგით ნომერს. მარკირება ნანგრევებზე ნანგრევების ამოღების შემდეგ, ხოლო ნანგრევების ამოღებამდე — ნანგრევების ზედაპირზე. მარკირების ფერი კონტრასტული უნდა იყოს ელემენტის ფონისა და ზომების მიმართ. მარკირების ზომა 300×300 მმ, ხოლო პატარა ელემენტებისთვის — 100×100 მმ. მარკირების ადგილი ელემენტის ზედაპირზე ისეთი უნდა იყოს, რომ ის ადვილად ამოიკითხებოდეს ელემენტის ამოღების შემდეგ.

ელემენტების მარკირების ნიშნები

- ელემენტის ნომერი — 1-დან 3-ზე
- ელემენტის ზომები — 3.200×0.400×0.150 მ
- ელემენტის მასა — 1560 კგ
- ელემენტის მოცულობა — 0.672 მ³
- ელემენტის ბეტონის კლასი — B25
- ელემენტის ზედაპირის ფართობი — 1.28 მ²
- ელემენტის ამოღების თარიღი — 01.19.16.001/034
- ელემენტის ამოღების ადგილი — ნანგრევების ზონა №8
- ელემენტის ამოღების ოპერატორი — ი. ბერიძე
- ელემენტის ამოღების ტექნიკა — ექსკავატორი CAT 320
- ელემენტის ტრანსპორტირების მიმართულება — ნანგრევებიდან დროებითი დასაწყობების ადგილისკენ
- ელემენტის დროებითი დასაწყობების ადგილი — დასაწყობების ადგილი №2
- ელემენტის ამოღების დაწყების დრო — 10:15
- ელემენტის ამოღების დასრულების დრო — 10:40
- ელემენტის ამოღების ხანგრძლივობა — 25 წუთი
- ელემენტის ამოღების ტემპერატურა — +18°C
- ელემენტის ამოღების ატმოსფერული პირობები — მოღრუბლული, ნალექების გარეშე
- ელემენტის ამოღების ხელმძღვანელი — ა. ჯაფარიძე
- ელემენტის ამოღების ოპერატორის ტელეფონი — 599 12 34 56
- ელემენტის ამოღების ოპერატორის ელფოსტა — operator@example.ge
- ელემენტის ამოღების ოპერატორის პირადი ნომერი — 01019016034
- ელემენტის ამოღების ოპერატორის მისამართი — ქ. ნანგრევები, ქუჩა №1, სახლი 1
- ელემენტის ამოღების ოპერატორის ორგანიზაცია — შპს „ნანგრევების ამოღება“
- ელემენტის ამოღების ოპერატორის საიდენტიფიკაციო ნომერი — 206159100
- ელემენტის ამოღების ოპერატორის ლიცენზიის ნომერი — №ნ-01.19.16.001/034
- ელემენტის ამოღების ოპერატორის ლიცენზიის მოქმედების ვადა — 2030 წლის 31 დეკემბერი
- ელემენტის ამოღების ოპერატორის ლიცენზიის გამცემი ორგანო — საქართველოს ტექნიკური ინსპექციის სამსახური
- ელემენტის ამოღების ოპერატორის ლიცენზიის გაცემის თარიღი — 2019 წლის 15 ნოემბერი
- ელემენტის ამოღების ოპერატორის ლიცენზიის ნომერი — ნ-0042
- ელემენტის ამოღების ოპერატორის ლიცენზიის სტატუსი — მოქმედი
- ელემენტის ამოღების ოპერატორის ლიცენზიის შეჩერების ან გაუქმების საფუძვლები — არ არის
- ელემენტის ამოღების ოპერატორის ლიცენზიის შეჩერების ან გაუქმების ორგანო — საქართველოს ტექნიკური ინსპექციის სამსახური
- ელემენტის ამოღების ოპერატორის ლიცენზიის შეჩერების ან გაუქმების თარიღი — არ არის
- ელემენტის ამოღების ოპერატორის ლიცენზიის შეჩერების ან გაუქმების ვადა — არ არის
- ელემენტის ამოღების ოპერატორის ლიცენზიის შეჩერების ან გაუქმების მიზეზი — არ არის
- ელემენტის ამოღების ოპერატორის ლიცენზიის შეჩერების ან გაუქმების გადაწყვეტილების ნომერი — არ არის
- ელემენტის ამოღების ოპერატორის ლიცენზიის შეჩერების ან გაუქმების გადაწყვეტილების თარიღი — არ არის
- ელემენტის ამოღების ოპერატორის ლიცენზიის შეჩერების ან გაუქმების გადაწყვეტილების გამომტანი ორგანო — არ არის
- ელემენტის ამოღების ოპერატორის ლიცენზიის შეჩერების ან გაუქმების გადაწყვეტილების გასაჩივრების ვადა — არ არის
- ელემენტის ამოღების ოპერატორის ლიცენზიის შეჩერების ან გაუქმების გადაწყვეტილების გასაჩივრების შედეგი — არ არის
- ელემენტის ამოღების ოპერატორის ლიცენზიის შეჩერების ან გაუქმების გადაწყვეტილების აღსრულების ვადა — არ არის
- ელემენტის ამოღების ოპერატორის ლიცენზიის შეჩერების ან გაუქმების გადაწყვეტილების აღსრულების ორგანო — არ არის
- ელემენტის ამოღების ოპერატორის ლიცენზიის შეჩერების ან გაუქმების გადაწყვეტილების აღსრულების შედეგი — არ არის
- ელემენტის ამოღების ოპერატორის ლიცენზიის შეჩერების ან გაუქმების გადაწყვეტილების აღსრულების ხარჯები — 0.000-ის ტოლი
- ელემენტის ამოღების ოპერატორის ლიცენზიის შეჩერების ან გაუქმების გადაწყვეტილების აღსრულების ხარჯების ანაზღაურების წყარო — არ არის
- ელემენტის ამოღების ოპერატორის ლიცენზიის შეჩერების ან გაუქმების გადაწყვეტილების აღსრულების ხარჯების ანაზღაურების ვადა — არ არის
- ელემენტის ამოღების ოპერატორის ლიცენზიის შეჩერების ან გაუქმების გადაწყვეტილების აღსრულების ხარჯების ანაზღაურების ორგანო — არ არის
- ელემენტის ამოღების ოპერატორის ლიცენზიის შეჩერების ან გაუქმების გადაწყვეტილების აღსრულების ხარჯების ანაზღაურების შედეგი — არ არის
- ელემენტის ამოღების ოპერატორის ლიცენზიის შეჩერების ან გაუქმების გადაწყვეტილების აღსრულების ხარჯების ანაზღაურების ხარჯები — 0.000-ის ტოლი
- ელემენტის ამოღების ოპერატორის ლიცენზიის შეჩერების ან გაუქმების გადაწყვეტილების აღსრულების ხარჯების ანაზღაურების ხარჯების ანაზღაურების წყარო — არ არის
- ელემენტის ამოღების ოპერატორის ლიცენზიის შეჩერების ან გაუქმების გადაწყვეტილების აღსრულების ხარჯების ანაზღაურების ხარჯების ანაზღაურების ვადა — არ არის
- ელემენტის ამოღების ოპერატორის ლიცენზიის შეჩერების ან გაუქმების გადაწყვეტილების აღსრულების ხარჯების ანაზღაურების ხარჯების ანაზღაურების ორგანო — არ არის
- ელემენტის ამოღების ოპერატორის ლიცენზიის შეჩერების ან გაუქმების გადაწყვეტილების აღსრულების ხარჯების ანაზღაურების ხარჯების ანაზღაურების შედეგი — არ არის
- ელემენტის ამოღების ოპერატორის ლიცენზიის შეჩერების ან გაუქმების გადაწყვეტილების აღსრულების ხარჯების ანაზღაურების ხარჯების ანაზღაურების ხარჯები — 0.000-ის ტოლი
- ელემენტის ამოღების ოპერატორის ლიცენზიის შეჩერების ან გაუქმების გადაწყვეტილების აღსრულების ხარჯების ანაზღაურების ხარჯების ანაზღაურების წყარო — არ არის
- ელემენტის ამოღების ოპერატორის ლიცენზიის შეჩერების ან გაუქმების გადაწყვეტილების აღსრულების ხარჯების ანაზღაურების ხარჯების ანაზღაურების ვადა — არ არის
- ელემენტის ამოღების ოპერატორის ლიცენზიის შეჩერების ან გაუქმების გადაწყვეტილების აღსრულების ხარჯების ანაზღაურების ხარჯების ანაზღაურების ორგანო — არ არის
- ელემენტის ამოღების ოპერატორის ლიცენზიის შეჩერების ან გაუქმების გადაწყვეტილების აღსრულების ხარჯების ანაზღაურების ხარჯების ანაზღაურების შედეგი — არ არის
- ელემენტის ამოღების ოპერატორის ლიცენზიის შეჩერების ან გაუქმების გადაწყვეტილების აღსრულების ხარჯების ანაზღაურების ხარჯების ანაზღაურების ხარჯები — 0.000-ის ტოლი

ელემენტების ამოღების ტექნოლოგიური რუკა

ელემენტების ამოღების ტექნოლოგიური რუკა განსაზღვრავს ელემენტების ამოღების თანმიმდევრობას, გამოსაყენებელ ტექნიკას, ოპერატორების რაოდენობას და ელემენტების დროებით დასაწყობების ადგილებს. ელემენტების ამოღება ხორციელდება ზედა სართულიდან ქვედა სართულისკენ, ნანგრევების ზედაპირის სტაბილურობის შენარჩუნებით. ელემენტების ამოღების ტექნოლოგიური რუკა შედგენილია ელემენტების ამოღების ტექნოლოგიური რუკების შედგენის ინსტრუქციის მოთხოვნების შესაბამისად.

ელემენტების ამოღების ტექნოლოგიური რუკის ნომერი	ნ-01.19.16.001/034
ელემენტების ამოღების ტექნოლოგიური რუკის შედგენის თარიღი	15 ნოემბერი 2020 წ.
ელემენტების ამოღების ტექნოლოგიური რუკის ავტორი	ი. ბერიძე
ელემენტების ამოღების ტექნოლოგიური რუკის შემმოწმებელი	ა. ჯაფარიძე
ელემენტების ამოღების ტექნოლოგიური რუკის დამტკიცების თარიღი	16 ნოემბერი 2020 წ.
ელემენტების ამოღების ტექნოლოგიური რუკის დამტკიცების ორგანო	საქართველოს ტექნიკური ინსპექციის სამსახური
ელემენტების ამოღების ტექნოლოგიური რუკის ნომერი	ნ-3
ელემენტების ამოღების ტექნოლოგიური რუკის ვერსია	1
ელემენტების ამოღების ტექნოლოგიური რუკის ძალაში შესვლის თარიღი	16 ნოემბერი 2020 წ.
ელემენტების ამოღების ტექნოლოგიური რუკის ძალაში შესვლის ვადა	31 დეკემბერი 2030 წ.

ელემენტების ამოღების ტექნოლოგიური რუკის ტექსტური ნაწილი

1. ელემენტების ამოღების ტექნოლოგიური რუკა შედგენილია ელემენტების ამოღების ტექნოლოგიური რუკების შედგენის ინსტრუქციის მოთხოვნების შესაბამისად.
2. ელემენტების ამოღების ტექნოლოგიური რუკის ნომერია ნ-01.19.16.001/034.
3. ელემენტების ამოღების ტექნოლოგიური რუკა ძალაშია 2020 წლის 16 ნოემბრიდან 2030 წლის 31 დეკემბრამდე.
4. ელემენტების ამოღების ტექნოლოგიური რუკის ავტორია ი. ბერიძე.
5. ელემენტების ამოღების ტექნოლოგიური რუკა შემოწმებულია და დამტკიცებულია საქართველოს ტექნიკური ინსპექციის სამსახურის მიერ.
6. ელემენტების ამოღების ტექნოლოგიური რუკის ვერსია 1-ია.
7. ელემენტების ამოღების ტექნოლოგიური რუკის ნომერია ნ-3.
8. ელემენტების ამოღების ტექნოლოგიური რუკის ძალაში შესვლის თარიღია 16 ნოემბერი 2020 წ.
9. ელემენტების ამოღების ტექნოლოგიური რუკის ძალაში შესვლის ვადაა 31 დეკემბერი 2030 წ.
10. ელემენტების ამოღების ტექნოლოგიური რუკის ძალაში შესვლის ორგანოა საქართველოს ტექნიკური ინსპექციის სამსახური.
11. ელემენტების ამოღების ტექნოლოგიური რუკის ძალაში შესვლის შედეგია ელემენტების ამოღების ტექნოლოგიური რუკების შედგენის ინსტრუქციის მოთხოვნების შესაბამისად.
12. ელემენტების ამოღების ტექნოლოგიური რუკის ძალაში შესვლის ხარჯებია 0.000-ის ტოლი.
13. ელემენტების ამოღების ტექნოლოგიური რუკის ძალაში შესვლის ხარჯების ანაზღაურების წყაროა არ არის.
14. ელემენტების ამოღების ტექნოლოგიური რუკის ძალაში შესვლის ხარჯების ანაზღაურების ვადაა არ არის.
15. ელემენტების ამოღების ტექნოლოგიური რუკის ძალაში შესვლის ხარჯების ანაზღაურების ორგანოა არ არის.
16. ელემენტების ამოღების ტექნოლოგიური რუკის ძალაში შესვლის ხარჯების ანაზღაურების შედეგია არ არის.
17. ელემენტების ამოღების ტექნოლოგიური რუკის ძალაში შესვლის ხარჯების ანაზღაურების ხარჯებია 0.000-ის ტოლი.
18. ელემენტების ამოღების ტექნოლოგიური რუკის ძალაში შესვლის ხარჯების ანაზღაურების ხარჯების ანაზღაურების წყაროა არ არის.
19. ელემენტების ამოღების ტექნოლოგიური რუკის ძალაში შესვლის ხარჯების ანაზღაურების ხარჯების ანაზღაურების ვადაა არ არის.
20. ელემენტების ამოღების ტექნოლოგიური რუკის ძალაში შესვლის ხარჯების ანაზღაურების ხარჯების ანაზღაურების ორგანოა არ არის.
21. ელემენტების ამოღების ტექნოლოგიური რუკის ძალაში შესვლის ხარჯების ანაზღაურების ხარჯების ანაზღაურების შედეგია არ არის.
22. ელემენტების ამოღების ტექნოლოგიური რუკის ძალაში შესვლის ხარჯების ანაზღაურების ხარჯების ანაზღაურების ხარჯებია 0.000-ის ტოლი.
23. ელემენტების ამოღების ტექნოლოგიური რუკის ძალაში შესვლის ხარჯების ანაზღაურების ხარჯების ანაზღაურების წყაროა არ არის.
24. ელემენტების ამოღების ტექნოლოგიური რუკის ძალაში შესვლის ხარჯების ანაზღაურების ხარჯების ანაზღაურების ვადაა არ არის.
25. ელემენტების ამოღების ტექნოლოგიური რუკის ძალაში შესვლის ხარჯების ანაზღაურების ხარჯების ანაზღაურების ორგანოა არ არის.
26. ელემენტების ამოღების ტექნოლოგიური რუკის ძალაში შესვლის ხარჯების ანაზღაურების ხარჯების ანაზღაურების შედეგია არ არის.
27. ელემენტების ამოღების ტექნოლოგიური რუკის ძალაში შესვლის ხარჯების ანაზღაურების ხარჯების ანაზღაურების ხარჯებია 0.000-ის ტოლი.

ელემენტების ამოღების ტექნოლოგიური რუკის გრაფიკული ნაწილი

ნახაზები

ფასადი „ა-ვ„	
ფასადი „ზ-ჶ„	
ფასადი „1-5„	
ფასადი „5-1„	
ელემენტების დასაწყობების ადგილების სქემა



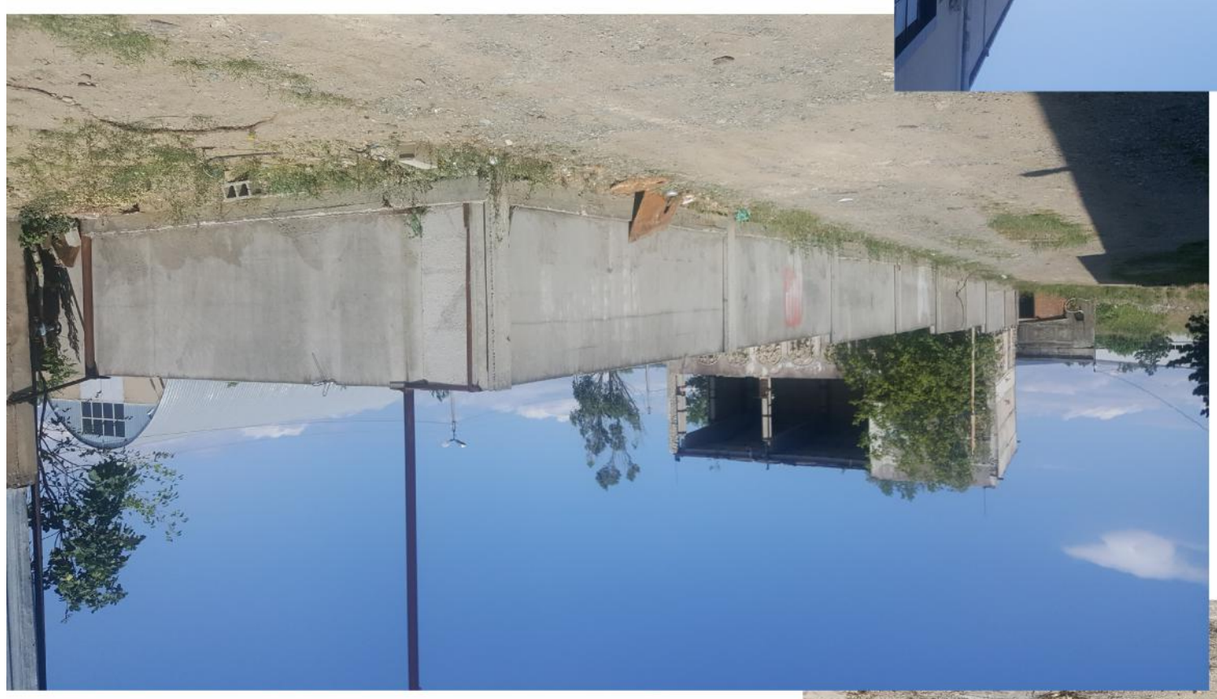



ЗЭЧФЭВЭЧ Э-3	ОЭЭЛЭЧЭЧЭ 2020 Ч.
	ФЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ№

ЭЭЛЭЭЧЭЭЭЭЭЭ

1. ФЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ

სადემონტაჟო სამუშაოთა კალენდარული გრაფიკი

№№	დასახელება	სამუშ. ხანგრძ. დღე	თვეები I	II	III
1	2	3		4	
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	10	10		
2	ღობის დემონტაჟი	30		30	
3	ტერიტორიის გასუფთავება	20		20	
4	სხვადასხვა სამუშაოები	75		75	

T=75 დღე (3 თვე)

შპს „შ" აალ0-777„			ობიექტის მისამართი: ქ.ხობი ი.ჩანტლაძის ქუჩა №8.
დირექტ.	ა.ქიმაშვილი		დამკვეთი: შპს „დუგლაძეების დვინის კომპანია",
არქიტექტ.	მ.ჯაშაშვილი		შინაარსი: ღობის დემონტაჟი
			სადემონტაჟო სამუშაოთა კალენდარული გრაფიკი
			წელი 2020
			სტადია მპ
			ფურც.

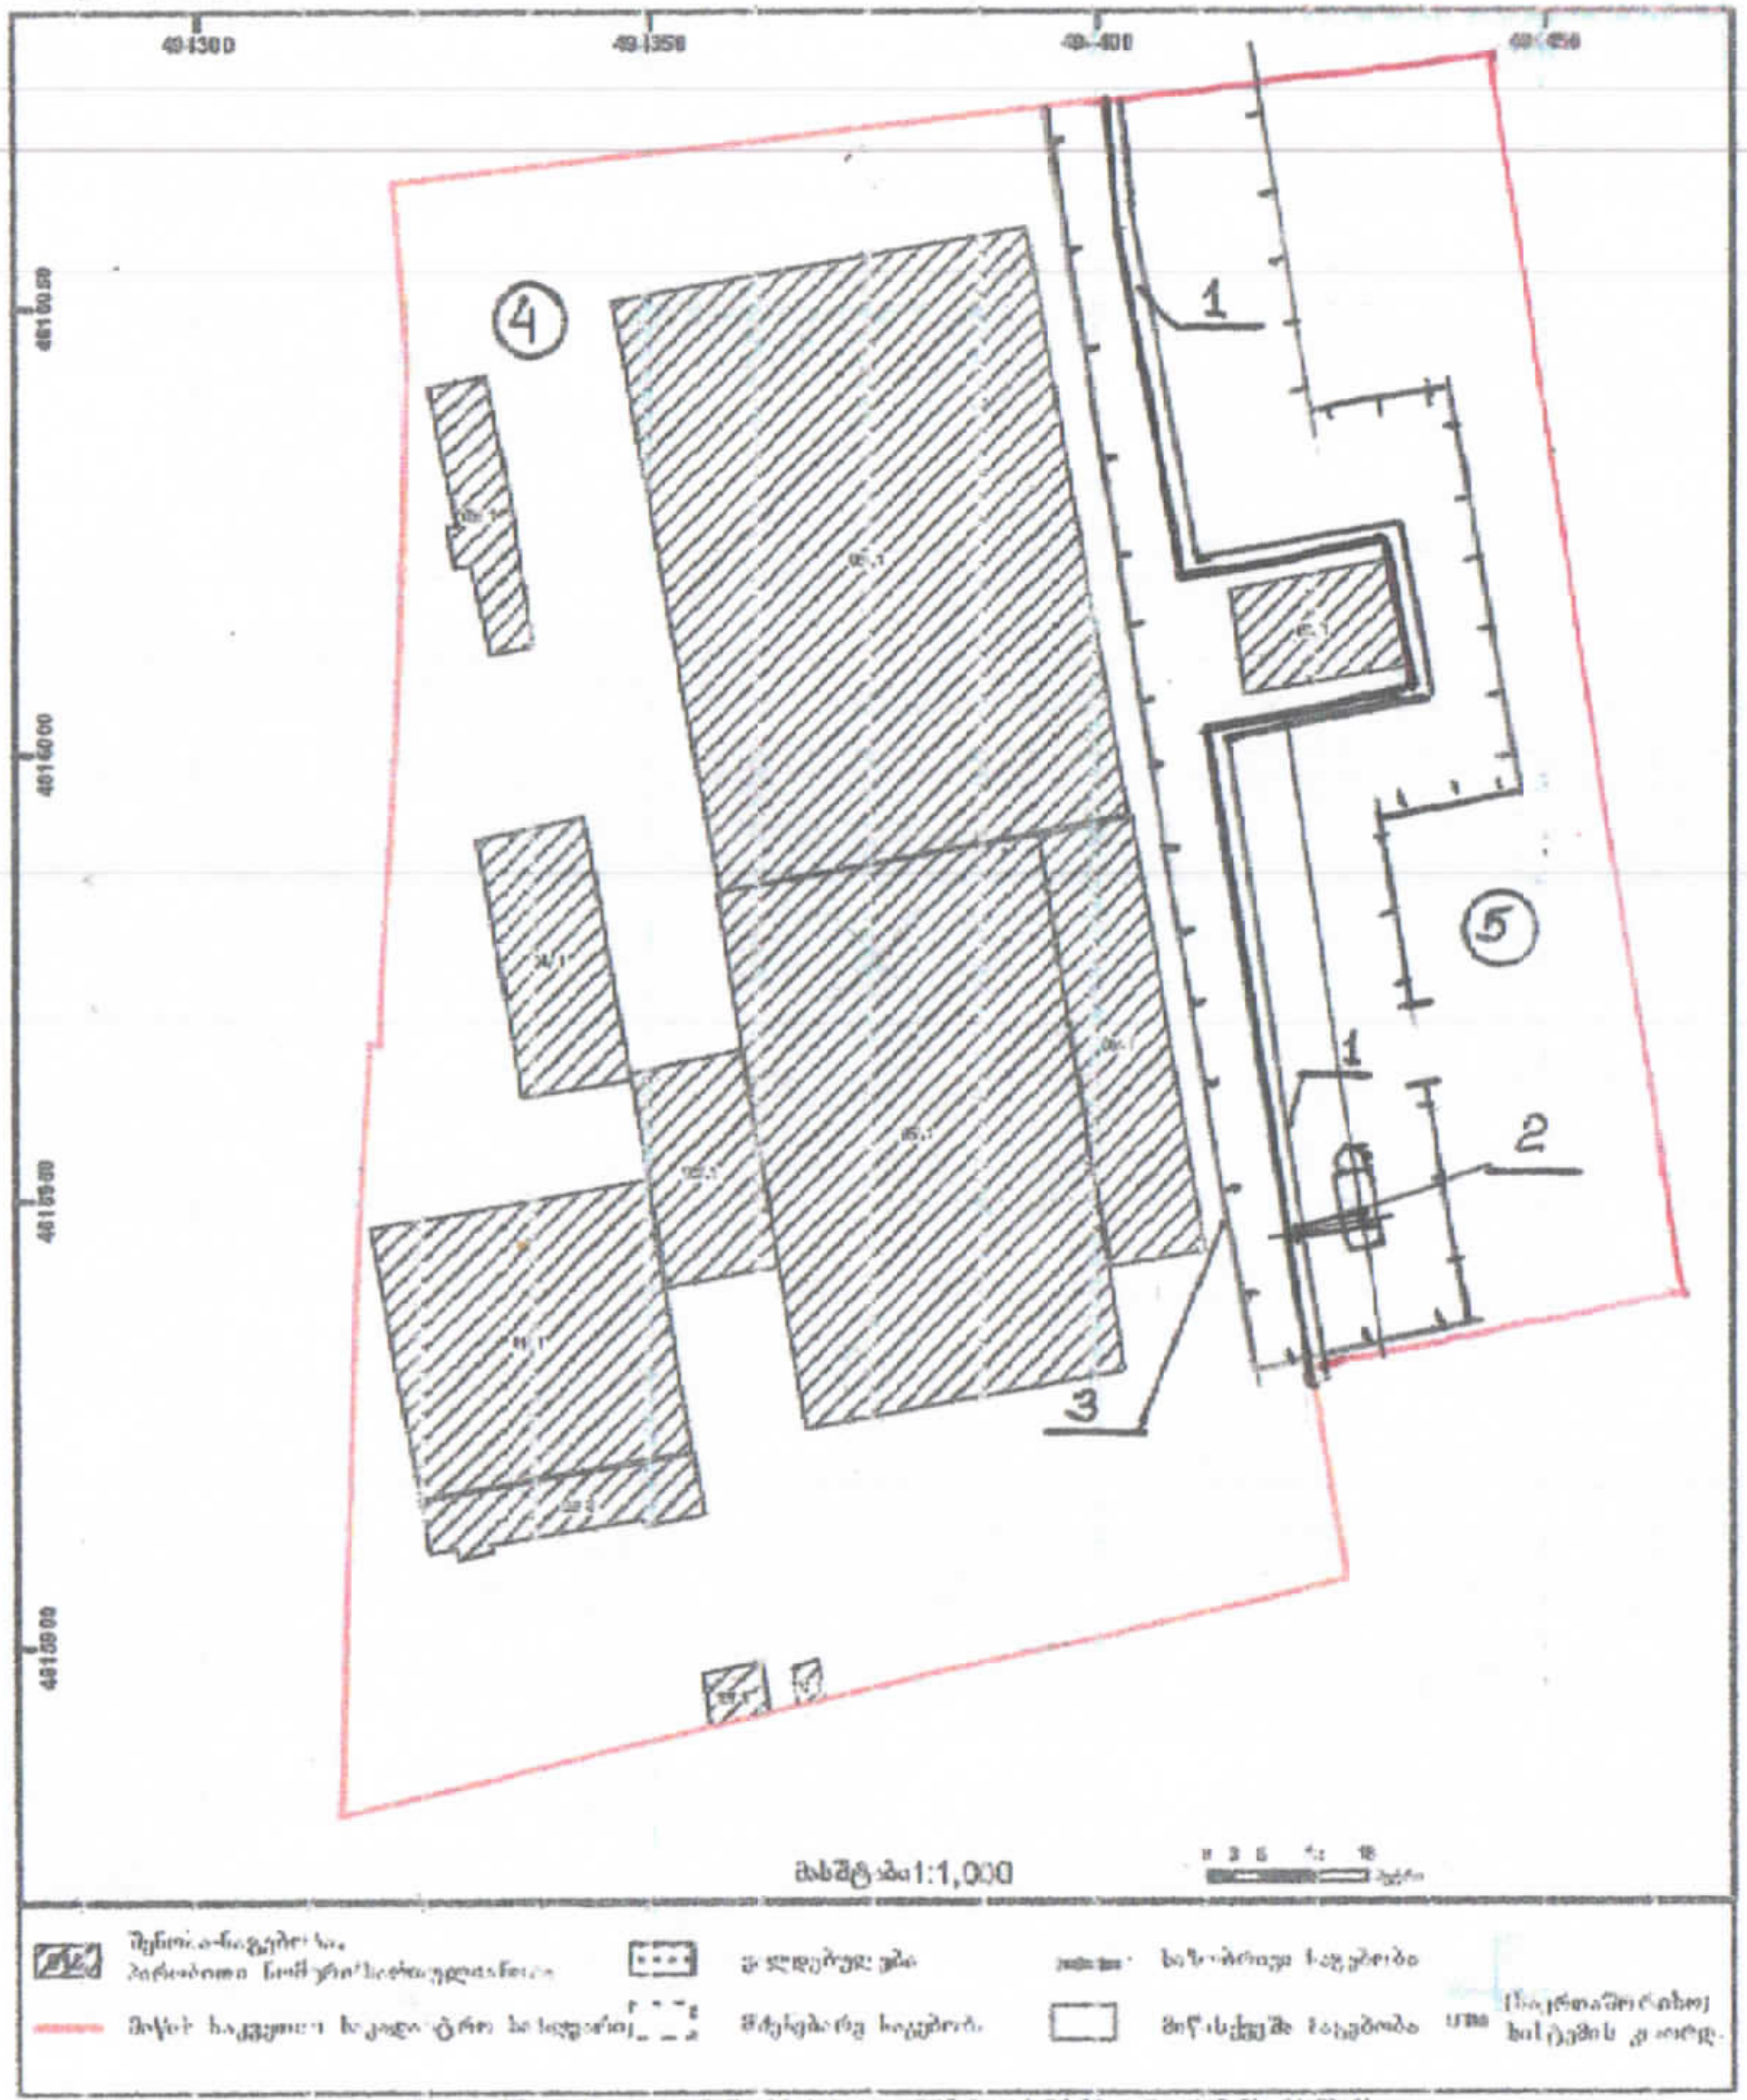

სამშენებლო გენგეგმა

პირობითი აღნიშვნები

- სადემონტაჟო ღობე
- დროებითი ღობე
- სამონტაჟო ამწე
- არსებული შენობები

ექსპლიკაცია

1. სადემონტაჟო
2. საავტომობილო ამწე
3. დროებითი ღობე.
4. შ.პ.ს. „დუგლაძეების ღვინის კომპანია"ს კუთვნილი ტერიტორია.
5. შ.პ.ს. „ივერია აგრო"ს კუთვნილი ტერიტორია

შპს „მოპოლი-777"	ობიექტის მისამართი: ქობულეთი, თ.ჩანტლაძის ქუჩა №8. დამკვეთი: შპს „დუგლაძეების ღვინის „კომპანია",	
დირექტ.	გ.ქემოშვილი	
არქიტექტ.	გ.ქემაშვილი	შინაარსი: ღობის დემონტაჟი
სამშენებლო გენგეგმა	წელი: 2020	სტადია: [illegible] ფურც.
