
ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსოპ ქონების მართვის სააგენტოს თანხმობის ასაღებად ატვირთულია განცხადება.

“ სამუშაო გულისხმობს დროებითი ღობის მოწყობას, მიწის ნაკვეთის ს/კ 01,15,02,040,013_ის მიჯნაზე, არსებული საცხოვრებელი სახლის დემონტაჟის და შემდგომში სამშენებლო სამუშაოების განსახორციელებლად. გაცნობებთ, რომ აღნიშნულ სამუშაოებზე აღებული გვქონდა თანხმობა. სააგენტოს გადაწყვეტილება №QN1795016. ამასთან ერთად სამუშაოებში შესულია შესასვლელი გზის მოწყობა, რომელიც მოქცეულია მითითებულ არეალში“.

განცხადების ნომერი № QN1836143.

შენიშვნა:
დროებითი სქემა შედგენილია ვსნ "37 - 84" და საქართველოს კანონის „საგზაო მოძრაობის შესახებ“ მოთხოვნების შესაბამისად

1. გამაფრთხილებელი ზონის სიგრძე შეადგენს 50 მეტრს.
2. სამუშაო ზონის სიგრძე 20 მეტრი.
3. ბუფერული ზონა არ გვაძლს ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები
4. სავალი ნაწილის დახურული ზოლის სიგანე არ გვაძლს ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები
5. სამუშაოთა წარმოების ზონის სიგრძეარ გვაძლს ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები
6. სტაბილიზაციის ზონის სიგრძე არ გვაძლს ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები
7. ნახაზზე ნაჩვენებია მხოლოდ დროებითი საგზაო ნიშნები
8. მარეგულირებლის დანიშნულებაა მშენებლობის პერიოდში სამშენებლო ტექნიკისა და ქვეითთა ნაკადების მოძრაობის ორგანიზება.

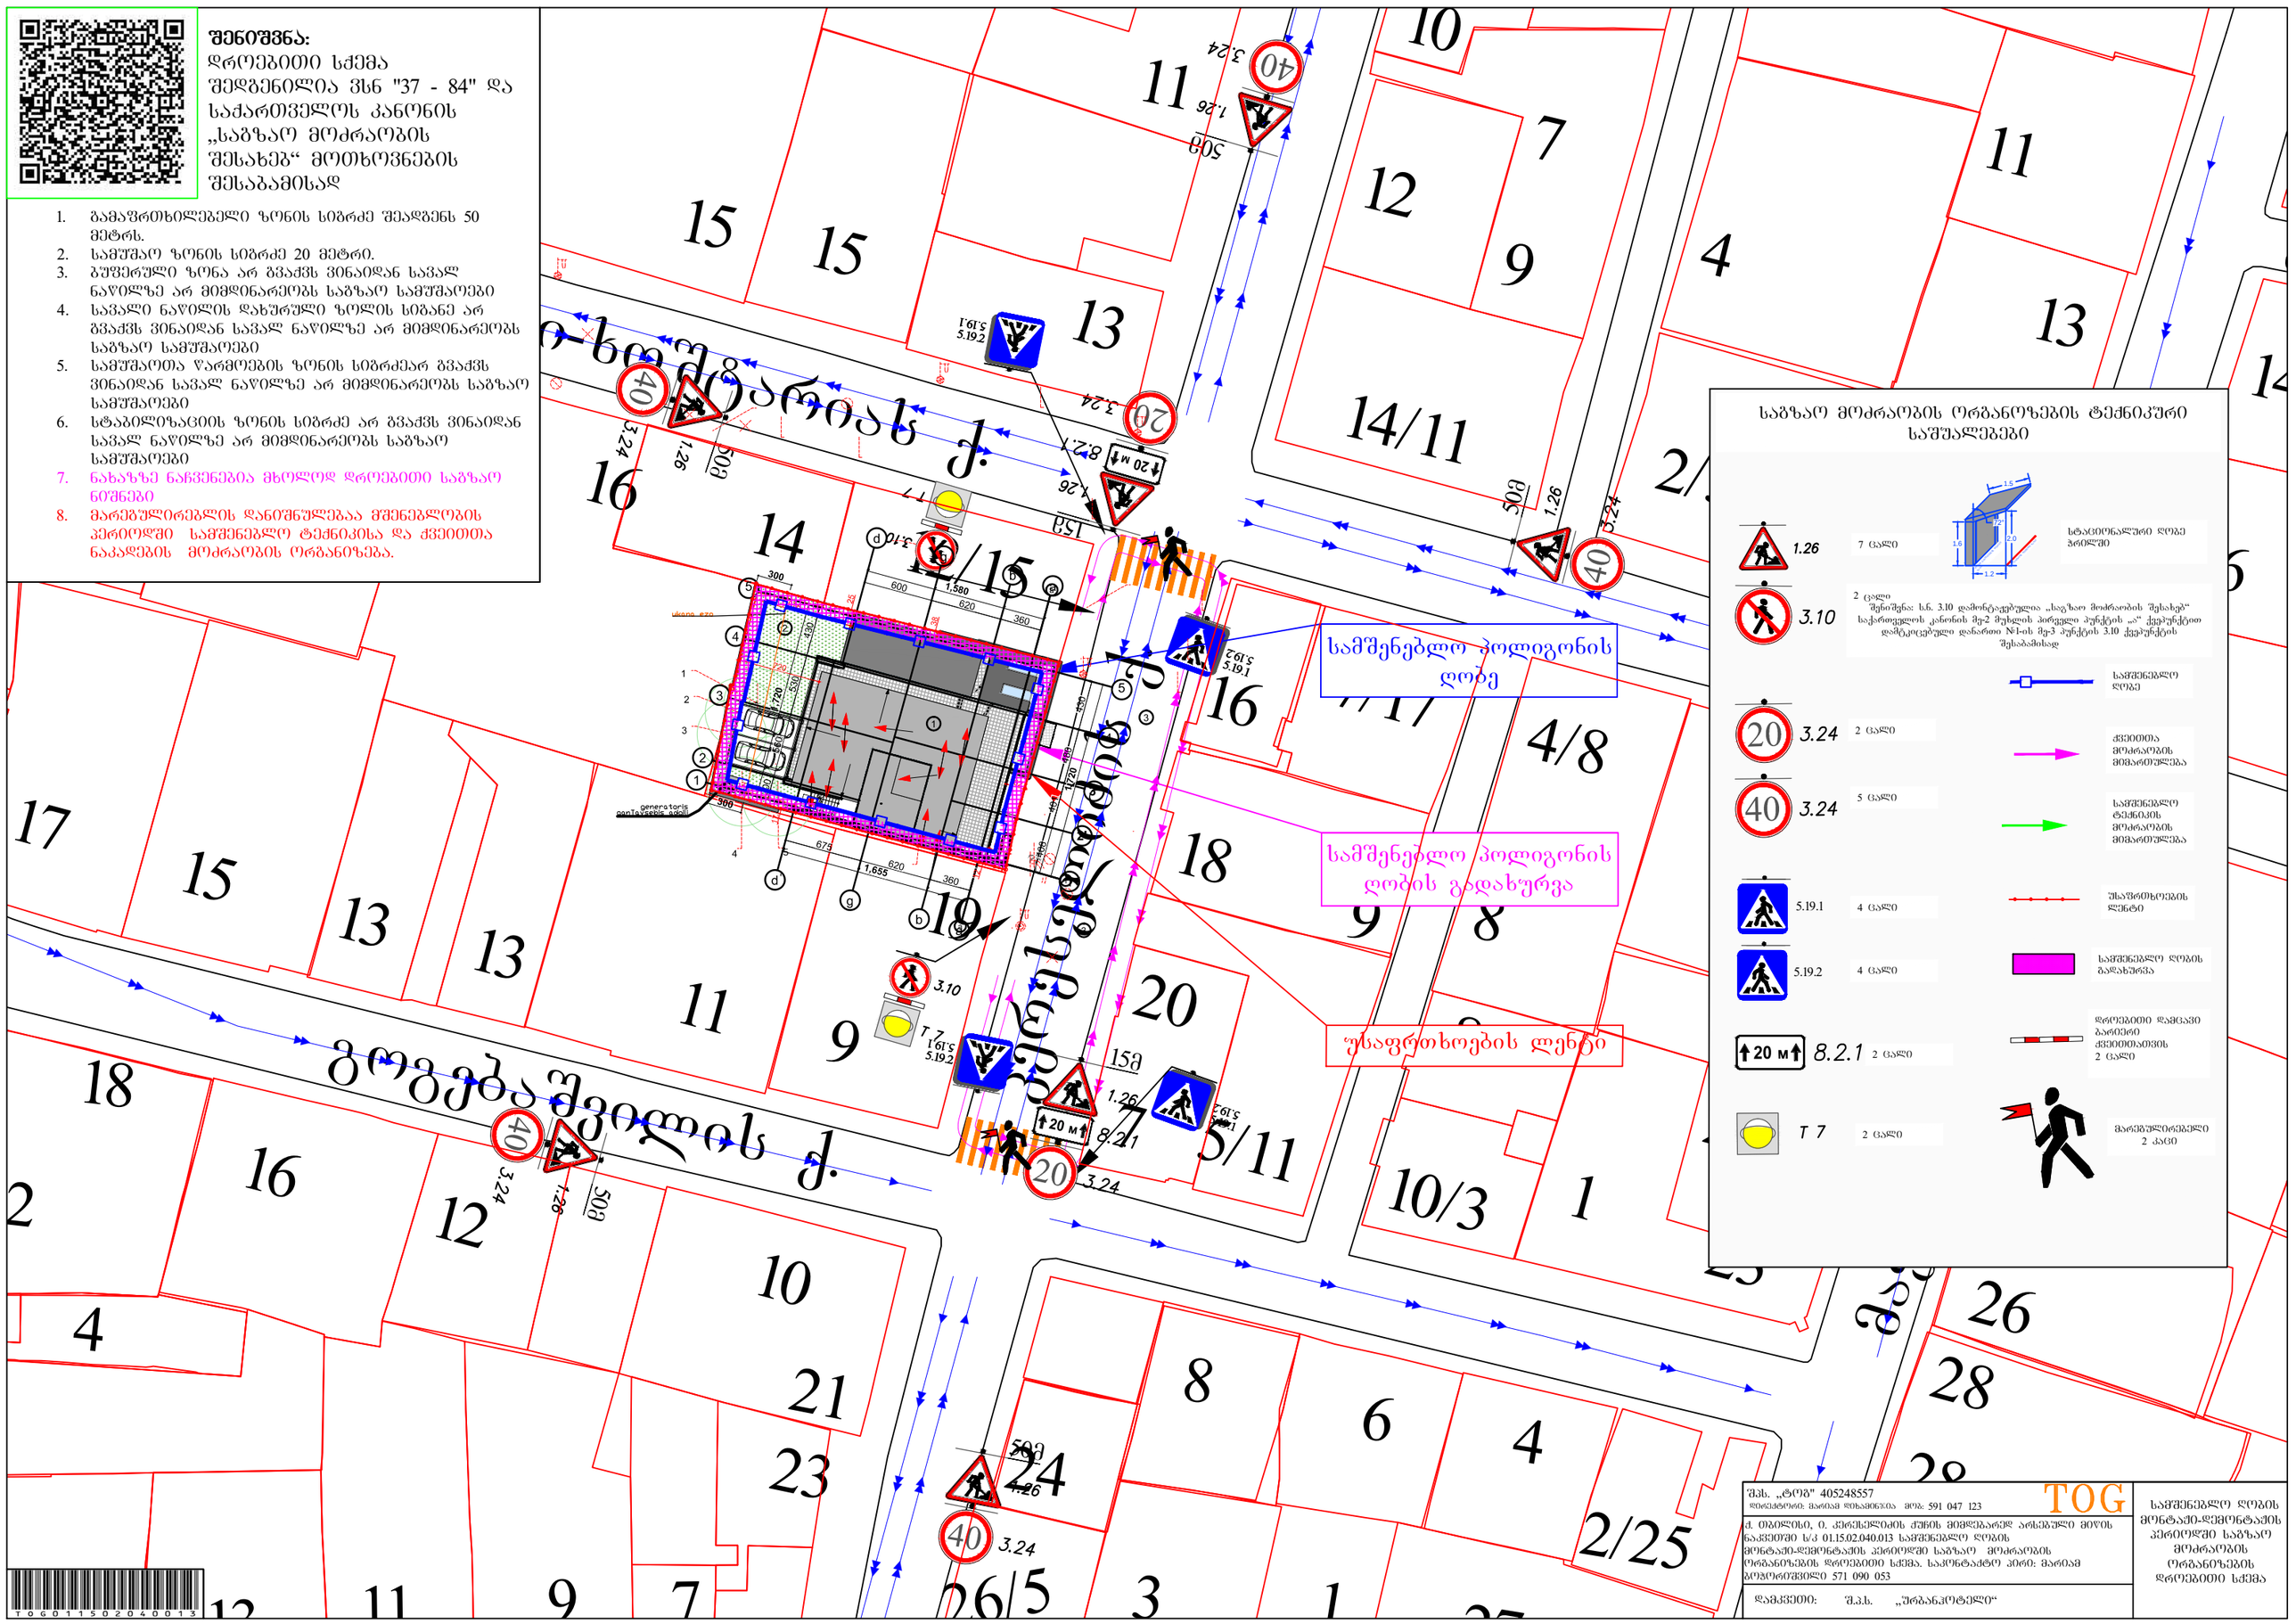

საბაზრო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებები

1.26	7 ცალი	სტაციონალური ღობე ბრილში
3.10	2 ცალი შენიშვნა: ს.ნ. 3.10 დამონტაჟებულია „საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით დამტკიცებული დანართი №1-ის მე-3 პუნქტის 3.10 ქვეპუნქტის შესაბამისად	
		სამშენებლო ღობე
20 3.24	2 ცალი	ქვეითთა მოძრაობის მიმართულება
40 3.24	5 ცალი	სამშენებლო ტექნიკის მოძრაობის მიმართულება
5.19.1	4 ცალი	უსაფრთხოების ლენტი
5.19.2	4 ცალი	სამშენებლო ღობის გადახურვა
20 მ 8.2.1	2 ცალი	დროებითი დამცავი ბარიერი ქვეითთათვის 2 ცალი
T 7	2 ცალი	მარეგულირებელი 2 კაცი

შპს. „ტოგ" 405248557
დირექტორი: მარიამ ფიფიანი მობ: 591 047 123

TOG

ქ. თბილისი, ი. კერესელიძის ქუჩის მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთში ს/კ 01.15.02.040.013 სამშენებლო ღობის მონტაჟი-დემონტაჟის პერიოდში საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა. საკონტაქტო პირი: მარიამ ბეჟორიშვილი 571 090 053


დამკვეთი: შ.პ.ს. „ურბანპროექტი“

სამშენებლო ღობის მონტაჟი-დემონტაჟის პერიოდში საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა

TOG01150204001 3

შენიშვნა:
დროებითი სქემა შედგენილია ვსნ "37 - 84" და საქართველოს კანონის „საგზაო მოძრაობის შესახებ“ მოთხოვნების შესაბამისად

1. გამაფრთხილებელი ზონის სიგრძე შეადგენს 50 მეტრს.
2. სამუშაო ზონის სიგრძე 15 მეტრი
3. ბუფერული ზონა არ გვაძლს ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები
4. სავალი ნაწილის დახურული ზოლის სიგანე არ გვაძლს ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები
5. სამუშაოთა წარმოების ზონის სიგრძეარ გვაძლს ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები
6. სტაბილიზაციის ზონის სიგრძე არ გვაძლს ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები
7. ნახაზზე ნაჩვენებია მხოლოდ დროებითი საგზაო ნიშნები
8. მარეგულირებლის დანიშნულებაა მშენებლობის პერიოდში სამშენებლო ტექნიკისა და ქვეითთა ნაკადების მოძრაობის ორგანიზება.

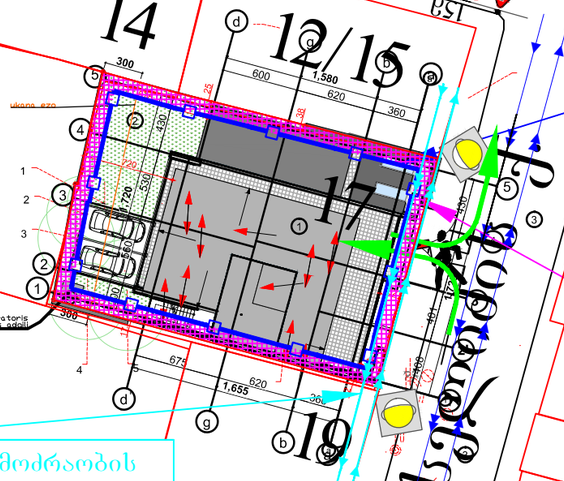

სამშენებლო პოლიგონის ღობე

სამშენებლო პოლიგონის ღობის გადახურგა

ქვეითთა მოძრაობის მიმართულება

საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებები

1.26	7 ცალი	სამშენებლო ღობე ჭრილში
20 3.24	2 ცალი	სამშენებლო ღობე
40 3.24	5 ცალი	სამშენებლო ტექნიკის მოძრაობის მიმართულება
		სამშენებლო ღობის გალახურვა
15 მ 8.2.1	2 ცალი	ქვეითთა მოძრაობის მიმართულება
T 7	2 ცალი	მარეგულირებელი 1 კაცი

შპს. „ტოგ“ 405248557
დირექტორი: მარიამ დიხამინჯია მობ: 591 047 123

TOG

ქ. თბილისი, ი. კერესელიძის ქუჩის მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთში ს/კ 01.15.02.040.013 მშენებლობის პერიოდში საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა.
საკონტაქტო პირი: მარიამ ბოჯორიშვილი 571 090 053

დამკვეთი: შ.პ.ს. „ურბანპროექტი“

საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა

TOG01150204001 3

შენიშვნა:
დროებითი სქემა შედგენილია ვსნ "37 - 84" და საქართველოს კანონის „საგზაო მოძრაობის შესახებ“ მოთხოვნების შესაბამისად

1. გამაფრთხილებელი ზონის სიგრძე შეადგენს 50 მეტრს.
2. სამუშაო ზონის სიგრძე გვაძლს 10 მეტრი
3. ბუფერული ზონა არ გვაძლს ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები
4. სავალი ნაწილის დახურული ზოლის სიბანე არ გვაძლს ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები
5. სამუშაოთა წარმოების ზონის სიგრძეარ გვაძლს ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები
6. სტაბილიზაციის ზონის სიგრძე არ გვაძლს ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები
7. ნახაზზე ნაჩვენებია მხოლოდ დროებითი საგზაო ნიშნები
8. მარეგულირებლის დანიშნულებაა მშენებლობის პერიოდში სამშენებლო ტექნიკისა და ქვეითთა ნაკადების მოძრაობის ორგანიზება.

ს/კ. 01.15.02.040.013

უსაფრთხოების ლენტი

ქვეითთა მოძრაობის მიმართულება

საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებები

1.26	8 ცალი	T 7	2 ცალი
3.10	2 ცალი შენიშვნა: ს.ნ. 3.10 დამონტაჟებულია „საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მუხ2 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით დამტკიცებული დანართი №1-ის მუხ3 პუნქტის 3.10 ქვეპუნქტის შესაბამისად		
3.24	2 ცალი		ქვეითთა მოძრაობის მიმართულება
3.24	6 ცალი		შესაზრახოების ლენტი
5.19.1	4 ცალი		დროებითი დამცავი ბარიერი ქვეითთათვის 2 ცალი
5.19.2	4 ცალი		
8.2.1	2 ცალი		მარეგულირებელი 2 კაცი


შპს. „ტოგ" 405248557 დირექტორი: მარიამ მზისთავი მობ: 591 047 123	TOG
ქ. თბილისი, ი. კერესელიძის ქუჩის მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთში ს/კ 01.15.02.040.013 შესახვევ-გამოსასვლელი გზის მოწყობის პერიოდში საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა საკონტაქტო პირი: მარიამ ბოჯორიშვილი 571 090 053	შესახვევ-გამოსასვლელი გზის მოწყობის პერიოდში საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა
დამკვეთი: შპს. „შრბანკოტელი“	

TOG01150204001 3


შენიშვნა:
საპროექტო ტერიტორიის შესასვლელ-გამოსასვლელები მოწყობილია „საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და საქართველოს მთავრობის მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის №41-ე დადგენილების შესაბამისად

მოსაწყობია ტროტუარი სამშენებლო ობიექტთან მისასვლელ არსებული გზის გასწვრივ სიგანით არანაკლებ 1.5 მ

მოსაწყობი გზა

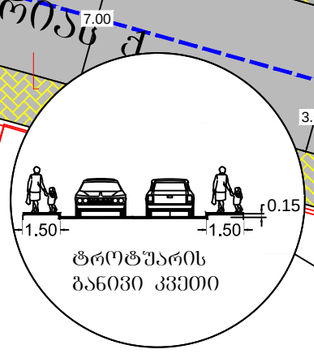

ტროტუარის განივი კვეთი

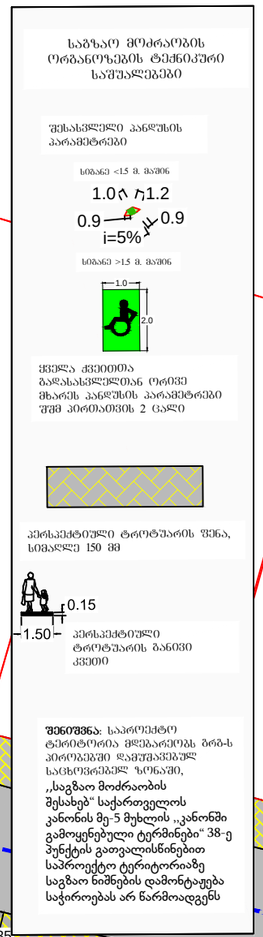

შპს. „ტოგ“ 405248557 დირექტორი: მაღლაკი ზურაბიშვილი მობ: 591 047 123	TOG
ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის ქუჩის მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთი ს/ა 01.15.02.040.013 მშენებარე ობიექტის საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა, საპროექტო/საგზაო ინჟინერიის დეპარტამენტის დაბანი. საპროექტო პირი: მაღლაკი ბოგოლიუბოვი 571 090 053	საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა
დამკვეთი: შ.პ.ს. „ურბანპროექტი“	

TOG01150204001 3
