შპს „ოპტიმუსი“

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

ქ.თბილისი, მეველეს ქ. N7ა (მიწის ნაკვეთი ს/კ 01.17.12.014.054) შენობა 02/3-ის სადემონტაჟო სამუშაოები



ვამტკიცებ:

შპს „ოპტიმუსი“-ს

დირექტორი

გ.ჭანკვეტაძე



თბილისი

2022წ.

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

შემადგენლობა:

ა) განმარტებითი ბარათი;

1. შესავალი;
2. სადემონტაჟო მოედნისა და სადემონტაჟო ობიექტის დახასიათება;
3. სამშენებლო მოედნის ორგანიზება და მოსამზადებელი სამუშაოების აღწერა;
4. დემონტაჟის საინჟინრო მომზადება და მითითებები სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმართვაზე და ფარული სამუშაოების აქტების ჩამონათვალი;
5. სადემონტაჟო სამუშაოთა ხანგრძლივობა;
6. სადემონტაჟო სამუშაოთა რიგითობა და ეტაპები;
7. უსაფრთხოების ტექნიკა;
8. ბუნების დაცვა და ეკოლოგია;
9. რეკომენდირებული მანქანა-მექანიზმების, სპეც.ავტო-ტრანსპორტისა და ხელსაწყოების უწყისი;

ბ) სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა. „მოპ-1“

გ) სამშენებლო მოედანზე სამშენებლო მანქანა-მექანიზმებისა და სპეც.ავტოტრანსპორტის გადადგილების გრაფიკული ნაწილი;

ა) განმარტებითი ბარათი

1.შესავალი

ქ.თბილისი, მეველეს ქ. N7ა (მიწის ნაკვეთი ს/კ 01.17.12.014.054) შენობის 02/3 -ის სადემონტაჟო სამუშაოების ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია შპს „ოპტიმუსი“-ს სპეციალისტის მიერ.

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტის დამუშავებას საფუძვლად დაედო შპს „მილერი 2020“ დავალება პროექტირებაზე, მიწის ნაკვეთზე სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარებასთან დაკავშირებით. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტის შემუშავებისას გამოყენებულ იქნა პროექტით მიღებული არქიტექტურული და კონსტრუქციული გადაწყვეტები, მშენებლობის რაიონის სიტუაციური გეგმა, ნაკვეთის საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა, ნაკვეთის გეოდეზიური მონაცემები.

წინამდებარე ,,სამუშაოთა ორგანიზაციის პროექტი“ დამუშავებულია ქვეყანაში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების და ტექნიკურ-ნორმატიული დოკუმენტების საფუძველზე:

1. სნდაწ 3.01.01-85* - ,,სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია“
2. სნდაწ 1.04.03-85 – ,,მშენებლობის ხანგრძლივობის ნორმები“
3. სნდაწ III-4-80- ,,უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში” -კრებული სამახსოვრო ქართულ ენაზე-მოქმედი სნ და წ ამონაკრები -საქართველოს ურბანიზაციისა და მშენებლობის სამინისტროს გამოცემა. თბილისი 1987 წ.
4. შ.ბაქანიძე, მ.ლორთქიფანიძე, - „ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე“ ქ.თბილისი 2006წ.
5. სნდაწ 3.01.01-85* „სამშენებლო საქმიანობის წარმოება“
6. სნდაწ 3.01.01-85* „ტექნიკური უსაფრთხოება მშენებლობაში“
7. N361 27.05. 2014 წ. „მშენებლობის უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური ზედამხედველობის შესახებ ტექნიიკური რეგლამენტი“

8.N477 27.10. 2017 წ. „სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი;

9.საქართველოს მთავრობის დადგენილება N255 2019 წლის 31 მაისი ქ. თბილისი მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობანაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების წესისა და პირობების შესახებ;

10. სნდაწ 3.03.01-87 –„მზიდი და შემომფარგლავი კონსტრუქციები“

11.სნ და წ 3.03.01-74 - ”ბურულები, ჰიდროიზოლაცია, ორთქლიზოლაცია”

12.სნ და წ 3.03.21-74 - “სამშენებლო კონსტრუქციების მოსაპირკეთებელი სამუშაოები” 13.სნ და წ 3.04.03-85 - “კოროზიისგან სამშენებლო კონსტრუქციებისა და ნაგებობების დაცვა”

ასევე სხვა მეთოდურ-ნორმატიული დამხმარე დოკუმენტაციის საფუძველზე.

სნ და წ 3.01.01-85*-ის „სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია“ მოთხოვნის თანახმად, სადემონტაჟო სამუშაოების დაწყებამდე, აუცილებლად უნდა დამუშავდეს სამუშაოთა წარმოების პროექტი. აკრძალულია დემონტაჟის დაწყება დამტკიცებული სამუშაოთა წარმოების პროექტის გარეშე.

სადემონტაჟო სამუშაოების წარმოებაზე დამკვეთმა აუცილებლად უნდა განახორციელოს ტექნიკური ზედამხედველობა შესაბამის უფლებამოსილებისა და გამოცდილების მქონე სუბიექტის მეშვეობით.

2. სადემონტაჟო მოედნისა და სადემონტაჟო ობიექტის დახასიათება

ქ.თბილისი, მეველეს ქ. N7ა (მიწის ნაკვეთი ს/კ 01.17.12.014.054)
შენობა აშენებულია გასული საუკუნის 20-იან წლებში, ის წარმოადგენს სამსართულიან კონსტრუქციულად მზიდკედლებიან ნაგებობას, რომელთა მზიდ კედლების შემავსებლად გამოყენებულია აგური და წვრილი სამშენებლო ბლოკი. შენობის კედლების გარე და შიდა ზედაპირები, კოროზირებული, ცვეთაგანცდილი და ამორტიზებულია.

სამუშაოები ითვალისწინებს მის სრულ დემონტაჟს და ტერიტორიის მოსუფთავებას.ობიექტზე საინჟინრო კომუნიკაციების, ასევე სხვა რაიმე ქსელის არსებობის შემთხვევაში, სამუშაოების დაწყებამდე აუცილებელია მათი ჩაჭრა საექსპლუატაციო ორგანიზაციების მეთვალყუროების ქვეშ, დადგენილი ნორმატიული და კანონმდებლობითი პირობების გათვალისწინებით, უსაფრთხოების წესების მაქსიმალური დაცვით.

სამუშაოთა მწარმოებელმა განუხრელად უნდა იხელმძღვანელოს დამტკიცებული საპროექტო დოკუმენტაციით, სადემონტაჟო ან სხვა საპროექტო გადაწყვეტილებებში ცვლილებების შეტანა ავტორებთან შეთანხმების გარეშე დაუშვებელია, ცვლილებები უნდა მოხდეს დადგენილი წესით, შესაბამისი ხელმოწერებით ავტორებისა და დამკვეთის მიერ.

3. სამშენებლო მოედნის ორგანიზება და მოსამზადებელი სამუშაოების აღწერა;

სამშენებლო მოედანი მდებარეობს კერძო საკუთრებაში არსებულ შემოღობილ, ტერიტორიაზე, მისი რელიეფი სწორია.

მოედანზე უცხო პირთა და იმ მუშა-პერონალის დაშვება, რომელიც არ არიან ჩართული სამონტაჟო სამუშაოებში აკრძალულია. მოედანზე უნდა მოეწყოს საშენ-მასალებათა დასაწყობებისთვის განკუთვნილი ლოკაცია, რომელიც უნდა შეზღუდოს სასიგნალო ლენტების საშუალებთ, ღობეზე და ტერიტორიაზე გაიკრას გამაფრთხილებელი, საინფორმაციო და ამკრძალავი ბანერები.

4.დემონტაჟის მომზადება და მითითებები სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმართვაზე მიიღებს თუ არა დამკვეთისაგან დამტკიცებულ საპროექტო დოკუმენტაციას, სამშენებლო ორგანიზაცია საჭიროების შემთხვევაში ამუშავებს სამუშაოთა წარმოების პროექტს, რომლის შედგენაც უნდა მოხდეს დემონტაჟის ორგანიზაციის პროექტში მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად. დემონტაჟი უნდა განხორციელდეს საავტორო და ტექნიკური ზედამხვედველობის ქვეშ; შემდეგ დაიწყება მოსამზადებელი სამუშაოების წარმოება, კერძოდ: განთავსდება მუშა- პერსონალისა და სამუშაოთა მწარმოებლი დროებითი ნაგებობა, საინფორმაციო და სადემონტაჟო ტერტორია განთავსებულია ქ.თბილისი,მეველეს ქ. N7ა(მიწისნაკვეთის/კ01.17.12.014.054). მოეწყობა გამაფრთხილებებლი ხასიათის ბანერები, არსებობის შემთხვევაში ჩაიჭრება ყველა საინჟინრო ქსელი შენობასთან მიმართებაში, რადგან ტერიტორია შემოღობილია, ის დამატებით სამშენებლო ღობის მოწყობას აღარ საჭიროებს. სადემონტაჟო შენობებს ცალკე ჩამოეფარება ფარდა სპეციალურად მოწყობილ ხარაჩოზე, რათა არ მოხდეს მტვრის გაბნევა მიმდებარე ზონებშიში. ამასთან გაწმენდითი და სადემონტაჟო სამუშაოების პარალელურად ყველა სამუშაო უნდა დაინამოს მტვრის თავიდან აცილების მიზნით, უნდა განხორციელდეს შენობის დაცლა, დაგვა-გასუფთავება და გადაყრა; დემონტაჟი უნდა დაიწყოს ეტაპობრივ რეჟიმში ხელით. რის შემდეგაც მოხდება მოჭრილი დაჭერილ-ჩაჭრილი ხის და სხვა კონსტრუქციების ავტო-თვითმცლელებზე დატვირთვა და გატანა ობიექტიდან.
გადახურვის სრული მოხსნა-გატანის შემდეგ უნდა დაიწყოს ზემოდან ქვევით ბლოკის კედლების; იატაკების და ა. შ. დემონტაჟი, ბოლოს საძირკლვლების დემონტაჟი საძირკვლის ძირის ნიშნულებამდე და გატანა ობიექტიდან. შენობის სადემონტაჟო სამუშაობი მომიჯნავე შენობებთან უნდა ჩატარდეს ხელით, ყოველგვარი ტექნიკის ჩარევის გარეშე.
მეორე ეტაპზე დაიწყება დანარჩენი შენობების დემონტაჟი; სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელება უნდა მოხდეს ზემოდან ქვემოთ მუშების სათანადო ინსტრუქტაჟით და მათი უზრუნველყოფით სპეციალური ტანსაცმლით და სათვალეებით;

5. სადემონტაჟო სამუშაოთა ხანგრძლივობა

სამუშაოების ხანგრძლივობისა და სამშენებლო სამუშაოების წარმართვის თავლსაზრისით ობიექტები - მოცულობითი და კონსტრუქციული გადაწყვეტითი სირთულის მიხედვით საშუალო მარტივი კატეგორიისაა.

სადემონტაჟო სამუშაოების ხანგრძლივობის ვადებისა და მისი განხორციელების ცალკეული პერიოდების დასადგენად ხელმძღვანელობენ სნ. და წ. 1.04.03-85 – „მშენებლობის ხანგრძლივობის ნორმები“; ასევე დამხმარე „სარეკონსტრუქციო და სამონტაჟო სამუშაოთა ხანგრძლივობის განსაზღვრა“ კალენდარული გეგემით გათვალისწინებული ფინანსური უზრუნველყოფისა და შესაძლებლობების საფუძველზე.

სამუშაოების განხორციელების გეგმიური ხანგრძლივობა აღნიშნული ნორმების გათვალისწინებით, ასევე რეალური სიტუაციის შესწავლის საფუძველზე დადგინდა სამუშაოთა წარმოების ხანგრძლივობა **T=6** თვის პერიოდით. მისი დაცვა შესაძლებელია უწყვეტი ფინანსირების პირობებში, რასაც ხელი უნდა შეუწყოს რბილმა და ზომიერმა კლიმატურმა პირობებმა.

კალენდარულ გეგმაზე ობიექტის დემონტაჟის შემოთავაზებული თანმიმდევრობა რეკომენდირებული ხასიათისაა, მისი კორექტირება შესაძლებელია სამუშაოთა წარმართვის პროცესში დამკვეთის ინტერესების გათვალისწინებით სამშენებლო პროცესში აღმოჩენილი სხვადასხვა გარემოებებით.

6.სადემონტაჟო სამუშაოების რიგითობა და ეტაპები

სამშენებლო სამუშაოების პროცესის წარმოების რიგითობის მიხედვით სადემონტაჟო ობიექტზე განისაზღვრა შემდეგი სამშენებლო ეტაპები:
ვინაიდან გრუნტის ზედაპირის ცვლილებას სამუშაოები არ ითვალისწინებს, I რიგის მოსამზადებელისამუშაოები წარმოდგენილია ორ ეტაპით:
ეტაპი N 1 - სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება/შეზღუდვებისა და საინფორმაციო ბანერების მოწყობა ; (ვადა 1/3 თვე 1 კვირა)
ეტაპი N 2 - არსებული საინჟინრო-კომუნიკაციების ჩაჭრა (ვადა 2/3 3 კვირა)
პირველი რიგის ორივე ეტაპზე - 1 თვე - 4 კვირა
II რიგის სამუშაოებისთვის გამოიყო სამი ეტაპი, რომლებშიც გაერთიანდა ყველა ძირითადი სამუშაოები:
ეტაპი N 3 - შენობა N02/3-ის არამზიდი კონსტრუქციების დემონტაჟი, (2 თვე - 8 კვირა)
ეტაპი N 4 -შენობა N02/3-ის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის დემონტაჟი, (2 თვე - 8 კვირა);

ეტაპი N 5 - სამშენებლო ნარჩენების გატანა, ტერიტორიის სრული დასუფთავება;

(1 თვე - 4 კვირა)

სულ დადგინდა ხუთი ერთეული ეტაპი -ხანგრძლივობით -6 თვე - 24 კვირა; სამუშაოები

უნდა წარიმართოს კალენდარული გეგმის მიხედვით**.** იხ**.** მოპ**-1**;

7.უსაფრთხოების ტექნიკა <u>ობიექტზე გამოყოფილი უნდა</u>

<u>იყოს უსაფრთხოების ინჟინერი;</u>

1.უცხო პირთა, აგრეთვე სადემონტაჟო ოპერაციებში დაუსაქმებელი მუშა-მომსახურეთა ყოფნა სამშენებლო მოედანზე დაუშვებელია.

2.მუშა-მომსახურე პერსონალს უნდა ჩაუტარდეს ინსტრუქტაჟი მშენებლობაზე უსაფრთხოების ტექნიკის, სიმაღლეზე მუშაობის ტექნიკური რეგლამენტის მიხედვით

სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყოფის საკითხებზე, პერიოდულად უნდა ჩატარდეს გამოცდაც.

3.სამუშაოთა წარმოების უზრუნველყოფისათვის და ტექნოლოგიების უზრუნველსაყოფად ასევე აუცილებელია მშენებლობის აღჭურვა განმარტებით ბარათში მოცემული ცხრილის მიხედვით, მანქანა - მექანიზმებით, ინსტრუმენტებით და დანადგარებით

4.მომუშავეთა შორის უსაფრთხოების ღონისძიებები უნდა იყოს დაცული სამშენებლო _ სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების ყველა ეტაპზე, თანახმად სნ და წ III _ 4 _ 80 (უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში) და სხვა ნორმატიულ - საკანონმდებლო დოკუმენტების მითითებების შესაბამისობით. მათგან ყურადღება მახვილდება შემდეგზე:

5.სამუშაო ადგილები მუშაობის პირობებისა და ტექნოლოგიურობის გათვალისწინებით უზრუნველყოფილი უნდა იყოს კოლექტიური დაცვისა და სიგნალიზაციის საშუალებით.

6.ადვილად აალებადი სამღებრო, საიზოლაციო და სხვა მასალების აგრეთვე მომწამლავი ნივთიერებების (ასეთების არსებობის შემთხვევაში) დღიური რაოდენობა სამუშაოთა წარმოების ზონაში არ უნდა აღემატებოდეს იმავე დღიური რაოდენობის მოთხოვნილებების შესაბამისობას.

7.მასალებისა და ნაკეთობების დასაწყობება უნდა მოხდეს მათზე ტექნოლოგიურ პირობათა გათვალისწინებით; ამავე დროს ისინი უნდა დაეწყოს მოსწორებულ ადგილზე, რომ მათი მოცურება არ მოხდეს.

8.ელექტრო უსაფრთხოების წესები ჩამოყალიბებულია სახსტანდარტში 12.1.0.13-88. ელექტრო კარადა უნდა იყოს ჩაკეტილ მდგომარეობაში. ელექტრო კაბელები, ელექტრო სადენები და მოწყობილობები კი იზოლირებული. გაშიშვლებული სადენების გამოყენება აკრძალულია.

9.იკრძალება ვიბრატორის და სხვა ელექტრო მოწყობილობების ადგილიდან-ადგილზე გადატანა, მისი ელექტრო ქსელიდან გამორთვის გარეშე. სამუშაოთა შესრულების შემდეგ ხელსაწყოები სუფთავდება და მშრალად იწმინდება.

10.სამშენებლო მოწყობილობათა ჩართვა (საწეველები, მოსახვეწი დანადგარები, ელექტრო შესადუღებელი აპარატები და სხვა) საბინაო ელექტროქსელში აკრძალულია.

11.ელ.მომმარაგებელი კომპანიის ტექნიკური ზედამხედველობის სამსახურთან შეთანხმებით, ნებადართული სატრანსფორმატორო ქვესადგურებიდან უნდა მოხდეს სამწვერიანი ელექტროკაბელის შემოყვანა დახურულ კარადაში, მრიცხველის დაყენებით, საიდანაც ძალოვანი და გასანათებელი სადენები გაიმართება;

12.დაუშვებელია არაქარხნული ხელსაწყოების გამოყენება. ყველა დისკოიანი ელ.ხელსწყო აღჭურვილი უნდა იყოს გარსაცმით;

13. ავარიული სიტუაციისშემთხვევაში უნდა მოხდეს სამუშაოების შეჩერება და ყველა სადემონტაჟო კონსტრუქციის დროებითი გამაგრება. სადემონტაჟო ობიექტი უნდა იყოს განათებული ღამის საათებში.

14.ყველა სადემონტაჟო სამუშაო უნდა შესრულდეს სნდაწ - III-4-80* - „უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში“-ის მოთხოვნების მკაცრი დაცვით, ასევე ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებების მოთხოვნების მკაცრი დაცვით.

15საჭიროების შემთხვევაში ობიექტზე სამშენებლო პროცესის წარმართვისას გათვალისწინებულ უნდა იქნას N477 27.10. 2017 წ. „სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნები. მშენებარე კარკასი შეიფუთოს არნიშნული რეგლამენტის მიხედვით მოაჯირებით, დამცავი ბადეებით და ა.შ. მუსა -პერსონალს პერიოდულად ჩაუტარდეს ინსტრუქტაჟი.

16.სადემონტაჟო ტრანსპორტის გადაადგილებისას მოედანზე აკრძალულია საქმეში ჩაურთველ პირთა ყოფნა სახიფათო ზონებში.

17.ყველა მუშა და ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი სამუშაოთა წარმოებისას აღჭურვილი უნდა იყოს ინდივიდუალური უსაფრთხოების კომპლექტით (უსაფრთხოების ქამრები,რეზინის ფეხსაცმელი; რეზინის ხელთათმანები,ჩაფხუტები და სხვა). აკრძალულია ობიექტზე მუშათა დაშვება დამცავი ჩაფხუტის, უსაფრთხოების ქამრების, რესპირატორებისა და დამცავი სათვალეების გარეშე.

18.აკრძალულია მანქანა-მექანიზმების მუშაობა უშუალოდ მოქმედი ელ.გადამცემი ხაზების ქვეშ. მოქმედი ელ.გადამცემი ხაზების სიახლოვეს მანქანა-მექანიზმების მუშაობა დასაშვებია მხოლოდ დამშვები განწესის საფუძველზე.

19.სადემონტაჟო სამუშაოებზე დასაქმებულებს აუცილებლად უნდა ჩაუტარდეს სისტემური სწავლება უსაფრთხოების ტექნიკის საკითხებში. მხოლოდ ამ სწავლებების შემდეგ არის ნებადართული მათი დაშვება სადემონტაჟო სამუშაოებზე. ყოველი მომუშავე სამუშაოს წარმოებისას უნდა იმყოფებოდეს უშუალოდ თავის სამუშაო ადგილზე,მოერიდოს სახიფათო ზონებში ყოფნას და სიარულს,დაემორჩილოს ამკრძალავ, გამაფრთხილებელ და მიმთითებელ ნიშნებს.

20.სამუშაოები უნდა სწარმოებდეს უშუალოდ სამუშაოთა მწარმოებლის და ობიექტზე დანიშნული უსაფრთხოების ინჟინრის მეთვალყურეობით. ნაგვის გატანა უნდა განხორციელდეს სპეციალური ავტოამწეების გამოყენებით და ავტოთვითმცლელებით; ზედმეტი ნაგვის დატვირთვა უნდა იწარმოოს გვერდითა ან უკანა მხრიდან.

8. ბუნების დაცვა და ეკოლოგია

სადემონტაჟო სამუშაოების დაწყება მოხდება ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის სამსახურის მიერ გაცემული ნებართვის შემდეგ.

1.სადემონტაჟო სამუშაოები აუცილებელია განხორციელდეს ბუნების დაცვით და ჰაერის გაბინძურების საწინააღმდეგო ღონისძიებების დაცვით.

2.გარემოს დაცვის სამსახურის ნებართვის გარეშე მშენებლობის სიახლოვეს იკრძალება ხეებისა და ნარგავების მოჭრა ან განადგურება.

3) დაუშვებელია არსებულ საკანცელიზაციო ჭებში ბეტონ-შემრევისა და ბეტონ-ტუმბოს მილსადენების ჩარეცხვა ან მათი დანაგვიანება სამშენებლო ნარჩენებით;

4) სადემონტაჟო სამუშაოების დამთავრების პერიოდში შენობიდან სამშენებლო ნაგვის ღიად გადმოყრა დაუშვებელია, სამონტაჟო სამუშაოთა წარმოებისას მიღებული უნდა იქნას ზომები და შემუშავდეს ღონისძიებები გარემოსა და გარშემომყოფთა დასაცავად მტვრისგან და ხმაურისგან.

9.რეკომენდირებული მანქანა-მექანიზმების, სპეც.ავტო-ტრანსპორტისა და ხელსაწყოების

უწყისი სამშენებლო პროცესის უწყვეტი რითმისა და ტექნოლოგიურობის უზრუნველსაყოფად აუცილებელია მისი აღჭურვა თანამედროვე ტექნიკური საშუალებებით, მათი რეკომენდირებული ჩამონათვალი მოცემულია ქვემოთ ცხრილში:

შპს ''ოპტიმუსი''-ს

დირექტორი,

გ.ჭანკვეტაძე

საკადასტრო გეგმა

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

საკადასტრო კოდი: **01.17.12.014.054**
განცხადების ნომერი: **882020788116**
მომზადების თარიღი: **21/10/2020**

ნაკვეთის დანიშნულება: **არასასოფლო სამეურნეო**
ფართობი: **6630 კვ.მ (WGS 84 / UTM zone 38N)**

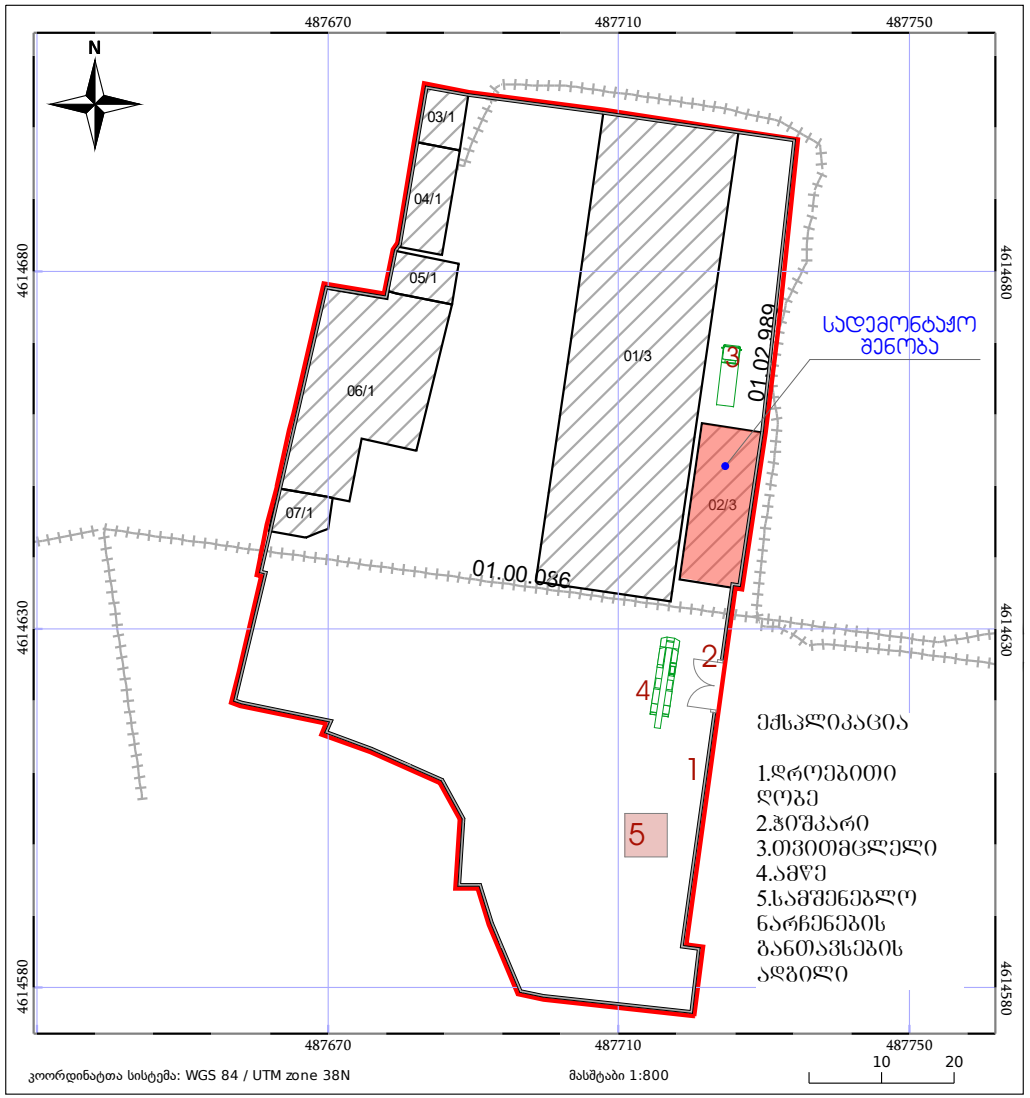

მშენებარე ნაგებობა
ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი
შენობა/ნაგებობა
ხაზობრივი ნაგებობა
ტყის ფონდი
ვალდებულება


12/01/2022


12/01/2022


12/01/2022


30
12/01/2022


12/01/2022


30
12/01/2022

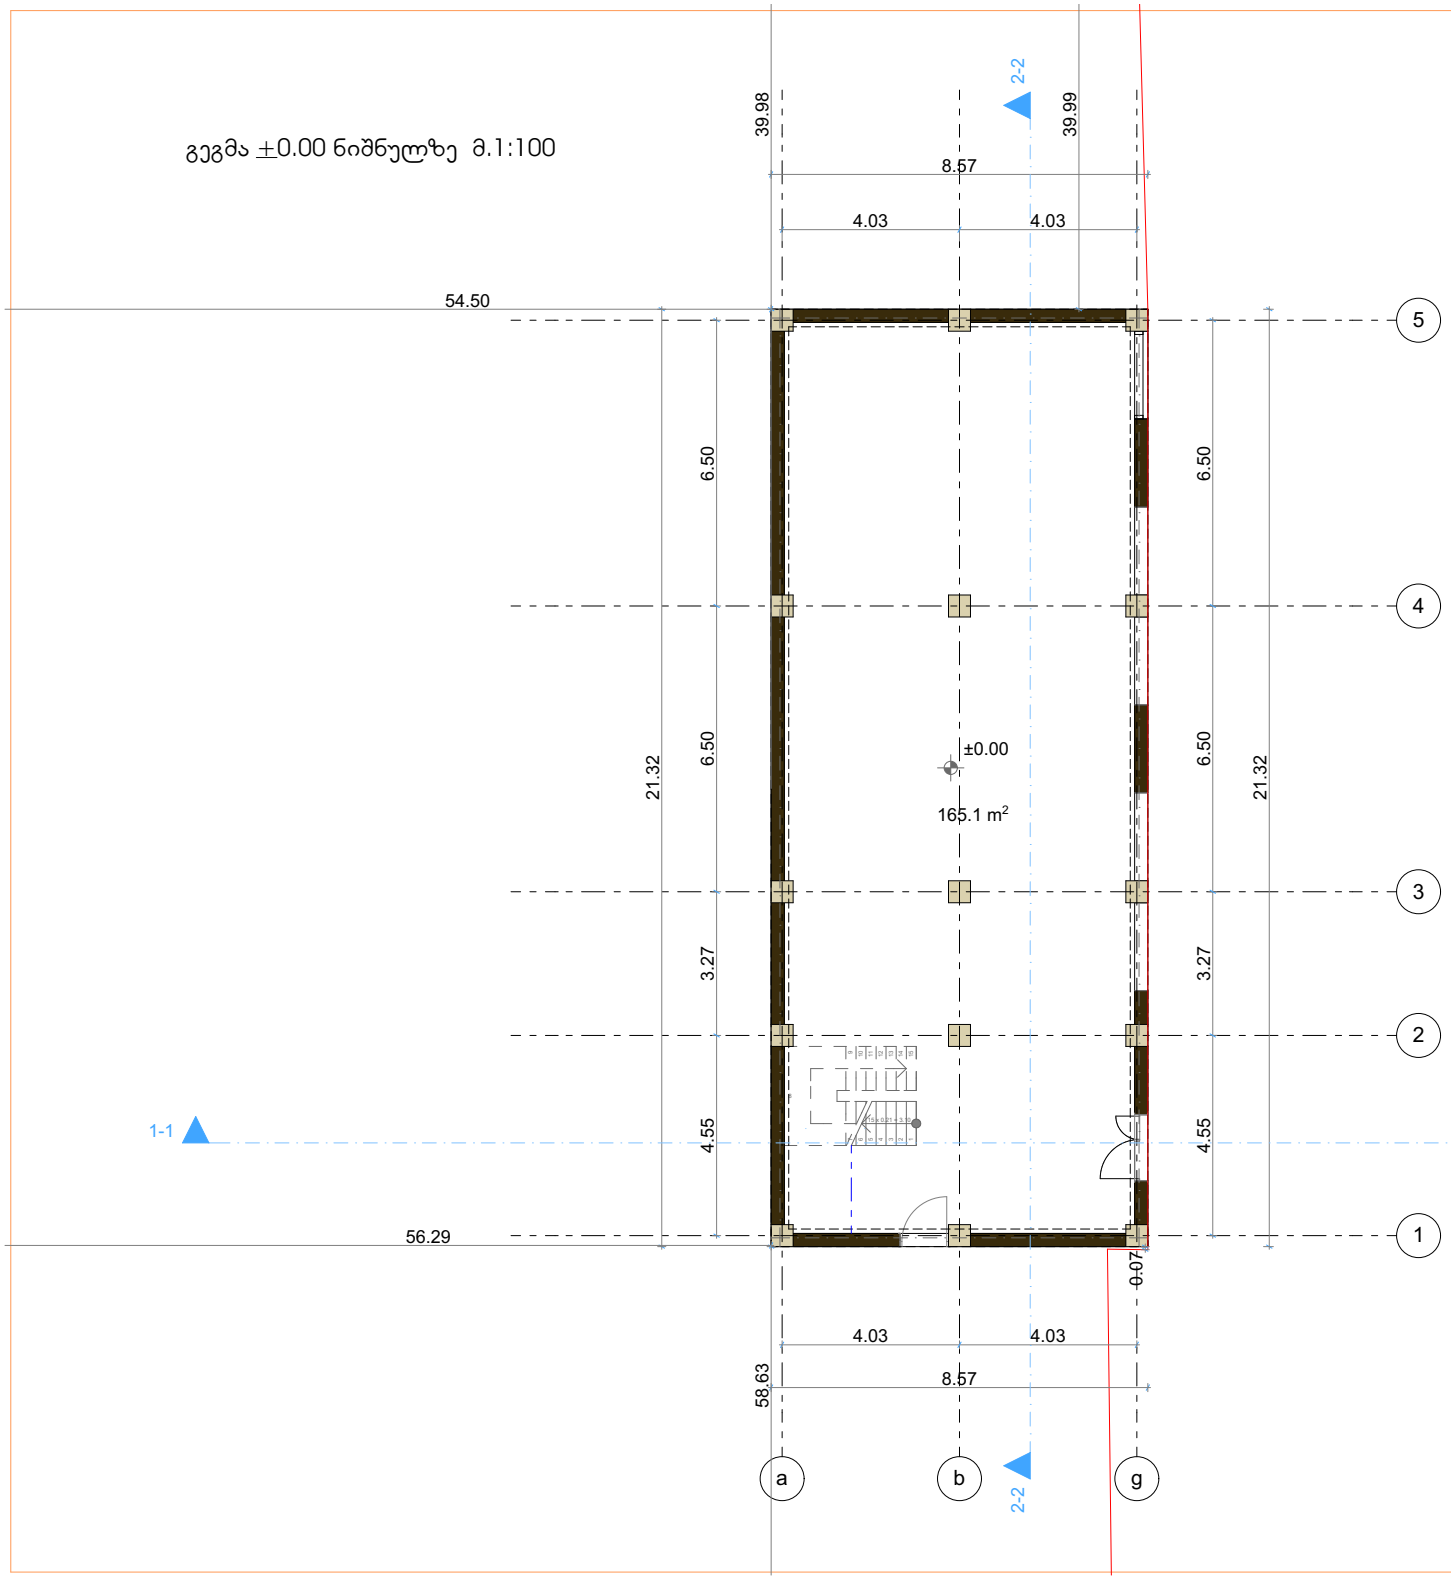

ფორმატი	A-3

დამკვეთი:
შპს "მილერი 2020"

პირობითი აღნიშვნა:

პროექტის დასახელება:
შენობა 2/3-ის დემონტაჟი

მისამართი:
ქ.თბილისი, ძუძა მეველე №7ა
ს/კ 01.17.12.014.054

პროექტის ნაწილი:
არქიტექტურული

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	გ. ჭანკვეტაძე	
მთ. არქიტექტორი	მ.ბარბაქაძე	
პრ. ავტორი	მ.ბარბაქაძე	
შემსრულებელი ორგანიზაცია	optimus მპობილი	

ფურცლის დასახელება:
გეგმა +0.00 ნიშნულზე

თარიღი 2022 წ.	მაშ: 1:100
ფურცლების რაოდენობა	
ფურცლის ნომერი №	

გეგმა +3.10 ნიშნულზე მ.1:100

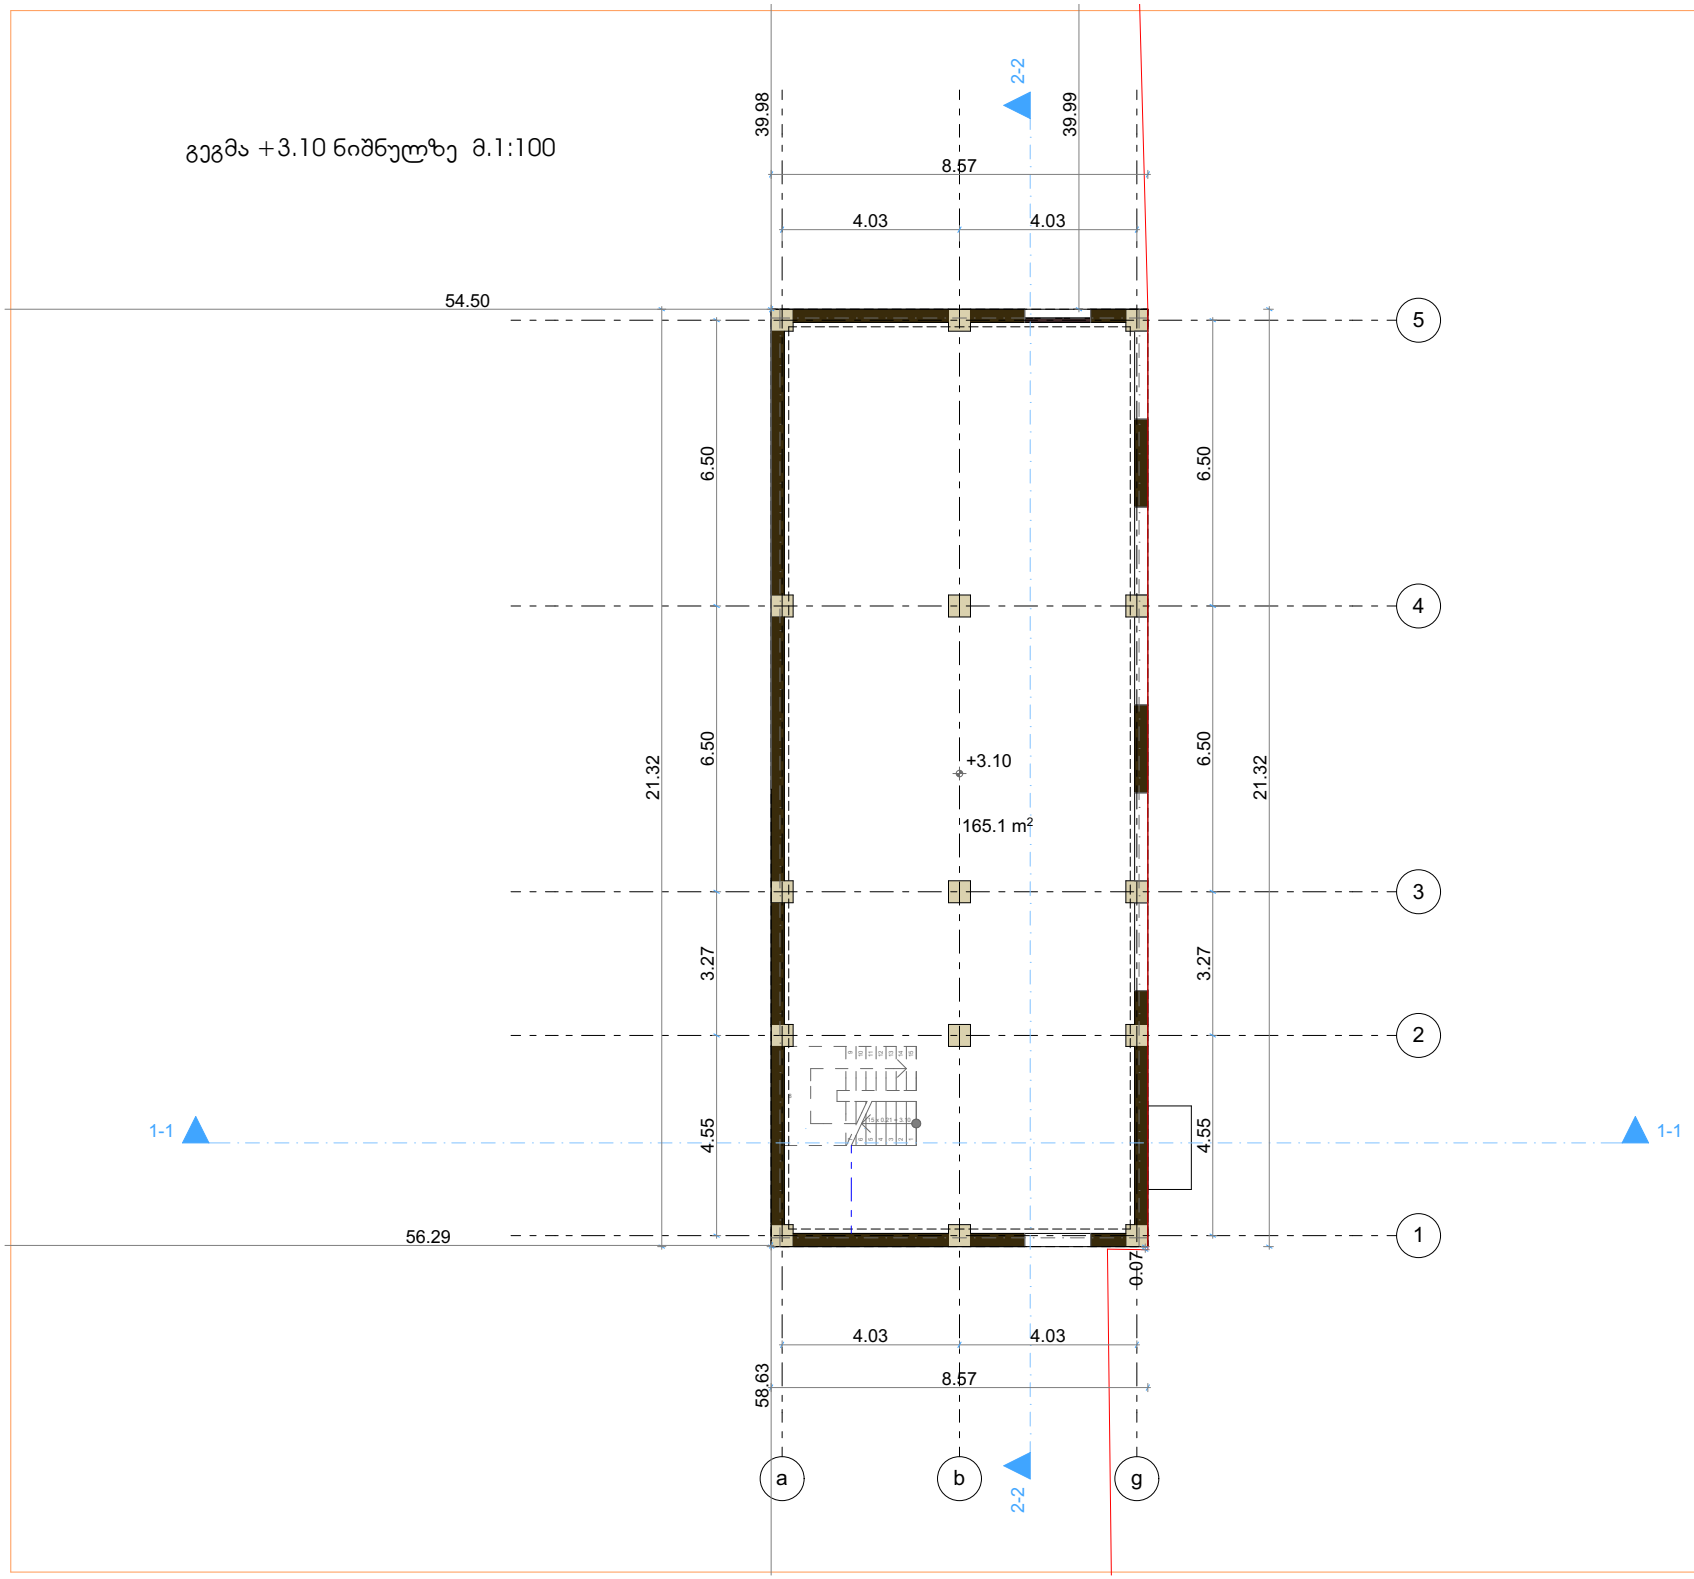

ფორმატი	A-3

დამკვეთი:
შპს "მილერი 2020"

პირობითი აღნიშვნა:

პროექტის დასახელება:
შენობა 2/3-ის დემონტაჟი

მისამართი:
ქ.თბილისი, ქუჩა მევენახე №7ა
ს/კ 01.17.12.014.054

პროექტის ნაწილი:
არქიტექტურული

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	გ. ჭანკვეტაძე	
მთ. არქიტექტორი	მ.ბარბაქაძე	
პრ. ავტორი	მ.ბარბაქაძე	

შემსრულებელი ორგანიზაცია: optimus მპობილი

ფურცლის დასახელება:
გეგმა +3.10 ნიშნულზე

თარიღი 2022 წ.	მაშ: 1:100
ფურცლების რაოდენობა	
ფურცლის ნომერი №	

გეგმა +6.20 ნიშნულზე მ.1:100

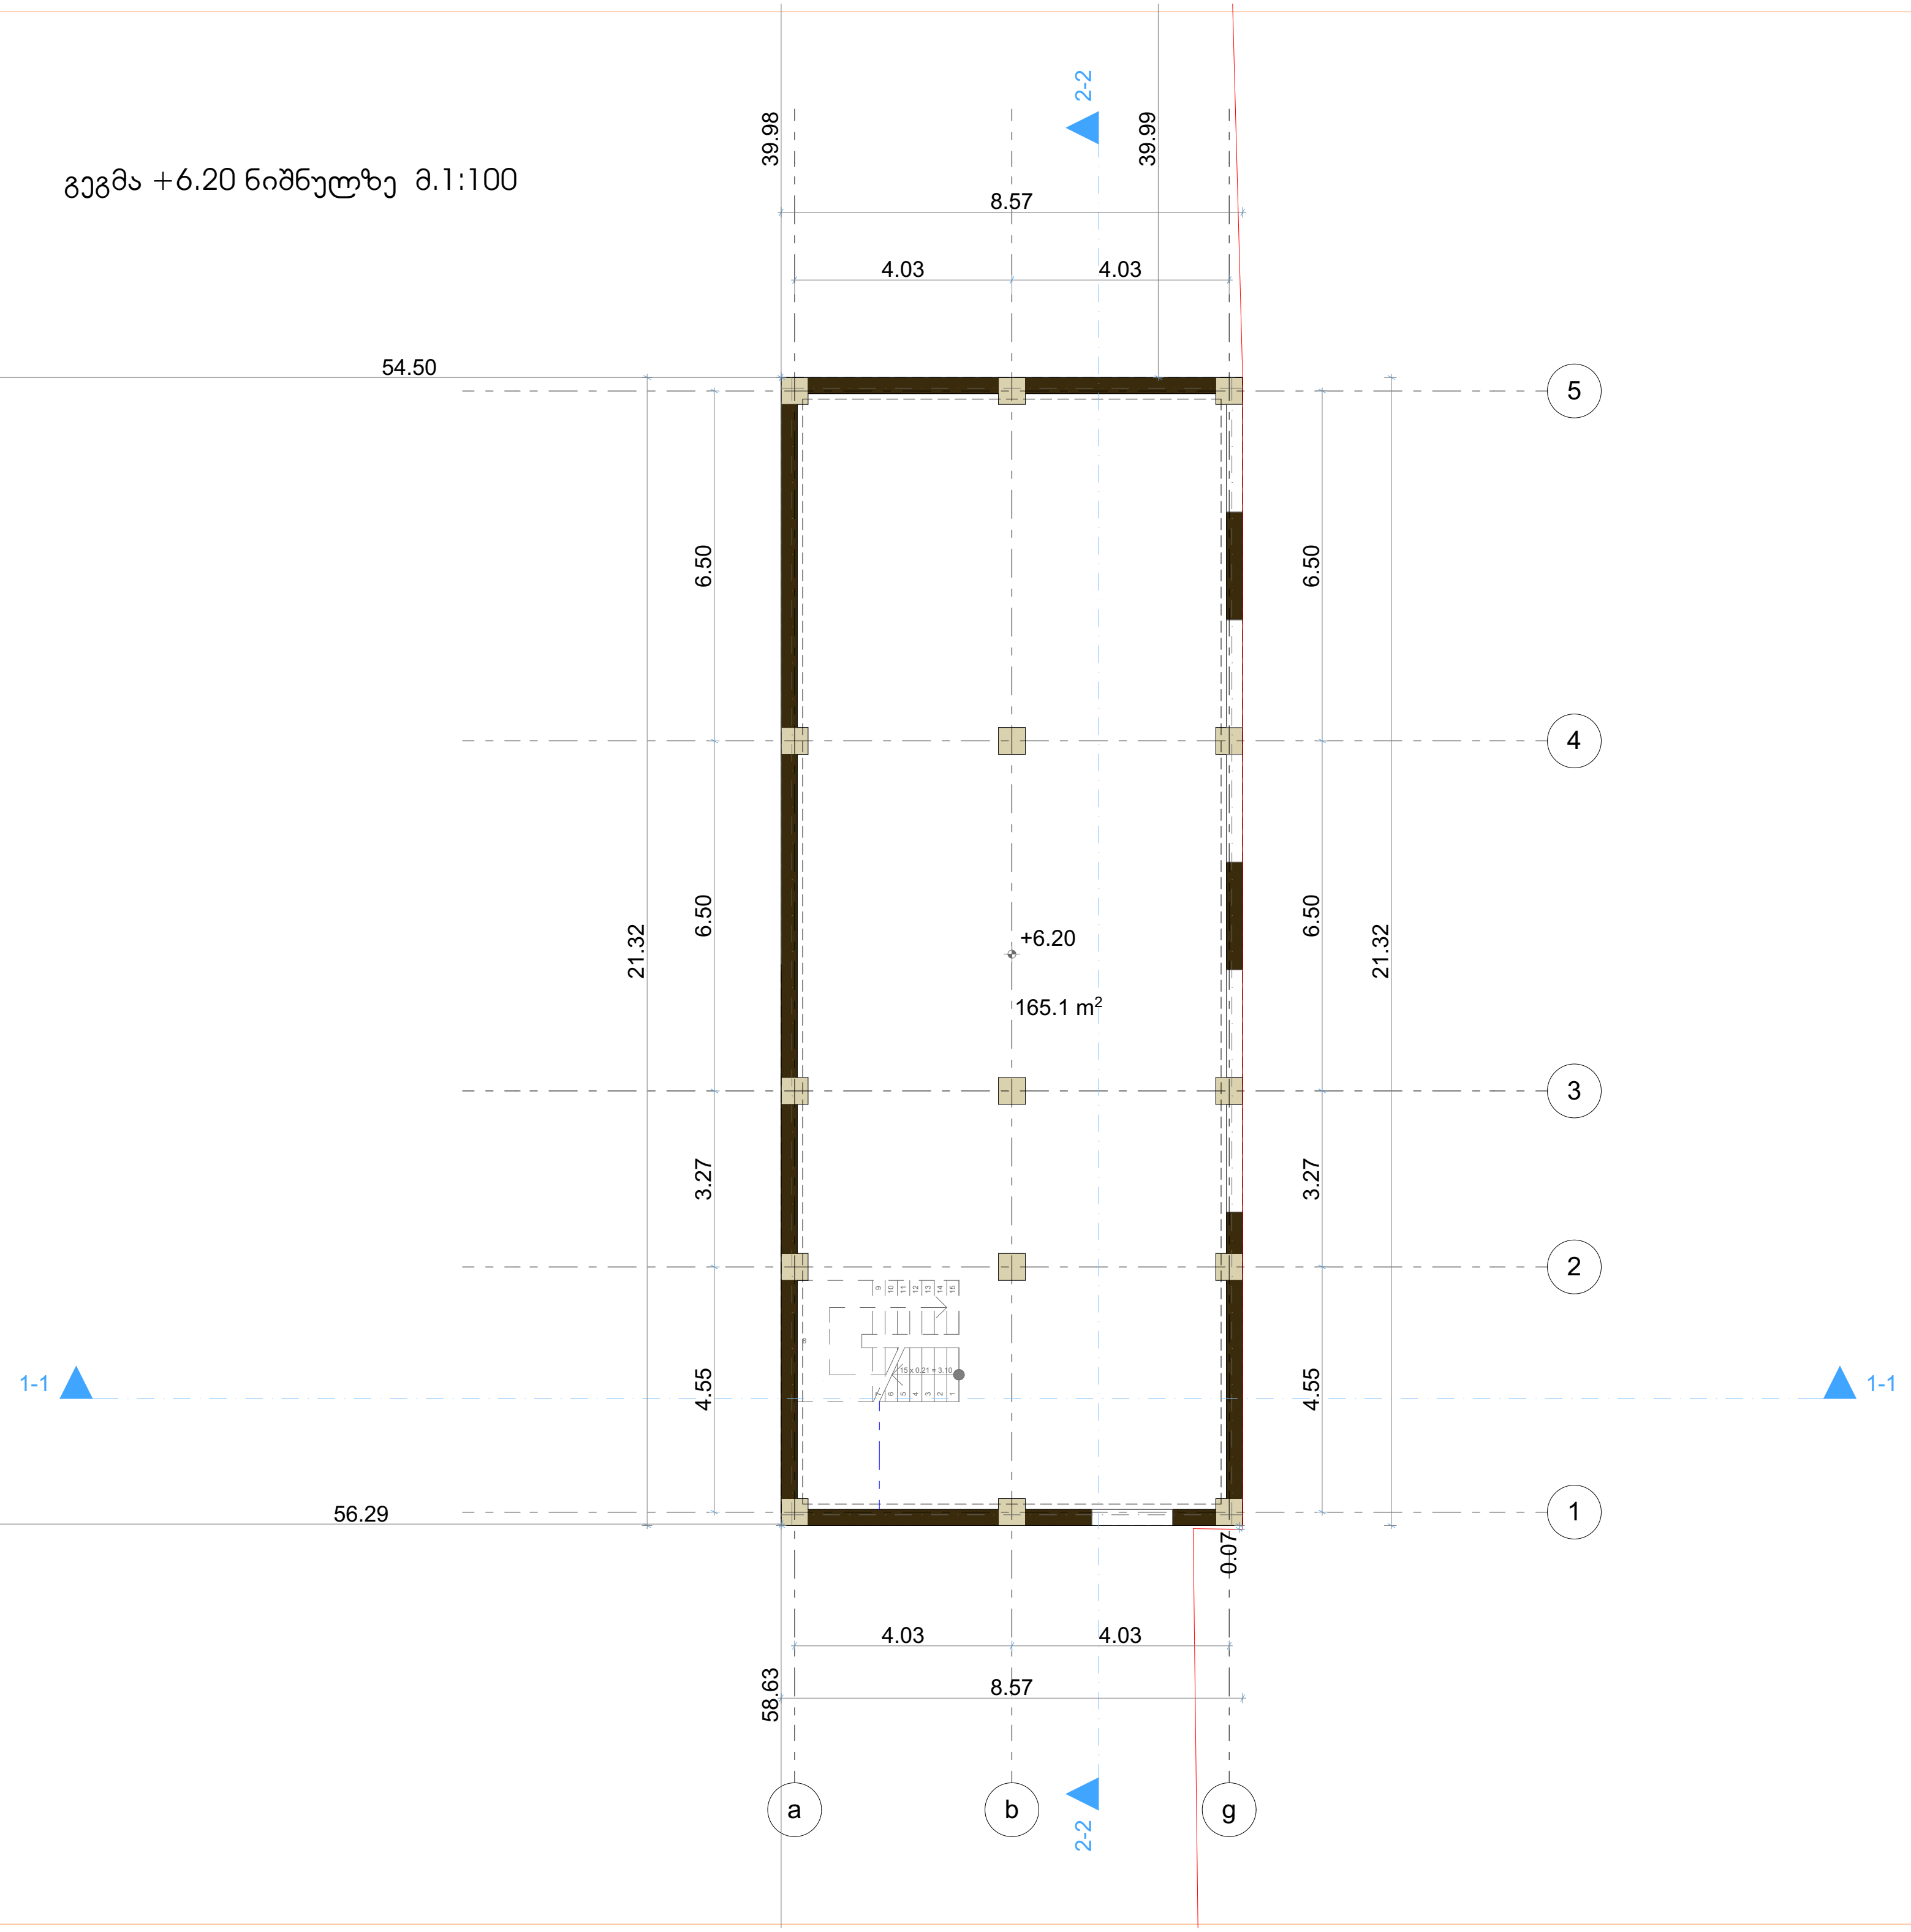

ფორმატი	A-3

დამკვეთი:
შპს "მილერი 2020"

პირობითი აღნიშვნა:

პროექტის დასახელება:
შენობა 2/3-ის დემონტაჟი

მისამართი:
ქ.თბილისი, ქუჩა მეველე №7ა
ს/კ 01.17.12.014.054

პროექტის ნაწილი:
არქიტექტურული

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	გ. ჯანკვეტაძე	
მთ. არქიტექტორი	მ.ბარბაქაძე	
პრ. ავტორი	მ.ბარბაქაძე	

შემსრულებელი ორგანიზაცია

ფურცლის დასახელება:
გეგმა +6.20 ნიშნულზე

თარიღი 2022 წ.	მაშ: 1:100
ფურცლების რაოდენობა	
ფურცლის ნომერი №	

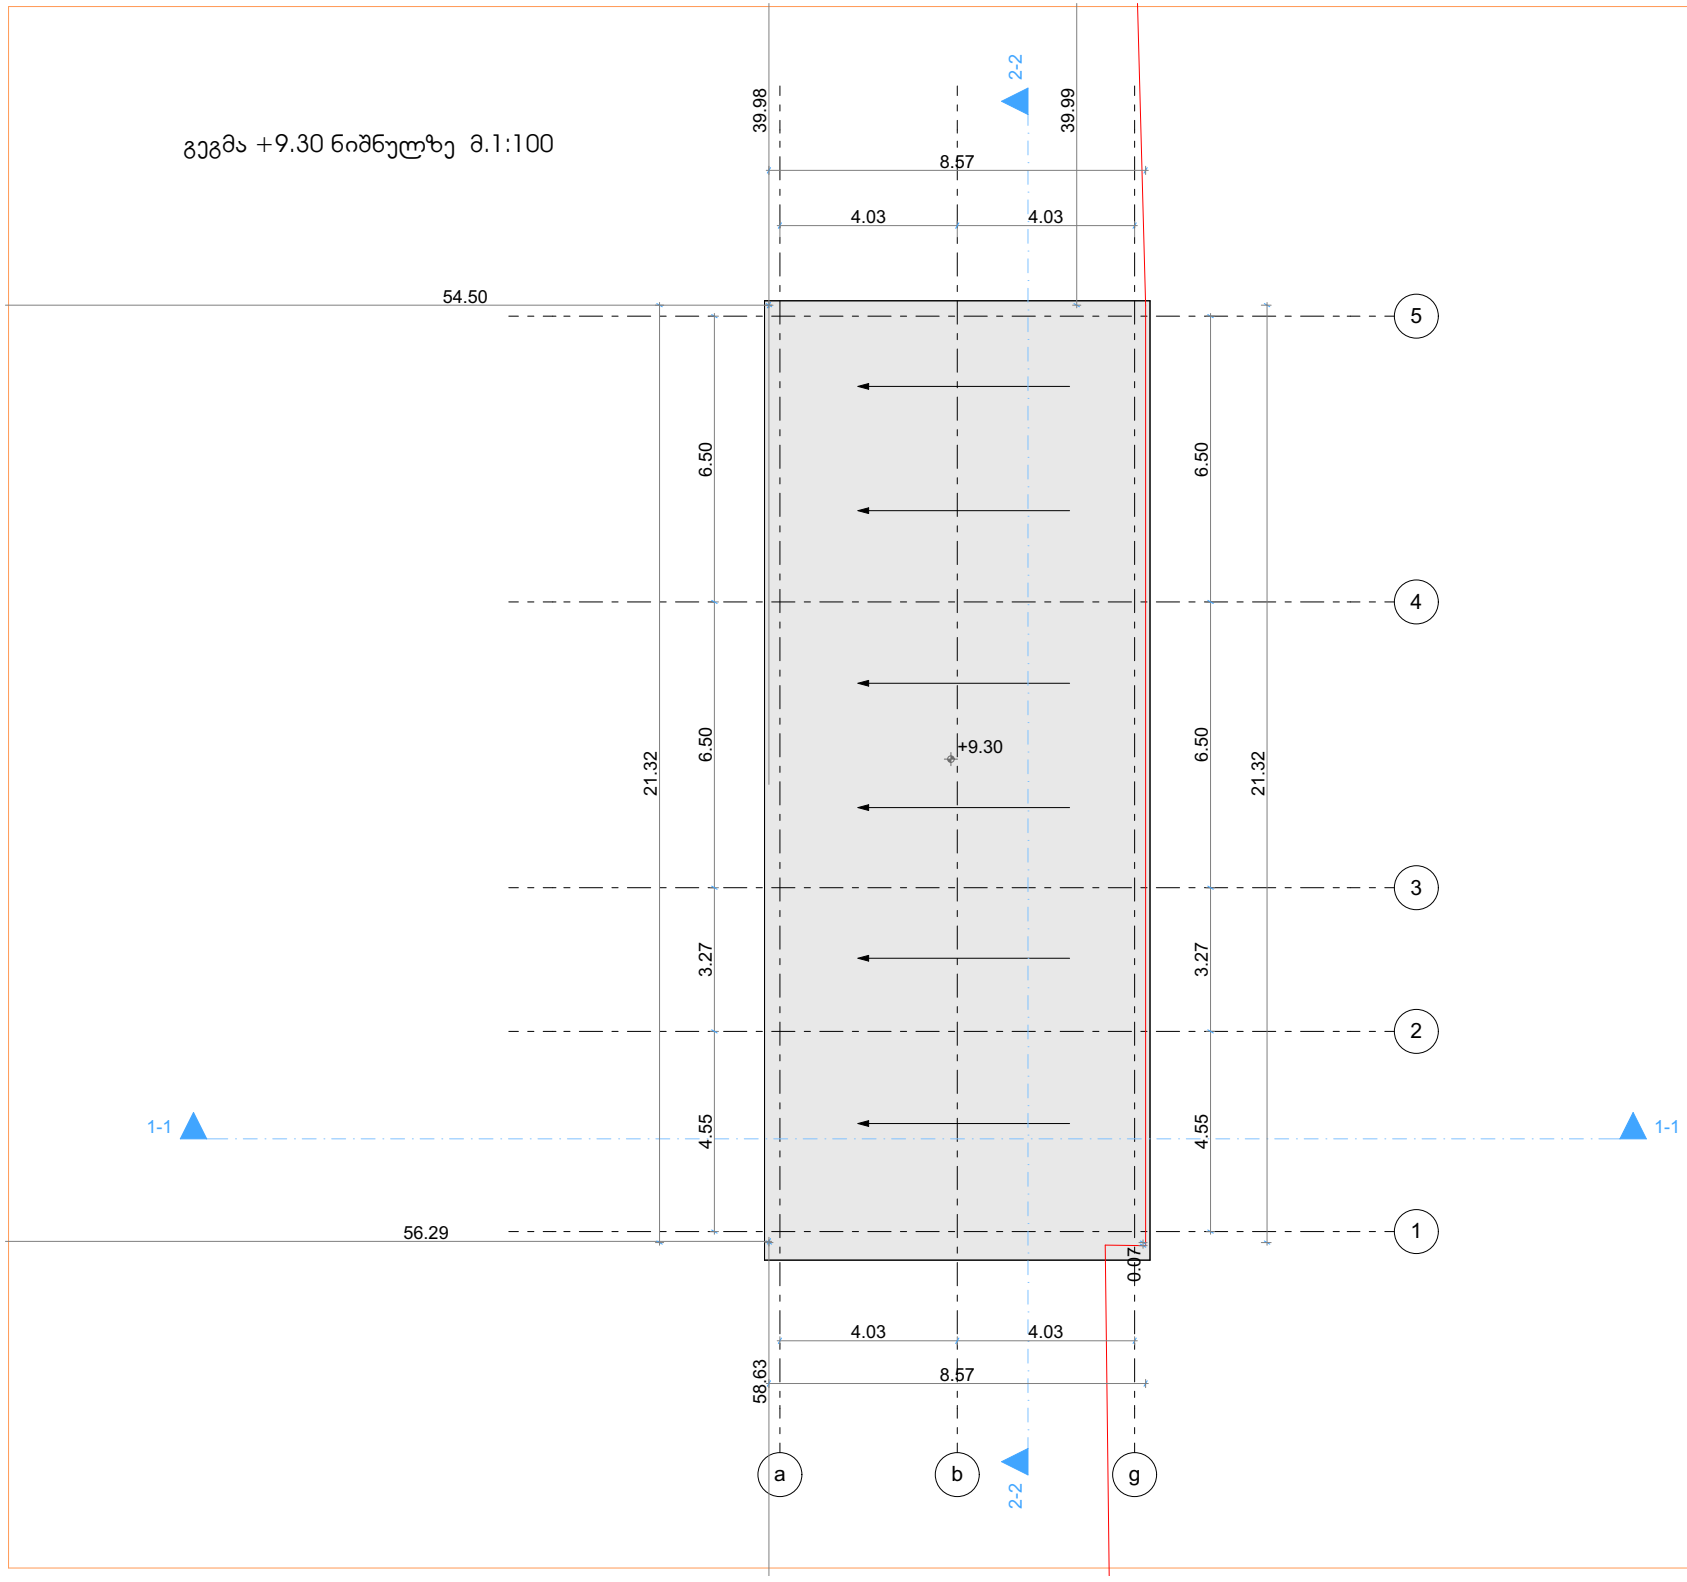

ფორმატი	A-3

დამკვეთი:

შპს "მილერი 2020"

პირობითი აღნიშვნა:

პროექტის დასახელება:

შენობა 2/3-ის დემონტაჟი

მისამართი:
ქ.თბილისი, ქუჩა მეველე №7ა
ს/კ 01.17.12.014.054

პროექტის ნაწილი:
არქიტექტურული

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	გ. ჭანკვეტაძე	
მთ. არქიტექტორი	მ.ბარბაქაძე	
პრ. ავტორი	მ.ბარბაქაძე	

შემსრულებელი ორგანიზაცია: optimus მეთოდი

ფურცლის დასახელება:

გეგმა +9.30 ნიშნულზე

თარიღი 2022 წ.	მაშ: 1:100
ფურცლების რაოდენობა	
ფურცლის ნომერი №	

ჭრილი 1-1 მ.1:100

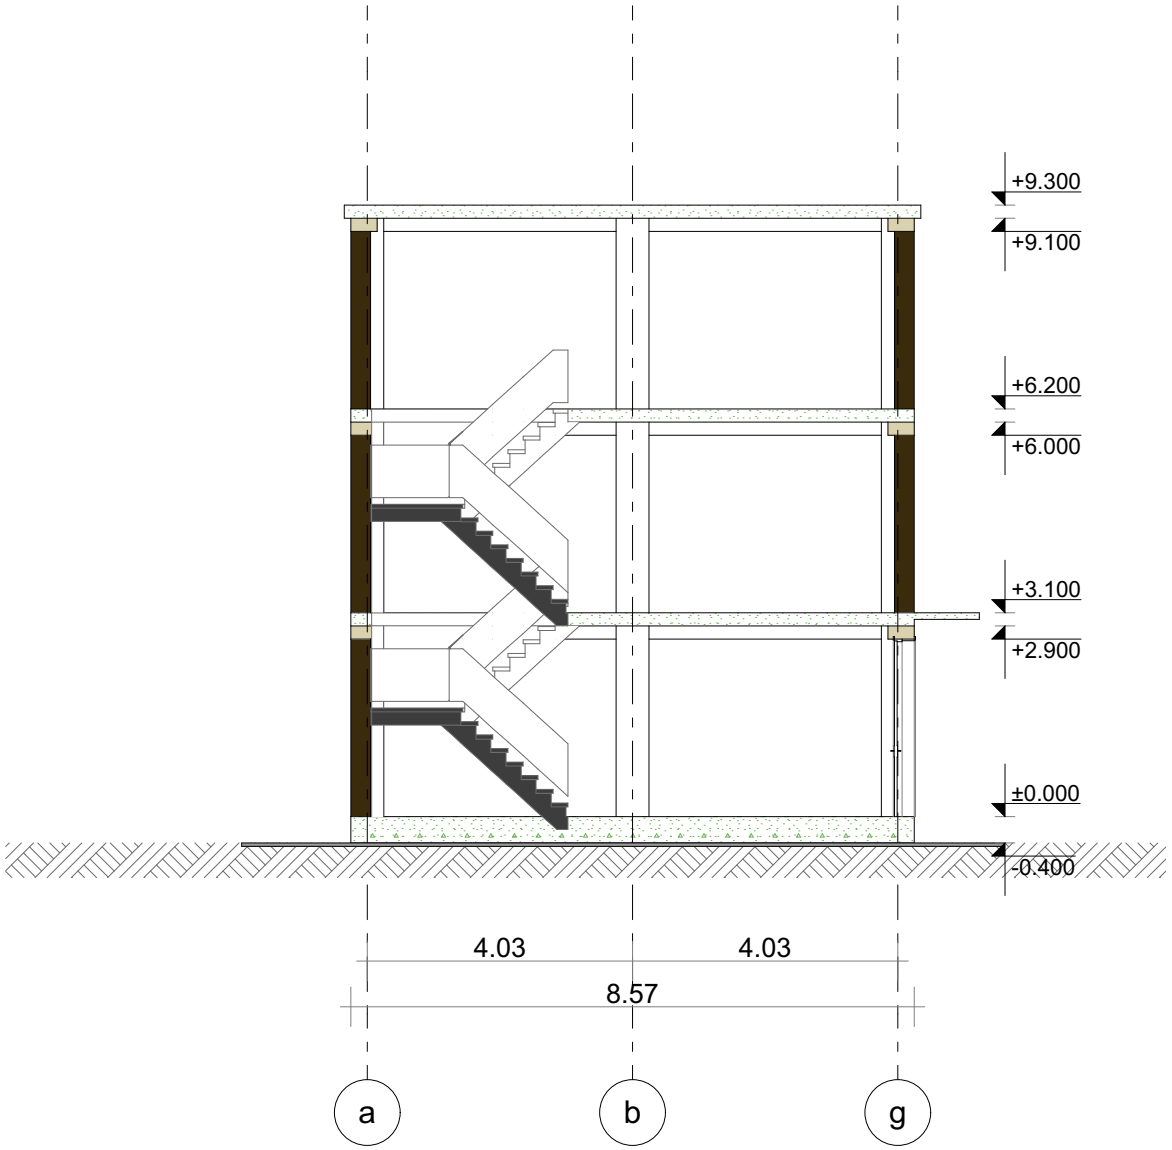

ფორმატი	A-3

დამკვეთი:
შპს "მილერი 2020"

პიროვნითი აღნიშვნა:

პროექტის დასახელება:
შენობა 2/3-ის დემონტაჟი

მისამართი:
ქ.თბილისი, ჭუჩა მეველე №7ა
ს/კ 01.17.12.014.054

პროექტის ნაწილი:
არქიტექტურული

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბ. ჭანკვეტაძე	
მთ. არქიტექტორი	მ.ბარბაქაძე	
პრ. ავტორი	მ.ბარბაქაძე	

შემსრულებელი ორგანიზაცია: optimus მშენებელი

ფურცლის დასახელება:
ჭრილი 1-1

თარიღი 2022 წ.	მაშ: 1:100
ფურცლების რაოდენობა	
ფურცლის ნომერი №	

ჭრილი 2-2 მ.1:100

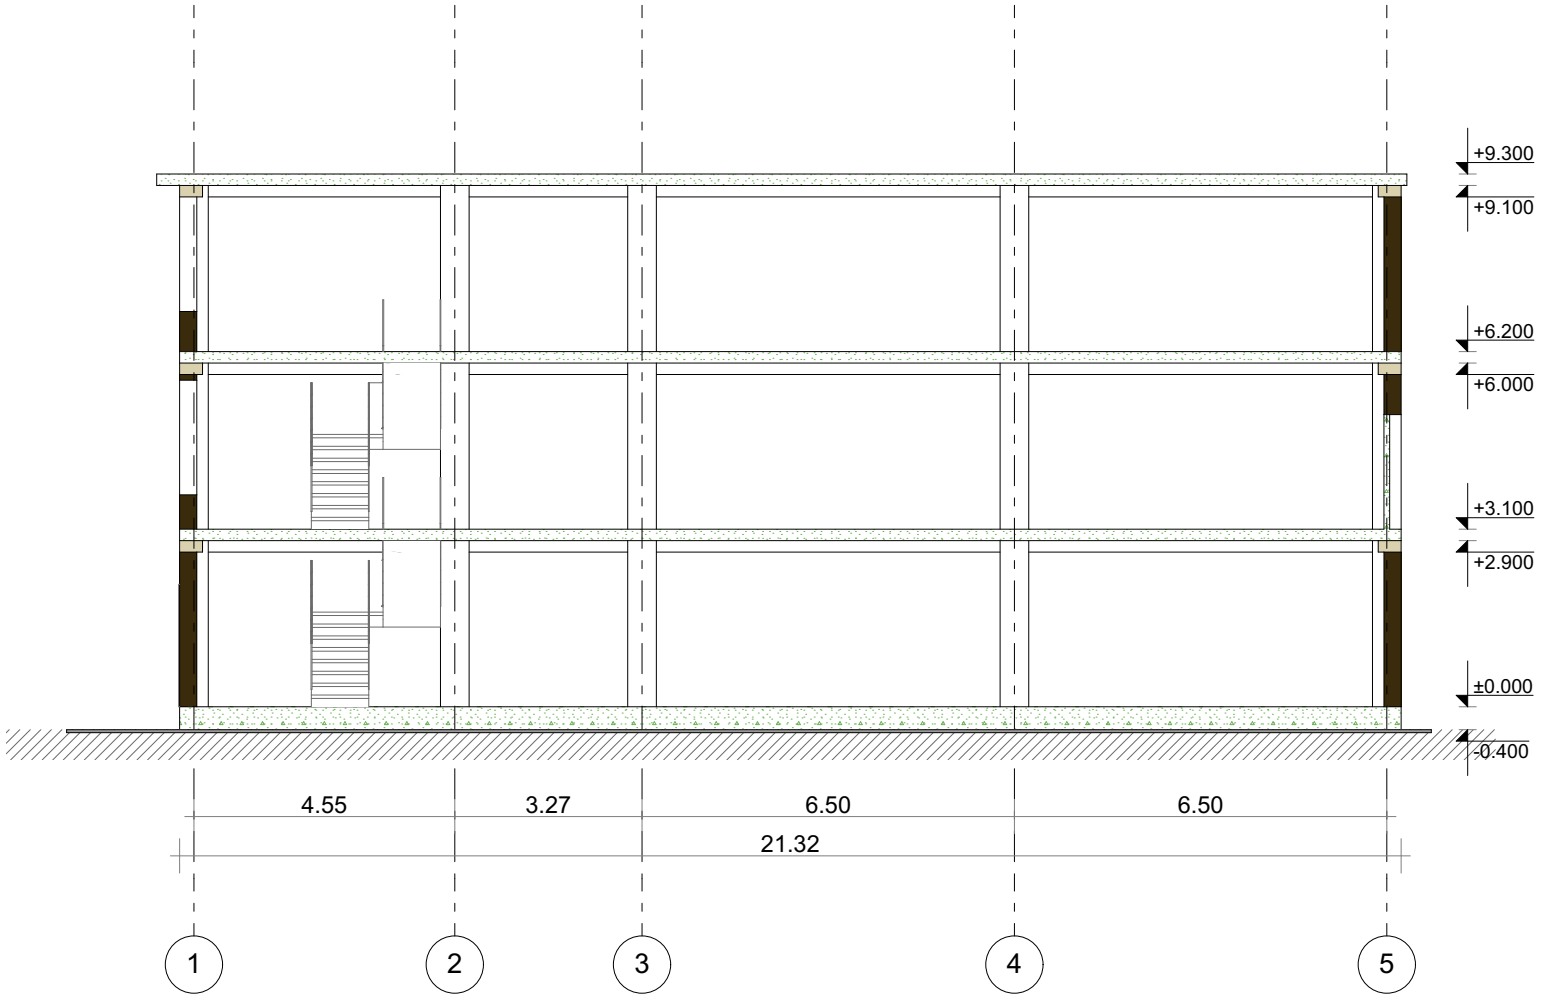

ფორმატი	A-3

დამკვეთი:
შპს "მილერი 2020"

პირობითი აღნიშვნა:

პროექტის დასახელება:
შენობა 2/3-ის დემონტაჟი

მისამართი:
ქ.თბილისი, ჟუჩა მეველე №7ა
ს/კ 01.17.12.014.054

პროექტის ნაწილი:
არქიტექტურული

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბ. ჭანკვეტაძე	
მთ. არქიტექტორი	მ.ბარბაქაძე	
პრ. ავტორი	მ.ბარბაქაძე	

შემსრულებელი ორგანიზაცია: optimus მწოდებელი

ფურცლის დასახელება:
ჭრილი 2-2

თარიღი 2022 წ.	მაშ: 1:100
ფურცლების რაოდენობა	
ფურცლის ნომერი №	

ფასადი 1-5 მ.1:100

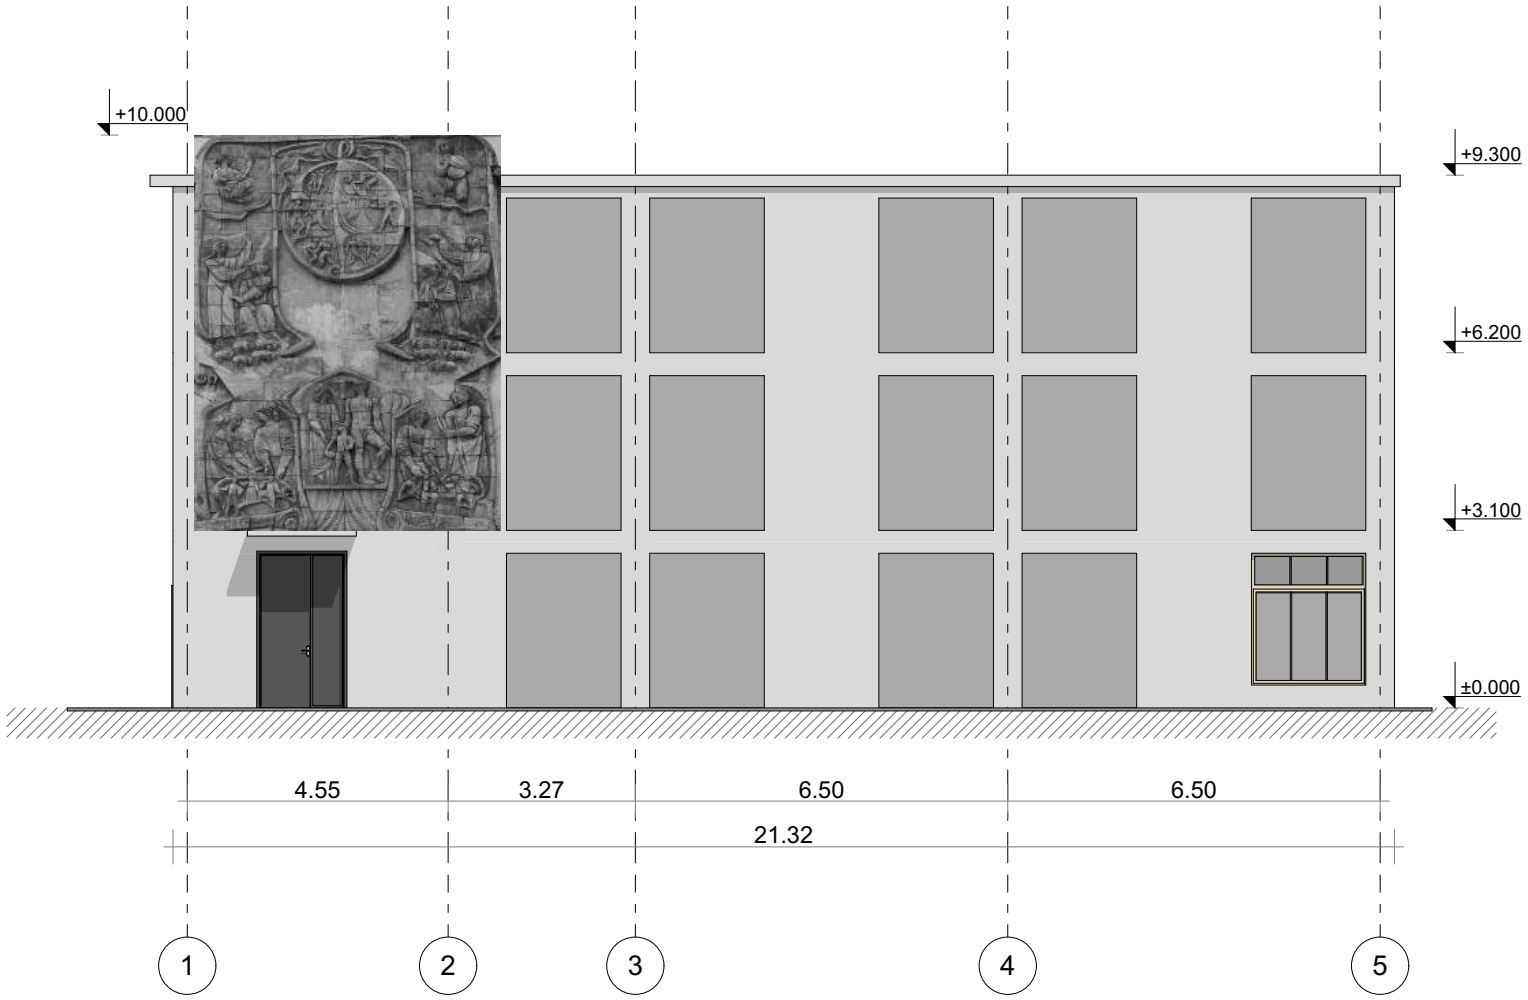

ფორმატი	A-3

დამკვეთი:
შპს "მილერი 2020"

პიროგითი აღნიშვნა:

პროექტის დასახელება:
შენობა 2/3-ის დემონტაჟი

მისამართი:
ქ.თბილისი, ჭუჭა მეველე №7ა
ს/კ 01.17.12.014.054

პროექტის ნაწილი:
არქიტექტურული

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბ. ჭანკვეტაძე	
მთ. არქიტექტორი	მ.ბარბაქაძე	
პრ. ავტორი	მ.ბარბაქაძე	
შემსრულებელი ორგანიზაცია	optimus მშენებელი	

ფურცლის დასახელება:
ფასადი 1-5

თარიღი 2022 წ.	მაშ: 1:100
ფურცლების რაოდენობა	
ფურცლის ნომერი №	

ფასადი ა-გ მ.1:100

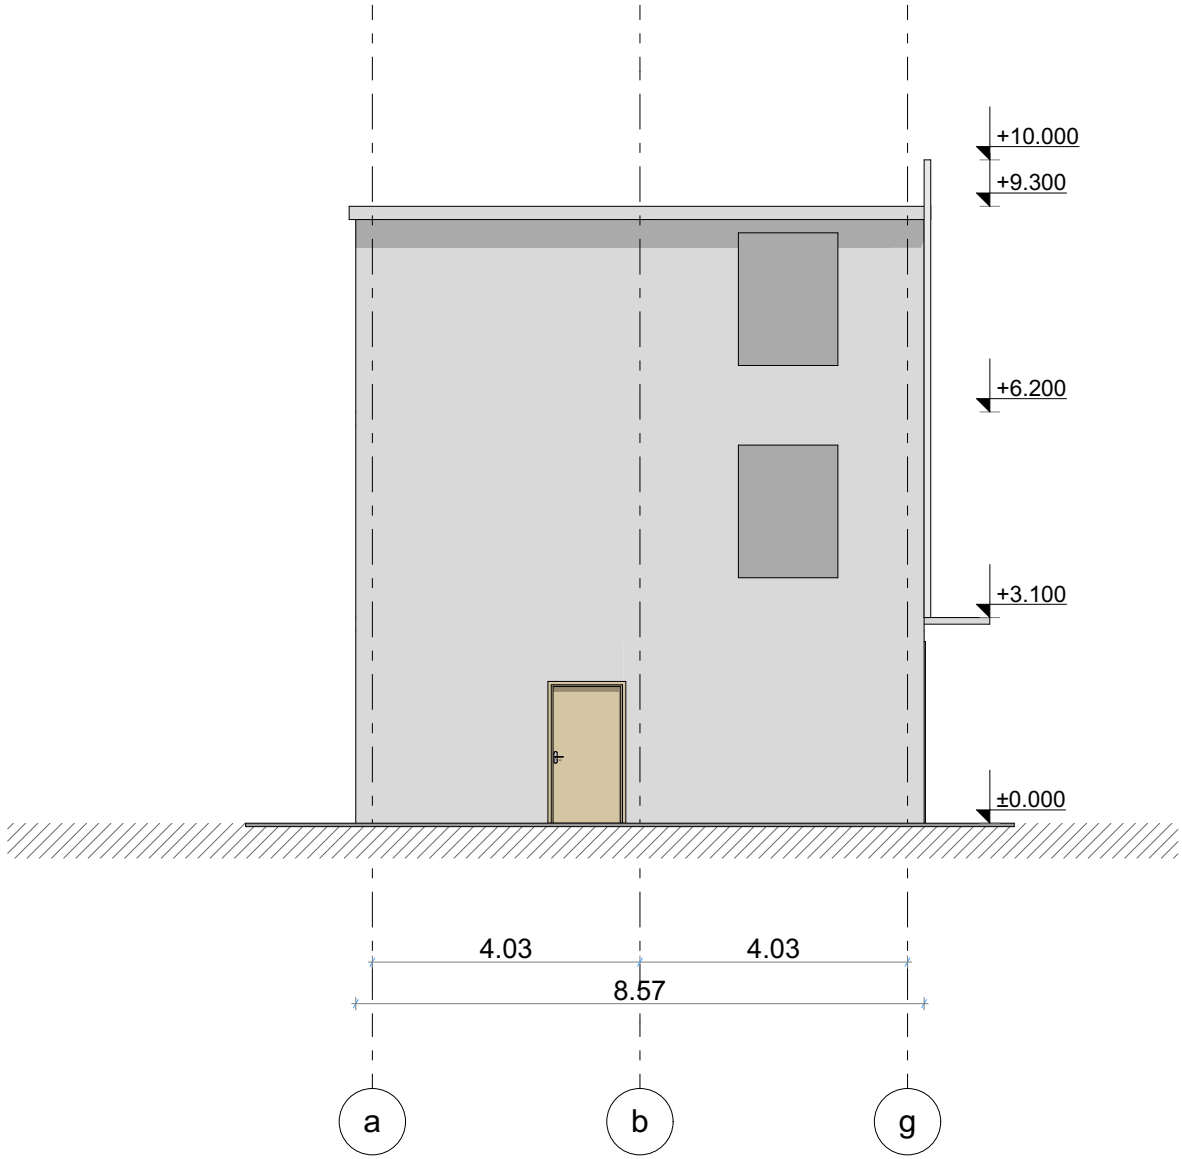

ფორმატი	A-3

დამკვეთი:
შპს "მილერი 2020"

პიროპითი აღნიშვნა:

პროექტის დასახელება:
შენობა 2/3-ის დემონტაჟი

მისამართი:
ქ.თბილისი, ქუჩა მევენახე №7ა
ს/კ 01.17.12.014.054

პროექტის ნაწილი:
არქიტექტურული

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბ. ჭანკვეტაძე	
მთ. არქიტექტორი	მ.ბარბაქაძე	
პრ. ავტორი	მ.ბარბაქაძე	
შემსრულებელი ორგანიზაცია	optimus მეთოდები	

ფურცლის დასახელება:
ფასადი ა-ბ

თარიღი 2021 წ.	მაშ: 1:100
ფურცლების რაოდენობა	
ფურცლის ნომერი №	

ფასადი 5-1 მ.1:100

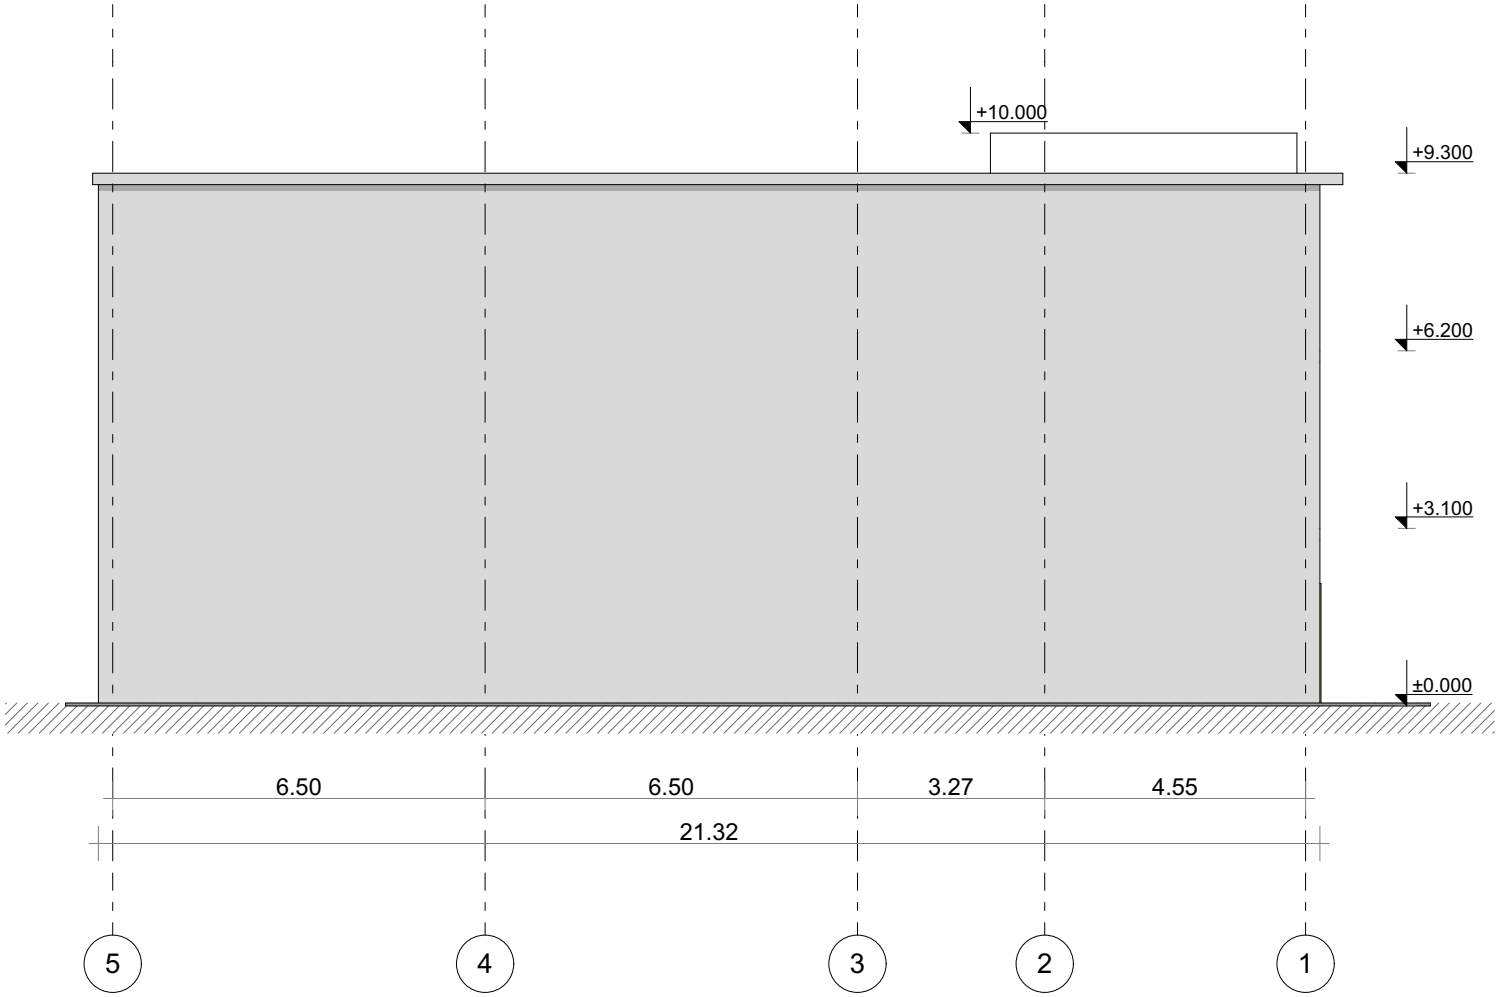

ფორმატი	A-3

დამკვეთი:
შპს "მილერი 2020"

პირობითი აღნიშვნა:

პროექტის დასახელება:
შენობა 2/3-ის დემონტაჟი

მისამართი:
ქ.თბილისი, ჭუჭა მეველე №7ა
ს/კ 01.17.12.014.054

პროექტის ნაწილი:
არქიტექტურული

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბ. ჭანკვეტაძე	
მთ. არქიტექტორი	მ.ბარბაქაძე	
პრ. ავტორი	მ.ბარბაქაძე	

შემსრულებელი ორგანიზაცია: optimus მშენებელი

ფურცლის დასახელება:
ფასადი 5-1

თარიღი 2022 წ.	მას: 1:100
ფურცლების რაოდენობა	
ფურცლის ნომერი №	

ფასადი გ-ა მ.1:100

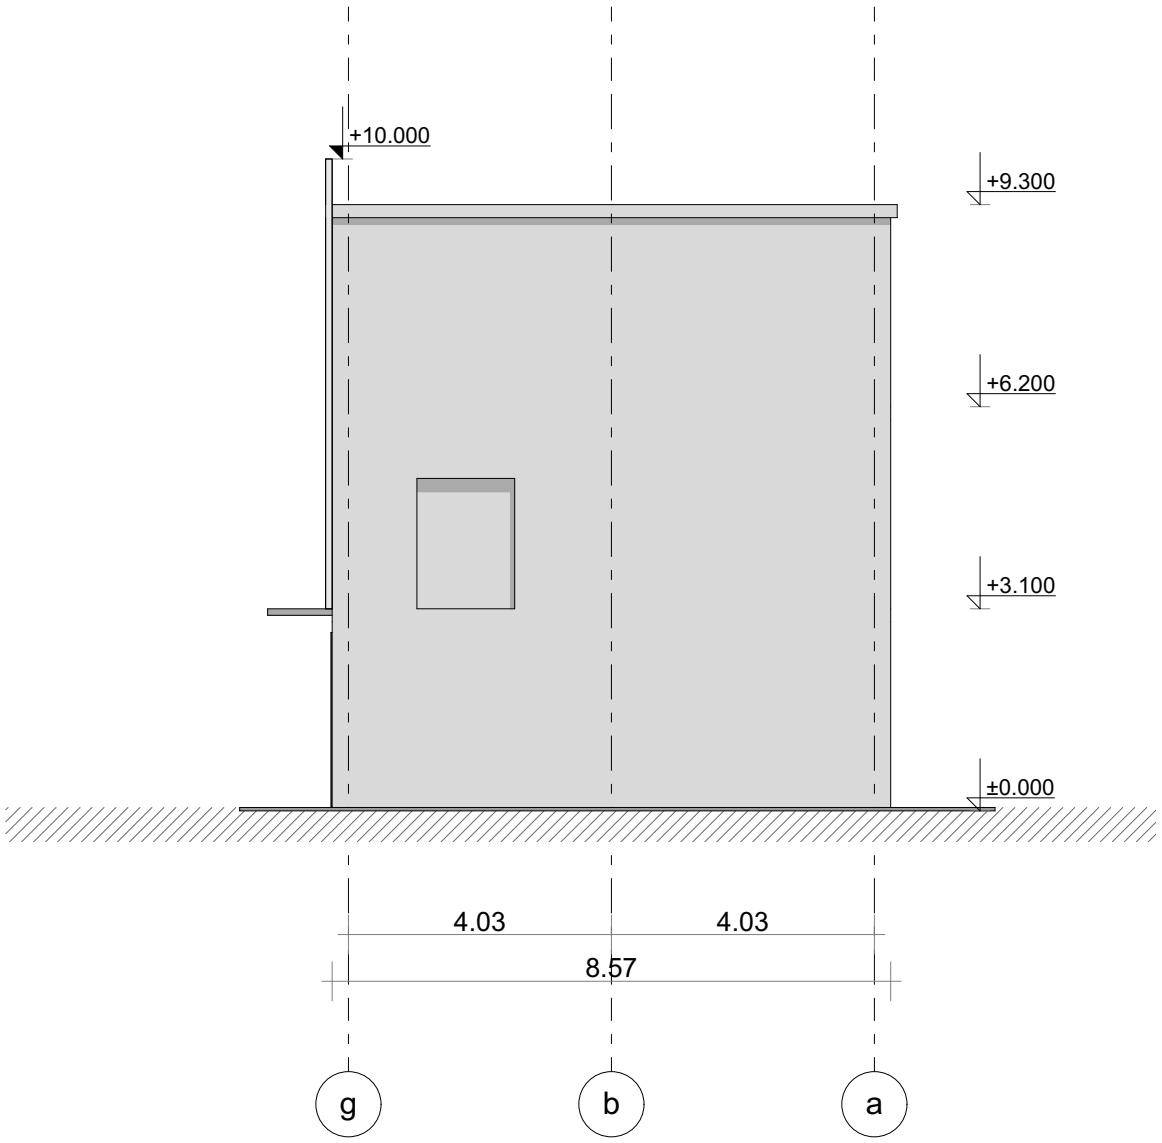

ფორმატი	A-3

დამკვეთი:
შპს "მილერი 2020"

პიროგითი აღნიშვნა:

პროექტის დასახელება:
შენობა 2/3-ის დემონტაჟი

მისამართი:
ქ.თბილისი, ჭუჭა მეველე №7ა
ს/კ 01.17.12.014.054

პროექტის ნაწილი:
არქიტექტურული

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბ. ჯანკეტაძე	
მთ. არქიტექტორი	მ.ბარბაძაძე	
პრ. ავტორი	მ.ბარბაძაძე	
შემსრულებელი ორგანიზაცია	optimus ოპტიმუსი	

ფურცლის დასახელება:
ფასადი ბ-ა

თარიღი 2022 წ.	მაშ: 1:100
ფურცლების რაოდენობა	
ფურცლის ნომერი №	

სამშენებლო სადემონტაჟო სამუშაოების წარმოების კალენდარული გარფიკი "მოპ-1"

საპროექტო ობიექტი მდებარეობს ქ.თბილისი.მეველეს ქ.№7ა ს/კ 01.17.12.014.054
მშენებლობის ორგანიიზაციის პროექტი დამუშავებულია სამშენებლო ნორმების და წესების მიხედვით.

შენობა წარმოადგენს სამრეწველო დანიშნულების ნაგებობას.

აღნიშნული სამუშაოების მომზადება და შესრულება საჭიროებს 6 თვის ვადას.

წარმოდგენილი გრაფიკი შედგენილია საქართველოს
მთავრობის №255 31.05.19 დადგენილების მე-20 მუხლის მე-8 პუნქტის თანახმად
მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში შესაძლებელია მშენებლობის განხორციელების ძირითადი
რიგის ეტაპების გაერთიანება,დაყოფა ან/და ამოღება ამ დადგენილებით განსაზღვრული შენობა-ნაგებობის
კლასების განსაზღვრა კლასების შესაბამისად
კერძოდ გრაფიკში გაწერილია ორი რიგის სამუშაოები
პირველი რიგის(მოსამზადებელი სამუშაოები) ორ ეტაპად და მეორე რიგის
(ძირითადი სამშენებლო სამუშაოები) სამ ეტაპად. სულ ხუთი ეტაპი
პირველი რიგის სამუშაოებს მიცემული აქვს ერთი თვის ვადა,მეორე რიგის სამუშაოების
ეტაპებს 5 თვის ვადა.სულ ექვსი თვე.

მშენებლობის გრაფიკი თვეების მიხედვით

	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე		II თვე		III თვე		IV თვე		V თვე		VI თვე	
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
	I რიგის სამუშაოები												
1	I ეტაპი სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება,შეზღუდვებისა და საინფორმაციო ბანერის გაკვრა												
2	2 ეტაპი არსებული საინჟინრო კომუნიკაციების ჩაჭრა												
	II რიგის სამუშაოები												
3	3 ეტაპი												
4	4 ეტაპი შენობა 02/3-ის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის დემონტაჟი												
5	5 ეტაპი სამშენებლო ნარჩენების გატანა, ტერიტორიის სრული დასუფთავება												

დირექტორი		გ.ჯანკვეტაძე	ქ.თბილისი, ქუჩა მეველე №7ა ს/კ 01.17.12.014.054	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
კონსტრუქტორი		გ.ჯანკვეტაძე		პროექტი		
შეასრულა		მ.ბარბაქაძე				
			კალენდარული გრაფიკი	optimus	შ.პ.ს."ოპტიმუსი"	
			სამრეწველო დანიშნულების შენობა	თბილისი 2021 წელი		

ქ.. თბილისის მერია

ტოპოგრაფიული გადაღება

მასშტაბი 1:500

მისამართი: ქ. თბილისი, მეველეს ქუჩა №7ა

ფართობი: 6630 მ

სარგებლობის ფორმა: კერძო საკუთრება

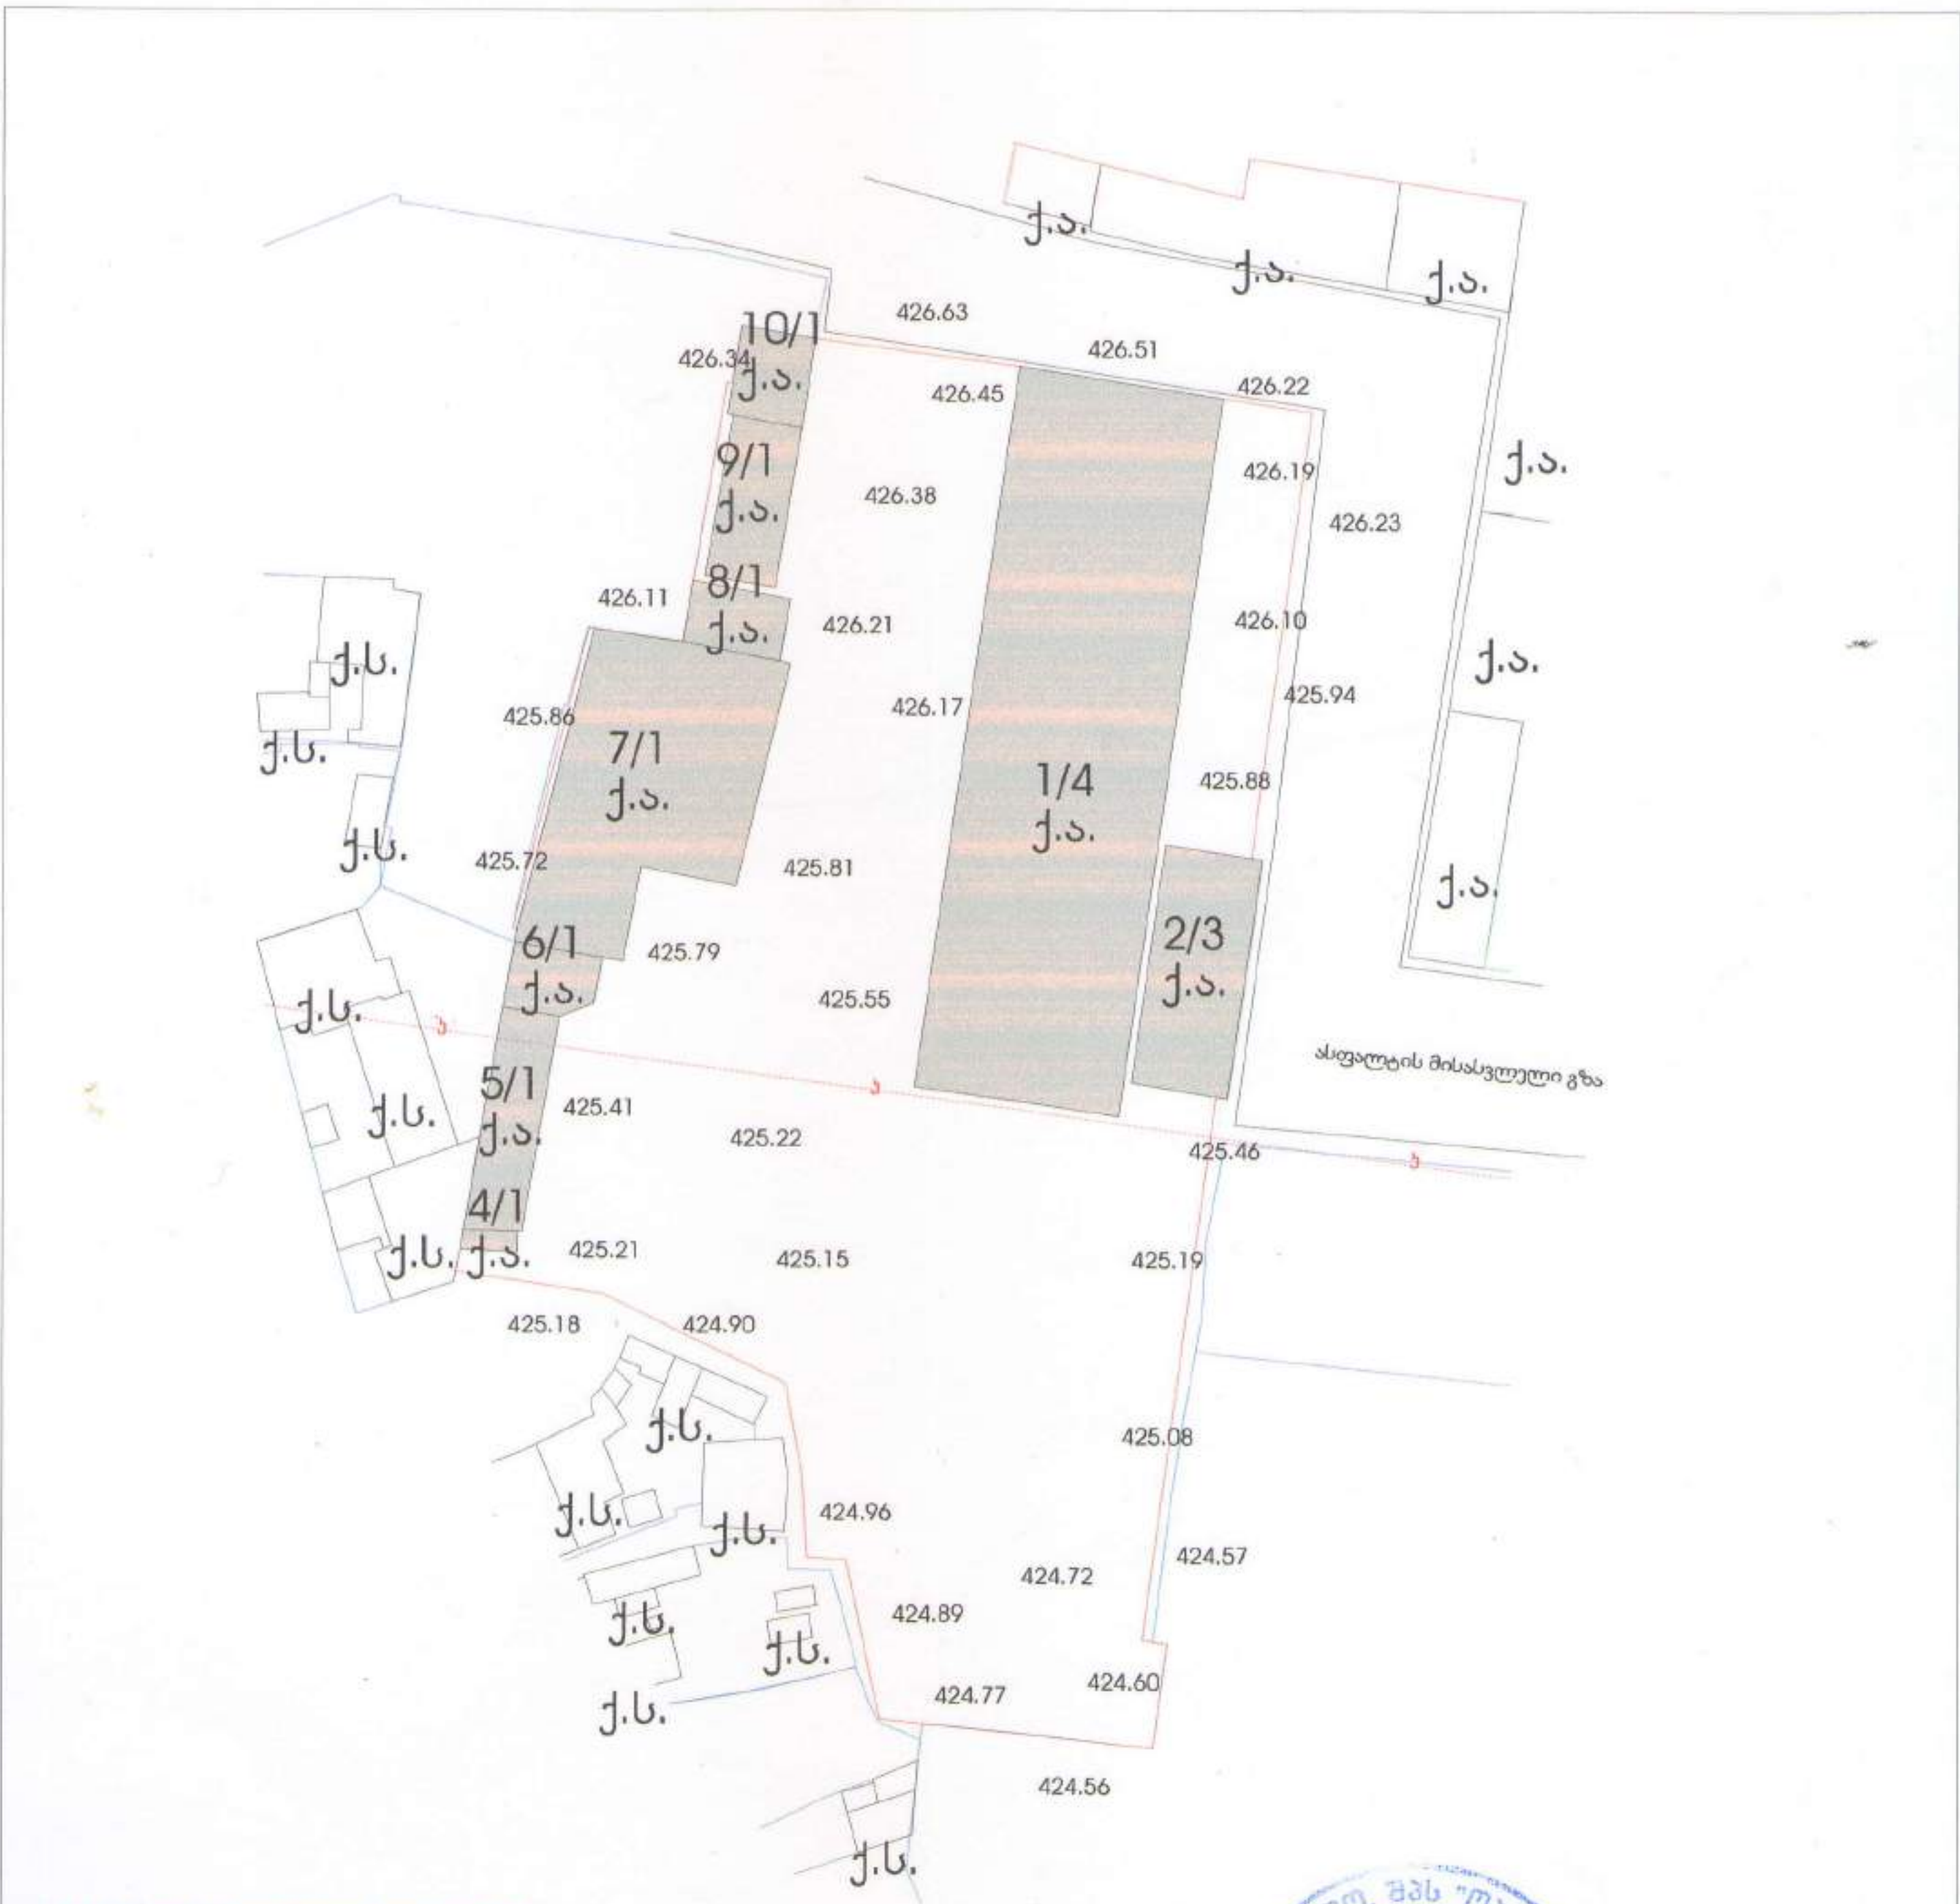

მიწისქვეშა კომუნიკაციები დატანილია საჯარო რეესტრის ელექტრონული ბაზის მიხედვით

შემოწმებულია დამკვეთის მითითებით

პირობითი ნიშნები

- ქ.ს. — ქვის საცხოვრებელი
- ა.ფ. — ავტოფარეხი
- ჰორიზონტალი
- ბორდიური
- გაზგაყვანილობა
- კანალიზაცია
- კავშირგაბმულობა
- წყალგაყვანილობა
- კოორდინატთა ბადე
- ლამპიონი
- ბეტონის ღობე

შ.პ.ს. ოპტიმუსი		ქ. თბილისი, მეველეს ქუჩა №7ა	შესრულების თარიღი
დირექტორი	გ.ჭანკვეტაძე	ტოპოგრაფიული გადაღება	20.05.2018 წ.
