
# მშენებლობის ჯალენდარული გრაფიკი

| № | სამუშაოთა ჩამონათვალი | დღე | 1 წელი | | | | | | | | | | | | 2 წელი | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | I თვე | II თვე | III თვე | IV თვე | V თვე | VI თვე | VII თვე | VIII თვე | IX თვე | X თვე | XI თვე | XII თვე | I თვე | II თვე | III თვე | IV თვე | V თვე | VI თვე | VII თვე | VIII თვე | IX თვე | X თვე | XI თვე | XII თვე |
| | | | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 |
| I | მშენებლობის პირველი რიგი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | მოსამზადებელი სამუშაოების პერიოდი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1ეტ. | მოსამზადებელი სამუშაოები რომლებიც დაკავშირებულია საშენებელი მიედნის მოწესრიგებასთან, მათ შორის არსებული ნაგებობების დაშლასთან და საშენებელი ნაგების მოედნებამდე , შესანარჩენებელი მწვანე ნარგავების დაცვასთან და მოწესრიგება სათანადო კომუნიკაციების გადატანასთან | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2ეტ. | შენიბა-ნაგებობის არეულზე დატვალება და ძირითადი ღერძების დატოპირება | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II | მშენებლობის მეორე რიგი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ძირითადი სამუშაოების პერიოდი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1ეტ. | შენიბა-ნაგებობის მიწის სამუშაოები<br>შენიბა-ნაგებობის ფუძის მოწყობის სამუშაოები | 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2ეტ. | ტერიტორიის გარშემო კაპიტალური ღობის მოწყობა;<br>შენიბა-ნაგებობის სამონტაჟო მოწყობის სამუშაოები;<br>ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა შენიბა-ნაგებობის ნულოვან ნიშნულამდე; | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3ეტ. | შენიბა-ნაგებობის ნულოვანი ნიშნულიდან ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის (არამჭიდი კონსტრუქციების გამოკლებით) მოწყობა;<br>შენიბა-ნაგებობის სახურავის და გადახურვის მოწყობა; | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4ეტ. | არამჭიდი კონსტრუქციების მოწყობა; შენიბა-ნაგებობის ლოკალური საგარეო სარეკლამო საინჟინრო-ტექნიკური ქსელების მოწყობა; | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5ეტ. | ტექნოლოგიური მოწყობილობების მონტაჟი : | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6ეტ. | შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები;<br>მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები. | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## ღობე

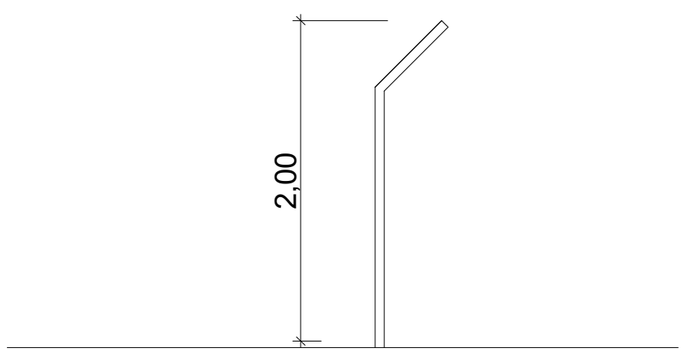


პირობითი აღნიშვნები

შესრულებული სამუშაოები

შესასრულებელი სამუშაოები

შენიშვნა:

აღნიშნულ მშენებლობის კალენდარულ გრაფიკში მოცემული I რიგის I და II ეტაპის და ასევე II რიგის I ეტაპის სამუშაოები უკვე შესრულებულია და მათ შესრულებაზე არსებობს შესაბამისი ოქმები

გთხოვთ მშენებლობის ნებართვა გასცეთ აღნიშნულის გათვალისწინებით და ახალი ნებართვის ითვლა ვადა დაიწყოს II რიგის II ეტაპიდან

ნახაზის დასახელება

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

ნახაზი

სქემატური პროექტი

დამკვეთი:

შ.პ.ს ოცნება

საიდ. ნომ: 245403086

ობიექტის დასახელება:

საქმეთონე და საწარმოო ობიექტები (ქარხანა)

ობიექტის მისამართი:

ქ. თბილისი
ბრიგოლ ლეონიძისანაძის ქ. №166 და ბრიგოლ ლეონიძისანაძის ქ. №166-ის მიმდებარედ
(საკ/კოდი: 01.19.22.006.085)

დამპროექტირებელი:


შ.პ.ს "ST.ART" ს/კ: 400022104
საქართველო, ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №115ა


| | | |
|---|---|---|
| ორგანიზაცია | ხელმოწერა | სახელი/გვარი |
| ხელმძღვანელი | | ა. ვარშავა |
| პრ. არქიტექტორი | | გ. კაკაბაძე |
| პრ. არქიტექტორი | | შ. ტაბიძეანაძე |
| შესრულება | | ქ. ლეონიძე |

საავტორო უფლება: შ.პ.ს "ST.ART"

მასშტაბი 1:500

ზომატი: A3

ქ. თბილისი 2021 წ.
