ქ. თბილისი, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირის VI ჩიხი №1
ქ. თბილისი, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი, №1-ის
მიმდებარედ
ს.კ. 01.19.35.007.134
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის

# მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

შემსრულებელი ა. მაისაშვილი

ქ.თბილისი 2022წ.

ქ. თბილისი, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირის VI ჩიხი №1
ქ. თბილისი, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი, №1-ის მიმდებარედ ს.კ. 01.19.35.007.134 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის
მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

სამუშაოთა ორგანიზაციის პროექტის შედგენას საფუძვლად დაედო არქიტექტურული პროექტი ტერიტორიის დათვალიერება და შესწავლა. მასთან სამანქანო მისასვლელი გზა გათვალისწინებულია და წარმოდგენილია საპროექტო გენგეგმის მიხედვით. სამშენებლო სამუშაოები წარიმართოს ძირითადად კალათასაკიდიანი ამწე და ბეტონის ტუმბოს დახმარებით.

უბანი ხასიათდება შემდეგი კლიმატური და სეისმური ფაქტორებით: ქარის დაწოლა – 45კგ.მ./მ2; თოვლის საფარის წონა - 50კგ/მ2, საამშენებლო მექანიზმების ნუსხა მოყვანილია ცხრილში მომდევნო ფურცელზე. სამუშაოთა წარმოების დროს აუცილებელია შრომის უსაფრთხოების წესების დაცვა, აგრეთვე შენობის მშენებლობის დროს სელიტებურ ზონაში მტვრის გაფანტვისაგან დამცავი ღონისძიებების უზრუნველყოფა.

## რიგითობა და ეტაპები

### მშენებლობის პირველი რიგი

1. **ეტაპი.**
   მოსამზადებელი სამუშაოები, რომლებიც დაკავშირებულია სამშენებლო მოედნის მოწესრიგებასთან, მათ შორის; შესანარჩუნებელი მწვანე ნარგავების დაცვასა და მიწისქვეშა საინჟინრო კომუნიკაციების შენარჩუნებასთან.

2. **ეტაპი.**
   შენობა-ნაგებობის გრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი ღერძების დაფიქსირება.

## მშენებლობის მეორე რიგი

1. ეტაპი.
   შენობა-ნაგებობის მიწის სამუშაოები; შენობა-ნაგებობის ფუძის მოწყობის სამუშაოები;

2.ეტაპი.
   შენობა-ნაგებობის საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები;
   ნულოვანი ციკლის დასრულება;

3.ეტაპი.
   ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა: შენობა-ნაგებობის ნულოვანი ნიშნულიდან +3.20 ნიშნულის რკინა ბეტონის ძირითადი კონსტრუქციების მონტაჟი;

4.ეტაპი.
   ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა: შენობა-ნაგებობის +6.50 - +9.80 ნიშნულის რკინა ბეტონის ძირითადი კონსტრუქციების მონტაჟი;

5.ეტაპი.
   ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა: შენობა-ნაგებობის +13.10 - +16.40 ნიშნულის რკინა ბეტონის ძირითადი კონსტრუქციების მონტაჟი;

6.ეტაპი.
   ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა: შენობა-ნაგებობის +19.70 - +23.00 ნიშნულის რკინა ბეტონის ძირითადი კონსტრუქციების მონტაჟი;

7.ეტაპი.
   ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა: შენობა-ნაგებობის +26.30 - +29.60 ნიშნულის რკინა ბეტონის ძირითადი კონსტრუქციების მონტაჟი;

8.ეტაპი.
   ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა: შენობა-ნაგებობის +33.40 - +36.05 ნიშნულის რკინა ბეტონის ძირითადი კონსტრუქციების მონტაჟი;

9.ეტაპი.
   შენობა-ნაგებობის სახურავისა და გადახურვის მოწყობა;

**10.ეტაპი.**

არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა;

გარე და შიდა კედლების ბლოკით ამოყვანა.

**11.ეტაპი.**

შენობა-ნაგებობის ლოკალური საერთო

სარგებლობის საინჟინრო-ტექნიკური ქსელების მოწყობა;

**12.ეტაპი.**

შენბა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები;

**13.ეტაპი.**

მიწის ნაკვეთის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამუშაოები.

# შენობის სამშენებლო წარმოების პროექტის შესადგენი ნორმატივები

2.1 СНиП 3.01.01-85 „Оригинализация строительного производства'' М.,1989

2.2 СНиП -4-80 „Техника безопасности на строительстве'' М., 1981

2.3 Справочник инженера строителя, М., 1989

2.4 Строительные стреловые самоходные краны, М., 1984

2.5 კრებული სამახსოვრო "სამშენებლო წარმოების ნორმები და წესები", ამონაწერი სამშენებლო ნორმებიდან და წესებიდან, თბ., 1987

2.6 მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში მომუშავეთა შორის უსაფრთხოების და სანიტარულ ჰიგიენური მომსახურეობის საკითხებზე მთავარ წყაროდ წარმოდგენილია საამშენბლო ნორმების საქართველოს მავრობის №41 დადგენილების პუნქტი №20-ის მიხედვით.

## ასაშენებელი ობიექტის დახასიათება

შენობა გეგმაში მრავალკუთხა ფორმისაა. სხვადასხვა ზომებით, საპროექტო შენობა წარმოადგენს ათ სართულს, სარდაფით. საძირკველი რკინა ბეტონის ფილა. კედლების შეგსება ხდება წვრილი საკედლე ბლოკით, გადახურვა რკინა-ბეტონის ფილა. სართულშუა კიბე წარმოადგენს მონოლითურ რკინა-ბეტონს.

## მშენებლობის ხანგრძლივობის შესახებ

შენობის მშენებლობა დაკვეთის მიერ განსაზღვრულია 36 თვის ვადაში რაც არის გაწერილი და გათვალიწინებული მშენებლობის კალენდარულ გრაფიკში. გეგმიურად დადგენილი ხანგრძლივობის დაცვა შენობების მშენებლობაზე 36 თვის პერიოდში შესაძლებელია უწყვეტი ფინანსირების შემთხვევაში, რასაც ხელი უნდა შეუწყოს ქ.თბილისი რბილმა და ზომიერმა კლიმატურმა პირობებმაც. სამუშაოთა შესრულების ვადების დაცვა უწყვეტ ფინანსირებაზეა დამოკიდებული, რაც უნდა გაითვალისწინოს დამკვეთმა.

# სამშენებლო მანქანა-მექანიზმების, დანადგარებისა და ინსტრუმენტების ჩამონათვალი

| № | დასახელება | მარკა | რაოდენ. ცალი |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | თვითმცლელი ძარიანი და სპეც-დანიშნულების ავტოტრანსპორტი სამშენებლო ტვირთის გადასატანად | სხვადასხვა | 5 |
| 2 | გადასატანი კომპრესორი | სო-48 | 2 |
| 3 | ელექტროშესადუღებელი საჭრელი აგრეგატი | კომპ. | 3 |
| 4 | ავტოკენური შედუღების და ჭრის აპარატი | კომპ. პკუ-35 | 3 |
| 5 | ბეტონმრევი | - | 4 |
| 6 | ლითონის სახარაჩო სექციები 100 მ2 ფართობისათვის | კომპ. | 10 |
| 7 | სტაციონარული ბეტონის ტუმბო | - | 1 |
| 8 | კალათასაკიდიანი ამწე | COMANSA NT 40100 | 1 |

# მომუშავეთა შრომის უსაფრთხოების წესების დაცვის თაობაზე

მომუშავეთა შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვა შენობათა სამშენებლო ცალკეულ ეტაპებზე აუცილებელია სნ და წ III-4-80* "უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე" და სხვა ნორმატულ-საკანონმდებლო დოკუმენტების შესაბამისობით. მათგან ყურადღებას გამახვილებთ შემდეგზე:

სამუშაო ადგილები მუშაობის პირობებისა და ტექნოლოგიურობის გათვალისწინებით უზრუნველყოფილი უნდა იყოს კოლექტიური დაცვისა და სიგნალიზაციის საშუალებით.

ელექტრო უსაფრთხოების წესები ჩამოყალიბებულია სახელმწიფო სტანდარტში 12.013-88 ელექტრო კარადა ყოველთვის უნდა იყოს ჩაკეტილ მდგომარეობაში, ელექტრო კაბელები, ელექრტო სადენები და ელექტრო მოწყობილობები კი იზოლირებულად. გაშიშვლებული სადენების გამოყენება აკრძალულია სამშენებლო მოედანზე.

ავტოამწის მუშაობის პერიობში დაუშვებელია უცხო პირთა, დაუსაქმებელ მუშა-მომსახურეთა ყოფნა, სამშემებლო გენგეგმაზე შემოფარგლული ავტოამწის მოქმედების სახიფათო ზონის ფარგლებში.

ღამის პერიოდებში უსაფრთხოების ზონის აღმნიშვნელი ფირნიშები აუცილებელია უნდა განთავსდეს და განათდეს.

სამუშაოთა უწყვეტობისა და ტექნოლოგიურობის, აგრეთვე შრომის უსაფრთხოების უზრუნველყოფად აუცილებელია მშენებლობის ცხრილში მოცემული და ჩვენს მიერ რეკომენდირებული მანქანა- მექანიზმებით, ინსტრუმენტებითა და დანადგარ-სამარჯვეებით აღჭურვა. ცხადია შესაძლებელია მათი შეცვლაც უფრო თანამედროვეთი.

სამუშაო ოპერაციებში დასაქმებული მუშაკები დაცული უნდა იყვნენ თავის დამცავი ჩაფხუტებით.

დაუშვებელია მანქანების, ხელსაწყოებისა და მოწყობილობების დატოვება ჩართულ მდგომარეობაში ზედამხედველობის გარეშე. ცხადია მათი ტექნიკური მომსახურეობაც უნდა მოხდეს ძრავის გამორთვის შემდეგ.

ლითონის ელემენტების ჩაჭრას ელექტრო ან აეროვანი აპარატებით ქვედა იარუსებზე 5 მეტრის რადიუსში ფართობები უნდა გავანთავისუფლოთ წვადი მასალებისაგან, ხოლო 10 მეტრის რადიუსში ასაფეთქებელი (მაგალითად ჟანგბადის ბალონები) მასალებისაგან სამშენებლო სამუშაოებზე დასაქმებულია ყველა მუშაკმა (როგორც მუშამ, ასევე მოსამსახურემ) უნდა შეისწავლოს შრომის უსაფრთხოების წესები, გაიაროს ინსტრუქტაჟი, ჩააბაროს გამოცდა სპეციალურ ჟურნალში ხელმოწერების დაფიქსირებით

# ბუნების დაცვითი და ჰაერის დაბინძურების საწინააღმდეგო ღონისძიებები

შენობა მდებარეობს ქალაქ თბილისი საგარეუბნო განაშენიანებაში. აღნიშნულის გამო აუცილებელია შენობის მშენებლობის პერიოდში შემდეგი ღონისძიებების დაცვა:

გარემოს დაცვის სამსახურის ნებართვის გარეშე იკრძალება მრავალწლიანი ხეებისა და ნარგავების მოჭრა, ამოძირკვა ან განადგურება.

მონოლითური რკინა-ბეტონის, კედლების, ტიხრების, იატაკის მშენებლობის პროცესში მოსალოდნელია მტვრის გაფანტვა გარე სივრცეში, რის გამოც შენობას უნდა ჩამოეყაროს ფარდა ანდა სამუშაოები განხოციელდეს დახურულ სივრცეში ვენტილაციის მოწყობით.

იკრძალება სამშენებლო ნაგვისა და ნარჩენების ღია წესით გადატანა და ჩამოყრა. სასურველია სამშენებლო ნაგვის პირდაპირ თვითმცლელი მანქანების ძარებში ჩაყრა. დიდი ზომის სამშენებლო ნარჩენები ან მოხსნილი ნაკეთობები უნდა ჩამოვუშვათ ამწის საშუალებით. აქაც სასურველია მაშინვე მოხდეს მათი ავტომანქანების ძარებში ჩატვირთვა და ნაგავსაყრელზე ან დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე მიტანა შესაბამისი სამსახურებთან შეთანხმების შემდეგ.

დაუშვებელია არსებული საკანალიზაციო ჭების დანაგვიანება სამშენებლო ნარცენებით.

ასევე დაუშვებელია ამოსახპაი ორმოების მოწყობა. ინვენტარული საყოფაცხოვრებო ვაგონეტიდან საკანალიზაციო ჩადინება უნდა მოეწყოს უშუალოდ საქალაქო საკანალიზაციო ჭებში. გენგეგმაზე მათ მოსაწყობად მითითებული ადგილები შესაძლებელია შეიცვალოს საკანალიზაციო ჭების სიახლოვეს მათი განთავსებით ამწეთა მოქმედების სახიფათო ზონების საზღვრების გათვალისწინებით. სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება ფხვიერ მდგომარეობაში რეკომენდირებული არ არის. ავტომანქანების ძარებში ჩატვირთვის შემდეგ მათი ზედაპირი დაინამოს.

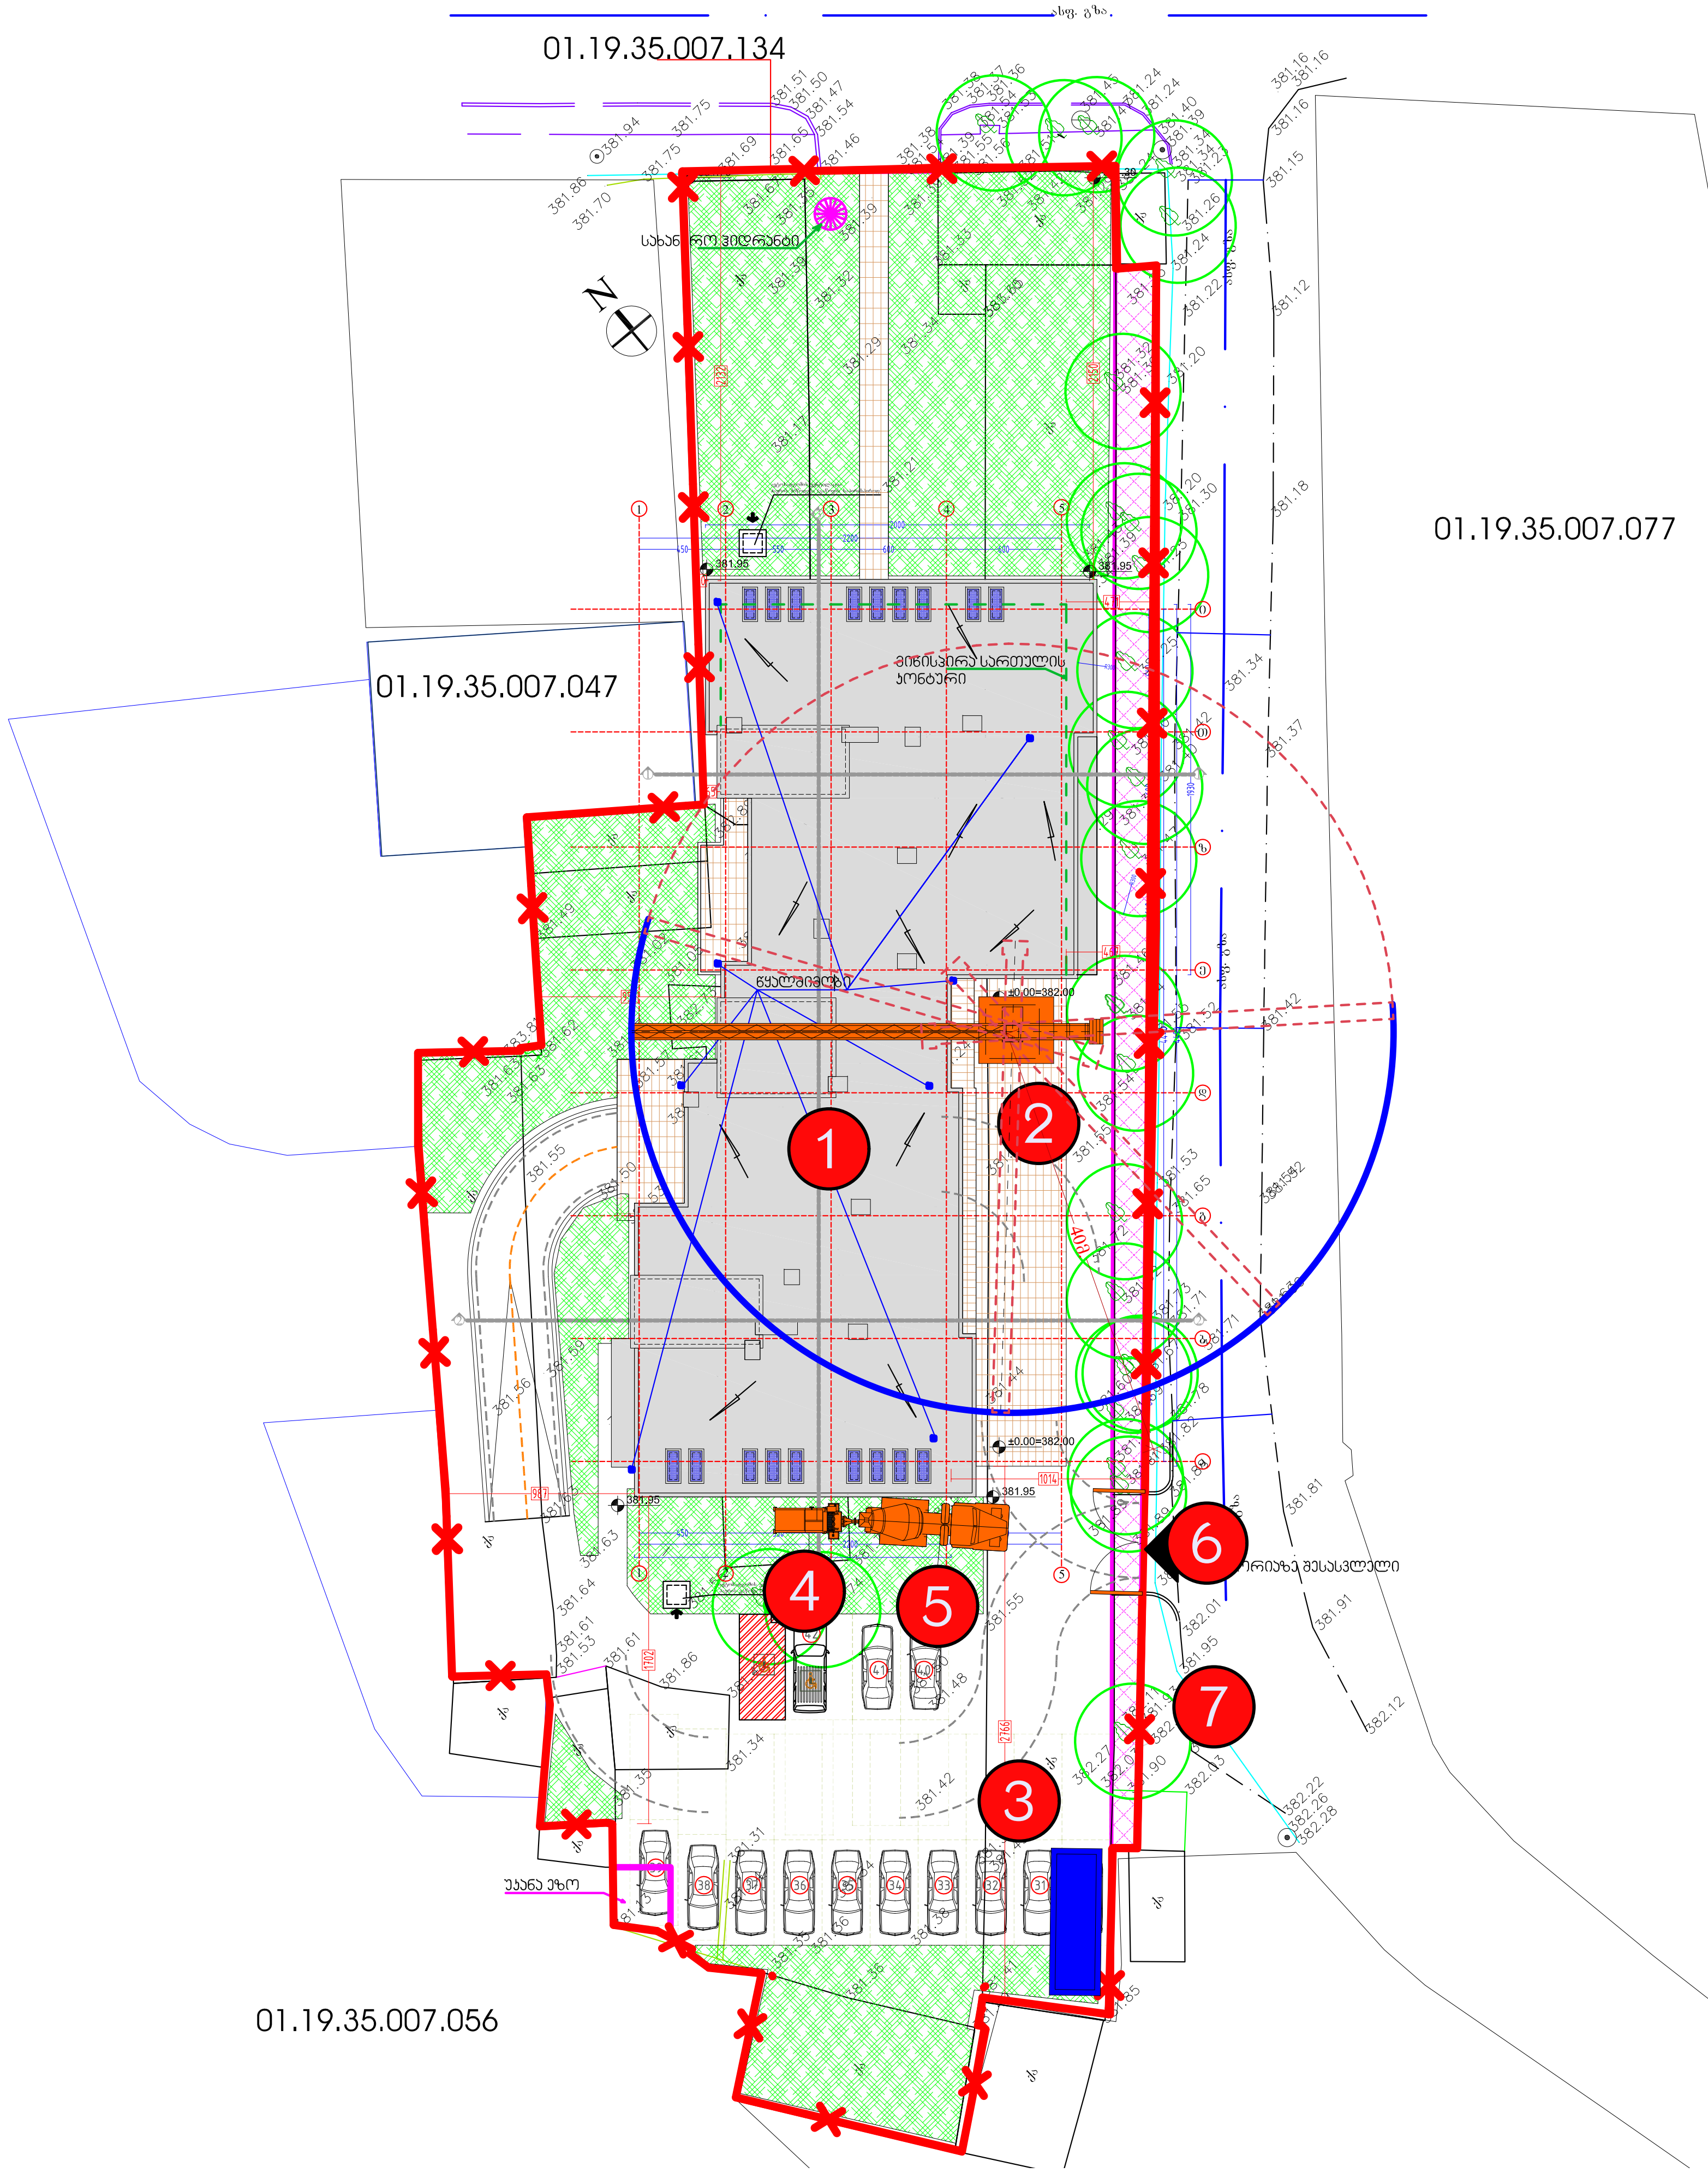


საპროექტო შენობა

მწარმოებლის ოთახი

დროებითი ღობე

ვერტიკალური საწეველა

ჭიშკარი

ექსპლიკაცია

1. საპროექტო ობიექტი
2. ვერტიკალური საწეველა
3. მწარმოებლის ოთახი
4. სტაციონარული ბეტონის ტუმბო
5. ბეტონმრევი
6. ჭიშკარი
7. სამშენებლო დროებითი ღობე

CUSTOMER: შპს "გგ ბრუკი" 406305252

Copyright LLC "GRC", All Rights Reserved. The Duplication, Reproduction, Copying, Sale, Licensing, or any other distribution or use of these drawings, any portion thereof, or the plans depicted hereon is Strictly Prohibited unless expressly authorized in writing by "GRC" LLC.

PROJECT #: 2021/BGS

SHEET NAME: სამშენებლო გეგმა

PROJECT NAME: მრავალფუნქციური საცხოვრებელი სახლის პროექტი

REV: A

DATE: 15-Jun-21

SCALE: NTS

PROJECT: მუშა

SHEET: A-01

OF: -00-

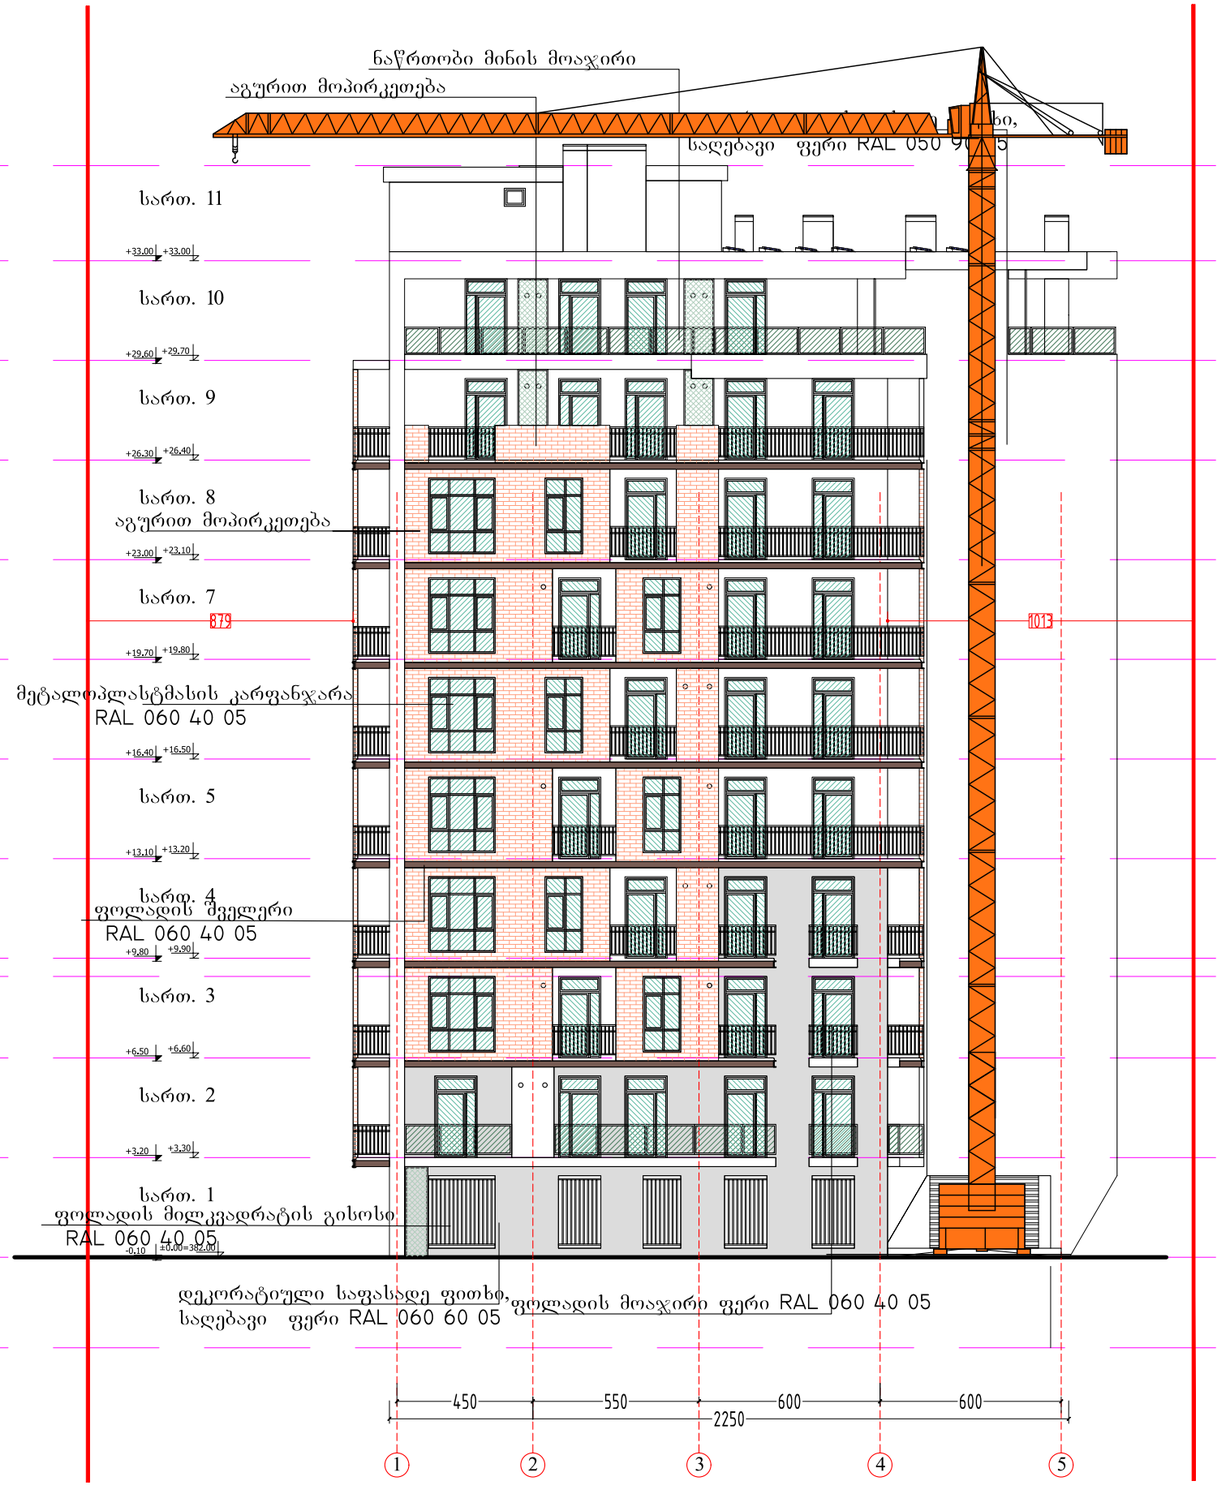



შპს "შ.პ.ს. "ორო"
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. №53ა
ტელ: (+995 599 31 32 52), E-mail: oro@inbox.ru


შპს
"შ.პ.ს. "ორო"
406305252

დამკვეთი
CLIENT

| თარიღი / DATE | ტექნიკური ნომერი / REV | მიმართება / NOTE |
|---|---|---|
| | | |


საავტორო უფლებები დაცულია კანონით. ამ ნახაზების გადაღება, კოპირება, გავრცელება ან გამოყენება ნებისმიერი ფორმით დაუშვებელია, თუ ამაზე წინასწარ წერილობითი ნებართვა არ გაქვთ მიღებული შპს "ორო"-ს.
Copyright LLC "ორო". All Rights Reserved. The Duplication, Reproduction, Copying, Sale, Licensing, or any other distribution or use of these drawings, any portion thereof, or the plans depicted hereon is Strictly Prohibited unless expressly authorized in writing by "ორო" LLC.


პროექტის #
PROJECT #
2021/BGS

სამოსახლო კომპლექსი
ნაგებობის სახელწოდება
OBJECT NAME

ნაგებობის ადგილმდებარეობა
PROJECT NAME

ნახაზის სახელწოდება
SHEET NAME

| ნახაზის ტიპი | ავტორი | თარიღი |
|---|---|---|
| მთავარი არქიტექტორი | | |
| არქიტექტორი | | |
| კონსტრუქციების მთავარი ინჟინერი | | |

ვერსია:
REV
A

თარიღი:
DATE
15-Jun-21

მასშტაბი
SCALE
NTS

პროექტი
PROJECT
მუშა

ფურცლის #
SHEET #
A-01

ფურცლების რაოდენობა
QTY
-00-

# მშენებლობის ჯალენდარული გრაფიკი

| № | სამუშაოთა ჩამონათვალი | დღე | 1 წელი | | | | | | | | | | | | 2 წელი | | | | | | | | | | | | 3 წელი | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | I თვე | II თვე | III თვე | IV თვე | V თვე | VI თვე | VII თვე | VIII თვე | IX თვე | X თვე | XI თვე | XII თვე | I თვე | II თვე | III თვე | IV თვე | V თვე | VI თვე | VII თვე | VIII თვე | IX თვე | X თვე | XI თვე | XII თვე | I თვე | II თვე | III თვე | IV თვე | V თვე | VI თვე | VII თვე | VIII თვე | IX თვე | X თვე | XI თვე | XII თვე |
| | | | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 | 10 20 30 |
| I | მშენებლობის პირველი რიგი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | მოსამზადებელი სამუშაოების პერიოდი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1ეტ. | მოსამზადებელი სამუშაოები, რომლებიც დაკავშირებულია სამშენებლო მოედნის მოწესრიგებასთან, მათ შორის; შემარჩენებელი მწვრივ ნარგავების დაცვასა და მოწისქვილზე საინჟინრო კომუნიკაციების შენარჩენებთან | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2ეტ. | შენობა-ნაგებობის კურტინზე დაკვლევა და ძირითადი ღერძების დატანირება | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II | მშენებლობის მეორე რიგი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ძირითადი სამუშაოების პერიოდი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1ეტ. | შენობა-ნაგებობის მიწის სამუშაოები;<br>შენობა-ნაგებობის ფუძის მოწყობის სამუშაოები; | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2ეტ. | შენობა-ნაგებობის საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები;<br>ნულოვანი ციკლის დარნულება; | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3ეტ. | ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა: შენობა-ნაგებობის ნულოვანი ნიშნულიდან +3.20 ნიშნულის ჩათვლით ძირითადი კონსტრუქციების მონტაჟი; | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4ეტ. | ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა: შენობა-ნაგებობის +6.50 - +9.80 ნიშნულის ჩათვლით ძირითადი კონსტრუქციების მონტაჟი; | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5ეტ. | ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა: შენობა-ნაგებობის +13.10 - +16.40 ნიშნულის ჩათვლით ძირითადი კონსტრუქციების მონტაჟი; | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6ეტ. | ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა: შენობა-ნაგებობის +19.70 - +23.00 ნიშნულის ჩათვლით ძირითადი კონსტრუქციების მონტაჟი; | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7ეტ. | ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა: შენობა-ნაგებობის +26.30 - +29.60 ნიშნულის ჩათვლით ძირითადი კონსტრუქციების მონტაჟი; | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8ეტ. | ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა: შენობა-ნაგებობის +33.40 - +36.05 ნიშნულის ჩათვლით ძირითადი კონსტრუქციების მონტაჟი; | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9ეტ. | შენობა-ნაგებობის სახურავისა და გადახურვის მოწყობა; | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10ეტ. | არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა:<br>გარე და შიდა კედლების ბლოკით ამოყვანა. | 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11ეტ. | შენობა-ნაგებობის ლოკალური საგრძნო<br>სარეგულირების საინჟინრო-ტექნიკური ქსელების მოწყობა; | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12ეტ. | შენა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები | 210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13ეტ. | მიწის ნაკვეთის დახუფოვების და კეთილმოწყობის სამუშაოები. | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


შპს „ეკო“
404305252



Copyright LLC "ეკო". All Rights Reserved. The Duplication, Reproduction, Copying, Sale, Licensing, or any other distribution or use of these drawings in any form, hereof, or the plans depicted thereon is Strictly Prohibited unless expressly authorized in writing by "ეკო" LLC.


| | |
|---|---|
| პროექტის № PROJECT # | 2021/BGS |
| ფაზა: | |
| ნახაზის სახელწოდება SHEET NAME | ზემოთ აღნიშნული ობიექტის მშენებლობის ორგანიზაციული ნაწილის ჯალენდარული გრაფიკი |
| პროექტის სახელწოდება PROJECT NAME | საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა |

| | |
|---|---|
| შემსრულებელი: | გიორგი ჯაბუნიძე |
| პასუხისმგებელი: | გიორგი ჯაბუნიძე |
| შემოწმებულ: | ლაშა ბერდენიშვილი |
| ხელმძღვანელი: | ალექსანდრე ბასილაია |

| | |
|---|---|
| გამოშვების REV: | A |
| თარიღი: DATE: | 15-Jun-21 |

| | |
|---|---|
| მასშტაბი SCALE | NTS |
| ობიექტის № | მუშა |
| ნახაზის № SHEET | A-01 |
| ნახაზის ფურცლების რაოდენობა | -00- |
