NEW POINT
Measuremant
Cadastre
Topography

შპს „ნიუ პოინტ“
საქართველო, თბილისი, მგალობლიშვილის ქუჩა №3,
I სართული, ოფისი №3; ს/ნ: 404883943

Ltd „New point“
office N3, floor N1, 3 mgaloblishvili str. Tbilisi, Georgia
ID: 404883943
+995 32 2945808; cell phone: +995 557 704433;
www.newpoint.ge info@newpoint.ge

დემონტაჟის ორგანიზაციის პროექტი

ქ. თბილისი, გზატკეცილი წყნეთი, №37ა ს/კ:01.14.06.007.020
არსებული 1 და 3 შენობა ნაგებობის სრული დემონტაჟი

დირექტორი: გ. კირკიტაძე

შეასრულა: გ. კეკელიძე

2023წ.

დემონტაჟის კალენდარული გარფიკი

№	სამუშაოს დასახელება	თვე	I				II		III		
		დღე	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	ტერიტორიის მომზადება სადემონტაჟო სამუშაოსათვის	20	—								
2	შენობის მეორე სართულის დემონტაჟი	20		—							
3	შენობის პირველი სართულის დემონტაჟი	20			—						
4	შენობის სარდაფის დემონტაჟი	20				—	—				
	სამშენებლო ნაგვის გატანა	10							—		
	ტერიტორიის დასუფთავება	10								—	—

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება დემონტაჟის ნებართვის გაცემის დღიდან და გაგრძელდება 3 თვე.

1. სადემონტაჟო მოედნის და ობიექტის 2. დახასიათება

1.1 სადემონტაჟო ობიექტის ქვეშ განკუთვნილი ტერიტორია განთავფსებულია ქალაქ თბილისში, გზატკეცილ წყნეთის, №37ა-ში. ნაკვეთზე საკადასტრო კოდით: 01.14.06.007.020; ტერიტორია მცირედ ქანობიანია, ირგვლის ესაზღვრება მაღალსართლიანი სახლებით განაშენიანებული ნაკვეთები.

1.2 სადემონტაჟო პროექტი ითვალისწინებს წითელ ხაზებში მოქცეულ ნაკვეთზე: 1 და3 შენობის სრულად, მიწის დონემდე დემონტაჟს მთლიანი ტერიტორიის მოსუფთავებით. 2 და 4 შენობა არ არსებობს რეალურად

№1 – 1-3 - სადემონტაჟო შენობა ორ სართულიანია, საცხოვრებელი ფუნქციის დანიშნულებით.

1.3 არსებული მდგომარეობა: სადემონტაჟო ობიექტი არასაექსპლუატაციო მდგომარეობაშია და დამკვეთის მოთხოვნით ექვემდებარება სრულ დემონტაჟს, ტერიტორიის მოსუფთავებით.

1.4. ობიექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებელი შემდეგია:

ნაკვეთის ფართი - 2323 მ^2

01 შენობა:

სადემონტაჟო შენობის განაშენიაბის ფართი – 245.54 მ^2

სადემონტაჟო საერთო ფართი – 245.54 მ^2

სადემონტაჟო მოცულობა – 736.00 მ^3

1.5. ტერიტორიაზე საინჟინრო კომუნიკაციების, წყალსადენ-კანალიზაციისა და დაბალი ძაბვის ელექტროკაბელების ქსელებია დემონტაჟის დაწყებამდე აუცილებელია პროექტის მიხედვით განსაზღვრული ყველა საინჟინრო ქსელის ჩაჭრა ან გადალაგება შესაბამისი საექსპლუატაციო სამსახურების ზედამხედველობისა და ნორმატიული დებულებების მიხედვით. საექსპლუატაციო ორგანიზაციის ქვეშ დადგენილიდა კანონმდებლობითი პირობების გათვალისწინებით.

1.6. სამუშაოთა მწარმოებელმა განუხრელად უნდა ხელმძღვანელოს დამტკიცებული საპროექტო დოკუმენტაციით სადემონტაჟო ან სხვა საპროექტო გადაწყვეტილებებში ცვლილებების თვითნებური შეტანა ავტორებთან შეთანხმების გარეშე დაუშვებელია, რაც უნდა მოხდეს დადგენილი წესით შესაბამისი ხელმოწერებით ავტორებისა და პროექტის მთავარი არქიტექტორის მხრიდან.

1.7. დემონტაჟის პროცესში, სადემონტაჟო დროებითი სატრანსპორტო მოძრაობა უნდა განხორციელდეს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტთან შეთანხმებული სატრანსპორტო სქემისა და ასეთი მათითებებისა და ნორმების მიხედვით მშენებლობის დასრულების შემდეგ უნდა განხორციელდეს აღნიშნული დროებითი სატრანსპორტო სქემის მოხსნა და მოეწყოს ახალი შეთანხმებული სატრანსპორტო მოძრაობის მანიშნებელი.

2. დემონტაჟისა და ტერიტორიის გასუფთავების ხანგრძლივობის დადგენა

2.1. დემონტაჟის ხანგრძლივობის ვადებისა და მისი განხორციელების ცალკეული პერიოდების დასადგენად ხელმძღვანელობენ სნ. და წ. 1.04.03-83,, მშენებლობის ხანგრძლივობის ნორმები და მარაგნაკეთი", აღნიშნული ნორმების გათვალისწიენბით, ასევე სადემონტაჟო შენობების არასაექსპლუარაციო მონაცემების გათვალისწინებით დემონტაჟის ხანგრძლივობა განისაზღვრა 3 თვის ხანგრძლივობით.

2.2. კალენდარულ გეგმაზე ობიექტის დემონტაჟის შემოთავაზებული თანმიმდევრობა რეკომენდირებული ხასიათისაა. მისი კორექტირება შესაძლებელია სამუშაოთა წარმართვის პროცესში დამკვეთის ინტერესების გათვალისწინებით და დემონტაჟის პროცესში აღმოჩენილი შესაძლებლობებით.

2.3. ობიექტის დემონტაჟის გეგემიურ ვადებში დასრულება სავსებით შესაძლებელია უწყვეტი ფინანსირების პირობებში, რასაც ხელი უნდა შეუწყოს მშენებლობის რაიონის რბილმა კლიმატურმა პირობებმაც, აგრეთვე სამშენებლო ორგანიზაციის მძლავრმა საწარმოო მექანიზებულმა ბაზამ.

3. დემონტაჟისა და ტერიტორიის გასუფთავების განხორციელების ტექნოლოგიური ნორმალი

3.1. კალენდარული გეგმით გათვალისწინებული ფინანსური უზრუნველყოფისა და შესაძლებლობების საფუძველზე უნდა მოხდეს სამუშაოთა თანმიმდევრობის განსაზღვრა.

3.2. დემონტაჟის განხორციელების გეგმიური ხანგრძლივობა 3 თვეა, სამუშაოები უნდა წარიმართოს კალენდარული გეგმის მიხედვით. დემონტაჟი უნდა განხორციელდეს ერთი მხრიდან, მიმდევრობითი მეთოდით, ზემოდან ქვევით.

3.3 ბოლო თვეებში განხორციელდება დემონტირებული მასალის საბოლოო გატანა სადემონტაჟო მოედნიდან, მთლიანი ტერიტორიის გასუფთავება და მომზადება ახალი მშენებლობისათვის.

4. დემონტაჟის საინჟინრო მომზადება და მშენებლობის წარმართვის ცალკეული ეტაპები

4.1. ჩვენს მიერ შედგენილი მოპ-ი ითვალისწინებს სნ და 3.01-0I-85 სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია მოთხოვნილებებს მშენებლობაზე ხანძარსაწინააღმდეგო და მშენებლობის უსაფრთხო წარმოების ღონისძიებათა დაცვით.

4.2. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტის დამუშავებას საფუძვლად დაედო შემდეგი მონაცემები:

დავალება პროექტირებაზე;
არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა.
მშენებლობის რაიონის სიტუაციური გეგმა;
ტოპოგრაფიული გეგმა;
აზომვითი ნახაზები.
ობიექტის ნატურაში დათვალიერება.
სადემონტაჟო შენობების პროექტი.

4.3. დემონტაჟის ორგანიზაციის პროექტი შესრულებულია მოქმედი სამშენებლო ნორმების, წესებისა და სახელმწიფო სტანდარტების (მათ შორის ხანძარფეთქებადი უსაფრთხოების) შესაბამისობით.

4.4. მიიღებს თუ არა დამკვეთისაგან დამტკიცებულ საპროექტო დოკუმენტაციას, სადემონტაჟო ორგანიზაცია საჭიროების შემთხვევაში ამუშავებს სამუშაოთა წარმოების პროექტს. ამ პროექტის შედგენა უნდა ხდებოდეს დემონტაჟის ორგანიზაციის პროექტში მიღებული გადაწყვეტილებების შესაბამისობით და ფლობელობაში არსებული მექანიზაციის ბაზის გათვალისწინებით.

4.5. სამუშაოთა დაწყება დაიშვება საპროექტო დოკუმენტაციის საფუძველზე ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ.“თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური”-დან სათანადო ნებართვის აღების შემდეგ. მოსამზადებელ პერიოდში უნდა მოხდეს:

1. დროებითი შენობების დაყენება უსაფრთხო ადგილზე-დროებით სათავსებად (მუშების გარდერობი, საპრარაბო, ..) უნდა მოეწყოს მცირე ზომის დროებითი შენობები, ან ამისათვის სამშენებლო ფირმამ უნდა უზრუნველყოს დროებითი ე.წ. “ვაგონეტკა” საცხოვრებლების შემოტანა-დადგმა აუცილებელია
მოეწყოს წითელი ხაზების ფარგლებში.

2. ამჟამად ტერიტორია გარშემორტყმულია კაპიტალური ღობით, მაგრამ თუკი სადმე დაზიანებული იქნება, მაშინ უნდა განხორციელდეს ფრაგმენტულად დროებითი ღობის მოწყობა-ხის, ლითონის ფურცლების, ფანერის ან სხვა სახის მასალის გამოყენებით, სურვილის შემთხვევაში შეღებილი, ზედ საინფორმაციო ბანერით. საჭიროების შემთხვევაში ტროტუარის დამცავი გადახურვით, დგარების ჩაბეტონებით გრუნტში ან და მობილურ გადასატან კონსტრუქციებში. სასურველია კონკრეტულ სადემონტაჟო შენობებს დემონტაჟის დროს ჩამოეფაროს ფარდა -ბადე სპეციალურად მოწყობილ ხარაჩოზე, რათა არ მოხდეს მტვრის გაბნევა მიმდებარე საცხოვრებელ ზონაში.

3. ვინაიდან სადემონტაჟო ობიექტი განაშენიანებულ ტერიტორიაზე მდებარეობს, ამიტომ უნდა მოეწყოს შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნები, ასევე ღამის პერიოდში განათება. მაქსიმალურად უნდა იყოს ეზოს მიმდებარედ, სამუშაოებში დაუსაქმებელი პირების უსაფრთხოება გათვალისწინებული.

4. ობიექტზე არის რამდენიმე ხე-ნარგავი, სასურველია სამუშაოების დაწყებამდე ისინი შეიფუთოს დამცავი ხის ფენილით მაქ. 2მ. სიმაღლეზე (დაზიანების თავიდან აცილების მიზნით).

5. სამშენებლო მოედნის უზრუნველყოფა დროებითი წყლით და ენერგიით არსებული ქსელებიდან, აქტის შედგენა მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოების შესახებ.

4.6. სამშენებლო წარმოების უწყვეტობისა და ტექნოლოგიურობის უზრუნველსაყოფად აუცილებელია დემონტაჟის წარმართვა ცხრილში ჩამონათვალი მანქანა-მექანიზმებით, ინსტრუმენტებითა და დანადგარებით.

4.7. დემონტაჟი უნდა განხორციელდეს საავტორო და ტექნიკური ზედამხედველობის ქვეშ. დახურული სამუშაოების მიღება ავტორების კონტროლის ქვეშ დადგენილი წესით აუცილებელია.

5. მითითებები სადემონტაჟო-გასასუფთავებელ სამუშაოებზე.

5.1. დემონტაჟის ნებართვების აღების შემდეგ დაიწყება დემონტაჟის სამუშაოების წარმოება (უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით თანახმად საქართველოში მოქმედი "მშენებლობის უსაფრთხოების წესები" (დამტკიცებული საქართველოს მთავრობის 27.05.2014 №361 დაგენილებით;) და "სნ და წ 111-4-80 უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში" და სხვა ნორმატულ საკანონმდებლო დოკუმენტების მითითებების შესაბამისობით.)

5.2. განთავსდება სადემონტაჟო საინფორმაციო ბანერი, ჩაიჭრება შენობის არსებული საინჟინრო ქსელების სხვა მიმდებარე ქსელებთან მიერთებები,ამასთან გაწმენდითი სამუშაოების პარალელურად ყველა სამუშაო უნდა დაინამოს მტვრის თავიდან აცილების მიზნით. დროებით სათავსებად (მუშების გარდერობი, საპრარაბო) მოეწყობა დროებითი თავშესაფარი მიმდებარე ტერიტორიაზე წითელი ხაზების ფარგლებში შიდა ეზოში.

5.3. სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელება უნდა მოხდეს ზემოდან ქვევით და სათანადო კომისიის დასწრებით. სამუშაოების დროს უნდა იყოს გათვალისწინებული: ყველა კონსტრუქციის დროებითი გამაგრება (ხის დროებითი დამჭერი კოჭებით და შეფიცვრებით), მუშების სათანადო ინსტრუქტაჟი და უზრუნველყოფა სპეციალური ტანსაცმლით და სათვალეებით, (სიმაღლეებზე მუშების მოძრაობა-მუშაობის შემთხვევაში თითოეული მუშა უნდა იყოს დაბმული სპეც. დამჭერი თოკებით ვარდნის თავიდან აცილების მიზნით) ასევე ყველა ადამიანს უნდა აეკრძალოს კონსტრუქციების დემონტაჟის დროს მის ქვეშ ყოფნა ან გავლა); ნაგვის გატანა სპეციალური ავტოამწეების და ავტოთვითმცელების საშუალებით. აქტის შედგენა ძირითადი პერიოდის სამუშაოების შესახებ. ნაგვის ტრანსპორტირების სვლა-გეზი უნდა შეთანხდეს ქალაქის საგზაო პატრულთან. ავარიული სიტუაციის შემთხვევაში უნდა მოხდეს სამუშაოების შეჩერება და ყველა სადემონტაჟო კონსტრუქციების გამაგრება. ყველა საშიში ადგილი უნდა იყოს შემოღობილი სათანადო განათებით ღამის საათებში.

5.4. მოსამზადებელი სამუშაოების (ზემოთ ჩამოთვლილი) შესრულების შემდეგ დემონტაჟი მოხდება შემდეგი თანმიმდევრობით შენობის ერთი მხრიდან:

5.4.1. დემონტაჟის პროცესი უნდა განხორციელდეს მიმდევრობით, 01 შენობა უნდა დემონტირდეს. თვითონ დემონტაჟი უნდა იწარმოოს შემდეგნაირად: თავდაპირველად უნდა განხორციელდეს ყველა საინჟინრო ქსელის ჩაჭრა-მოხსნა, კონდიციონერების მოხსნა მთლიან სისტემასთან ერთად, გარე განათებების მოხსნა და ა. შ. ქსელების ჩაჭრის შემდეგ უნდა განხორციელდეს კარ-ფანჯრების დემონტაჟი ლითონის გისოსებთან ერთად, შემდეგ შევსებული ღიობების დემონტაჟი, პარალელურად უნდა განხორციელდეს შიდა ზედაპირების მოპირკეთებების მოხსნა (კედლების, იატაკის, ჭერების ფენილები) შემდეგ სახურავის ფენილის დემონტაჟი წყალგადამყვან სისტემასთან ერთად (ჟოლობები, მილები, ღარები, ძაბრები...), შემდეგ უნდა განხორციელდეს სახურავის ფენილის ქვეშ ხის სანივნივე სისტემის დემონტაჟი მეორე სართულის გადახურვის ჭერთან ერთად. შემდეგ დაიწყოს ზევიდან ქვევით ტიხრების დემონტაჟი, გარე კედლების დემონტაჟი. უნდა გაშიშვლდეს მთლიანად შენობის კარკასი. ამის შემდეგ უნდა განხორციელდეს ანაკრები გადახურვის ფილების დემონტაჟი ერთი მხრიდან მიმდევრობით, მონოლითური რკინაბეტონის ანაკრები ფილები დემონტირდება ამწე მექანიზმების გამოყენებით. ამწე მექანიზმებით უნდა მოხდეს თითოეული ანაკრები კონსტრუქციის დაჭერა სპეციალური ე.წ. ტროსებით ან თოკებით და შემდეგ უნდა ჩაიჭრას გადაბმებში ანაკრები კონსტრუქცია, მოხსნილი კონსტრუქცია ისევ ამწის გამოყენებით უნდა დაწყობილ იქნას მიმდებარე ტერიტორიაზე ან მანქანა მექანიზმებზე. ანაკრები კონსტრუქციების მოხსნის პერიოდში მათ ქვეშ მუშა-მოსამსახურეთა მოძრაობა სასტიკად აკრძალულია. რამდენიმე ადგილას გადახურვა წარმოდგენილია ხის მასალით, მათი დეონტაჟი უნდა განხორციელდეს ხელის მექანიზმებით, ჯერ უნდა მოიხსნას ფენილი, შემდეგ კოჭები და ა. შ. გადახურვის ფილების დემონტაჟის შემდეგ დემონტირდება პირველი სართულის კედლები, შემდეგ კარკასი, შემდეგ საძირკვლები, ანაკრები საძირკვლების შემთხვევაში დემონტაჟი განხორციელდება ზემოთაღწერილი მეთოდით, შენობაში მონოლითური კონსტრუქციების შემთხვევაში ფრაგმენტულად დაიბურღება ხელის საბურღი მექანიზმით ნაწილ-ნაწილ ფრაგმენტებად მონოლითური კონსტრუქცია, არმირების გაშიშვლების

შემდეგ მაქს. 3 მ2 ფართის არმირება უნდა დაჭერილ იქნას ამწეზე გამობმით, შემდეგ გამობმულ დაჭერილი სექციის ხელის მექანიზმებით ჩაჭრა უნდა განხორციელდეს, ჩაჭრილ-მოხსნილი სექცია უნდა განთავსდეს ავტოთვითმცლელზე და გატანილ იქნას ტერიტორიიდან. ასე უნდა განხორციელდეს მიმდევრობით შემდეგი სექციებიც. შენობის დემონტაჟთან ერთად უნდა დემონტირდეს უკანა მხრიდან შენობის ღია ტერასა ეზოს კიებეებტან ერთად. შენობის დემონტაჟი უნდა განხორციელდეს შენობის ქვეშ მიწის ნიშნულამდე.

თავდაპირველად უნდა განხორციელდეს საინჟინრო ქსელის ჩაჭრა-მოხსნა, შემდეგ ლითონის კარის დემონტაჟი, შემდეგ უნდა განხორციელდეს აგურის კედლების დემონტაჟი ზევიდან ქვევით, შემდეგ უნდა განხორციელდეს რკინაბეტონის კონსტრუქციების დემონტაჟი 01 შენობის დემონტაჟის მსგავსად.

დემონტაჟის პარალელურად და დასასრულს უნდა განხორციელდეს ყველა კონსტრუქციისა და ზედმეტი ნაგვის გატანა ობიექტიდან, ტერიტორია მთლიანად უნდა მოსუფთავდეს და მომზადებულ იქნას ახალი მშენებლობისათვის.

დემონტაჟი უნდა განხორციელდეს ინჟინერ-სპეციალისტის მეთვალყურეობის ქვეშ. კატეგორიულად უნდა აიკრძალოს მუშა-მოსამსახურეთა მოძრაობა სადემონტაჟო კონსტრუქციების ქვეშ.

5.5.სამშენებლო ნაგვის გატანა მოხდება ავტოთვითმცლელებით.
5.6.სამშენებლო წარმოების უწყვეტობისა და ტექნოლოგიურობის უზრუნველსაყოფად აუცილებელია მშენებლობის წარმართვა ცხრილში ჩამოთვლილი მანქანა-მექანიზმებით, ინსტრუმენტებითა და დანადგარებით. სამუშაოები უნდა შესრულდეს სნ და წ III-15-80-ით გათვალისწინებული მოთხოვნების სრული დაცვით.

6. რეკომენდირებული მანქანა-დანადგარები, მექანიზმები და ინსტრუმენტები

6.1. ენებლობის ნორმების უწყვეტი რითმისა და ტექნოლოგიურობის უზრუნველსაყოფად აუცილებელია მისი აღჭურვა თანამედროვე ტექნიკური საშუალებებით. მათი რეკომენდირებული ჩამონათვალი მოცემულია ცხრილში:

№	დასახელება	მარკა	რაოდენობა
1	2	3	4
1	თვითმცლელი, ძარიანი სპეც. ტრანსპორტი, სამშენებლო ნაგვის ტერიტორიიდან გასაზიდად	სხვადასხვა	4
2	ექსკავატორი დემონტირებული მასალის გადასაადგილებლად	სხვადასხვა	2
3	სააგტომობილო ტანამედროვე ამწე	სხვადასხვა	2
4	ხელის სანგრევი ჩაქუჩები (პერფორატორი)	ცალი	5
5	ლითონის ელექტრომჭრელები (ბარგალკები)	კომპლექტი	2
6	ე.წ. "ბობკატი"	ცალი	2
7	პნევმატური ინსტრუმენტი: საჭრელი, საბურღი და ა.შ.	კომპლექტი	20
8	პნევმატური ინსტრუმენტი: საჭრელი, საბურღი და ა.შ.	კომპლექტი	10
9	შხვადასხვა დანიშნულების ხელის მოწყობილობა-ინსტრუმენტები: ნიჩბები, ბარები, ლომები, წერაქვები და სხვა	კომპლექტი	10

6.2. რეკომენდებული მანქანა-დანადგარები და ინსტრუმენტ-მოწყობილობები შესაძლოა შეიცვალოს ანალოგიურით ან უფრო თანამედროვეთი.

7. მშენებლობაზე შრომისა და ელექტროუსაფრთხოების წესების დაცვა

მომუშავეთა შრომის უსაფრთხოების ღონისძიებები სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების ყველა ეტაპზე უნდა იყოს დაცული თანახმად საქართველოში მოქმედი "მშენებლობის უსაფრთხოების წესები" (დამტკიცებული საქართველოს მთავრობის 27.05.2017წ. №361 დაგენილებით;) და "სნ და წ 111-4-80 უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში" და სხვა ნორმატულ-საკანონმდებლო დოკუმენტების მითითებების შესაბამისობით. მათგან ყურადღება მახვილდება შემდეგზე:

7.1. სამუშაო ადგილები მუშაობის პირობებისა და ტექნოლოგიურობის გათვალისწინებით უზრუნველყოფილ უნდა იყოს კოლექტიური დაცვისა და სიგნალიზაციის საშუალებებით.

7.2. ზედმეტი ნაგვის და გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმცლელებზე უნდა წარმოებდეს გვერდიდან ან უკანა მხრიდან.

7.3. მოხსნილი ღირებული დეტალების, კონსტრუქციების და ნაკეთობების დასაწყობება უნდა მოხდეს მათზე ტექნოლოგიური მოთხოვნილებების პირობათა გათვალისწინებით; ამავე დროს ისინი უნდა დაეწყოს მოსწორებულ ადგილზე, რომ მათი მოცურებაც არ მოხდეს.

7.4. ელექტრო უსაფრთხოების წესები ჩამოყალიბებულია საქ. სტანდარტში 12.1.013-88. ელექტროკარადა ყოველთვის უნდა იყოს ჩაკეტილ მდგომარეობაში, ელექტროკაბელები, ელექტროსადენები და მოწყობილობები კი იზოლირებული. გაშიშვლებული სადენების გამოყენება აკრძალულია.

7.5. სადემონტაჟო მოწყობილებათა ჩართვა (საწეველები, სხვადასხვა ელექტრო აპარატები და სხვა) მიმდებარე ელექტროქსელში აკრძალულია. ელექტროქსელის სამსახურის ტექზედამხედველობის სამსახურთან შეთანხმებით ნებადართული სატრანსფორმატორო ქვესადგურიდან უნდა მოხდეს სამწვერიანი ელექტროკაბელის შემოყვანა დახურულ კარადაში, მრიცხველის დაყენება საიდანაც ძალოვანი და გასანათებელი სადენები გაიმართება მომხმარებლისაკენ.

7.6. ელექტროსაწეველას და სხვა მანქანა მექანიზმების მუშაობის პეროდში მის ქვეშ ან სიახლოვეს უცხო და სამშენებლო ოპერაციებში დაუსაქმებელ პირთა ყოფნა აკრძალულია. უცხო პირთა, აგრეთვე სამშენებლო ოპერაციებში დაუსაქმებელ მუშა-მოსამსახურეთა ყოფნა სამშენებლო მოედანზე და მის სიახლოვეს სახიფათო ზონაში დაუშვებელია. მექანიზმების მუშაობის დროს მოშორებით დგება მესიგნალე და აწესრიგებს როგორც ფეხმავალთა, ასევე ავტოტრანსპორტის მოძრაობას.

7.7. სამუშაოთა უწყვეტობისა და ტექნოლოგიურობის უზრუნველსაყოფად აუცილებელია მშენებლობის აღჭურვა ცხრილში ჩამოთვლილი მანქანა-მექანიზმებით, ინსტრუმენტებითა და დანადგარ-სამარჯვებით.

8. ეკოლოგია და ბუნების დაცვის საკითხები

8.1. დემონტაჟის პროცესში აუცილებელია განხორციელდეს სპეციალური ღონისძიებები მიმდებარე ტერიტორიის დამტვერიანების თავიდან ასაცილებლად.

8.2. დემონტაჟის სამუშაოების შესრულების პერიოდში ფასადებს საჭიროა ჩამოეფაროს ფარდა, რათა ამ შემთხვევაშიც არ მოხდეს მტვრის გაბნევა სელიტებულ ზონაში.

8.3. დაუშვებელია არსებულ საკანალიზაციო ჭებში ბეტონ და ხსნარმილსადენების ჩარეცხვა ან მათი დანაგვიანება სამშენებლო ნარჩენებით.

8.4. ზემოთ მითითებული დებულებებიდან გამომდინარე მშენებლობა უნდა განხორციელდეს ბუნების დაცვითი და ჰაერის გაბინძურების საწინააღმდეგო ღონისძიებების დაცვით მომქმედი საკანონმდებლო აქტებისა და ნორმატული დოკუმენტების შესაბამისობით.

9. მოპ-ის შედგენისათვის ნორმატული ბაზა

9.1. სნ და წ 3. 0.1 0.1-85 “სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია”.

9.2. სნ და წ 1. 0.4 0.3-85 “მშენებლობის ხანგრძლივობის ნორმები საცხოვრებელი სახლრბი მშენებლობაზე”.

9.3. ენებლობის ორგანიზაციის პროექტის შედგენის ეტალონი სახრეთის მთიანი რაიონისათვის.

9.4. კრებული-სამახსოვრო „სამშენებლო წარმოების ნორმები და წესები „ამონაკრები მომქმედი სამშენებლო ნორმებიდან და წესებიდან”, ურბანიზაციისა და მშენებლობის სამინისტროს გამოცემა, თბილისი, 1987 წელი ქართულ ენაზე.

9.5. და წ III – 4-80 “უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე”

miwis nakveTis topografiuli gegma

New Point

qalaqi Tbilisi, gzatkecili wyneTi, #37a (s/k: 01.14.06.007.020)
i.b.a. `kaza-bagebi~-is (s/n: 205229670) sakuTrebaSi arsebuli 2323 kv.m. arasasoflo-sameurneo
daniSnulebis miwis nakveTis da misi mimdebare teritoriis topografiuli gegma

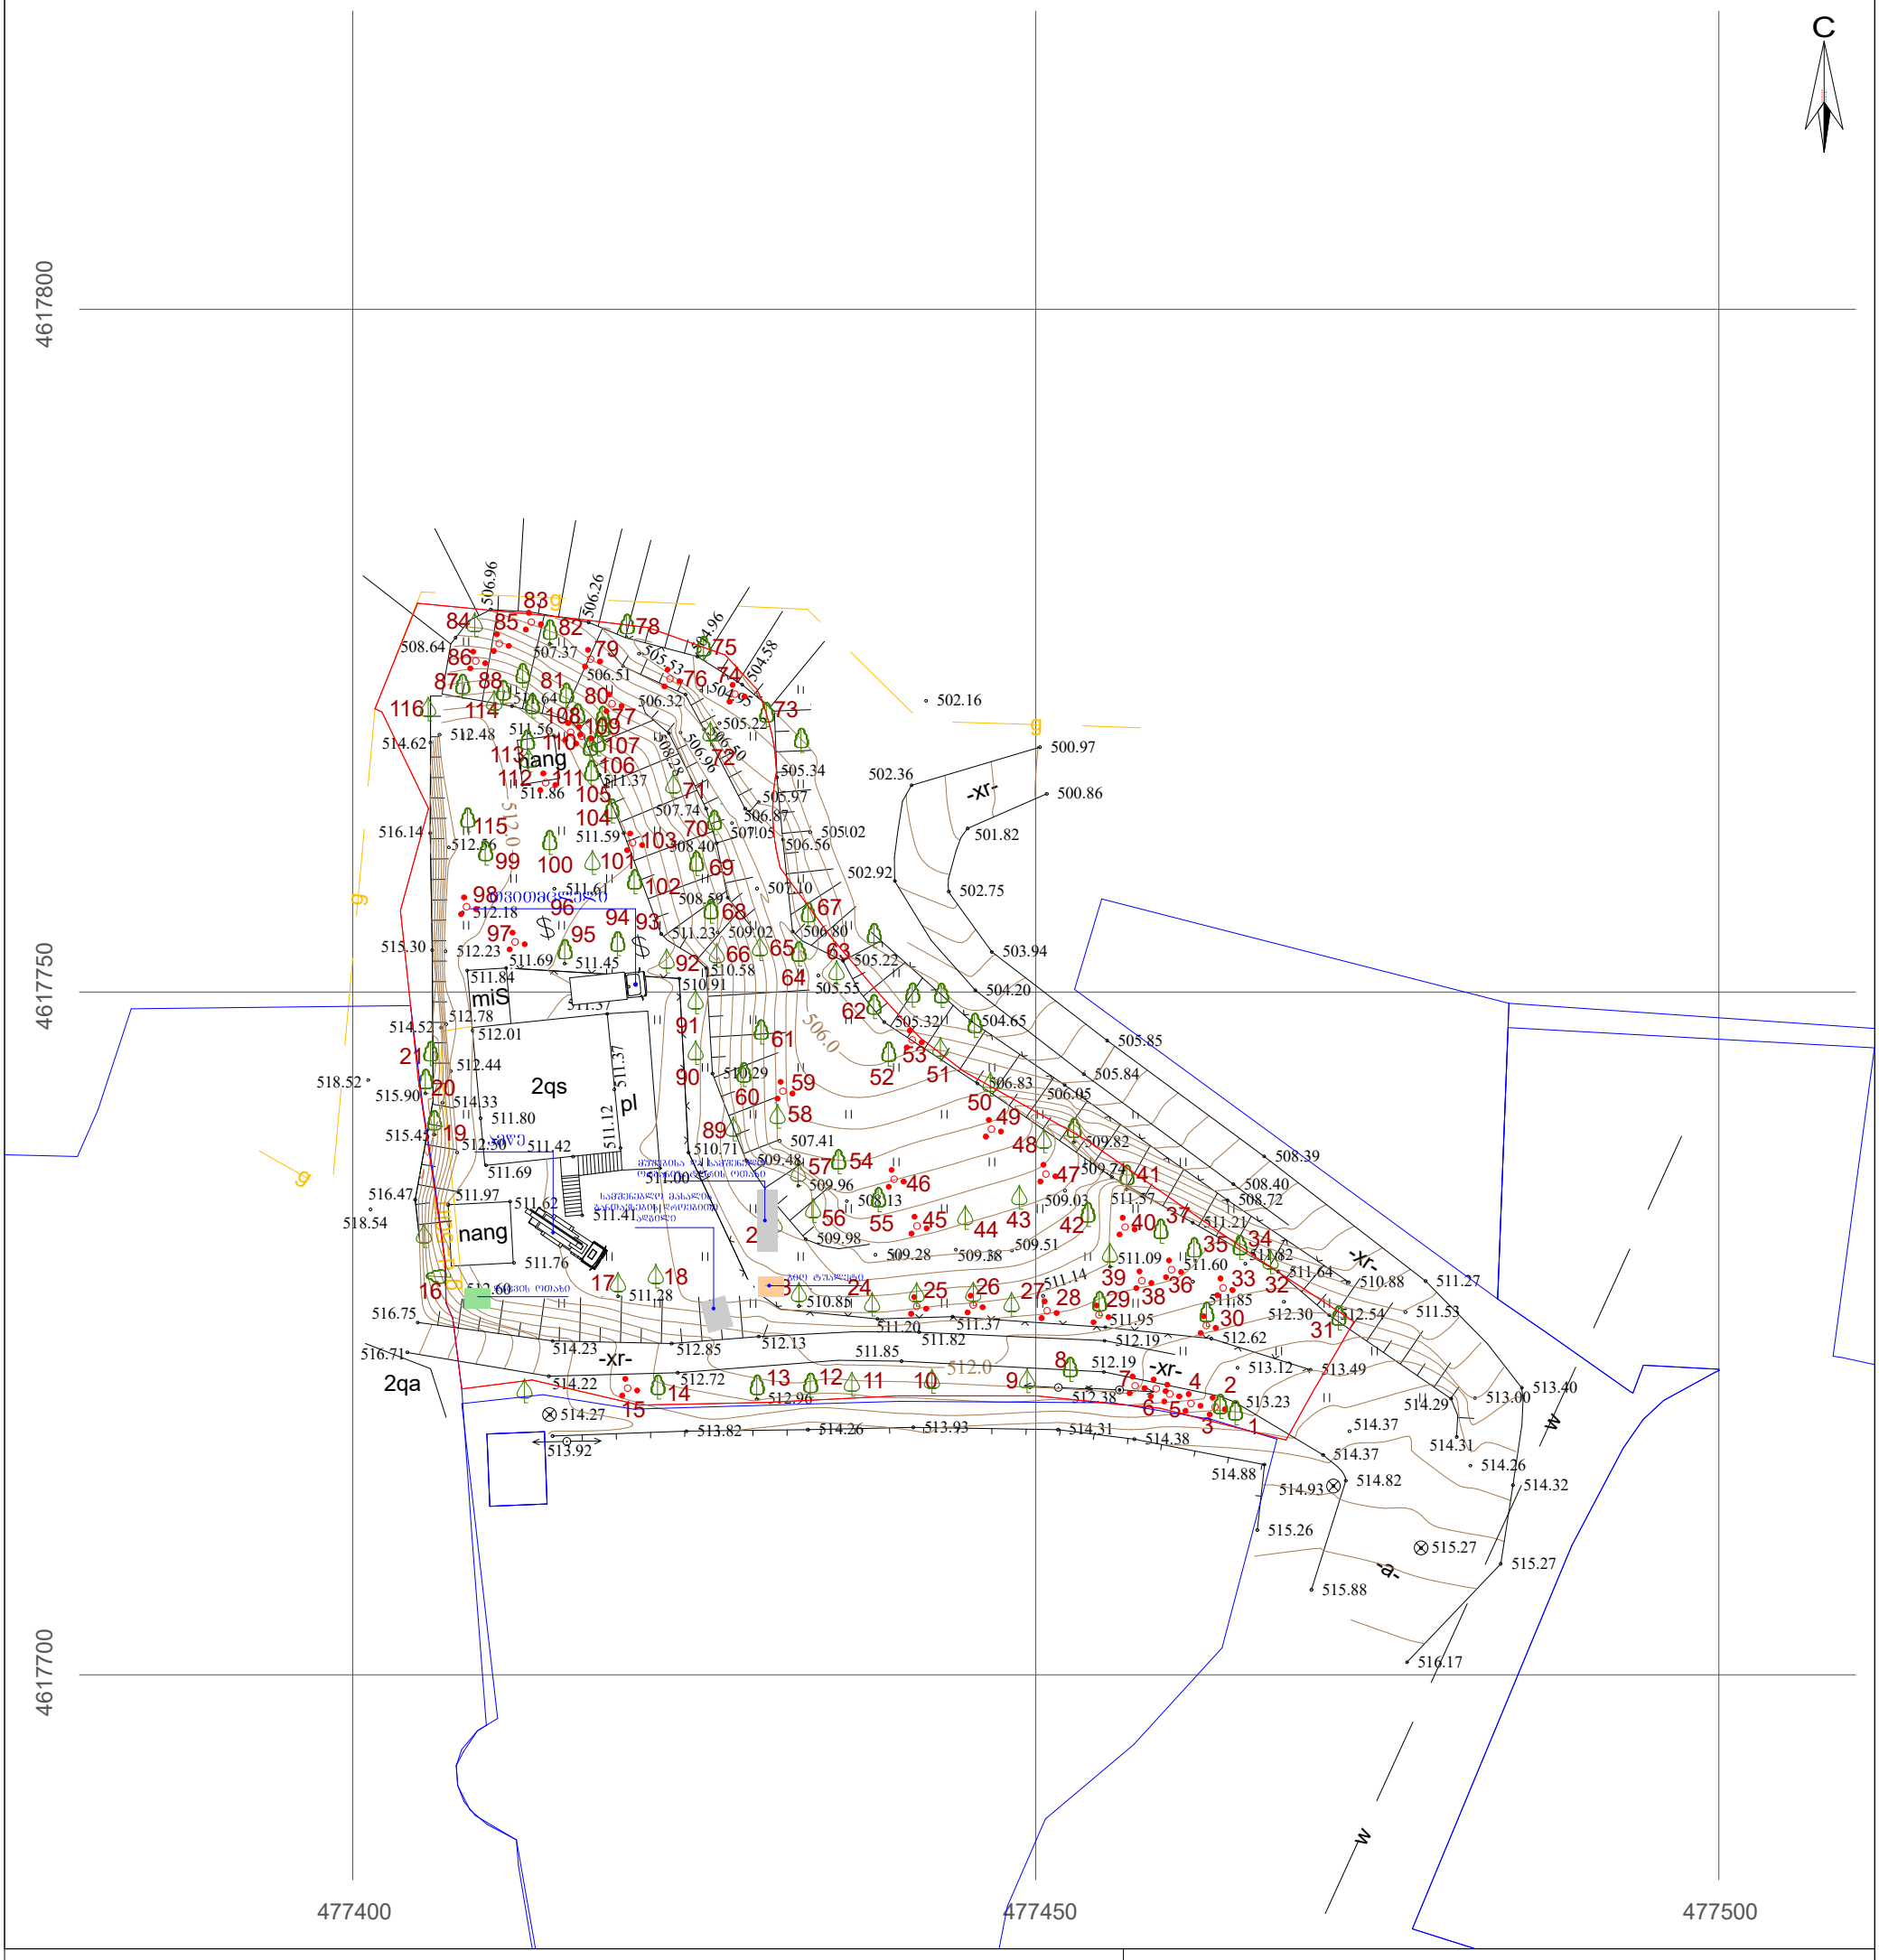

pirobiTi aRniSvnebi

WGS 1984 -is koordinatTa sistemis UTM proeqcia

qs	sacx. Senoba	xis Robe	w	wyalgayvaniloba
qa	arasacx. Senoba	Robe	g	gazi
	farduli	liTonis Robe	k	kanalizacia
	mSenebare Senoba	qvis kedeli	san	saniaRvre
	wiwvovani xe	kedeli	kg	kavSirgabmuloba
	foTlovani xe	flate	el. qselebi	
	xilkenkrovani	rkinigza	Tg	gaTboba
	mcenare/ palma/vazi	sameTvalyureo Webi		
	gare ganaTeba	el. gadamcemi xazi		

SeniSvna: 1) gegmaze datanilia sajaro reestrSi registrirebuli nakveTis sazRvrebi
2) vinadan gegmaze datanilia mxolod registrirebuli miwisqveSa komunikaciebi maTi mdebareobebis dazusteba moxdes yvela komunikaciis warmomadgenlebTan

New Point

Sps `niu point~
saqarTvelo, Tbilisi, mgaloblisvilis quCa #3,
I sarTuli, ofisi #3; s/n: 404883943
www. newpoint.ge info@newpoint.ge
tel:/ tel: +995 32 2945808; mob: /cell phone: +995 557 704433;

Ltd `NewPoint~
office N3, floor N1, 3 mgaloblishvili str.
Tbilisi, Georgia ID: 404883943

direqtori:		g. kirkitaZe
azoma:		v. virsalaZe
daxaza:		v. virsalaZe
maStabi: 1:500	formati: A3	20/08/2022 w.

შენობა ნაგებობა 1
I სართულის გეგმა

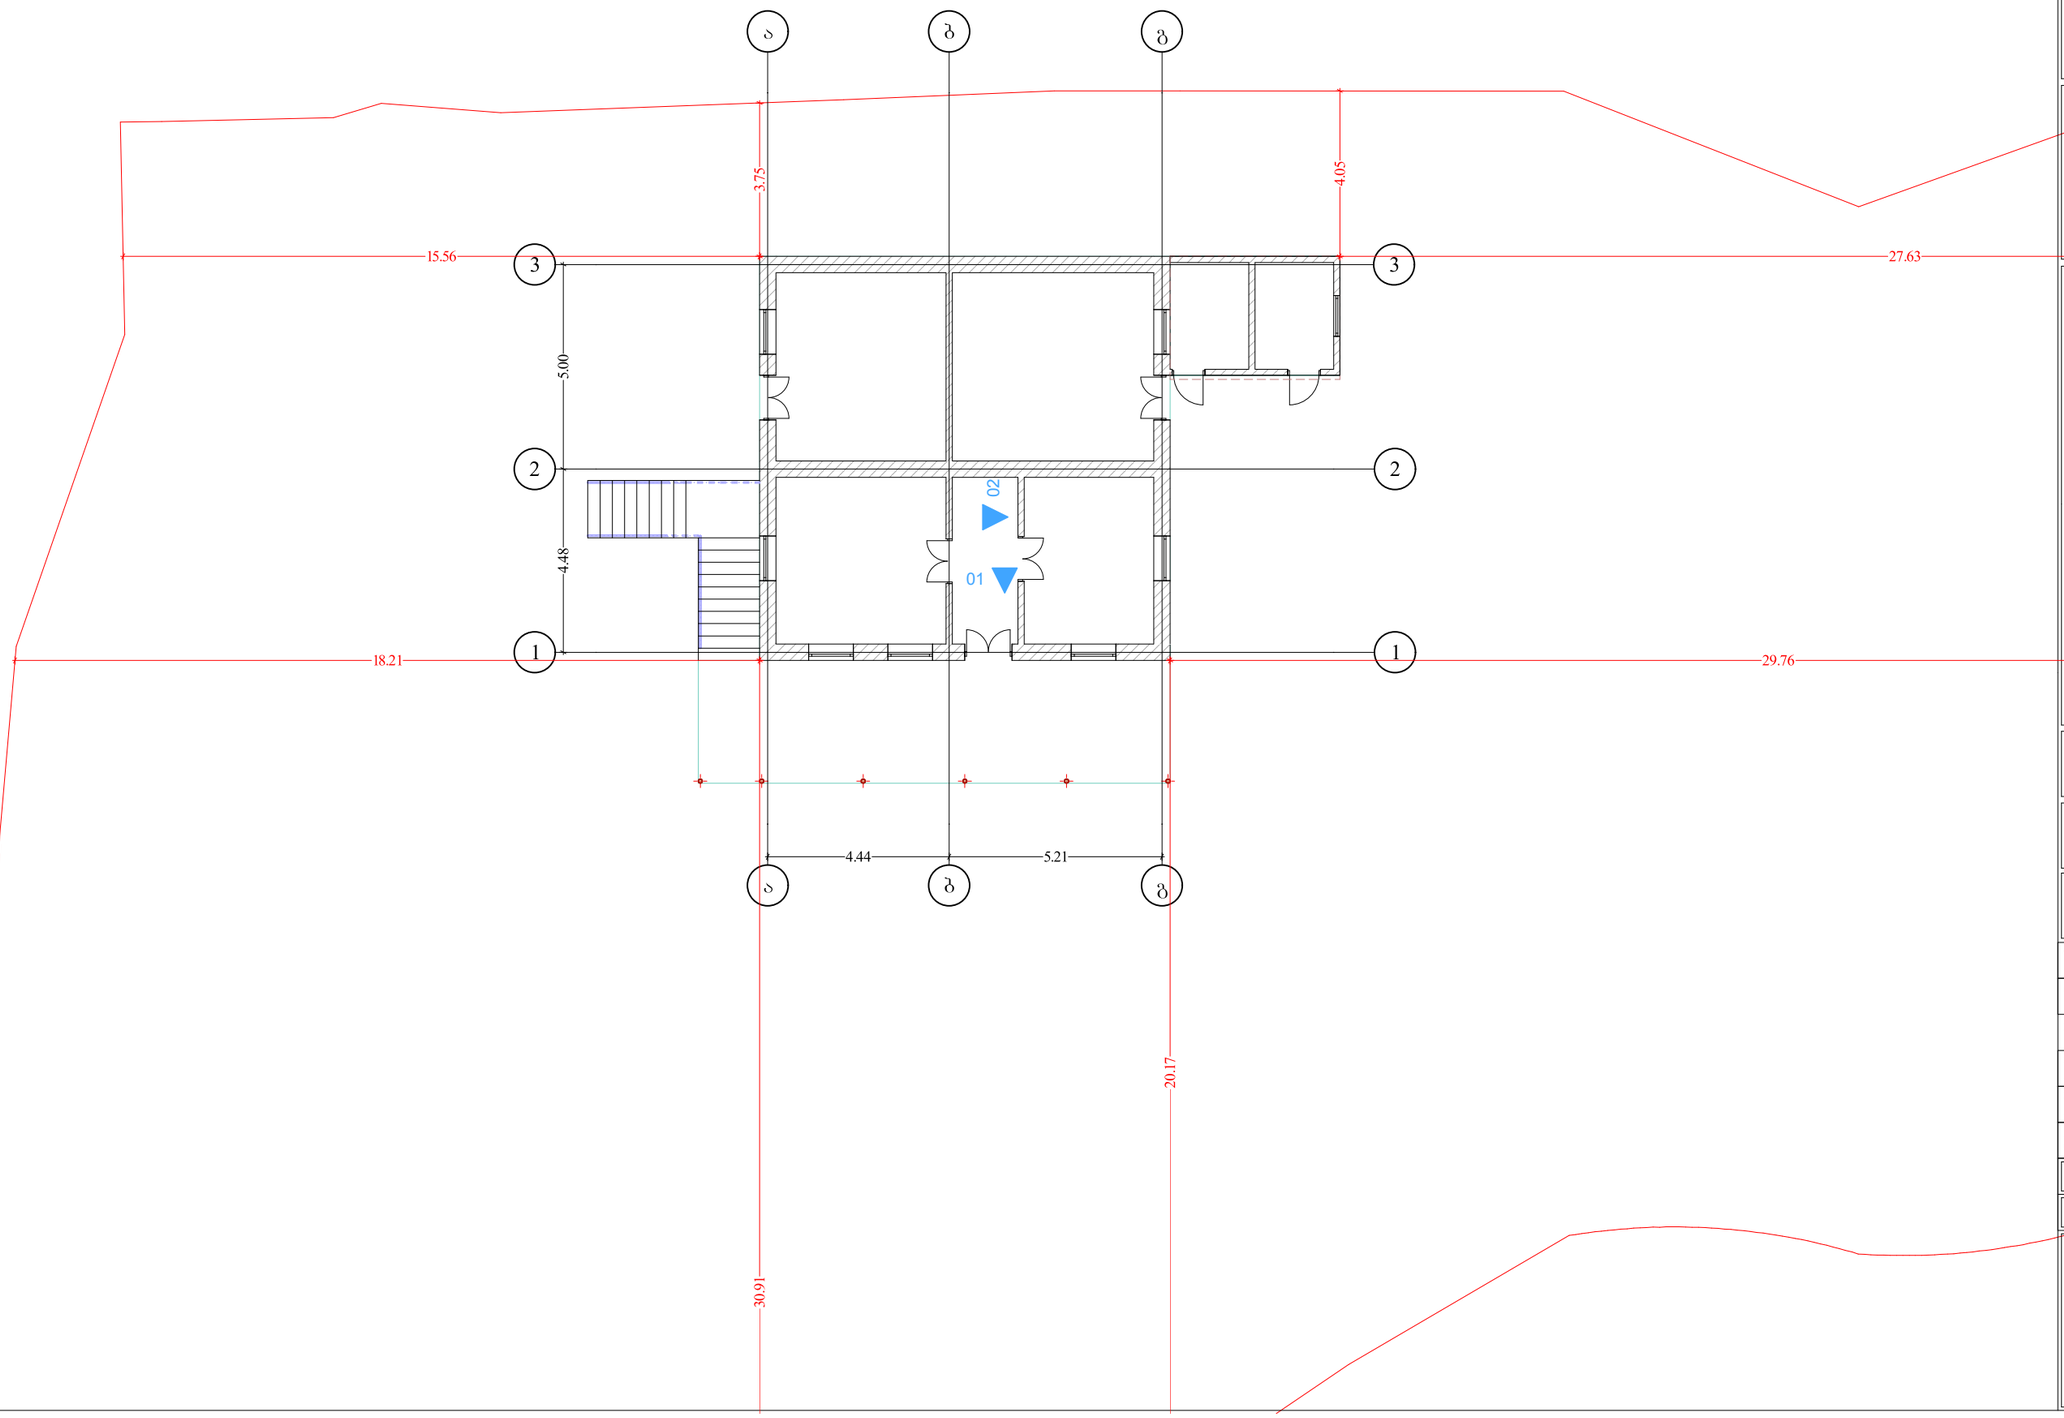

NEW POINT
Measuremant
Cadastre
Topography

შპს „ნიუ პოინტ“
საქართველო, თბილისი, მგალობლიშვილის ქუჩა №3,
I სართული, ოფისი №3; ს/ნ: 404883943
Ltd „New point“
office N3, floor N1, 3 mgaloblishvili str. Tbilisi, Georgia
ID: 404883943
+995 32 2945808; cell phone: +995 557 704433;
www.newpoint.ge info@newpoint.ge

შენიშვნები — Notes

ექსპლიკაცია — Explication

ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები — Technical-econimic indicators

ქალაქი თბილისი, გზატკეცილი წყნეთი, №37ა (ს/ნ:01.14.06.007.020)

განაშენიანების ფართობი 245.54 მ^2

სართულების რაოდენობა 2

პროექტის დასახელება — Project

სათავსო

დამკვეთი — Client

დალი ტიგიშვილი (ID:01024066153)

მისამართი — Address

ქალაქი თბილისი, გზატკეცილი წყნეთი, №37ა (ს/ნ:01.14.06.007.020)

თანამდებობა Position	სახელი გვარი Name Nurame	ხელმოწერა Signature
დირექტორი Director		გ. კირკიტაძე
პროექტის ავტორი Author		გ. კვკვლიძე
არქიტექტორი Architector		გ. კვკვლიძე
არქიტექტორი Architector		
კონსტრუქტორი Constructor		

არქიტექტურული ნაწილი
architecture

ნახაზი Drawing	თარიღი Date of issue	06/06/2023
	მასშტაბი Scale	1:150
	სტადია Stage	პროექტი
	ფორმატი Paper size	A3
	ფაილის სახელი File name	
	ფურცელი Pages	

შენობა ნაგებობა 1
II სართულის გეგმა

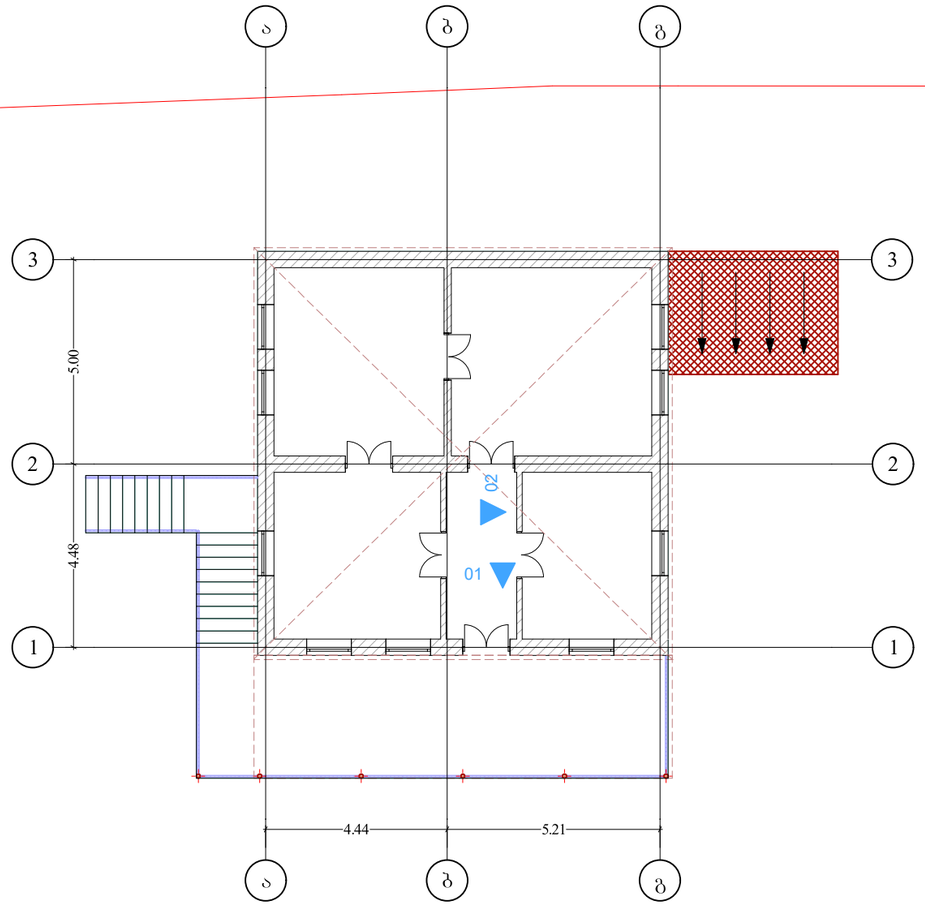

NEW POINT
Measuremant
Cadastre
Topography

შპს „ნიუ პოინტ“
საქართველო, თბილისი, მცხეთისქუჩის ქუჩა №3,
I სართული, ოფისი №3; ს/კ: 404883943
Ltd „New point“
office N3, floor N1, 3 mgaloblishvili str. Tbilisi, Georgia
ID: 404883943
+995 32 2945808; cell phone: +995 557 704433;
www.newpoint.ge info@newpoint.ge

შენიშვნები — Notes

ექსპლიკაცია — Explication

ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები — Technical-econimic indicators

ქალაქი თბილისი, გზატკეცილი წყნეთი, №37ა (ს/კ:01.14.06.007.020)

განაშენიანების ფართობი 245.54 მ²

სართულების რაოდენობა 2

პროექტის დასახელება — Project

სათავსო

დამკვეთი — Client

დალი ტიგიშვილი (ID:01024066153)

მისამართი — Address

ქალაქი თბილისი, გზატკეცილი წყნეთი, №37ა (ს/კ:01.14.06.007.020)

თანამდებობა Position	სახელი გვარი Name Nurame	ხელმოწერა Signature
დირექტორი Director		გ. კირკიტაძე
პროექტის ავტორი Author		გ. კეკელიძე
არქიტექტორი Architector		გ. კეკელიძე
არქიტექტორი Architector		
კონსტრუქტორი Constructor		

არქიტექტურული ნაწილი
architecture

ნახაზი Drawing	თარიღი Date of issue	06/06/2023
	მასშტაბი Scale	1:150
	სტადია Stage	პროექტი
	ფორმატი Paper size	A3
	ფაილის სახელი File name	
	ფურცელი Pages	

შენობა ნაგებობა 1
სახურავის გეგმა

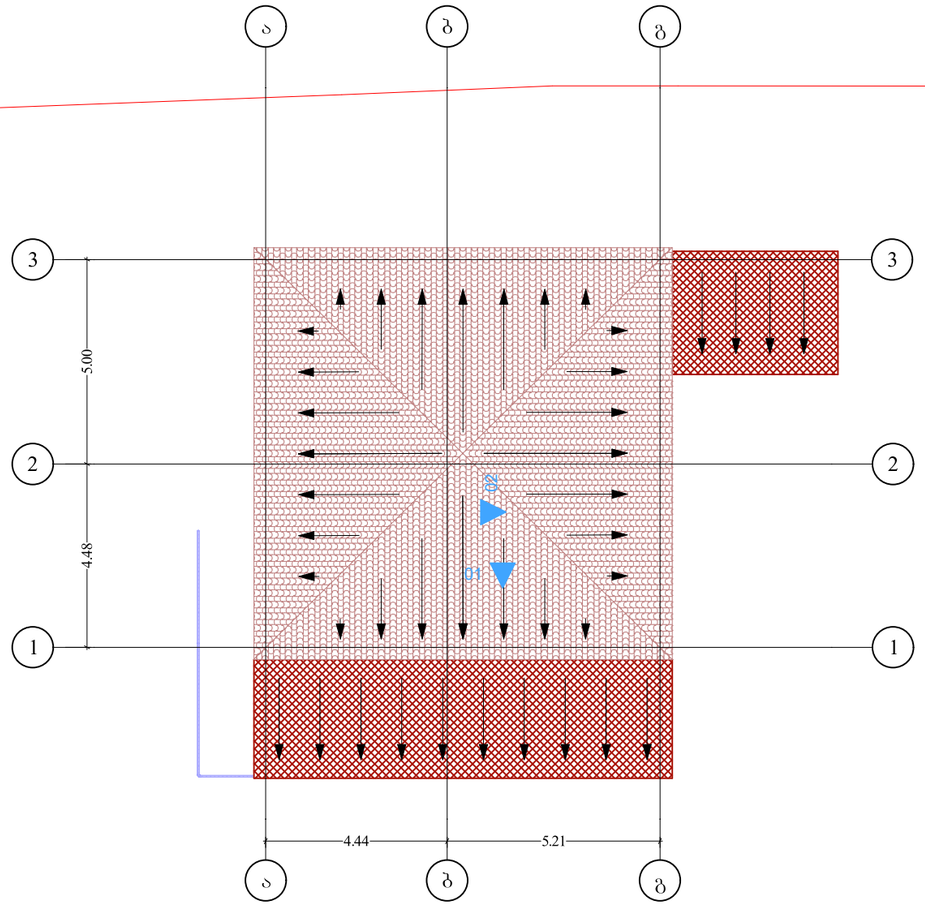

NEW POINT
Measuremant
Cadastre
Topography

შპს „ნიუ პოინტ“
საქართველო, თბილისი, მცხეთისგზისპირის ქუჩა №3, I სართული, ოფისი №3; ს/ნ: 404883943
Ltd „New point“
office N3, floor N1, 3 mgaloblishvili str. Tbilisi, Georgia
ID: 404883943
+995 32 2945808; cell phone: +995 557 704433;
www.newpoint.ge info@newpoint.ge

შენიშვნები — Notes

ექსპლიკაცია — Explication

ტექნიკურ-ეკონომიური მაჩვენებლები — Technical-econimic indicators

ქალაქი თბილისი, გზატკეცილი წყნეთი, №37ა (ს/ნ:01.14.06.007.020)

განაშენიანების ფართობი 245.54 მ²

სართულების რაოდენობა 2

პროექტის დასახელება — Project

სათავსო

დამკვეთი — Client

დალი ბიგიშვილი (ID:01024066153)

მისამართი — Address

ქალაქი თბილისი, გზატკეცილი წყნეთი, №37ა (ს/ნ:01.14.06.007.020)

თანამდებობა Position	სახელი გვარი Name Nurame	ხელმოწერა Signature
დირექტორი Director		გ. კირკიტაძე
პროექტის ავტორი Author		გ. კეკელიძე
არქიტექტორი Architector		გ. კეკელიძე
არქიტექტორი Architector		
კონსტრუქტორი Constructor		

არქიტექტურული ნაწილი
architecture

ნახაზი Drawing	თარიღი Date of issue	06/06/2023
	მასშტაბი Scale	1:150
	სტადია Stage	პროექტი
	ფორმატი Paper size	A3
	ფაილის სახელი File name	
	ფურცლები Pages	

შენობა ნაგებობა 1
ფასადი 3-1

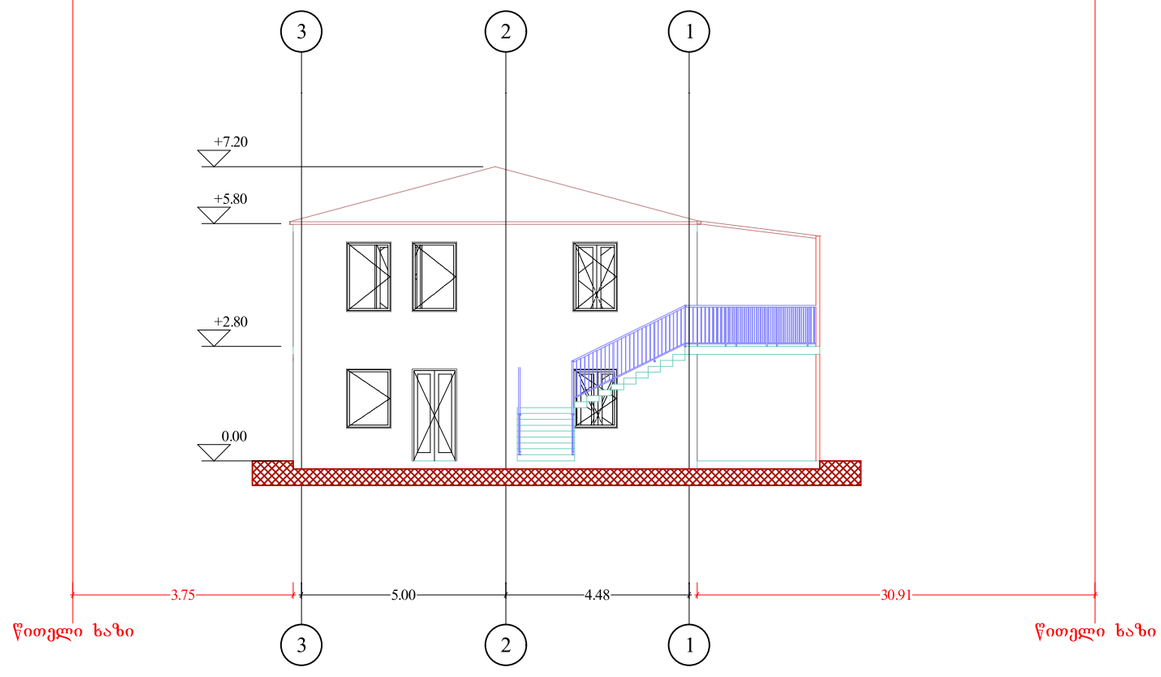

NEW POINT
Measuremant
Cadastre
Topography

შპს „ნიუ პოინტ"
საქართველო, თბილისი, მგალობლიშვილის ქუჩა №3,
I სართული, ოფისი №3; ს/ნ: 404883943
Ltd „New point"
office N3, floor N1, 3 mgaloblishvili str. Tbilisi, Georgia
ID: 404883943
+995 32 2945808; cell phone: +995 557 704433;
www.newpoint.ge info@newpoint.ge

შენიშვნები — Notes

ექსპლიკაცია — Explication

ტექნიკურ-ეკონომიური მაჩვენებლები — Technical-econimic indicators

ქალაქი თბილისი, გზატკეცილი წყნეთი, №37ა (ს/კ:01.14.06.007.020)

განაშენიანების ფართობი 245.54 მ²

სართულების რაოდენობა 2

პროექტის დასახელება — Project

სათავსო

დამკვეთი — Client

დალი ტიგიშვილი (ID:01024066153)

მისამართი — Address

ქალაქი თბილისი, გზატკეცილი წყნეთი, №37ა (ს/კ:01.14.06.007.020)

თანამდებობა Position	სახელი გვარი Name Nurame	ხელმოწერა Signature
დირექტორი Director		გ. კორკიტაძე
პროექტის ავტორი Author		გ. კეკელიძე
არქიტექტორი Architector		გ. კეკელიძე
არქიტექტორი Architector		
კონსტრუქტორი Constructor		

არქიტექტურული ნაწილი
architecture

ნახაზი Drawing	თარიღი Date of issue	06/06/2023
	მასშტაბი Scale	1:150
	სტადია Stage	პროექტი
	ფორმატი Paper size	A3
	ფაილის სახელი File name	
	ფურცელი Pages	

შენობა ნაგებობა 1
ფასადი გ-ა

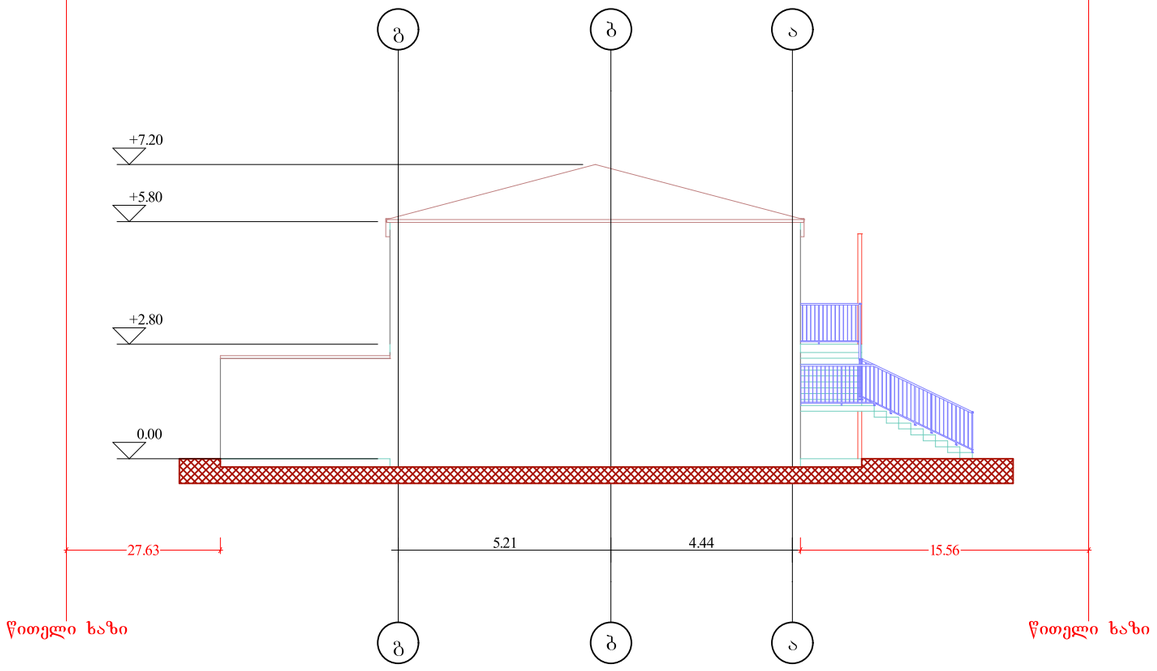

NEW POINT
Measuremant
Cadastre
Topography

შპს „ნიუ პოინტ"
საქართველო, თბილისი, მგალობლიშვილის ქუჩა №3,
I სართული, ოფისი №3; ს/ნ: 404883943

Ltd „New point"
office N3, floor N1, 3 mgaloblishvili str. Tbilisi, Georgia
ID: 404883943
+995 32 2945808; cell phone: +995 557 704433;
www.newpoint.ge info@newpoint.ge

შენიშვნები — Notes

ექსპლიკაცია — Explication

ტექნიკურ-ეკონომიური მაჩვენებლები — Technical-econimic indicators

ქალაქი თბილისი, გზატკეცილი წყნეთი, №37ა (ს/ნ:01.14.06.007.020)

განაშენიანების ფართობი 245.54 მ²

სართულების რაოდენობა 2

პროექტის დასახელება — Project

სამუშაო

დამკვეთი — Client

დალი ტიგიშვილი (ID:01024066153)

მისამართი — Address

ქალაქი თბილისი, გზატკეცილი წყნეთი, №37ა (ს/ნ:01.14.06.007.020)

თანამდებობა Position	სახელი გვარი Name Nurame	ხელმოწერა Signature
დირექტორი Director		გ. კირკიტაძე
პროექტის ავტორი Author		გ. კეკენლიძე
არქიტექტორი Architector		გ. კეკენლიძე
არქიტექტორი Architector		
კონსტრუქტორი Constructor		

არქიტექტურული ნაწილი
architecture

ნახაზი Drawing	
თარიღი Date of issue	06/06/2023
მასშტაბი Scale	1:150
სტადია Stage	პროექტი
ფორმატი Paper size	A3
ფაილის სახელი File name	
ფურცელი Pages	

შენობა ნაგებობა 1
ფასადი 1-3

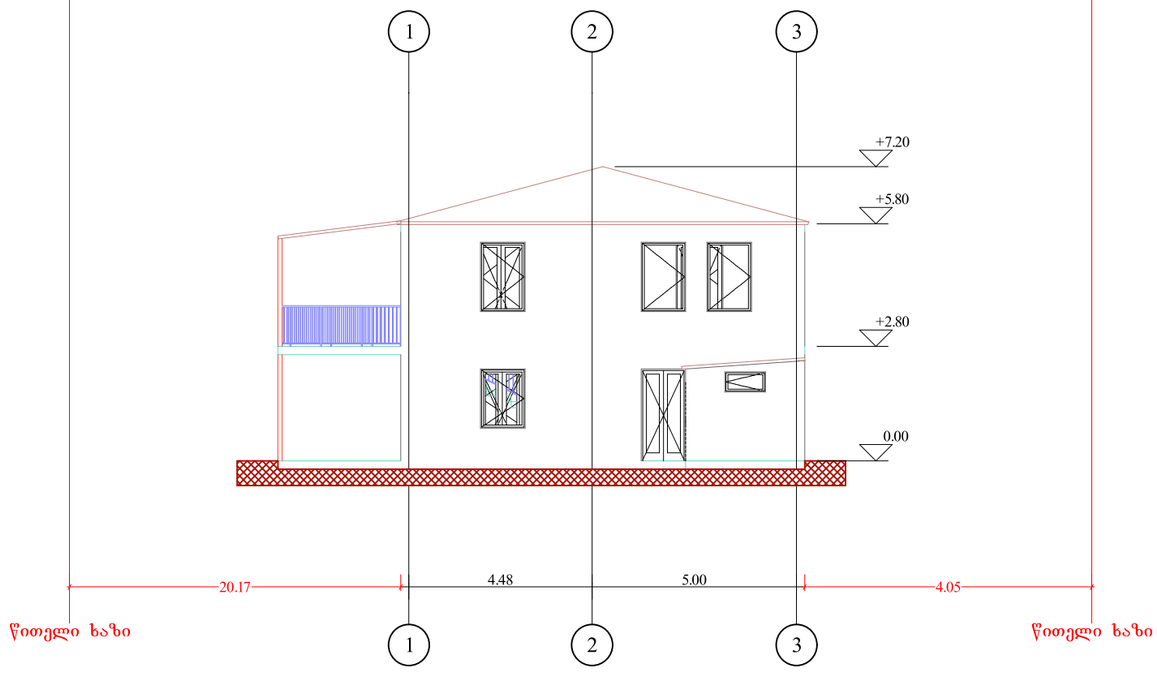

NEW POINT
Measuremant
Cadastre
Topography

შპს „ნიუ პოინტ“
საქართველო, თბილისი, მგალობლიშვილის ქუჩა №3,
I სართული, ოფისი №3; ს/ნ: 404883943
Ltd „New point“
office N3, floor N1, 3 mgaloblishvili str. Tbilisi, Georgia
ID: 404883943
+995 32 2945808; cell phone: +995 557 704433;
www.newpoint.ge info@newpoint.ge

შენიშვნები — Notes

ექსპლიკაცია — Explication

ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები — Technical-econimic indicators

ქალაქი თბილისი, გზატკეცილი წყნეთი, №37ა (ს/ს:01.14.06.007.020)

განაშენიანების ფართობი 245.54 მ²

სართულების რაოდენობა 2

პროექტის დასახელება — Project

სათავსო

დამკვეთი — Client

დალი ტიგიშვილი (ID:01024066153)

მისამართი — Address

ქალაქი თბილისი, გზატკეცილი წყნეთი, №37ა (ს/ს:01.14.06.007.020)

თანამდებობა Position	სახელი გვარი Name Nurame	ხელმოწერა Signature
დირექტორი Director		გ. კირკიტაძე
პროექტის ავტორი Author		გ. კეკელიძე
არქიტექტორი Architector		გ. კეკელიძე
არქიტექტორი Architector		
კონსტრუქტორი Constructor		

არქიტექტურული ნაწილი
architecture

ნახაზი Drawing	თარიღი Date of issue	06/06/2023
	მასშტაბი Scale	1:150
	სტადია Stage	პროექტი
	ფორმატი Paper size	A3
	ფაილის სახელი File name	
	ფურცელი Pages	

შენობა ნაგებობა 1
ფასადი ა-გ

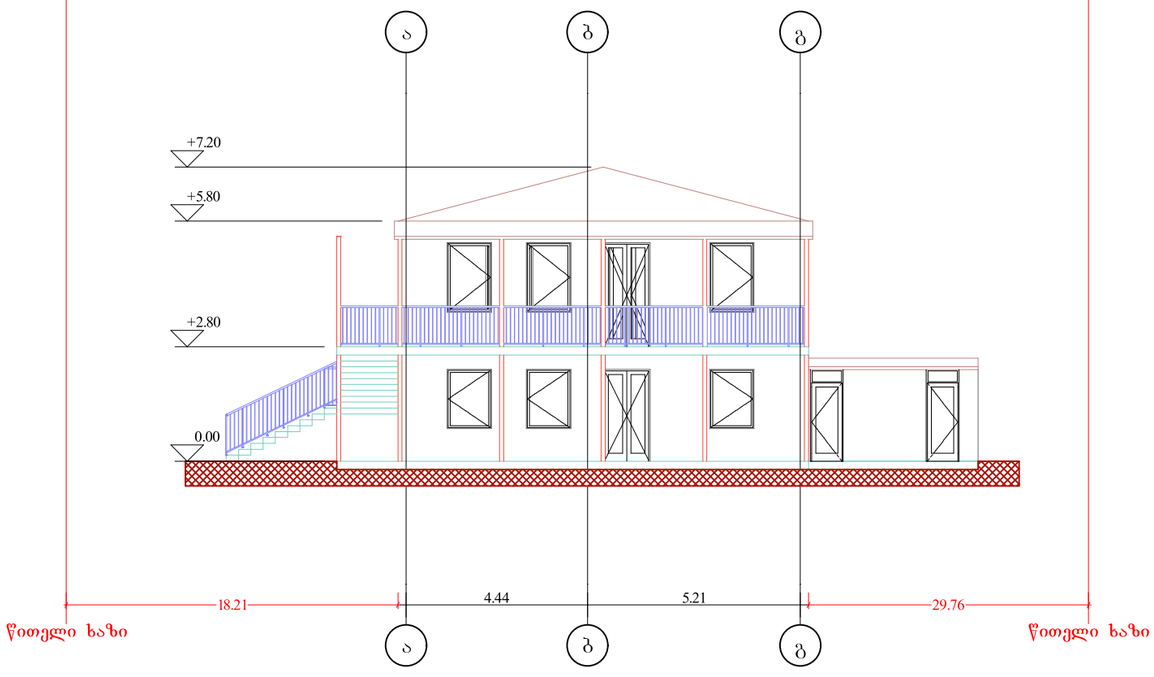

NEW POINT
Measuremant
Cadastre
Topography

შპს „ნიუ პოინტ"
საქართველო, თბილისი, მგალობლიშვილის ქუჩა №3,
I სართული, ოფისი №3; ს/ნ: 404883943
Ltd „New point"
office N3, floor N1, 3 mgaloblishvili str. Tbilisi, Georgia
ID: 404883943
+995 32 2945808; cell phone: +995 557 704433;
www.newpoint.ge info@newpoint.ge

შენიშვნები — Notes

ექსპლიკაცია — Explication

ტექნიკურ-ეკონომიური მაჩვენებლები — Technical-econimic indicators

ქალაქი თბილისი, გზატკეცილი წყნეთი, №37ა
(ს/ნ:01.14.06.007.020)

განშენიანების ფართობი 245.54 მ²

სართულების რაოდენობა 2

პროექტის დასახელება — Project

სათავსო

დამკვეთი — Client

დალი ტიგიშვილი (ID:01024066153)

მისამართი — Address

ქალაქი თბილისი, გზატკეცილი წყნეთი, №37ა
(ს/ნ:01.14.06.007.020)

თანამდებობა Position	სახელი გვარი Name Nurame	ხელმოწერა Signature
დირექტორი Director		გ. კორკიტაძე
პროექტის ავტორი Author		გ. კაკაძე
არქიტექტორი Architector		გ. კაკაძე
არქიტექტორი Architector		
კონსტრუქტორი Constructor		

არქიტექტურული ნაწილი
architecture

ნახაზი Drawing	თარიღი Date of issue	06/06/2023
	მასშტაბი Scale	1:150
	სტადია Stage	პროექტი
	ფორმატი Paper size	A3
	ფაილის სახელი File name	
	ფურცელი Pages	

შენობა ნაგებობა 1
ჭრილი 02

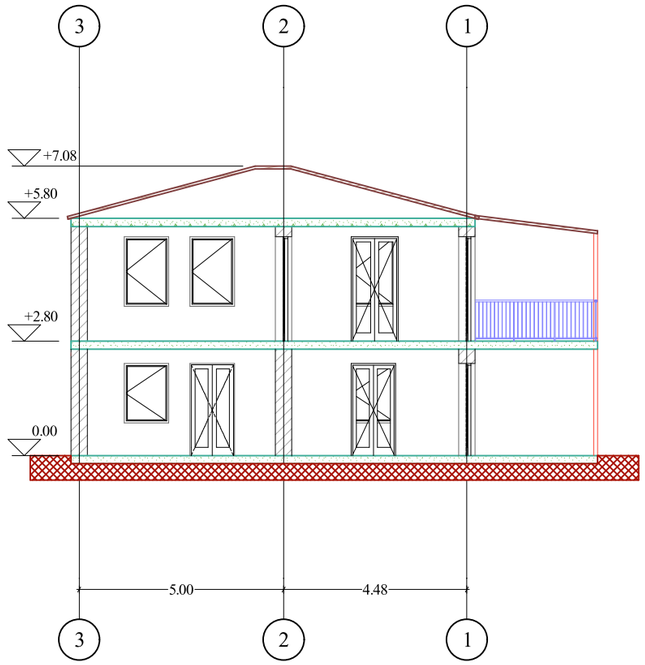

NEW POINT
Measuremant
Cadastre
Topography

შპს „ნიუ პოინტ“
საქართველო, თბილისი, მგალობლიშვილის ქუჩა №3,
I სართული, ოფისი №3; ს/ნ: 404883943

Ltd „New point“
office N3, floor N1, 3 mgaloblishvili str. Tbilisi, Georgia
ID: 404883943
+995 32 2945808; cell phone: +995 557 704433;
www.newpoint.ge info@newpoint.ge

შენიშვნები — Notes

ექსპლიკაცია — Explication

ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები — Technical-econimic indicators

ქალაქი თბილისი, გზატკეცილი წყნეთი, №37ა (ს/ს:01.14.06.007.020)

განაშენიანების ფართობი 245.54 მ²

სართულების რაოდენობა 2

პროექტის დასახელება — Project

სათავსო

დამკვეთი — Client

დალი ტიგიშვილი (ID:01024066153)

მისამართი — Address

ქალაქი თბილისი, გზატკეცილი წყნეთი, №37ა (ს/ს:01.14.06.007.020)

თანამდებობა Position	სახელი გვარი Name Nurame	ხელმოწერა Signature
დირექტორი Director		გ. კირკიტაძე
პროექტის ავტორი Author		გ. კეკელიძე
არქიტექტორი Architector		გ. კეკელიძე
არქიტექტორი Architector		
კონსტრუქტორი Constructor		

არქიტექტურული ნაწილი
architecture

ნახაზი Drawing	თარიღი Date of issue	06/06/2023
	მასშტაბი Scale	1:150
	სტადია Stage	პროექტი
	ფორმატი Paper size	A3
	ფაილის სახელი File name	
	ფურცელი Pages	

შენობა ნაგებობა 1
ჭრილი 01

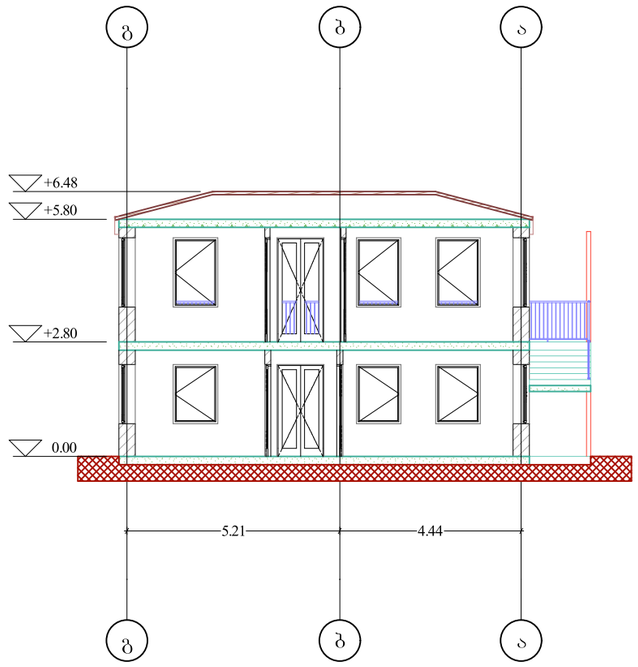

NEW POINT
Measuremant
Cadastre
Topography

შპს „ნიუ პოინტ“
საქართველო, თბილისი, მგალობლიშვილის ქუჩა №3,
I სართული, ოფისი №3; ს/ნ: 404883943
Ltd „New point“
office N3, floor N1, 3 mgaloblishvili str. Tbilisi, Georgia
ID: 404883943
+995 32 2945808; cell phone: +995 557 704433;
www.newpoint.ge info@newpoint.ge

შენიშვნები — Notes

ექსპლიკაცია — Explication

ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები — Technical-econimic indicators

ქალაქი თბილისი, გზატკეცილი წყნეთი, №37ა (ს/ს:01.14.06.007.020)

განაშენიანების ფართობი 245.54 მ²

სართულების რაოდენობა 2

პროექტის დასახელება — Project

სათავსო

დამკვეთი — Client

დალი ტიგიშვილი (ID:01024066153)

მისამართი — Address

ქალაქი თბილისი, გზატკეცილი წყნეთი, №37ა (ს/ს:01.14.06.007.020)

თანამდებობა Position	სახელი გვარი Name Nurame	ხელმოწერა Signature
დირექტორი Director		გ. კირკიტაძე
პროექტის ავტორი Author		გ. კეკელიძე
არქიტექტორი Architector		გ. კეკელიძე
არქიტექტორი Architector		
კონსტრუქტორი Constructor		

არქიტექტურული ნაწილი
architecture

ნახაზი Drawing	თარიღი Date of issue	06/06/2023
	მასშტაბი Scale	1:150
	სტადია Stage	პროექტი
	ფორმატი Paper size	A3
	ფაილის სახელი File name	
	ფურცელი Pages	
