მშენებლობის ორგანიზაციის
პროექტი

ARCHITECTURE
NEO-A
CONSULTING

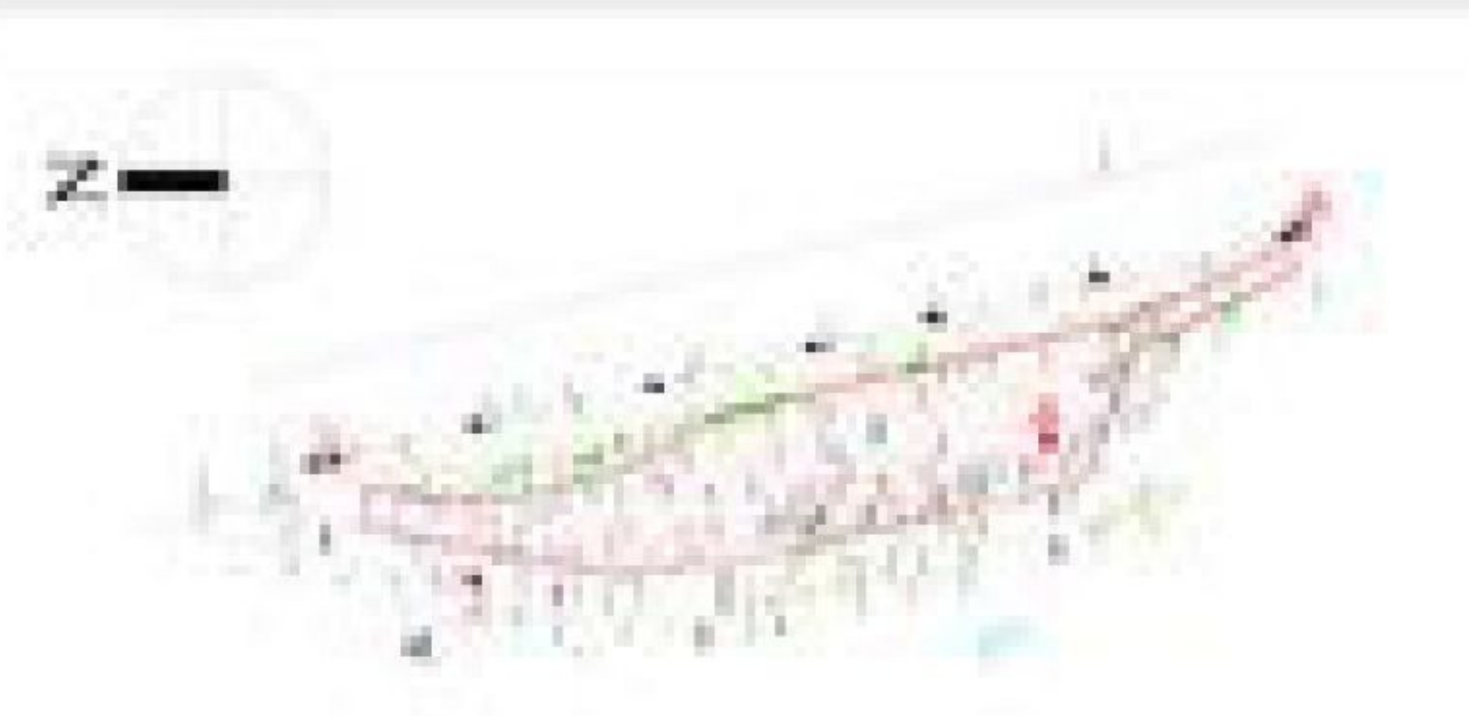

A2

11.13

DWG

„მოპ„ მარკის ნახაზების უწყისი

რიგ №	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	შენიშვნა
1	საერთო მონაცემები	
2	მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი	
3		

განმარტებითი ბარათი

1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებული შემოკლებულ ვარიანტში .
2. ქ. თბილისის სამშენებლო უბანი, ტერიტორიების ზოგადი რაიონირების სქემის მიხედვით მიეკუთვნება 8 ბალიან ზონას .
3. საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება საამშენებლო ნორმების და წესების - **СНиП** 1.04.03-85 , T = 2 თვე .

4 მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში მომუშავეთა შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვა მიღებულია **СНиП** III-4-80* მიხედვით.

5. გარემოს დაცვის ღონისძიებანი :
   - პროექტირების დროს და შემდგომ მშენებლობაში გამოყენებული იყოს ნაკლებად ტოქსიკური საამშენებლო მასალები .
   - მოცემულ პროექტში აღნიშნულია მშენებლობის მოქმედების არიალი (საამშენებლო მოედანი) , აუცილებლად უნდა იყოს შემოღობილი. გარემოს დაცვის სამსახურის ნებართვის გარეშე , მშენებლობის სიახლოვეს იკრძალება მრავალწლიანი ხეების და ნარგავების მოჭრა - განადგურება. დაუშვებელია არსებულ საკანალიზაციო ჭებში ბეტონის ხსნარ - მილსადენების ჩარეცხვა ან მათი დანაგვიანება საამშენებლო ნარჩენებით .

ARCHITECTURE
NEO-A
CONSULTING

საპროექტო ჯგუფი



ავტო მომსახურების ცენტრი
მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

A2

11.13

DWG

8-100

ავტომომსახურეობის ცენტრის მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№№	სამუშაოს დასახელება	გან-ბა	რ-ბა	1 თვე				2 თვე			
				1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	დღე	5								
2	საინფორმაციო დაფის მოწყობა	დღე	5								
3	სარეკლამო ღობის მოწყობა	დღე	20								
4	სარემონტო სამუშაოებია	დღე	60								

ARCHITECTURE

NEO-A

CONSULTING

საპროექტო ჯგუფი



ავტო მომსახურების ცენტრი

მშენებლობის ორგანიზების პროექტი

A2

11.13

DWG

A-100
