მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

მშენებლობის ორგანიზების პროექტი

დამკვეთი :	შპს "დიდი დიღომი რეზიდენს"
შემსრულებელი ორგანიზაცია :	შპს "სტუდიო ალფა სახლი"
პროექტის ავტორი :	მ. პაპუკაშვილი



საკადასტრო მონაცემები	ს.კ. 01.10.06.022.011
ობიექტის მისამართი	ქ. თბილისი, დასახლება დიდი დიღომი, პეტრე იბერის ქუჩის შესახვევი N13
ფუნქციური დანიშნულება	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ქ. თბილისი

2024 წ.

ობიექტის დასახელება : მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კომპლექსი (კომერციული და საცხოვრებელი)

ობიექტის მისამართი : ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქუჩის შესახვევი N13

ს.კ. 01.10.06.022.011

მშენებლობის ორგანიზების პროექტი

შემსრულებელი ორგანიზაცია : შპს „ალფა სახლი“ ს.კ. 404664573

ქ. თბილისი 2023

საერთო ნაწილი

საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქუჩის შესახვევი N13, ს.კ. 01.10.06.022.011. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის სამშენებლო სამუშაოების მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია შპს „ალფა სახლის“ მიერ. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტის შემუშავებისას გამოყენებულ იქნა პროექტით მიღებული არქიტექტურული და კონსტრუქციული გადაწყვეტები, მშენებლობის რაიონის სიტუაციური გეგმა, ნაკვეტის საინჟინრო გეოლოგიური კვლევა, ნაკვეთის გეოდეზიური მონაცემები. წინამდებარე „სამუშაოთა ორგანიზაციის პროექტი“ დამუშავებულია ქვეყანაში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების და ტექნიკურ-ნორმატიული დოკუმენტების საფუძველზე:

1. სნდაწ 3.01.01-85* - „სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია“;
2. სნდაწ 1.04.03-85 - „მშენებლობის ხანგრძლივობის ნორმები“;
3. სნდაწ III-4-80- „უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში”
4. კრებული სამახსოვრო ქართულ ენაზემოქმედი სნ და წ ამონაკრები -საქართველოს ურბანიზაციისა და მშენებლობის სამინისტროს გამოცემა. თბილისი 1987 წ;
5. შ. ბაქანიძე, მ. ლორთქიფანიძე, - „ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე“ ქ.თბილისი, 2006წ;
6. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 27 მაისის # 361-ე დადგენილება - „მშენებლობის უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი“.
7. საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის # 477 დადგენილება - „სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი“.
8. საქართველოს მთავრობის დადგენილება N255 2019 წლის 31 მაისი ქ. თბილისი მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების წესისა და პირობების შესახებ;
9. სნდაწ 3.03.01-87 -„მზიდი და შემომფარგლავი კონსტრუქციები“;
10. სნ და წ 3.04.03-85 - “კოროზიისგან სამშენებლო კონსტრუქციებისა და ნაგებობების დაცვა” ასევე სხვა მეთოდურ-ნორმატიული დამხმარე დოკუმენტაციის საფუძველზე.

ნაკვეთი თავისი დანიშნულების მიხედვით არასასოფლო სამეურნეოა, მასზე იგეგმება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის (კომერციული და საცხოვრებელი) განთავსება მიწის ნაკვეთის ფართობი შეადგენს 40 230 კვ.მეტრს. ტერიტორია ხასიათდება რთული რელიეფით. +480.50 და +485.85 ნიშნულები. დონეთა შორის სხვაობა შეადგენს 5.35 მეტრს. შენობის ნულოვანი ნიშნული : ±0.00 = +488.00. საპროექტო კომპლექსი მოიცავს 4 შენობა-ნაგებობას. საპროექტო ტერიტორია წარმოადგენს მეორე სექტორს, როგორც ჩრდილოეთით ისე აღმოსავლეთით ესაზღვრება განაშენიანების რეგულირების გეგმით გათვალისწინებული დანარჩენი სექტორები, ხოლო სამხრეთით და დასავლეთით - მისასვლელი გზა. ტერიტორიაზე დაგეგმილია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის (კომერციული და საცხოვრებელი) განთავსება.

შენობების სართულიანობა განსაზღვრულია შემდეგნაირად:
ორი მიწისქვეშა სართული, -2 სართული სიმაღლით h=3.0 მ და -1 სართული სიმაღლით h=3.35 მ.
ოცდასამი მიწისზედა სართული, 1 სართული სიმაღლით h=6.0 მ,
2 - 22 სართულები სიმაღლით h=3.3 მ, ხოლო 23-ე სართული სიმაღლით h=4.5 მ.
საპროექტო შენობა მიეკუთვნება 4 კლასს.
კლასის განმსაზღვრელი პარამეტრები : შენობის სიმაღლე - 82.50 მ.
შენობის ჯამური მოშენების ფართობი - 31767.8 კვ.მ
კონსტრუქციული სქემა - ნაგებობა გადაწყვეტილია რკინაბეტონის კარკასულ ვარიანტში, დიაფრაგმებით და არმირებული ბეტონის კედლებით. საპროექტო შენობის გაბარიტული ზომები : მიწისქვეშა ნაწილი - 46,00 X 58,00; მიწისზედა ნაწილი 21,70 X 55,70;
გეგმაში მარტივი კონფიგურაციის ფორმის.
შენობას გააჩნია კომბინირებული საძირკველი, კერძოდ ხიმინჯები და ფილა. ზომები ღერძებში 57.50 X 45.50;
კონსტრუქციული ელემენტები (სართ. გადახურვის ფილა, სვეტი, რიგელი, ა.შ.)
სართულშუა გადახურვის ფილა - 20 სმ.
რიგელები - 50X50(h)სმ;
სვეტები - 50X50 სმ, 80X50 სმ; 100X50 სმ; 120X50 სმ; 140X50 სმ; 150X50 სმ;
კიბე - მონოლითური რკ.ბეტონის;
მონოლითური რკ.ბეტონის კედლები - 30 სმ.; 20სმ;
სახურავი - ე.წ. ბრტყელი გადახურვა;
საძირკვლის ფუძედ მიჩნეული გრუნტის მახასიათებლები:
დასახელება - ქვიშაქვა მცირე სიმტკიცის - წარმოადგენს კლდოვან ქანს, მცირე სიმტკიცის ქვიშაქვებს. გრუნტს აქვს სიმტკიცის და დეფორმაციის მაღალი მაჩვენებელი და რეკომენდირებულია ფუძის გრუნტად.
საძირკვლის ტიპი - ბურღვით-ნატენი ხიმინჯები კლდოვან ქანებში ჩაანკერებით.
საანგარიშო წინაღობა Rc=12.1 მპა
თოვლის საფარის წონა - 0,50 კპა;
ქარის წნევის ნორმატიული მნიშვნელობა - 0,85 კპა;
დასკვნა - მშენებლობისთვის გამოყოფილ უბანი და მის ირგვლივ არსებული ტერიტორია მიეკუთვნება დაბალი გეოლოგიური საფრთხის ზონას. მიწის ნაკვეთი მდგრადია და მასზე და მის მიმდებარედ სახიფათო გეოლოგიური მოვლენები გავრცელებული არ არის.

შენიშვნა: ვინაიდან მიწის ნაკვეთზე გათვალისწინებულია რელიეფის ცვლილება, შენობის ქვაბულიდან ამოღებული მიწა დასაწყობდება საპროექტო ტერიტორიაზე.

ობიექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები

შენობა 5

1. მიწის ნაკვეთის ფართობი - 40230 კვ.მ
2. განაშენიანების ფართობი - 31 767.8 კვ.მ
3. საერთო ფართობი - 29 104.2 კვ.მ
4. კომერციული ფართობი - 696.3 კვ.მ
5. საცხოვრებელი ფართობი - 20 088.1 კვ.მ
6. საზაფხულო ფართობი - 4 062.9 კვ.მ
7. ავტოფარეხების - 2 366.5 კვ.მ
8. კიბის უჯრედის ფართობი - 2 691.3 კვ.მ
9. სასაწყობე ფართობი - 416 კვ.მ
10. დამხმარეს ფართობი - 36.6 კვ.მ
11. სამშენებლო მოცულობა - 113 395 კუბ.მ
12. სამშენებლო მოცულობა 0.00 ნიშნულის ზემოთ - 96 453 კუბ.მ
13. სამშენებლო მოცულობა 0.00 ნიშნულის ქვემოთ - 16 942 კუბ.მ
14. შენობა-ნაგებობის კონსტრუქციული სიმაღლე - 89.95 მ.
15. კონსტრუქციული სიმაღლე 0.00 ნიშნულის ზემოთ - 82.4 მ.
16. კონსტრუქციული სიმაღლე 0.00 ნიშნულის ქვემოთ - 7.55 მ.
17. განაშენიანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (სსზ-2) კ1 - 1142.4 კვ.მ.
18. განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (სსზ-2) კ2 - 22 171.9 კვ.მ.
19. გამწვანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (სსზ-2) კ3 - 16 208.2 კვ.მ

ფუნქციური დანიშნულება	ობიექტის მისამართი	შემსრულებელი ორგანიზაცია	დირექტორი		მშენებლობის ორგანიზების პროექტი	A - 3
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	ს.კ. 01 10.06.022.011 ქ.თბილისი, პეტრე იბერის ქუჩის შესახვევი N13	შპს სტუდიო ალფა სახლი ს.კ. 404664573	მ.პაპუკაშვილი არქიტექტორი მ.პაპუკაშვილი			მასშტაბი თარიღი 14/03/2024 ფურცელი ა-02

სამშენებლო მოედნის ორგანიზება და მოსამზადებელ სამუშაოთა აღწერა.

ძირითადი სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე უნდა მოეწყოს სამშენებლო მოედანი. სამშენებლო მოედნის საზღვრები უნდა მოექცეს მიწის ნაკვეთის საზღვრებში, შესაბამისად უნდა შემოიღობოს სამშენებლო მოედანი და მასზე განთავსდეს დროებითი შენობანაგებობები ისე, როგორც მითითებულია სამშენებლო მოედნის გეგმაზე, კერძოდ: უნდა მოეწყოს ელექტროენერგიის ფარი დაცულად და დამიწებით, მოეწყოს დროებითი წყლის ონკანი და პირსაბანი, ტერიტორიის ბოლოში განთავსდეს დროებითი ნაგებობა მუშათა გასახდელისათვის სადაც უნდა განთავსდეს ასევე ხანძარსაწინააღმდეგო ფარი. ტერიტორიის ბოლოში განთავსდეს მუშათა პერსონალისათვის დროებითი ტუალეტი, მონიშნული და მოსწორებული უნდა იქნას ტერიტორია არმატურის განთავსებისათვის, ასევე საყალიბე და სხვა მასალათა დასაწყობებისათვის. მიწის სამუშაოების დაწყებამდე უნდა მოხდეს შენობის ღერძული დაკვალვა სათანადო აქტის გაფორმებით. სამშენებლო მოედანზე უნდა დამაგრდეს საზოგადოებრივი სივრცეებიდან აღქმადი საინფორმაციო დაფა. სამშენებლო მოედანზე სამუშაოები უნდა იყოს ორგანიზებული იმგვარად, რომ უზრუნველყოფილ იქნეს მშენებლობის უსაფრთხოება. საჭიროა დაცული იქნეს ყველა ხანძარსაწინაარმდეგო ღონსძიებები თანახმად „ხანძარსაწინააღმდეგო ნორმების სამშენებლო - სამონტაჟო სამუშაოების შესრულებისას“ ს.ნ. და წ 2.01.02-91-ის მიხედვით. სამშენებლო მოედანზე შესვლა უნდა იყოს კონტროლირებადი და დროებით ღობეზე მოეწყოს დამცავი საფარი, რომელიც უზრუნველყოფს ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხოებას. სიბნელის დროს შემოღობვა უნდა იყოს აღჭურვილი სასიგნალო ნათურებით, ან გამოყენებულ იქნეს ისეთი მასალა, ან შეფერილობა, რომელიც აღიქმება სიბნელეში. სამშენებლო მოედანზე გამოყოფილი უნდა იყოს პასუხისმგებელი პირი, რომელიც პასუხს აგებს უსაფრთხოების წესების დაცვისათვის.

მშენებლობის რიგითობები, ეტაპები და მათი ხანგრძლივობის აღწერა.

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის #255 დადგენილების მე-20 მუხლის თანახმად ასაშენებელი საგამოფენო დარბაზის შენობის მშენებლობა დავყავით 2 რიგად :
1 რიგი - მშენებლობის განხორციელებისთვის მოსამზადებელი სამუშაოები;
2 რიგი - მშენებლობის განხორციელების ძირითადი რიგის სამუშაოები;
თავის მხრივ თითოეული რიგი დაიყო ეტაპებად, რომლებიც წარმოდგენილი გვაქვს კალენდარულ გრაფიკში.

1 რიგის მშენებლობის განხორციელებისათვის მოსამზადებელი სამუშაოები :

1 ეტაპი - მოსამზადებელი სამუშაოები - 90 დღე;
2 ეტაპი - - გრუნტის ზედაპირის ცვლილება და შენობის დაკვალვა/ ძირითადი ღერძების დაფიქსირება - 60 დღე;
2 რიგის მშენებლობის განხორციელებისათვის ძირითადი რიგის სამუშაოები. :

3 ეტაპი - შენობა-ნაგებობის მიწის სამუშაოები, ფუძის და საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები; ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა +0.00 ნიშნულამდე - 240 დღე;
4 ეტაპი - 1 -23 სართულების ძირითადი კონსტრუქციული სისტემების მოწყობა +0.00 - +76.30 ნიშნულებზე - 690 დღე;
5 ეტაპი - შენობა ნაგებობის სახურავისა და გადახურვის მოწყობა +80.00 ნიშნულზე - 60 დღე;
6 ეტაპი - არამზიდი კონსტრუქციის მოწყობა - 750 დღე;
7 ეტაპი - შენობა-ნაგებობის ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო-ტექნიკური ქსელების მოწყობა; ტექნოლოგიური მოწყობილობების მონტაჟი - 270 დღე;
8 ეტაპი - შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები - 180 დღე;
9 ეტაპი - მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები - 180 დღე;
10 ეტაპი - ამწეს განთავსების ადგილის ღიობის შევსება - 30 დღე;
12 ეტაპი - შენობა ნაგებობის სახურავისა და გადახურვის მოწყობა +80.04 ნიშნულზე - 60 დღე;
13 ეტაპი - არამზიდი კონსტრუქციის მოწყობა - 630 დღე;
14 ეტაპი - შენობა-ნაგებობის ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო-ტექნიკური ქსელების მოწყობა - 90 დღე;
15 ეტაპი - ტექნოლოგიური მოწყობილობების მონტაჟი - 180 დღე;
16 ეტაპი - შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები - 180 დღე;
17 ეტაპი - მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები - 180 დღე;
18 ეტაპი - ამწეს განთავსების ადგილის ღიობის შევსება - 30 დღე;
მშენებლობა განხორციელდება 18 ეტაპად, საერთო ხანგრძლივობა 42 თვე.
სანებართვო პირობებით გათვალისწინებული მშენებლობის ეტაპის დასრულებამდე 10 დღით ადრე ნებართვის მფლობელი ვალდებულია შეატყობინოს საჯარო ზედამხედველობის ორგანოს მშენებლობის ეტაპის დასრულების შესახებ. კოდექსით განსაზღვრული პირის მიერ უნდა შედგეს ოქმი მშენებლობის დასრულების შესახებ სამშენებლო მოედანზე წარმოებული სამუშაოების დათვალიერებისა და სანებართვო პირობებთან შესაბამისობის დადგენის საფუძველზე. ცალკეული ეტაპების ჩაბარების წესი, ასევე, ეტაპის ჩაუბარებლობის შემთხვევაში განსახორციელებელი ღონისძიებების საკითხი უნდა მოწესრიგდეს კოდექსის შესაბამისად.

ამწით სამუშაოების წარმოება

ამწე მდებარეობს: ქ.თბილისი, დასახლება დიდი დიღომი პეტრე იბერის შესახვევი #13). კოშკურა ამწე SIMMA POTAIN GT 185, მწარმოებელი ქვეყანა იტალია, გამოშვების წელი 1990, სრული სიმაღლე 51 მეტრი, ისრის სიგრძე 45 მეტრი, ამწეობა ერთმაგი ჩახვევით 4ტ, ორმაგი ჩახვევით 8ტ, ამწეობა ისრის ბოლოში 1.3ტ, 5 ნახვრეტიანი სექცია-6ც, 3 ნახვრეტიანი სექცია 4ც. კოშკურა ამწემ იმუშაოს გენ-გეგმაზე ნაჩვენები სქემის მიხედვით: ტვირთების მიტანა შენობამდე მოხდეს დაბალ სიმაღლეზე, აწევა - შენობის ვერტიკალზე, სახურავზე გადავლებით სამუშაო ადგილზე მიტანა, დაშვება და ტვირთისაგან განთავისუფლება. მშენებლობის იმ ნაწილში, სადაც ამწის მუშაობა შეზღუდულია, სამშენებლო და სამონტაჟო სამუშაოები შესრულდეს ხელით. დაცულ იქნას უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომები. ტვირთების ჩაბმის წინ, წინასწარ უნდა იქნას გათვალისწინებული ამწის დასაშვები ტვირთამწეობა ტვირთის დაშვების ადგილას. არასამუშაო პერიოდში ამწის კაუჭი უდნა აიწიოს მაქსიმალურ სიმაღლეზე , ხოლო ამწის მობრუნების მექანიზმი გადაყვანილ უნდა იქნას პარკინგის რეჟიმზე. მოცემული ქარის სიჩქარის გადამეტების შემთხვევაში, შეწყდეს მუშაობა. კოორდინირებული მოქმედების უზრუნველსაყოფად, აწმის მემანქანესა და ჩამბმელებს შორის უნდა დამყარდეს რადიოკავშირი. განისაზღვროს სახიფათო ზონის საზღვრები სათანადო ნორმების მიხედვით,თვალსაჩინო ადგილას უნდა გამოიკრას გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი ნიშნები. სახანძრო უსაფრთხოება დაცულ იქნას „პპბ“ 05 - 08 ნორმების შესაბამისად.
ელოექტრო უსაფრთხოება დაცულ იქნას „გოსტ“ 198 - 013 - 78 გათვალისწინებით. ყველა სამშენებლო და სამონტაჟო დამუშაო შესრულებულ იქნას ს. წ. და წ. III - 4 80*-ს „უსაფრთხიოების ტექნიკა მშენებლობაზე “ - მოთხოვნების დაცვით. ასევე სახელმწიფო ზედამხედველობის ორგამოების მიერ დამტკიცებილი წესებით და ინსტრუქციებით. მუშაობის დაწყების წინ მემანქანეს ჩაუტარდეს ინსტრუქტაჟი საზედამხედველო ორგანიზაციაში და გადაეცეს ნებართვა. მშენებლობის უსაფრთხოების წესების დარღვევისთვის, პასუხისმგებლობა განისაზღვრება „არქიტექტულ-სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.

დაფარული სამუშაოებისა და გამოცდის აქტების ჩამონათვალი

ყველა სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები უნდა განხორციელდეს პროექტში წარმოდგენილი ტექნიკური სპეციფიკაციების, შესაბამისი სტანდარტებისა და ხარისხის დაცვით. სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოთა წარმოება უნდა განხორციელდეს მოქმედი სამშენებლო კანონმდებლობით დადგენილი ნორმებისა და წესების შესაბამისად და მშენებლობის ორგანიზების პროექტით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვით. სამეურნეო და ტექნიკური დამხმარე შენობის მშენებლობისათვის ობიექტზე სავალდებულოდ შესადგენი საშემსრულებო დოკუმენტაცია და სამუშაოთა აქტები: 1. დაკვალვის აქტი; 2. საძირკვლისათვის მოწყობილი ქვაბულისა და თხრილების დათვალიერების აქტი; 3. საძირკვლისათვის ფუძის მოწყობის ფარული სამუშაოების აქტი; 4. საძირკვლის არმირების ფარული სამუშაოების აქტი; 5. გეოდეზიური შემოწმების აქტები; 6. არმირების ფარული სამუშაოების აქტები; 7. ბეტონირების წინ ყალიბის შესაბამისობის დადასტურების აქტები; 8. დაბეტონების აქტები; 9. კედლების წყობის აქტები. დაკვალვის აქტზე ხელი უნდა მოაწეროს გეოდეზისტმა და სამუშაოთა მწარმოებელმა; საძირკვლისათვის ქვაბულისა და თხრილების დათვალიერების აქტზე, ასევე საძირკვლისათვის ფუძის მოწყობის ფარული სამუშაოების აქტზე ხელს აწერენ გეოდეზისტი, გეოლოგი, კონსტრუქტორი და სამუშაოთა მწარმოებელი; გეოდეზიური შემოწმების აქტებზე ხელს აწერენ გეოდეზისტი და სამუშაოთა მწარმოებელი; დანარჩენ ფარულ აქტებზე ხელი უნდა მოაწერონ კონსტრუქტორმა და სამუშაოთა მწარმოებელმა.

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მეთოდების და ღონისძიებათა აღწერა

სამშენებლო ნორმებზე და წესებზე ჩამოყალიბებული უსაფრთხოების ტექნიკის მოთხოვნები სავალდებულოა როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო სტრუქტურებისათვის, რომლებიც ანხორციელებენ ნებისმიერ სამშენებლო საპროექტო საქმიანობას. ამავე დროს იგი დაცული უნდა იყოს სამუშაოთა წარმოების პროექტის შედგენისა და ნებისმიერი სამშენებლო საქმიანობის დროს. ყველა სფეროში, მათ შორის სამშნებლო სფეროში უსაფრთხოების საკითხებს ზედამხედველობას უწევს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
ინსპექცია. სამშენებლო მასალების, მანქანებისა და სატრანსპოტო საშუალებების გამოყენებისას, საჭიროა დავიცვათ ქარხანა დამამზადებლისა და მიმწოდებელი ორგანიზაციის ინსტრუქციით გათვალისწინებული ექსპლოატაციის და გამოყენების მოთხოვნები. შეძლებისდაგვარად დაცული უნდა იყოს აგრეთვე სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ISO მიერ ჩამოყალიბებული პროდუქციის ხარისხის მართვის სისტემა ISO 9000 და მისი შემდგომი მოდიფიკაციები. ამასთნ ერთად, აუცილებელია შრომის დაცვის პრობლემების ინტეგრირება ხარისხის მართვის სისტემაში. მშენებლობაში საშიში სიტუაციის გამოსავლენად უნდა დამყარდეს კოოპერაციული კავშირი მშენებარე ორგანიზაციისა და სამედიცინო ორგანიზაციას შორის. უნდა წარმოებდეს სამუშაო ადგილების სისტემატური შესწავლა მშენებლობაზე უსაფრთხოების თვალზასრისით საშიში წყაროების გამოსავლენად. სამუშაოზე დანიშვნის წინ და სამუშაოს შესრულების პერიოდში სამედიცინო გამოკვლევები უნდა ჩატარდეს კანონის და მთავრობის სადირექტივო მოთხოვნების შესაბამისად. თუ მშენებლობაზე გამოიყენება საზღვარგარეთის მუშები, მათი სამედიცინო გამოკვლევა უნდა ჩატარდეს საზღვარგარეთ. ხმარების წინ ინსტრუმენტი უნდა იყოს დათვალიერებული. ინსტრუმენტის ხმარებისას გამოყენებული უნდა იყოს დამცავი საშუალებები (სათვალეები, ხელთათმანები, სპეცტანსაცმელი და სხვა). ელექტრო ინსტრუმენტებს უნდა ქონდეს საფარი, რომელიც იცავს მოძრავ ნაწილებს როგორც მუშაობის, ასევე შენახვის დროს. აკრძალულია სამშენებლო ინსტრუმენტების გამოყენება არადანიშნულების მიხედვით. ქიმიურ, ფხვიერ მასალასთან მუშაობისას წარმოქმნილი მტვრის და სხვა მავნე ზემოქმედების კონტროლი უნდა განხორციელდეს სათანადო ხელსაწყოების გამოყენებით. მანქანების, ინსტრუმენტების, ინვენტარის, ტექნიკური აღჭურვილობის, მოწყობილობის, კოლექტიური და ინდივიდუალური საშუალებების ექსპლოატაციის უსაფრთხოების მოთხოვნის დაცვაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება: მანქანების და დამცავი საშუალებების ტექნიკურ მდგომარეობაზე ორგანიზაციას, რომელიც აწარმოებს სამუშაოებს. სამუშაოთა წარმოების შრომის უსაფრთხოების მოთხოვნებზე ორგანიაციას, რომელიც აწარმოებს სამუშაოებს. დამოუკიდებელ მაღლივ(5 მეტრი და მეტი) ზემცოცავ სამუშაოებზე დაიშვებიან 18 წელს გადაცილებული პირები, რომელთაც გავლილი აქვთ სამედიცინო შემოწმება და ცნობილი არიან საკვალიფიკაციო თანრიგით. მუშები, რომლებიც პირველად დაიშვებიან ზემცოცავ სამუშაოებზე, ერთი წლის განმავლობაში უნდა მუშაობდნენ გამოცდილი მუშის მეთვალყურეობის ქვეშ. მუშებსა და ინჟინერ-ტექნიკურ პერსონალს უნდა ჰქონდეს სპეცტანსაცმელი, სპეცფეხსაცმელი და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები. სამშენებლო ობიექტზე მყოფი ყველა პირი ვალდებულია ეხუროს დამცავი ჩაფხუტი. ჩაფხუტისა და სხვა დამცავი საშუალებების გარეშე მუშები და ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი სამუშაოზე არ დაიშვებიან. სამშენებლო ობიექტზე მომუშავე მუშები და ინჟინერტექნიკური პერსონალი უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ სანიტარულ-საყოფაცხოვრებო პირობებით. მშენებლობის ყველა ობიექტზე გმოყოფილი უნდა იყოს ადგილი ან სათავსო სამედიცინო აფთიაქის და სხვა პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოსაჩენი საშუალებების განსათავსებლად. სამშენებლო მეოდანზე მომუშავე ყველა პიროვნება უზრუნველეყოფილი უნდა იყოს სასმელი წყლით. სამშენებლო-სამონტაჟო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ვალდებულია უზრუნველყოს, რომ ყველა მუშაკმა დაიცვას შინაგანაწესით განსაზღვრული შრომის დაცვის მოთხოვნები. უცხო და არაფხიზელ მდგომარეობაში მყოფ პირთა დაშვება სამშენებლო მოედანზე აკრძალულია. ამინდის უეცარი ცვლილებების დროს (ქარბუქი, ქარიშხალი, დიდთოვლიანობა და სხვა) სამშენებლო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ვალდებულია შეწყვიტოს სამშენებლო პროცესების წარმოება. სახაზო-საინჟინრო ტექნიკურმა პერსონალმა სადირექტივო ორგანოების მიერ დაწესებული ვადების მიხედვით უნდა გაიაროს უსაფრთხოების ტექნიკის წესების და საწარმოო სანიტარიის ცოდნის შემოწმება, შესასრულებელი სამუშოთა სახის გათვალისწინებით. ცოდნის შემოწმება უნდა გაფორმდეს სათანადო წესით. უსაფრთხოების ტექნიკასა და საწარმოო სანიტარიის ცოდნის არადამაკმაყოფილებლად შეფასებისას მათ ეკრძალებათ სამუშაო წარმოების ხელმძღვანელობა განმეორებით შემოწმებამდე. გამნეორებით შეფასება უნდა ჩაუტარდეს მუშაკებს არსებული წესის მიხედვით ყოველწლიურად, მუშას უნდა ჩაუტარდეს მშენებლობის უსაფრთხო მეთოდებით წარმოების ცოდნის შემოწმება. ცოდნის შემოწმება უნდა ჩაატაროს სამშენებლო-სამონტაჟო ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ბრძანებით დანიშნულმა კომისიამ . სამუშაოები, რომლებიც უნდა შესრელდეს კვალიფიციური მუშა ხელის გამოყენებით, საჭიროებს გამკაცრებულ ზედამხედველობას. მშენებელი მუშები ზოგ შემთხვევაში განიცდიან სხვადასხვა სახის მავნე ზემოქმედებას.

მშენებელი მუშები ზოგ შემთხვევაში განიცდიან სხვადასხვა სახის მავნე ზემოქმედებას. ამ ზემოქმედების პიროზები არაერთგვაროვანია, იგი დამოკიდებულია კონკრეტულ პროფესიაზე, სამუშაო დროის ხანგრძლივობასა და სხვა სპეციფიკურ პირობებზე. ისეთი სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოთა წარმოება, რომლის მიმართაც წაყენებულია შრომის უსაფრთხოების დამატებითი მოთხოვნები, დაიშვებიან 18 წელზე მეტი ასაკის პირები, რომელთაც აქვთ პროფესიული გამოცდილება, გაიარეს სწავლება აღნიშნული სამუშაოების ჩატარებაზე და აქვთ სათანაო სერთიფიკატი ან კანონით გათვალისწინებული სხვა დოკუმენტი. უნდა დაინიშნოს პასუხისმგებელი პირი (ან პირები) საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალიდან ზედამხედველობისათვის. სამუშაოზე დაშვებამდე მას (მათ) უნდა ჩაუტარდეს სწავლებასაუბრები უსაფრთხოების ტექნიკასა და საწარმოო-საინჟინრო სანიტარიის წესების დაცვის საკითხებზე. მუშებმა და სახაზო საინჟინრო-ტექნიკურმა პერსონალმა, რომლებიც დაკავებულნი არინ მავნე და საშიშ სამუშაოებზე, უნდა გაიარონ სათანადო სამედიცინო შემოწმება. ქარის დასაშვებ სიჩქარეს და სხვა კლიმატურ პირობებს, რომლის დროსაც უნდა შეწყდეს სამუშაოთა წარმოება, განსაზღვრავს ადგილობრივი სახელმწიფო აღმასრულებელი ხელისუფლება. მავნე და მძიმე სამუშაობაში შეზღუდული უნდა იყოს ქალთა შრომის გამოყენება. სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაობის წარმოებისას საჭიროა დაცული იყოს საწარმოო ოპერაციების თანმიმდევრობა ისე რომ, ჩატარებული ოპერაცია არ ქმნიდეს საწარმოო საშიშროების წარმოქმნას შემდგომი ოპერაციის შესრულებისას. პოლიმერული მასალებისა და ნაკეთობების გამოყენებისას უნდა ვიხელმძღვანელოთ მათი პასპორტით, ტარაზე არსებული ნიშნებითა და წარწერებით.
განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს საქართველოს მთვრობის N477 დადგენილებით სიმაღლეზე მუშაობის მოთხოვნებს

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ქ. თბილისში, ფარახლებია ფეხის ფიქრებს, კიბის ბაქიის შესახვევი N13. ს/კ 01.10.06.022.011


მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გეგმა


	ჯგუფის N	ტასკის N		1 თვე												2 თვე												3 თვე												4 თვე											
				1 დღე			2 დღე			3 დღე			4 დღე			5 დღე			6 დღე			7 დღე			8 დღე			9 დღე			10 დღე			11 დღე			12 დღე			13 დღე			14 დღე			15 დღე			16 დღე			17 დღე		
				10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
I ეტაპი		1	მრავალსართულიანი საცხოვრებლის ტიპობრივი მშენებლობის ზედამხედველობის ორგანიზაციის (შემდგომში N1; N2; N3) საქმიანობის მოქმედების მოქმედებისა, ორგანიზაციის ნარჩენების წარმოქმნის პირველადი საქმიანობები																																																		
		2	მოედნის ზერეპირების ცვლილება, შენობის წარმოების ორგანიზაციის ძირითადი ნივთიერებების ჩამოტანა																																																	
		3	შენობა-ნაგებობების მოედნ საქმიანობის; შენობა-ნაგებობის შენის მოედნის საქმიანობის; შენობა-ნაგებობის საძირკვლის მოედნის საქმიანობის, ძირითადი კონსტრუქციული ელემენტების მოედნა შენობა-ნაგებობის ნარჩენის ნარჩენების																																																	
		4	1 - 23 საერთვლების ძირითადი კონსტრუქციული ელემენტების ელემენტის ±0.00 და +76.30 ნიშნულებზე																																																	
		5	შენობა-ნაგებობის სახურავზე და გარსახურის მოედნა +80.00 ნიშნულზე																																																	
		6	არაპირდი კონსტრუქციის მოედნა																																																	
		7	შენობა-ნაგებობის ლოკალური საირმე საგებლების სინქრონიზაციის ტრანსპორტირების მოედნა; ტექნოლოგიური მოედნის ელემენტების მოედნის მიზანი																																																	
		8	შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																																																	
		9	მოედ ნაკეთების კეთილმოწყობის სამუშაოები																																																	
		10	ავარ განთავსების არეალის დემონტაჟი																																																

				18 დღე			19 დღე			20 დღე			21 დღე			22 დღე			23 დღე			24 დღე			25 დღე			26 დღე			27 დღე			28 დღე			29 დღე			30 დღე			31 დღე			32 დღე			33 დღე			34 დღე		
				10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
I ეტაპი		1	მრავალსართულიანი საცხოვრებლის ტიპობრივი მშენებლობის ზედამხედველობის ორგანიზაციის (შემდგომში N1; N2; N3) საქმიანობის მოქმედების მოქმედებისა, ორგანიზაციის ნარჩენების წარმოქმნის პირველადი საქმიანობები																																																	
		2	მოედნის ზერეპირების ცვლილება, შენობის წარმოების ორგანიზაციის ძირითადი ნივთიერებების ნივთიერებების მოქმედება																																																	
		3	შენობა-ნაგებობის მოედნ საქმიანობის; შენობა-ნაგებობის შენის მოედნის საქმიანობის; შენობა-ნაგებობის საძირკვლის მოედნის საქმიანობის, ძირითადი კონსტრუქციული ელემენტების მოედნა შენობა-ნაგებობის ნარჩენების																																																	
		4	1 - 23 საერთვლების ძირითადი კონსტრუქციული ელემენტების ელემენტის ±0.00 და +76.30 ნიშნულებზე																																																	
		5	შენობა-ნაგებობის სახურავზე და გარსახურის მოედნა +80.00 ნიშნულზე																																																	
		6	არაპირდი კონსტრუქციის მოედნა																																																	
		7	შენობა-ნაგებობის ლოკალური საირმე საგებლების სინქრონიზაციის ტრანსპორტირების მოედნა; ტექნოლოგიური მოედნის ელემენტების მოედნის მიზანი																																																	
		8	შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																																																	
		9	მოედ ნაკეთების კეთილმოწყობის სამუშაოები																																																	
		10	ავარ განთავსების არეალის დემონტაჟი																																																

				35 დღე			36 დღე			37 დღე			38 დღე			39 დღე			40 დღე			41 დღე			42 დღე																												
				10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30																										
I ეტაპი		1	მრავალსართულიანი საცხოვრებლის ტიპობრივი მშენებლობის ზედამხედველობის ორგანიზაციის (შემდგომში N1; N2; N3) საქმიანობის მოქმედების მოქმედებისა, ორგანიზაციის ნარჩენების წარმოქმნის პირველადი საქმიანობები																																																	
		2	მოედნის ზერეპირების ცვლილება, შენობის წარმოების ორგანიზაციის ძირითადი ნივთიერებების ნივთიერებების მოქმედება																																																	
		3	შენობა-ნაგებობის მოედნ საქმიანობის; შენობა-ნაგებობის შენის მოედნის საქმიანობის; შენობა-ნაგებობის საძირკვლის მოედნის საქმიანობის, ძირითადი კონსტრუქციული ელემენტების მოედნა შენობა-ნაგებობის ნარჩენების																																																	
		4	1 - 23 საერთვლების ძირითადი კონსტრუქციული ელემენტების ელემენტის ±0.00 და +76.30 ნიშნულებზე																																																	
		5	შენობა-ნაგებობის სახურავზე და გარსახურის მოედნა +80.00 ნიშნულზე																																																	
		6	არაპირდი კონსტრუქციის მოედნა																																																	
		7	შენობა-ნაგებობის ლოკალური საირმე საგებლების სინქრონიზაციის ტრანსპორტირების მოედნა; ტექნოლოგიური მოედნის ელემენტების მოედნის მიზანი																																																	
		8	შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																																																	
		9	მოედ ნაკეთების კეთილმოწყობის სამუშაოები																																																	
		10	ავარ განთავსების არეალის დემონტაჟი																																																

ფუნქციური დანიშნულება	ობიექტის მისამართი	შემსრულებელი ორგანიზაცია	დირექტორი		მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გეგმა	A - 3	
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	ს.კ. 01 10.06.022.011 ქ.თბილისი, პეტრე იბერის ქუჩის შესახვევი N13	შპს სტუდიო ალფა სახლი ს.კ. 404664573	მ.პაპუკაშვილი არქიტექტორი მ.პაპუკაშვილი			მასშტაბი	
						თარიღი	14/03/2024
						ფურცელი	ა-05

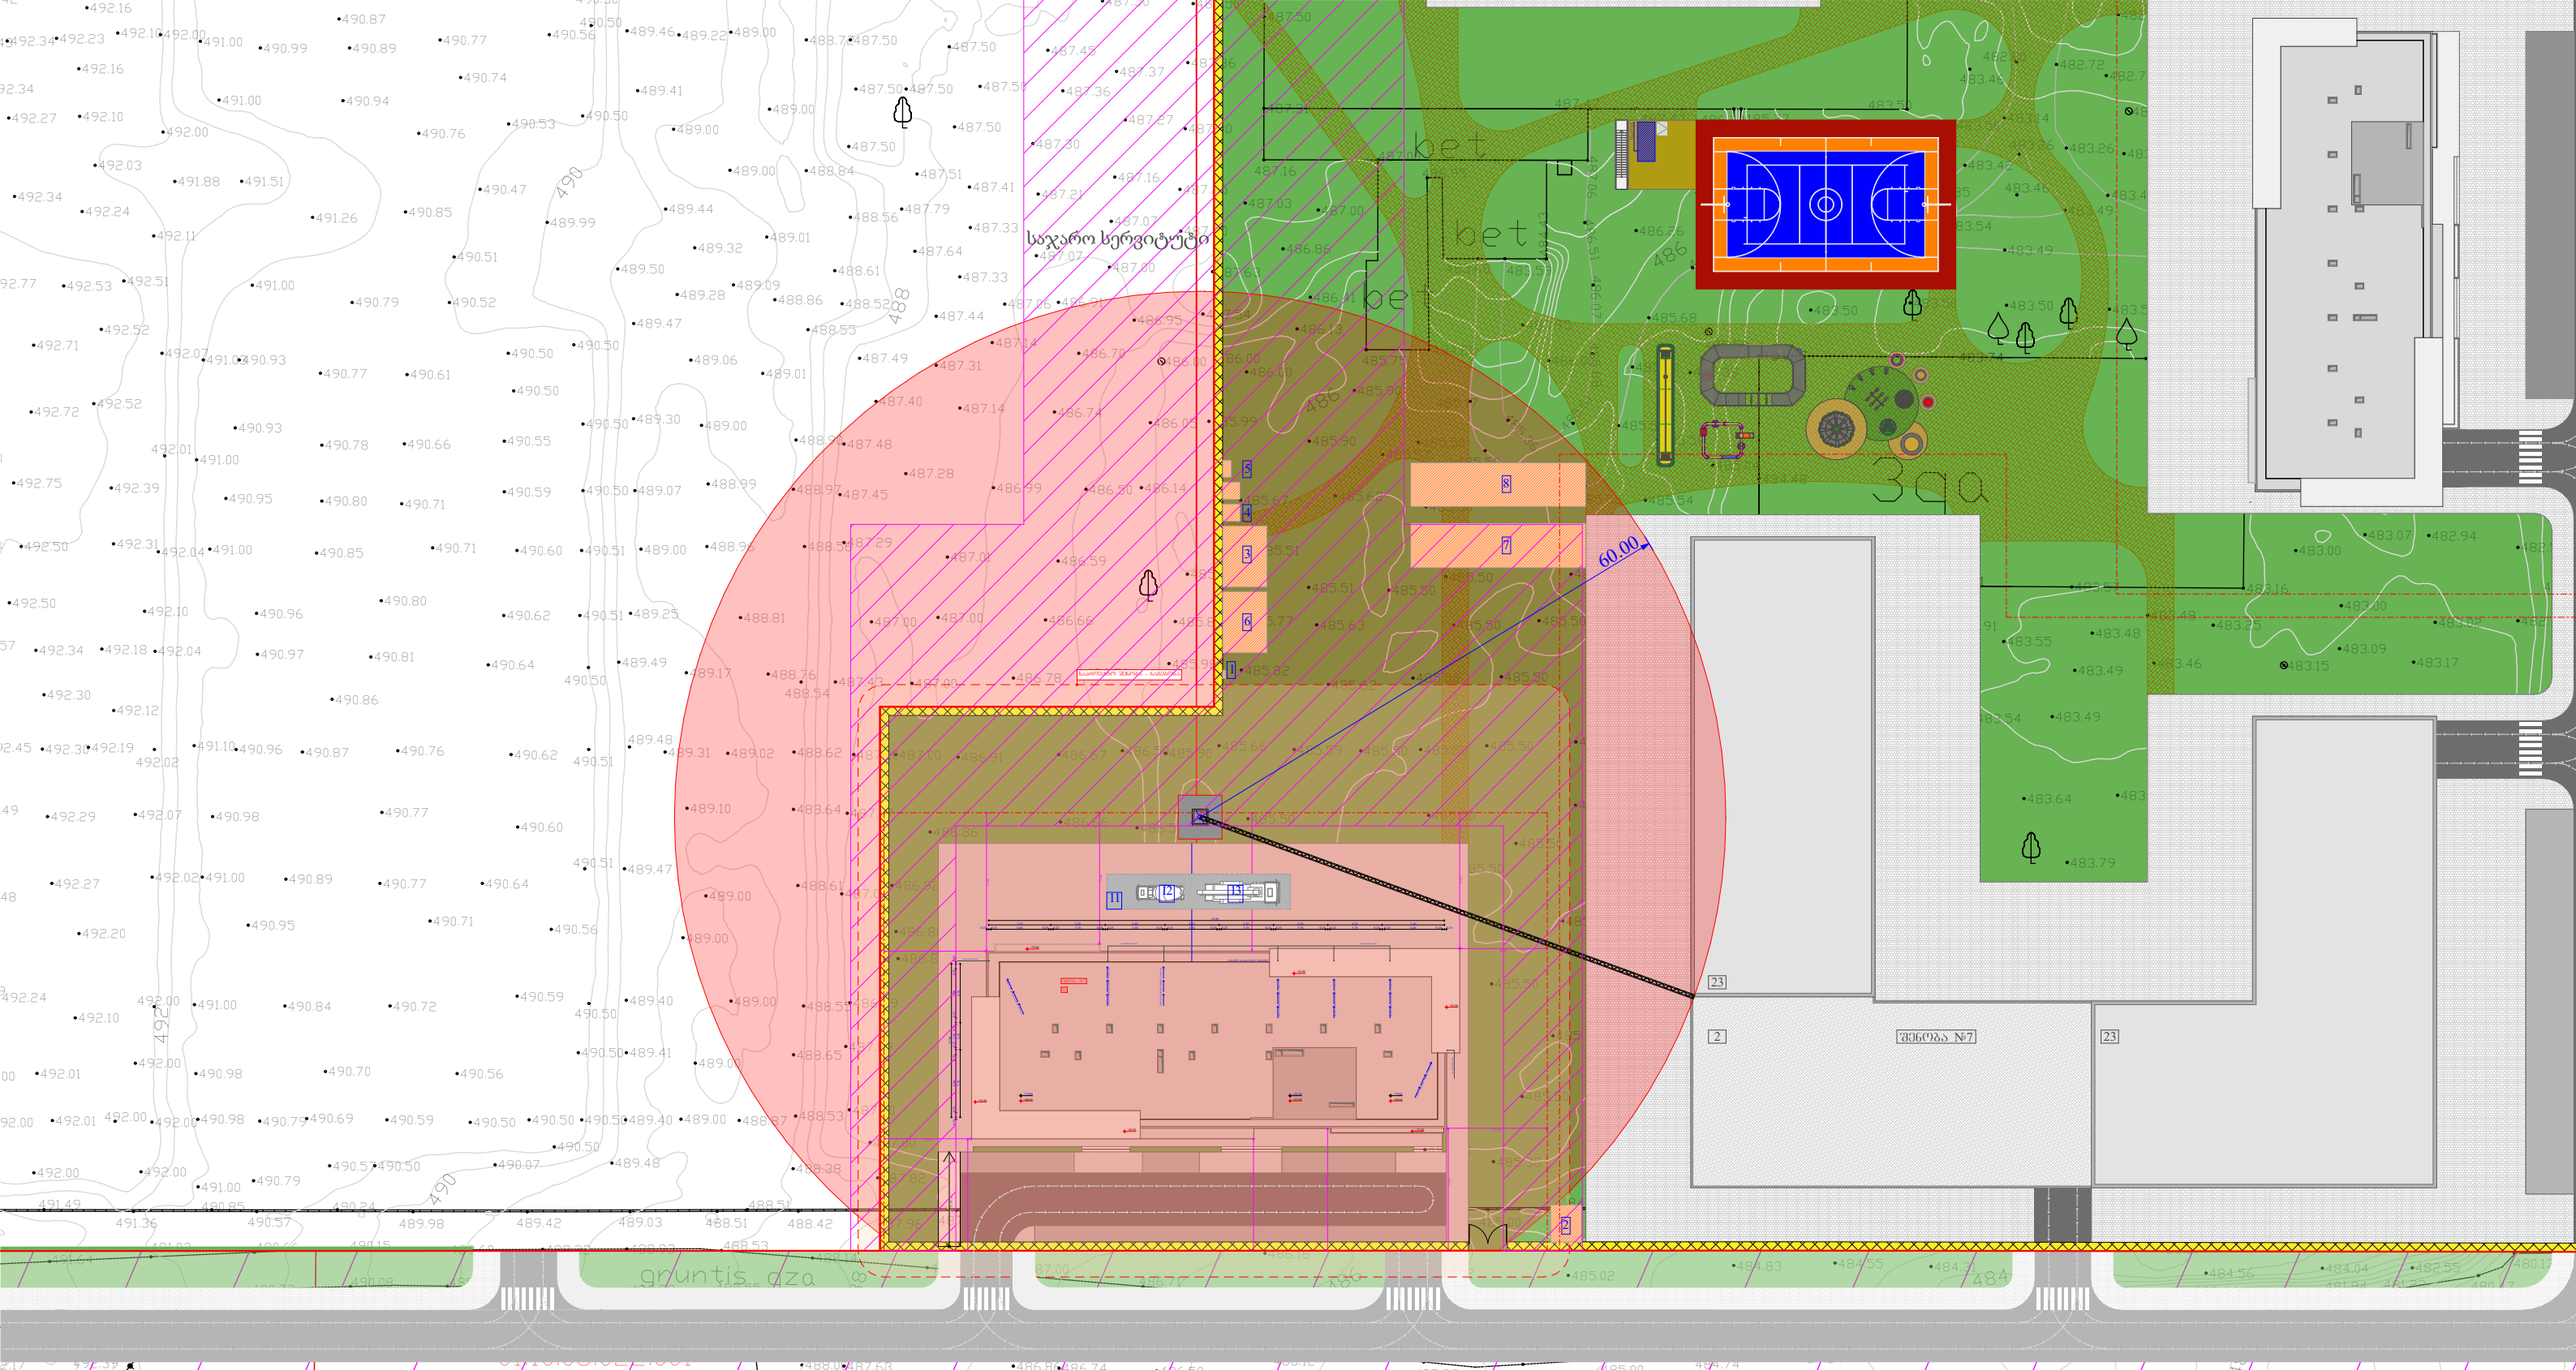



შენიშვნა: ვინაიდან მიწის ნაკვეთზე გათვალისწინებულია რელიეფის ცვლილება, შენობის ქვაბულიდან ამოღებული მიწა დასანყობდება საპროექტო ტერიტორიაზე.

ფუნქციური დანიშნულება	ობიექტის მისამართი	შემსრულებელი ორგანიზაცია	დირექტორი		სამშენებლო მოედნის გეგმა და მანქანა-მექანიზმების მოძრაობის სქემა
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	ს.კ. 01 10.06.022.011 ქ.თბილისი, პეტრე იბერის ქუჩის შესახვევი N13	შპს სტუდიო ალფა სახლი ს.კ. 404664573	მ.პაპუკაშვილი არქიტექტორი მ.პაპუკაშვილი		

A - 3	
მასშტაბი	1:700
თარიღი	14/03/2024
ფურცელი	ა-06
