საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მეორე კორპუსზე განსათავსებელი წარწერების პროექტი

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი



2024 წელი

შინაარსი

ა/ განმარტებითი ბარათი

ბ/ კალენდარული გეგმა

გ/ გრაფიკული ნაწილი:

ნახაზი მოპ-1;

ნახაზი მოპ-2

ა/ განმარტებითი ბარათი

1 საპროექტო ობიექტი მდებარეობს ქ. თბილისში, მერაბ კოსტავას ქ. №67/69ა-ში.

2 წინამდებარე პროექტი ითვალისწინებს შემდეგ სამუშაოების განხორციელებას:

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მეორე სასწავლო კორპუსზე უნდა განხორციელდეს პროექტით გათვალისწინებული "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი" და "GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY" წარწერების მოცულობით ასოებში, ასევე საქართველოს გერბის შესრულებულსაინფორმაციო წარწერის ასოების განტავსება. შესრულებული იქნება თითბერის ფურცლებით (სისქე 5მმ).

ცენტრალური შესასვლელის ფასადის ფართობი: 792 მ2

წარწერის განთავსებული ადგილის ფართობი: 8.2 მ2

სიმაღლე ქუჩის დონიდან წარწერამდე: 10,3 მ

საერთო შენიშვნები:

1. სამუშოების დროს უნდა იყოს გათვალისწინებული:
   მუშების სათანადო ინსტრუქტაჟი და უზრუნველყოფა სპეციალური ტანსაცვლით, ქამრებით და სათვალეებით.
   სამშენებლო ნაგავი დროულად უნდა იქნას გატანილი.
2. ვინაიდან მშენებლობის ხანგრძლივობა არ განისაზღვრება СниП 1.04.03-85 თანახმად, ხანგრძლივობა პირობითად მიღებულია 7 დღე სამუშაოთა მოცულობიდან გამომდინარე.
3. სამონტაჟო სამუშაოების განხორციელება შესაძლებელია განხორციელდეს სამშენებლო ავტოსაწეველა АГП28-ის მეშვეობით (ან ანალოგიური ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლების მქონე ავტოსაწეველას მეშვეობით).
4. ყველა სამუშაოს განხორციელება მოხდეს საქართველოს მთავრობის 2007წ 28 მარტის №62 დადგენილების – "მშენებლობის უსაფრთხოების წესები"-ს მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

სამშენებლო მანქანების, მექნიზმების, დანადგარებისა და ინსტრუმენტის ჩამონათვალი

№	დასახელება	მარკა	რაოდ.	შენიშვნა
1.	სამშენებლო ავტოსაწეველა	АГП28	1	სამონტაჟო სამუშაოები
2.	ა/თვითსაცლელი	ЗиЛ-4352	1	სატრანსპორტო სამუშაოები
3.	პნევმატური ინსტრუმენტი: საბურღი, ხრახნდამჭერი და სხვა	კომპ.	1	სამონტაჟო სამუშაოები

IV.კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	დღეები						
	1	2	3	4	5	6	7
მოსამზადებელი სამუშაოები	1						
სამონტაჟო სამუშაოების ჩატარება					6		
სამშენებლო ნაგვის გატანა							1

დაამუშავა /ლ.მექვაბიშვილი/

სამშენებლო გენგეგმა

ექსპლიკაცია

1. ავტო საწვეელა
2. დროებითი ღია საწყობი

პირობითი აღნიშვნები

- დროებითი შენობა-ნაგებობები

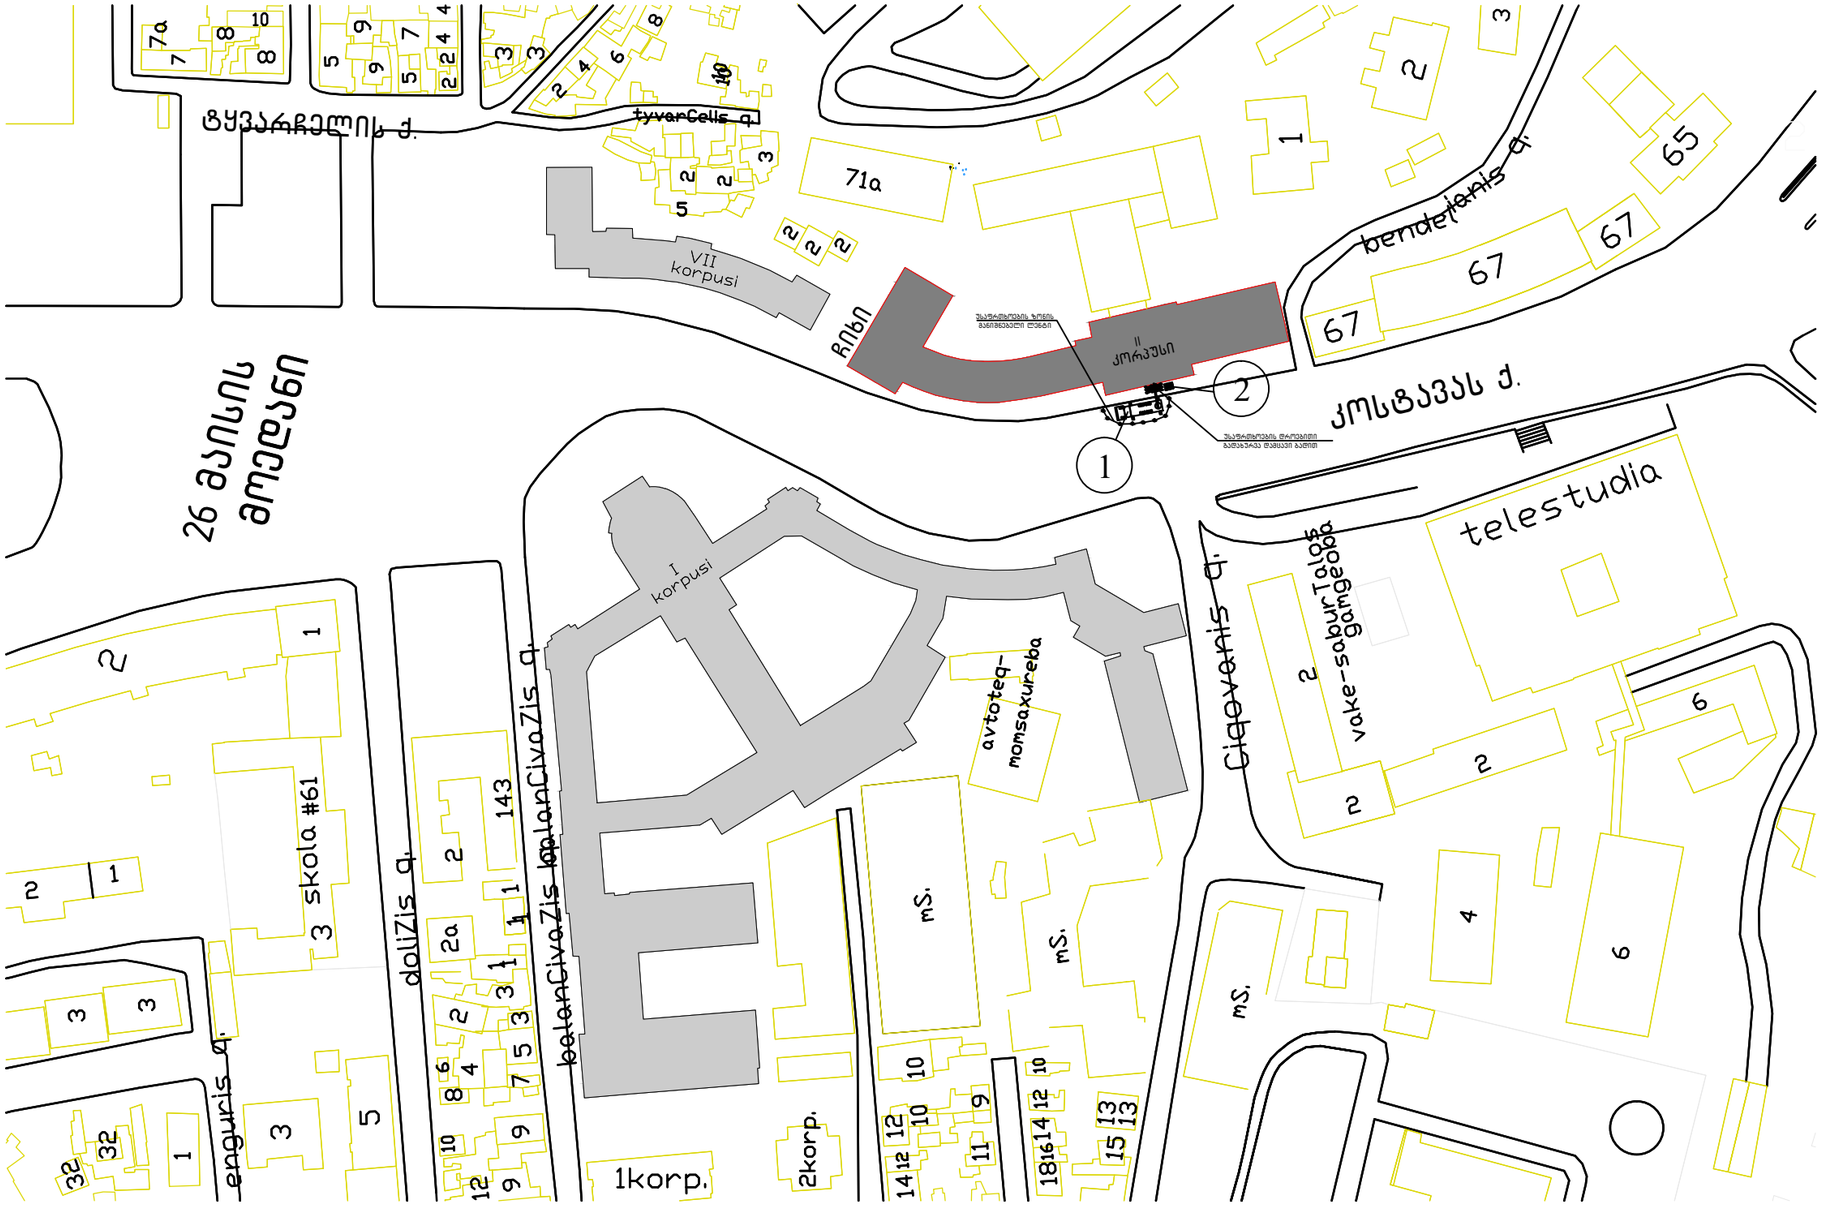

ფორმატი PAPER SIZE	ხელშეკ. № CONTRACT #	პროექტის № PROJECT #	ფაილის სახელი FILE NAME
A-3			

პროექტი PROJECT	საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მთავარ კორპუსზე განთავსებული ნარწერების პროექტი
მისამართი ADRESS	ქ.თბილისი, მ.კოსტავას № 68

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
შესრულა:	ლ.მექვაბიშვილი	

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

ნახაზი DRWG.	სამშენებლო გენგეგმა

სტადია STAGE	ინდექსი INDEX	ფურც. PAGES
მუშა პროექტი		მპპ - 1

სამონტაჟო სქემა

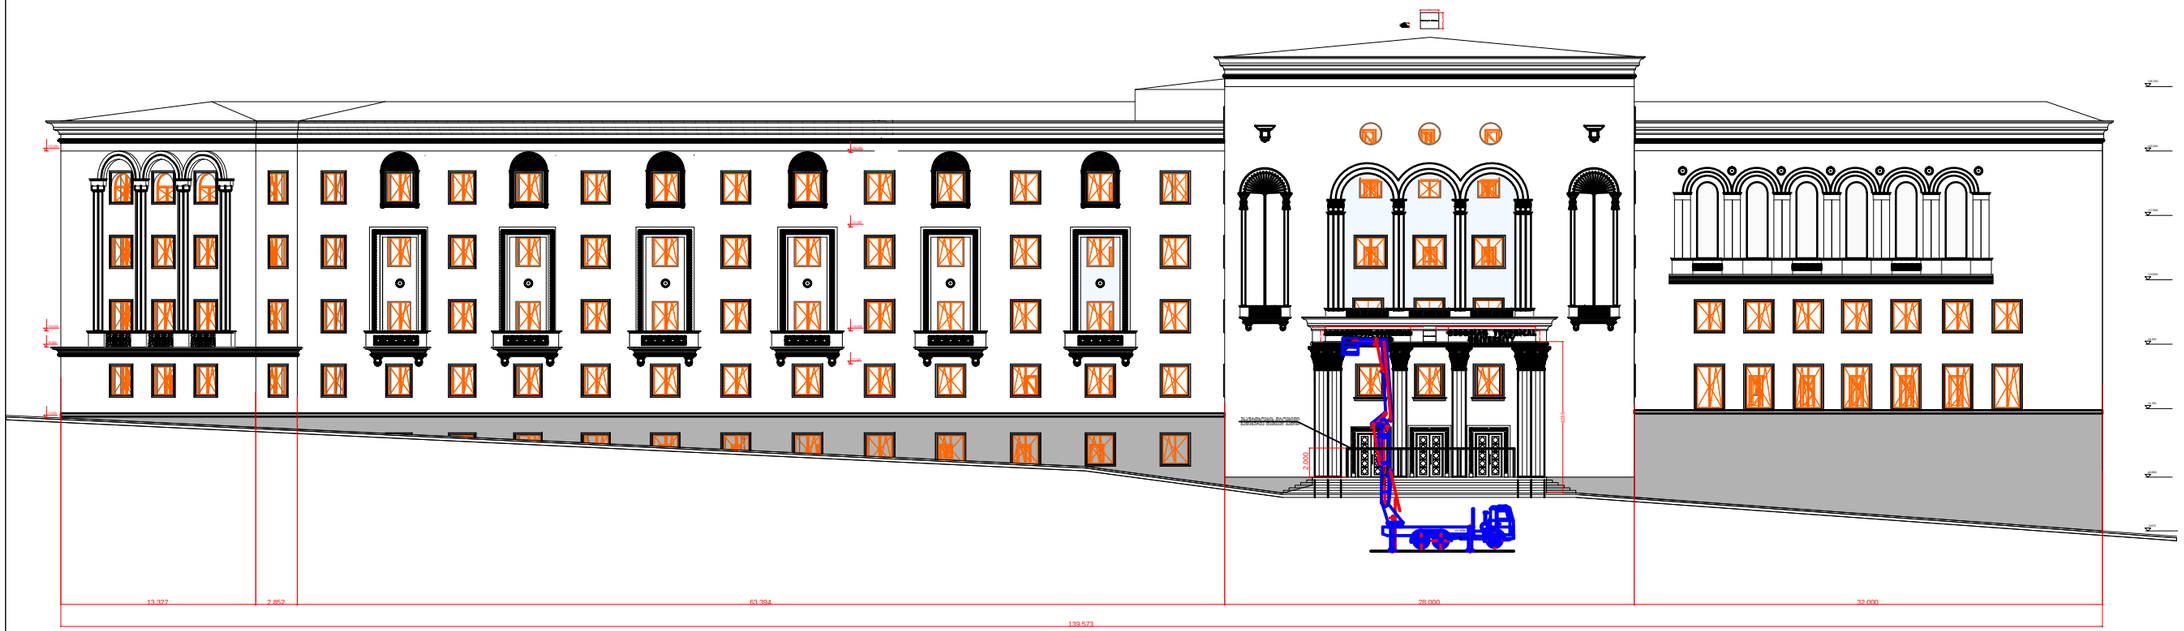

ავტო საწევლა **agp-28**
ტექნიკური მახასიათებლები:

1. საბურავების ფორმულა – 4X2
2. ისრის აწევის სიმაღლე – 28მ
3. ტვირთამწეობა – 250 კგ
4. ისრის შვერა – 13.8 მ

ფორმატი PAPER SIZE	ხელშეკრულების № CONTRACT #	პროექტის № PROJECT #	ფაილის სახელი FILE NAME
A-3			

პროექტი PROJECT	საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მეორე კორპუსზე განთავსებული ნარწერების პროექტი
მისამართი ADRESS	ქ.თბილისი, მაკოსტავას № 68

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
შესრულა:	ლ.მექვაბიშვილი	

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

ნახაზი DRWG. სამონტაჟო სქემა

სტადია STAGE	ინდექსი INDEX	ფურ. PAGES
მუშა პროექტი		მოკ - 2
