მისამართი: ქ. თბილისი, თორნიკე ერისთავის ქ.
№38 ს.კ. 01.12.08.037.085

დემონტაჟის ორგანიზაციის პროექტი

დირექტორი: მ. ხვედელიძე

ქ. თბილისი

2024 წ.

ამწე ტექნიკის და ხის დამცავი ღობის სპეციფიკაცია



ამწე **LIEBHER LTM 1050** ტვირთამწეობა 50ტ. ისრის სიგრძე 40 მ, +გუსაგი 16 მ



ამწე **KAMAZ 53229** ტვირთამწეობა 25ტ. ისრის სიგრძე 21 მ, +გუსაგი 6 მ



სატვირთველი **SAMSUNG SL 150** ტვირთამწეობა 25კუბ მ.



ექსკავატორ დამტვირთველი **3CX-4WS-SM** ტვირთამწეობა 2,7 ტ.



FORD	CARGO 3430D	მოცულობა: 16 კუბური მეტრი
KAMAZ	6520	მოცულობა: 12 კუბური მეტრი
KAMAZ	5551	მოცულობა: 6 კუბური მეტრი



ამწე კალათა

Manitou BF 165 ATJ ტვირთამწეობა 300 კგ. სიმაღლე 16 მ

ხის დამცავი ღობე

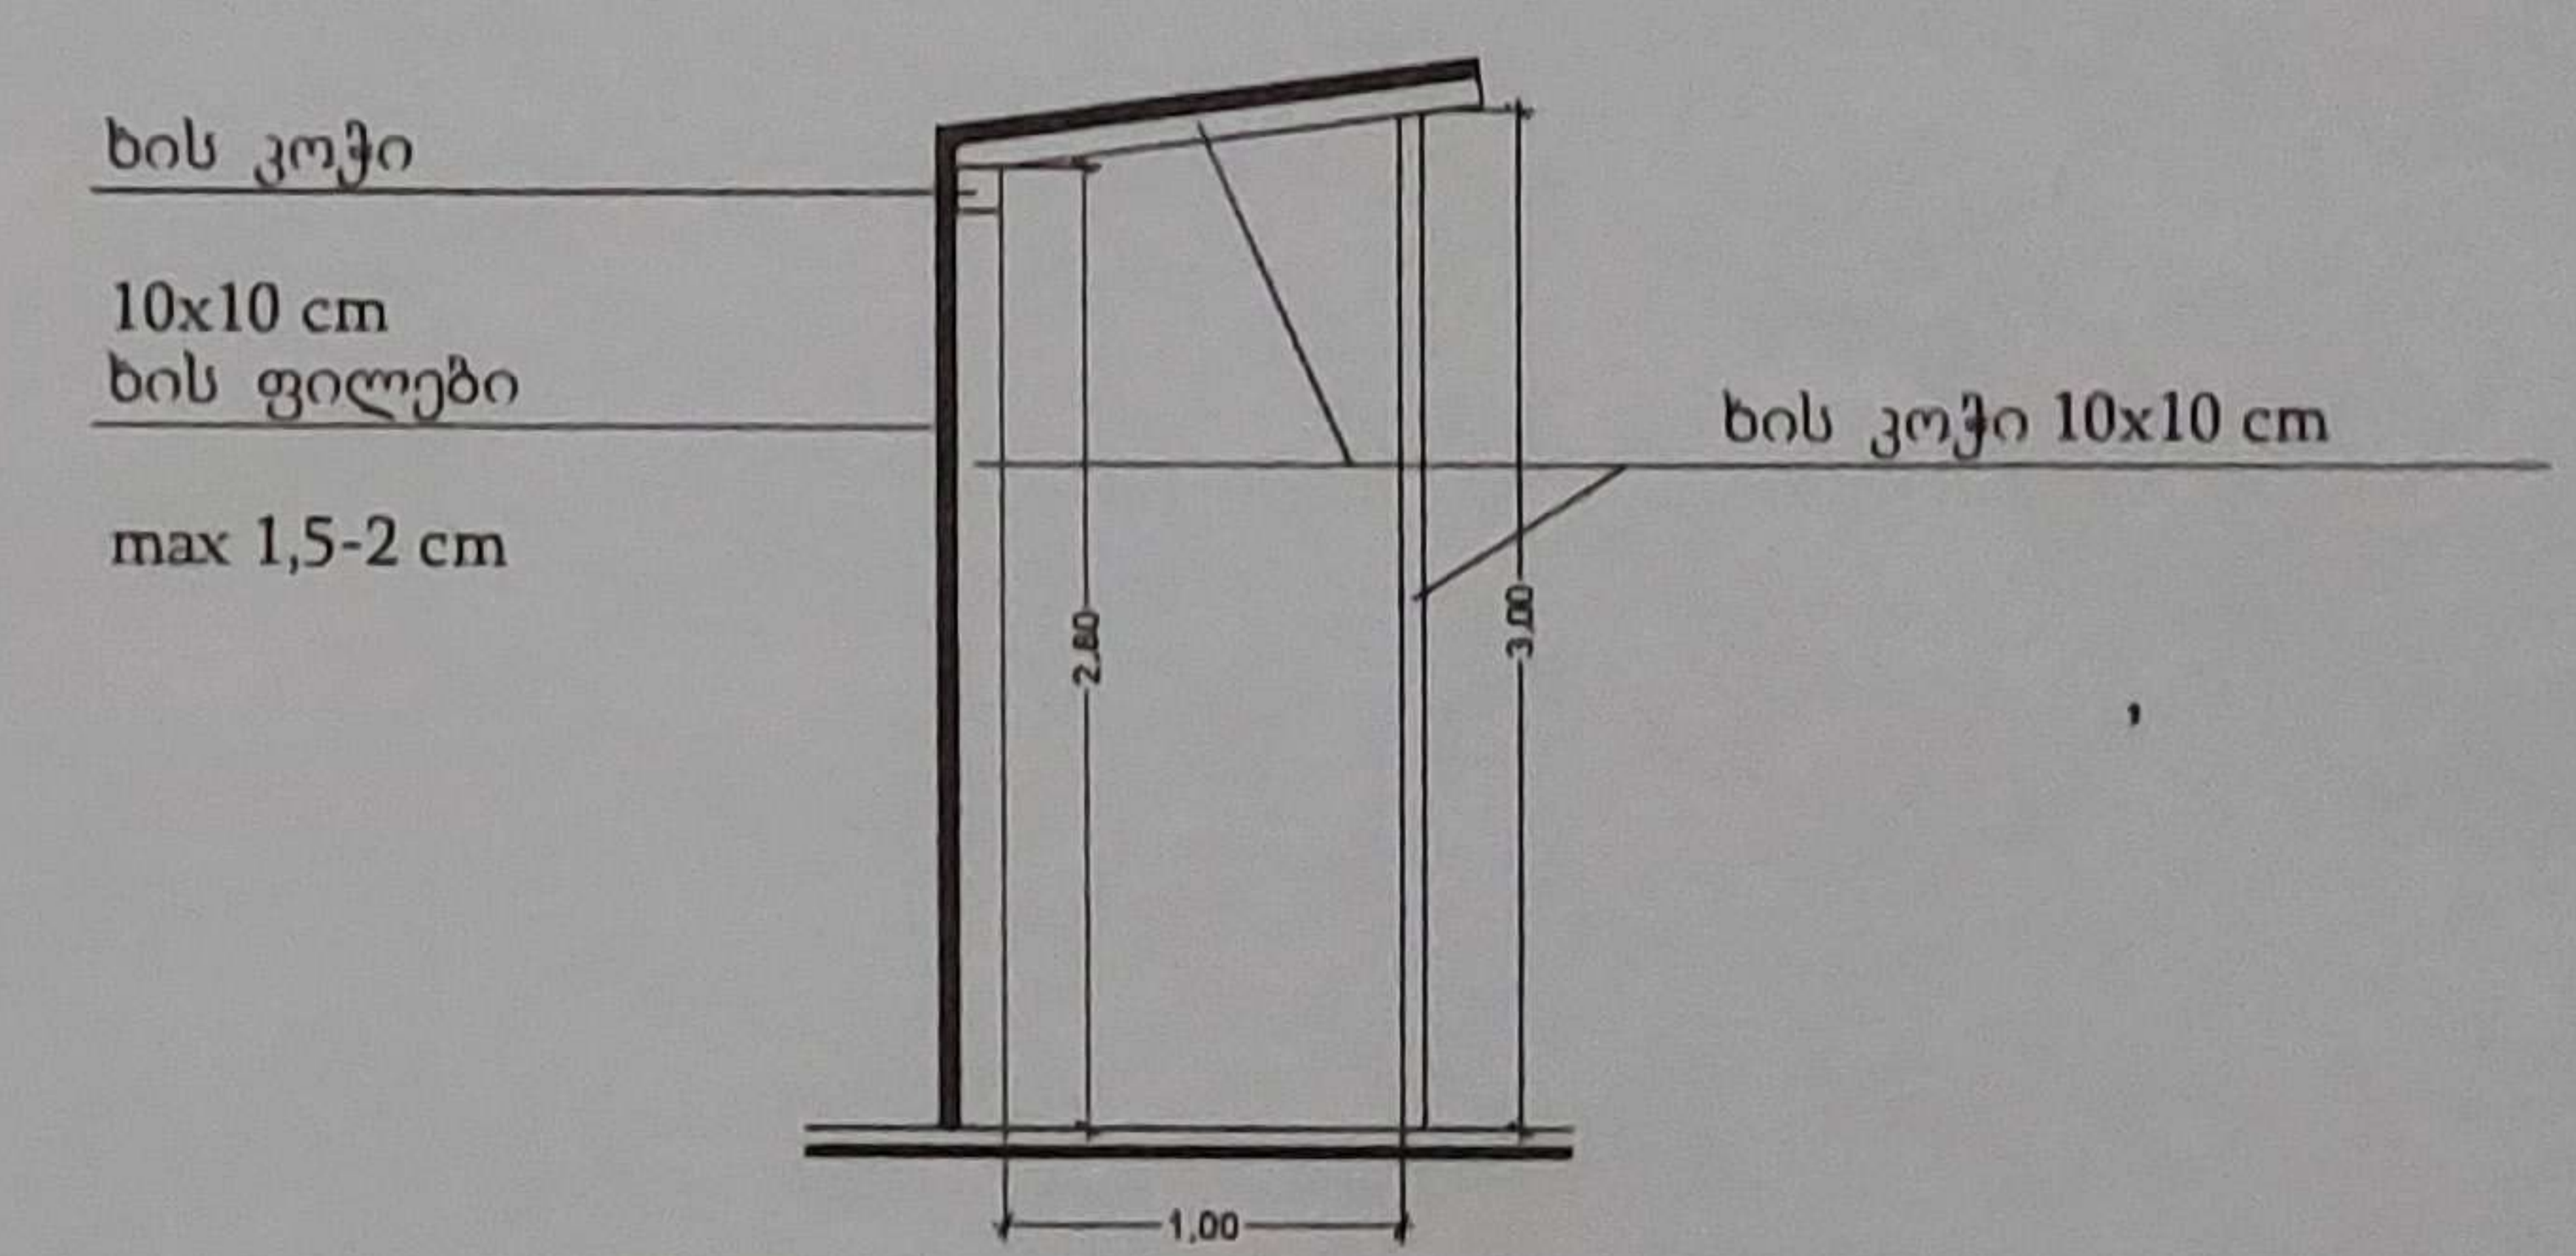

1. სამშენებლო–სამონტაჟო სამუშაოები უნდა განხორციელდეს "ს.ნ და წ" მოთხოვნათა მკაცრი დაცვით განსაკუთრებით უსაფრთხოების მოთხოვნების დაცვით "ს.ნ და წ.–III-4.80"–სა
2. მ.ო.პ.–ში მითითებული ამწე შეიძლება შეიცვალოს სხვა ამწე მექანიზმით .

Four group			მისამართი: ქ. თბილისი, თორნიკე ერისთავის ქ. №38 ს.კ. 01.12.08.037.085			
დირექტორი		[illegible]	კლინიკის დემონტაჟის პროექტი			
არქიტექტორი		[illegible]				
დამკვეთი		შ.პ.ს. „№1 ქალთა კონსულტაცია"	ფურცელი	რაოდენობა	მასშტაბი 1:100	თარიღი 2024 წ

ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები (მეათედების სიზუსტით)

მიწის ნაკვეთის ფართობი (კვ.მ) 546;

განაშენიანების ფართობი (კვ.მ) 253.82;

საერთო ფართობი (კვ.მ) 392.27

სამშენებლო მოცულობა (კუბ.მ) 1 440

ნიშნულს ზევით (კუბ.მ) 1 200

ნიშნულს ქვევით (კუბ.მ) 240

შენობა ნაგებობის კონსტრუქციული სიმაღლე (მ) 10.15

ნიშნულს ზევით (მ) 9.52

ნიშნულს ქვევით (მ) 0.63

საკადასტრო კოდი: 01.12.08.037.085

1. სამუშაოთა ორგანიზაციის პროექტი.

სამუშაოთა ორგანიზაციის პროექტის შედგენას საფუძვლად, საკადასტრო რუკა და ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, აგრეთვე ტერიტორიის დათვალიერება და შესწავლა.

დასაშლელია საკადასტრო გეგმაზე დატანილი შენობა-ნაგებობა ნომრებით 01/2.

სადემონტაჟო შენობა-ნაგებობების საერთო ფართი შეადგენს: 392.27 კვ. მ.

დასაშლელი სამუშაოები წარიმართება სამშენებლო საწეველათი, დასაშლელი სამშენებლო მასალების და ნაგვის დასატვირთად გამოყენებული იქნას თვითმცლელი ავტოტრანსპორტი. სადაც საშუალება ექნება, დანარჩენი ხელით დაიტვირთება.

ადგილი ხასიათდება შემდეგი კლიმატური და სეისმური ფაქტორებით:

ქარის დაწოლა: 54-55 კგ/ კვ. მ.,

თოვლის საფარის წონა: 80 კგ/ კვ. მ.,

სეისმიურობა: 8 ბალი.

სადემონტაჟო სამუშაოების წარმოება დაიწყება ხელით დაშლით, სამშენებლო ნაგავი გატანილი იქნება ხელის მიქანიკური საშუალებებით.

დემონტაჟის დაიწყება არსებული კომუნიკაციების ჩახსნით, ზევიდან-ქვევით, ეტაპობრივად.

სახურავის დემონტაჟი მთლიანად მოხდეს ხელით.
თავდაპირველად მოხდება თუნუქის ფირფიტების ჩაჭრა. სამუშაოები ჩატარდეს ხელით. ჩიჭრას ლითონის ფირფიტები. მოიხსნას სახურავის ლითონის ფურცლები. თანმიმდევრობით ჩაიხსნას ფერმების ჰორიზონტალური კავშირები და შემდეგ მოხდეს ხის კოჭების დემონტაჟი მომიჯნავე შენობებთან ახლოს განთავსებული კედლების დემონტაჟი მოხდეს ხელით. მძიმე ტექნიკის გამოყენების გარეშე.

დასაშლელი სამუშაოების წარმოების პერიოდში არსებული ტერიტორიის ფარგლებში მოხდება მასალა-ნაკეთობების (საძირკვლის ბლოკის , ლითონის და სხვა) დაწყობა (დაშტაბელება) ახალ მშენებლობაში გამოყენების თვალსაზრისათ.

დაშლილი სამშენებლო მასალებისა და ნაგვის გატანა გათვალისწინებულია თვითმავალი ამწით და თვითმცვლელი ავტოტრანსპორტით.

სამუშაოთა წარმოების დროს აუცილებელია შრომის უსაფრთხოების წესების დაცვა, აგრეთვე შენობის დაშლის დროს სელიტებუს ზონაში მტვრის გაფანთვისგან

დამცავი ღონისძიებების უზრუნველყოფა: დამცავი ბადე და ხის დამცავი ღობე, როგორც ნაჩვენებია გენ. გეგმაზე.

დაშლის სამუშაოებზე დამკვეთის მიერ დადგენილია გეგმიური ხანგრძლივობა.

2. დასაშლელი ობიექტების დახასიათება.

სადემონტაჟო შენობა-ნაგებობები წარმოადგენს გასული საუკუნის შუა წლებში აშენებულ ობიექტებს.

უმეტეს წილად მზიდ კონსტრუქციას ბეტონის მზიდი ბლოკები. საძირკვლად გამოყენებულია რკინა-ბეტონის კონტრუქცია. სახურავი შესრულებულია ღრუტანიანი ფილებით (სიმკარებით)

შენობის კომუნიკაციები (წყალგაყვანილობა, კანალიზაციის სისტემა, ელეკტროგაყვანილობა ფაქტობრივად განადგურებულია.

შენობის მზიდი კონსტრუქცია დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია და დემონტაჟის დროს არ საჭიროებს დამატებით გამაგრებას უსაფრთხოების მიზნით.

3. მითითებები სამუშაოთა წარმოების თაობაზე:

როგორც აღინიშნა ნახაზებზე დასაშლელი სამუშაოების წარმართვა უნდა მოხდეს

ხელით და მხოლოდ მერე ამწის საშუალებით. სამუშაოები უნდა დაიწყოს არსებული კომუნიკაციების ჩახსნით, შემდეგ კი სახურავის დემონტაჟით.

სახურავის დემონტაჟი მთლიანად მოხდეს ხელით.

თავდაპირველად მოხდება თუნუქის ფირფიტების ჩაჭრა. სამუშაოები ჩატარდეს ხელით. ჩიჭრას ლითონის ფირფიტები. მოიხსნას სახურავის ლითონის ფურცლები. თანმიმდევრობით ჩაიხსნას ფერმების ჰორიზონტალური კავშირები და შემდეგ მოხდეს ხის კოჭების დემონტაჟი მომიჯნავე შენობებთან ახლოს განთავსებული კედლების დემონტაჟი მოხდეს ხელით. მძიმე ტექნიკის გამოყენების გარეშე.

მოხსნილი მასალები გასუფთავდეს, გაიწმინდოს და გატანილ იქნას (იმთავითვე) შესაბამისი მძიმე ტექნიკით.

4. მოთხოვნილება კადრებზე და დროებით შენობა-ნაგებობებზე:

შენობის დაშლის პერიოდში მუშათა რაოდენობა სხვადასხვა იქნება.

შენობის დაშლის პროცესში სხვა საყოფაცხოვრებო სათავსოების და კანტორის მოწყობის მიზანშეწონილობა დამოკიდებულია სამუშაოთა მწარმოებელზე.

აგრეთვე შენობის დაშლის პერიოდში უსაფრთხოების მიზნით დემონტაჟის ტერიტორია უნდა შემოიღობოს.

5. მოთხოვნილება სამშენებლო ავტოტრანსპორტზე:

ავტოტრანსპორტი ანგარიშდება 1მლნ/ლარ სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოთა ღირებულების წლიური მოცულობის მიხედვით.

თანამედროვე პირობებში მანქანების დაქირავება წარმოებს მოთხოვნილობის მომენტისთვის.

სამშენებლო მანქანების, მექანიზმების, დანადგარების და ინსტრუმენტების ჩამონათვალი:

#/#	დასახელება	რაოდენობა
1	თვითმცვლელი ძარიანი და სპეცდანიშნულების ავტოტრანსპორტი სამშენებლო ტვირთის გადასატანად.	3
2	გადასატანი კომპრესსორი	4
3	ელექტროშესადუღებელი საჭრელი აგრეგატი	3
4	ავტოგენური შედუღების და ჭრის აპარატი	3
5	მობილური ამწეები ავტოსვლაზე	2
6	პნევმატიური ინსტრუმენტები (საბურღი, ძრაძნდამჭერი და სხვა)	6

მითითება: აღნიშნულ ტექნიკას შეიძლება დაემატოს უფრო თანამედროვე ან სხვა მანქანა-მექანიზმები და ინვენტარი.

6. მუშათა შორის უსაფრთხოების წესების დაცვის თაობაზე:

მომუშავეთა შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვა შენობათა დაშლის ცალკეულ ეტაპზე აუცილებელია სნწ III-4-80* ''უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაძე'' და სხვა ნორმატიულ საკანონმდებლო შესაბამისობით.

მათგან ყურადღებას ვამახვილებთ შემდეგზე:

13.1 სამუშაო ადგილები მუშაობის პირობებისა და ტექნოლოგიურობის გათვალისწინებით უზრუნველყოფილი უნდა იყოს კოლექტიური დაცვისა და სიგნალიზაციის საშუალებით.

13.2 ელექტროუსაფრთხოების წესები ჩამოყალიბებულია სახ. სტ. 12. 013-88, ელექტროკარადა ყოველთვის უნდა იყოს ჩაკეთილ მდგომარეობაში, ელექტროკაბალაბი, ელექტროსადენები და ელექტრომოწყობილობები კი იზოლირებული.

13.3 ამწეების მუშაობის პირობებში დაუშველებელია უცხო პირთა, ასევე დაშლის ოპერაციებში დაუსაქმებელ მუშა-მოსამსახურეთა ყოფნა გენგეგმაზე შემოხაზულ ამწეთა მოქმედების სახიფათო ზონის ფარგლებში . ასეთი ზონები შესაძლებელია სცილდებოდეს შემოღობილ ტერიტორიის ფარგლებსაც, რის გამოც აუცილებელია შემომზღუდავი ღონისძიებების განხორციელება.

იკრძალება ისრის ტრიალი დასაშლელი შენობის გარეთ.

დაშლილი კონსტრუქციის ჩამოშვებაუნდა განხორციელდეს შენობის ვერტიკალის გასვრივ, მათი მათი ავტოსატრანსპორტო საშუალებებში პირდაპირი ჩატვირთვით.

კონსტრუქციიდან მარყუჟების ჩახსნაზე გამოყოფილი მუშები შორიდან ხელმძღვანელებენ ჩამოშვების პროცესს. შემდეგ უახლოვდებიან და ასრულებენ მანქანაში ჩატვირთვას უსაფრთხოების წესების დაცვითა და მარყუჟების შესხნით.

იკრძალება ამწის ისარზე ჩამოკიდებული ტვირთით ისრის შემობრუნება მოედნისა ან ქუჩის მხარეს, ცხადია ისრის ტრიალიც ღერძის გარშემო.

აუცილებელია ტერიტორიაზე გაიკრას ამწის მოქმედების სახიფათო ზონების აღმნიშვნელი პირნიშნები ღობის გარეთა რადიუსების მითითებით მეტრებში.

ღამის პერიოდში უსაფრთხოების ზონის ეს ნიშნები აუცილებელია განათდეს.

7. ბუნების დაცვითი და ჰაერის დაბინძურების საწინააღმდეგო ღონისძიებები.

შენობის დაშლის პერიოდში აუცილებელია შემდეგი ღონისძიებების დაცვა:

- ✓ გარემოს დაცვის სამსახურის ნებართვის გარეშე იკრძალება მრავალწლიანი ხეების და ნარგავების მოჭრა, ამოძირკვა და განადგურება.
- ✓ კედლების, ტიხრების, იატაკის ფილის დაშლის პროცესში მოსალოდნელია მტვრის გაფანთვა გარე სივრცეში, რის გამო შენობას უნდა ჩამოეფაროს ფარდა ან სამუშაოები განხორციელდეს დახურულ სივრცეში ვენტილაციის მოწყობით.
- ✓ იკრძალება სამშენებლო ნაგვისა და ნარჩენების ღია წესით ჩამოყრა. სასურველია სამშენებლო ნაგვის ჩამოყრა პირდაპირ თვითმცვლელი მანქანების ძარებში. დიდი ზომის სამშენებლო ნარჩენები ან მოხსნილი ნაკეთობები (მაგ. გისოსები) უნდა ჩამოუშვას ამწის საშუალებით. აქაც სასურველია მაშინვე მოხდეს მათი ავტომანქანების ძარებში ატვირთვა ან დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე ტრანსპორტირება.
- ✓ დაუშვებელია ამოსახაპი ორმოების მოწყობა.

დაშლით სამუშაოებში დასაქმებული პერსონალი დაცული უნდა იყოს თავის დამცავი ჩაფხუტებით (კასკებით).

დაუშვებელია მანქანების, ხელსაწყობების და მოწყობილობების დატოვება ჩართულ მდგომარეობაში, ზედამხედველობის გარეშე. ცხადია მათი მომსახურებაც უნდა მოხდეს ძრავის გამორთვის შემდეგ.

ლითონის ელემენტების ჩაჭრას ელექტრო ან აიროვანი აპარატებით ქვედა იარუსზე 5 მ რადიუსში ფართობები უნდა გავანთავისუფლოდ წვადი მასალებისგან.

მხოლო 10 მ რადიუსში ფართობები უნდა გავანთავისუფლოდ ასაფეთქებელი მასალებისგან.

დასაშლელ სამუშაოებზე დასაქმებულმა პერსონალმა (როგორც მუშამ ასევე მოსამსახურემ) უნდა შეისწავლოს შრომის უსაფრთხოების წესები, გაიაროს ინსტრუქტაჟი, ჩააბაროს გამოცდა სპეციალურ ჟურნალში ხელმოწერების დაფიქსირებით.



დემონტაჟის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი

შენობების დემონტაჟი 01/3.

N	სამუშაოების ჩამონათვალი	6 თვე		
		2 თვე	2 თვე	2 თვე
1	ტერიტორიის მომზადება			
2	საინჟინრო კომუნიკაციების ჩახსნა			
3	შენობების დემონტაჟი 01/2.			
4	სამშენებლო მასალის დასაწყობება			
5	სამშენებლო მოედნის გასუფთავება ნარჩენებისაგან			

			მისამართი: ქ. თბილისი, თორნიკე ერისთავის ქ. №38 ს.კ. 01.12.08.037.085			
დირექტორი		ბ. ხუცილიძე	კლინიკის დემონტაჟის პროექტი			
არქიტექტორი		მ. სისიაშვილი				
დამკვეთი		შ.პ.ს. „№1 ქალთა კონსულტაცია"	ფურცელი	რაოდენობა	მასშტაბი 1:100	თარიღი 2024 წ.

ქ. თბილისი, თორნიკე ერისთავის ქ. №38 - 546კვ.მ.

არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ს/კ01.12.08.037.085

ტოპოგრაფიული გეგმა

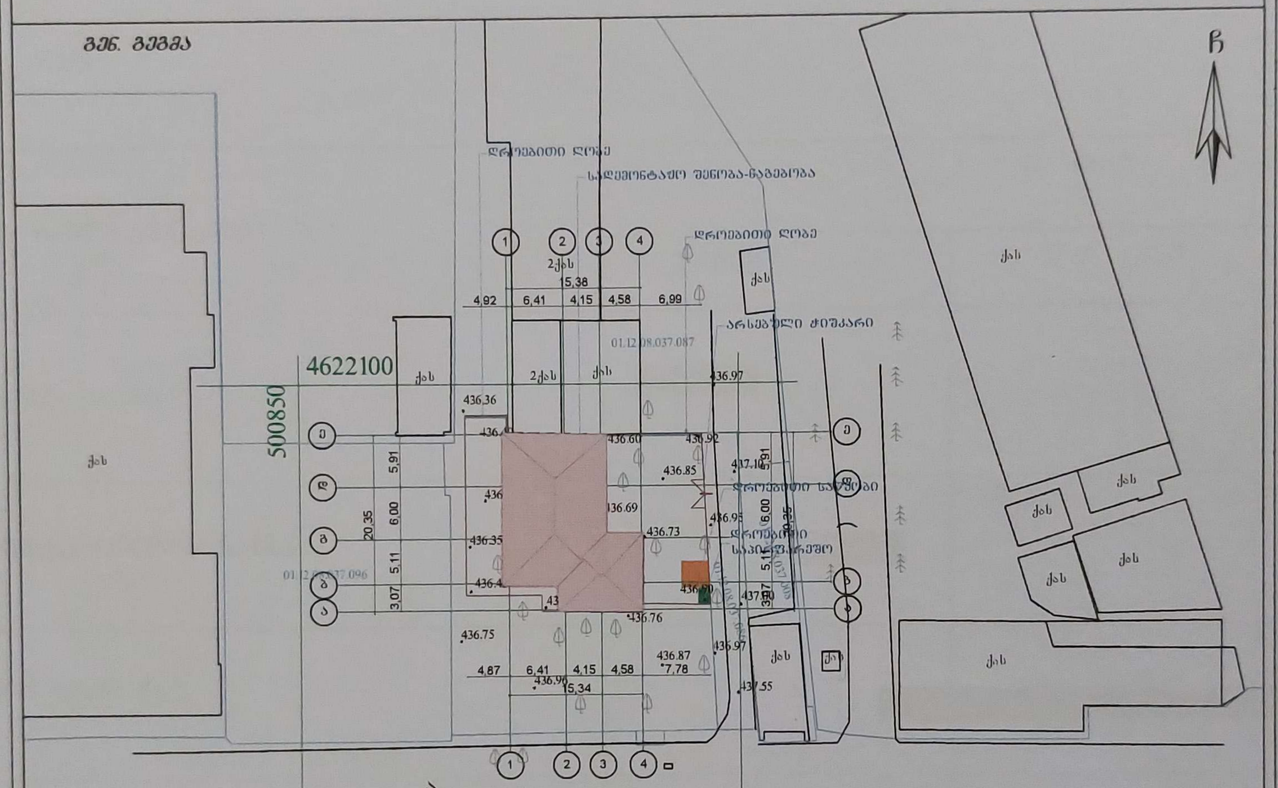

თორნიკე ერისთავის ქუჩა

პირობითი აღნიშვნები

WGS 1984 -ის კოორდინატთა სისტემის UTM პროექცია

	საც. შენობა		ბორდიული ქვა ღობე		გზა
	არასაც. შენობა		ქის კედელი		წყალგაყვანილობა
	დამჭერი		ძეგლი		გაზი
	მშენებარე შენობა		ფილტე	ქ	ქანალიზაცია
	სატრანსფორმ. ჯიხური		რკინაბეტ.	სად	სანაგვე
	ხელი		სამოძრაო ნაწილი	ქმ	ელექტროგაყვანილობა
	ბაღი ბაღის გარე განათება			თმ	ელ. ქსელები განათება

ქმ	ელექტრო ქსელი		სერვიტუტი
ბეტონი			
წყალგაყვანილობა			
გაზი			
ქანალიზაცია		ბოძკარი	
სანაგვე			
ელექტროგაყვანილობა		გზანი	
ელ. ქსელები განათება			

შენიშვნა: 1) ნაკვეთის საზღვარი (თუ იგი არ ემთხვევა ნახაზზე) მითითებულია დამკვეთის მიერ

2) მიწის სამუშაოების შესრულებისას შეტყობინეთ კომუნალიების წარმომადგენლებს

შპს „იმპლი – R"

დირექტორი		რ. ჩვენელიძე
ა/ოსი		რ. ჩვენელიძე
დახაზა:		მ. ჩვენელიძე
დამკვეთი:		შპს "N1 ქალთა კონსულტაციები"
მაშტაბი: 1:500		02.07.2024 წ.

საქართველო. შპს სამშენებლო კომპანია MEDIAR GEORGIA. BUILDING COMPANY 400246386

I სართულის გეგმა

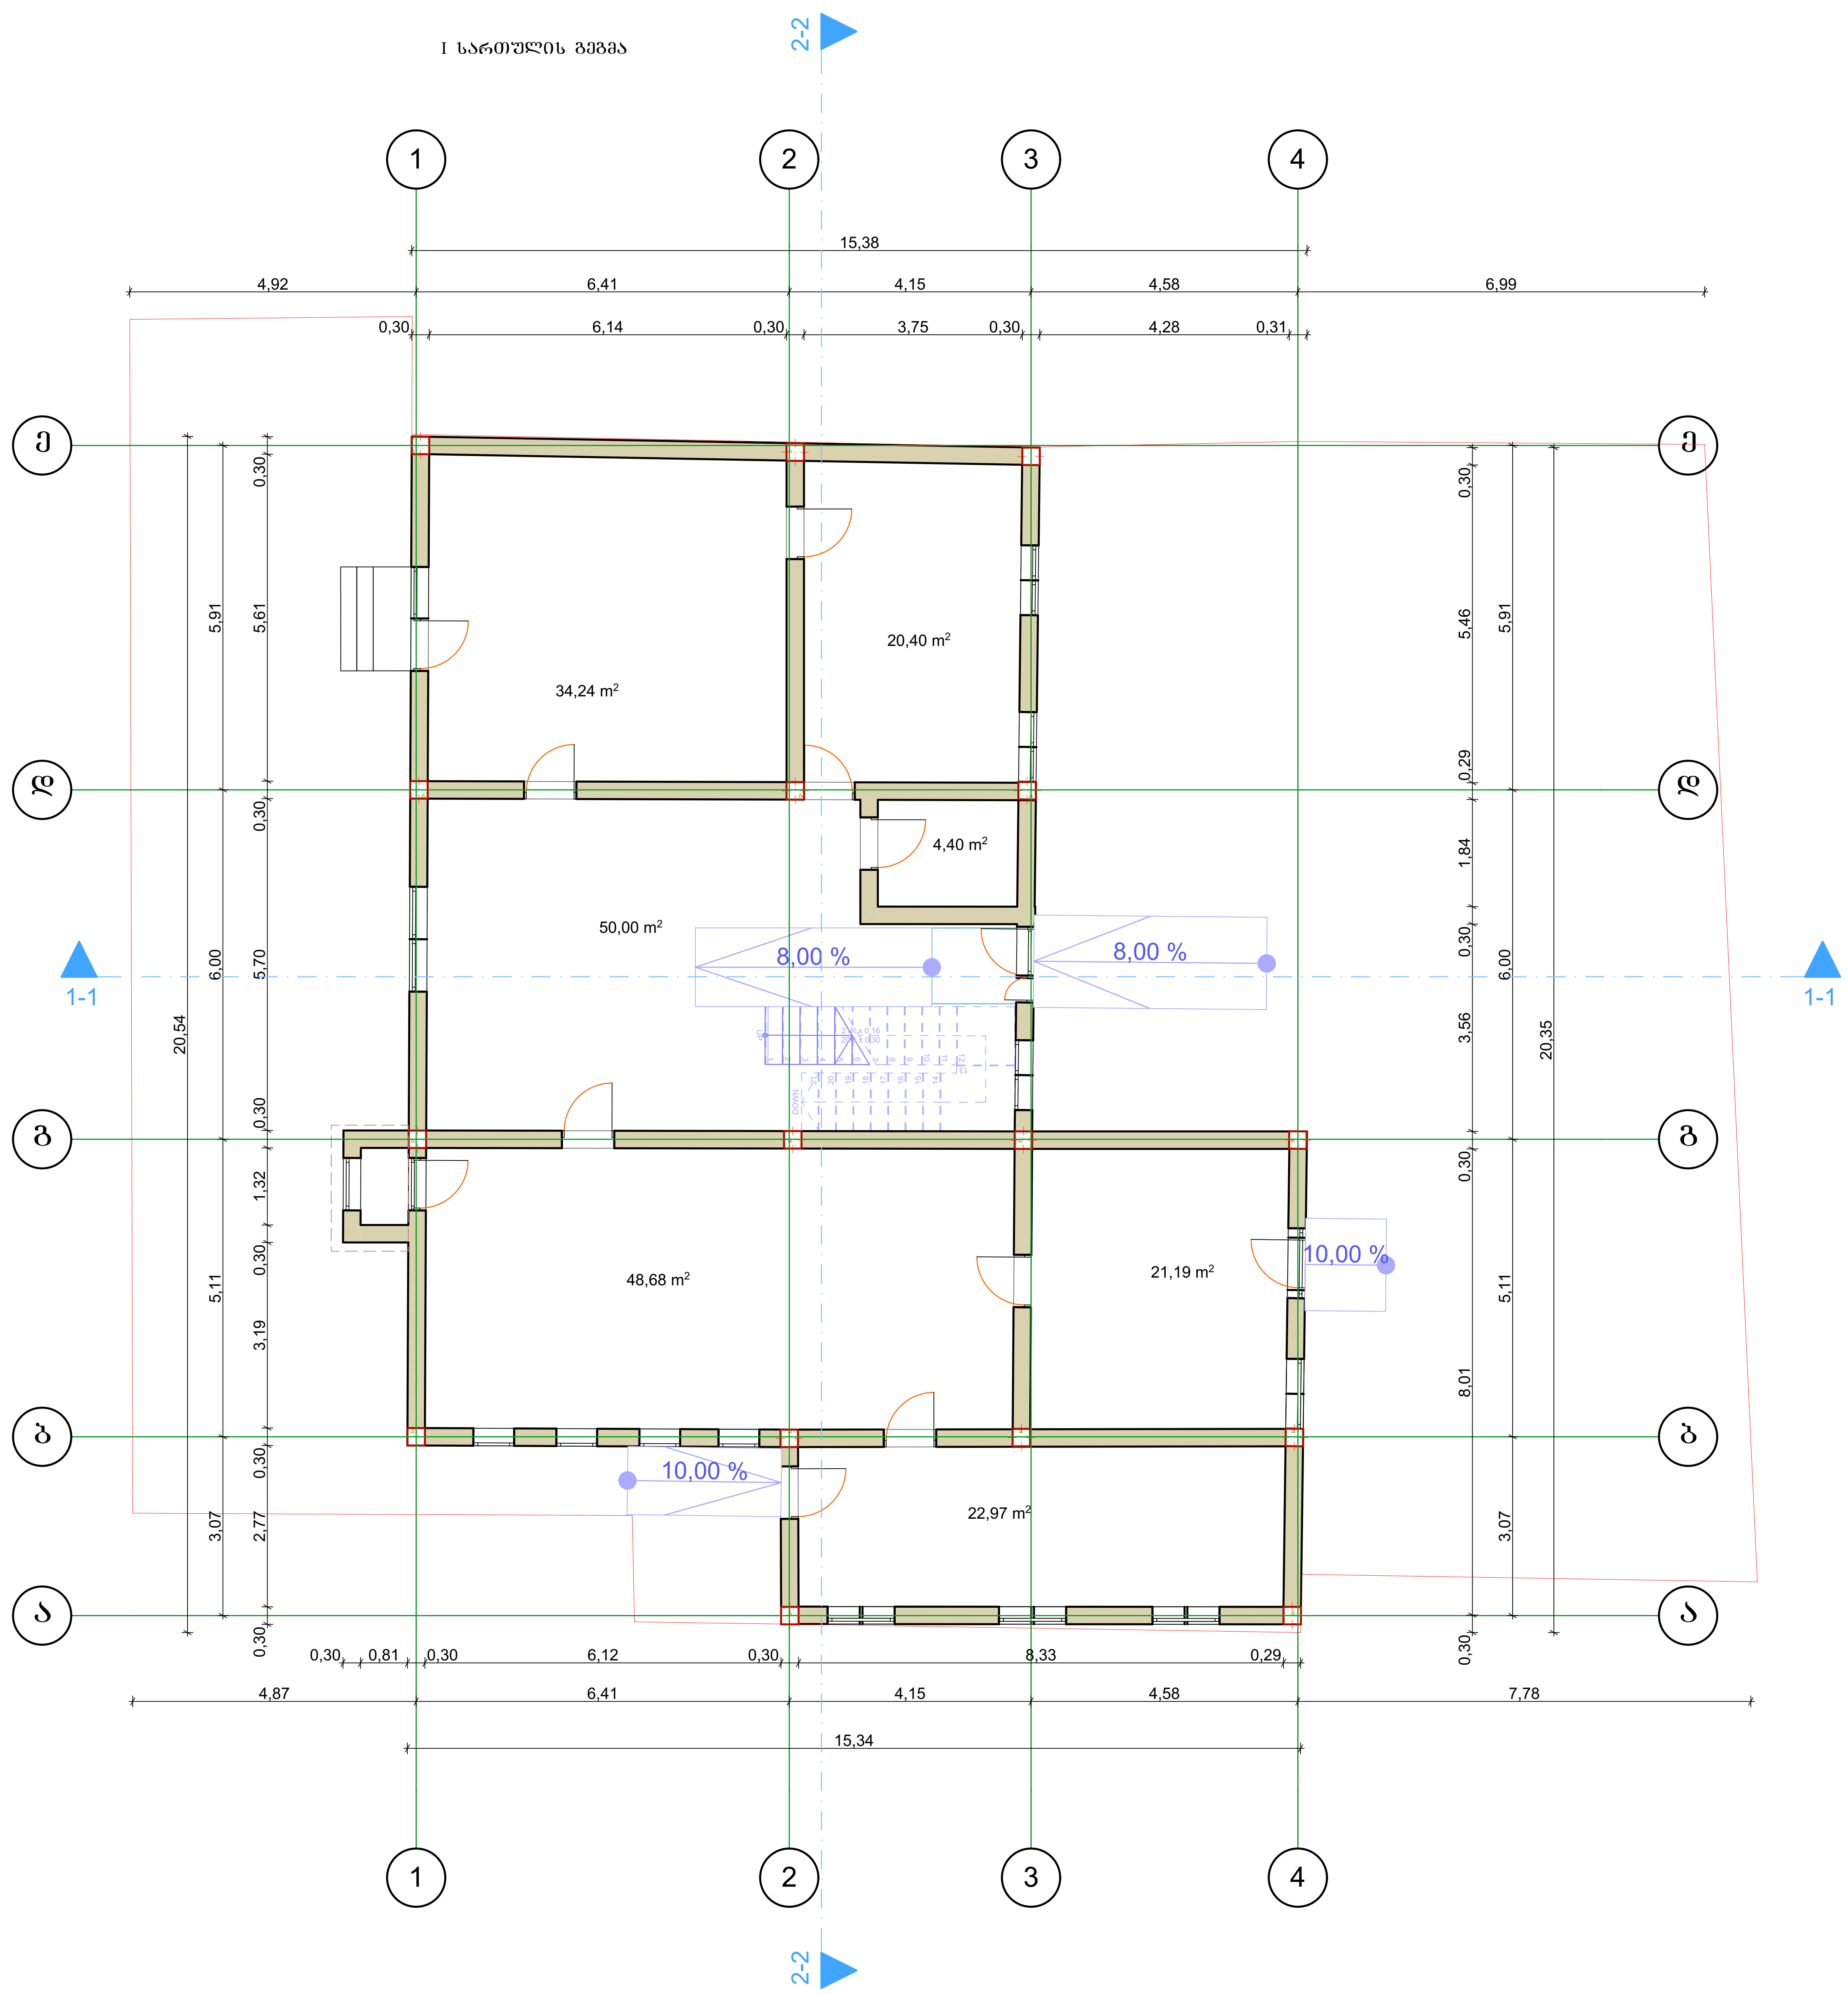

four group			მისამართი: ქ. თბილისი, თორნიკე ერისთავის ქ. №38 ს.კ. 01.12.08.037.085
დირექტორი		მ. ხვედელიძე	კლინიკის დემონტაჟის პროექტი
არქიტექტორი		მ. სესიაშვილი	
დამკვეთი		შ.პ.ს. „№1 ქალთა კონსულტაცია“	ფურცელი / რაოდენობა / მასშტაბი 1:100 / თარიღი 2024 წ.

II სართულის გეგმა

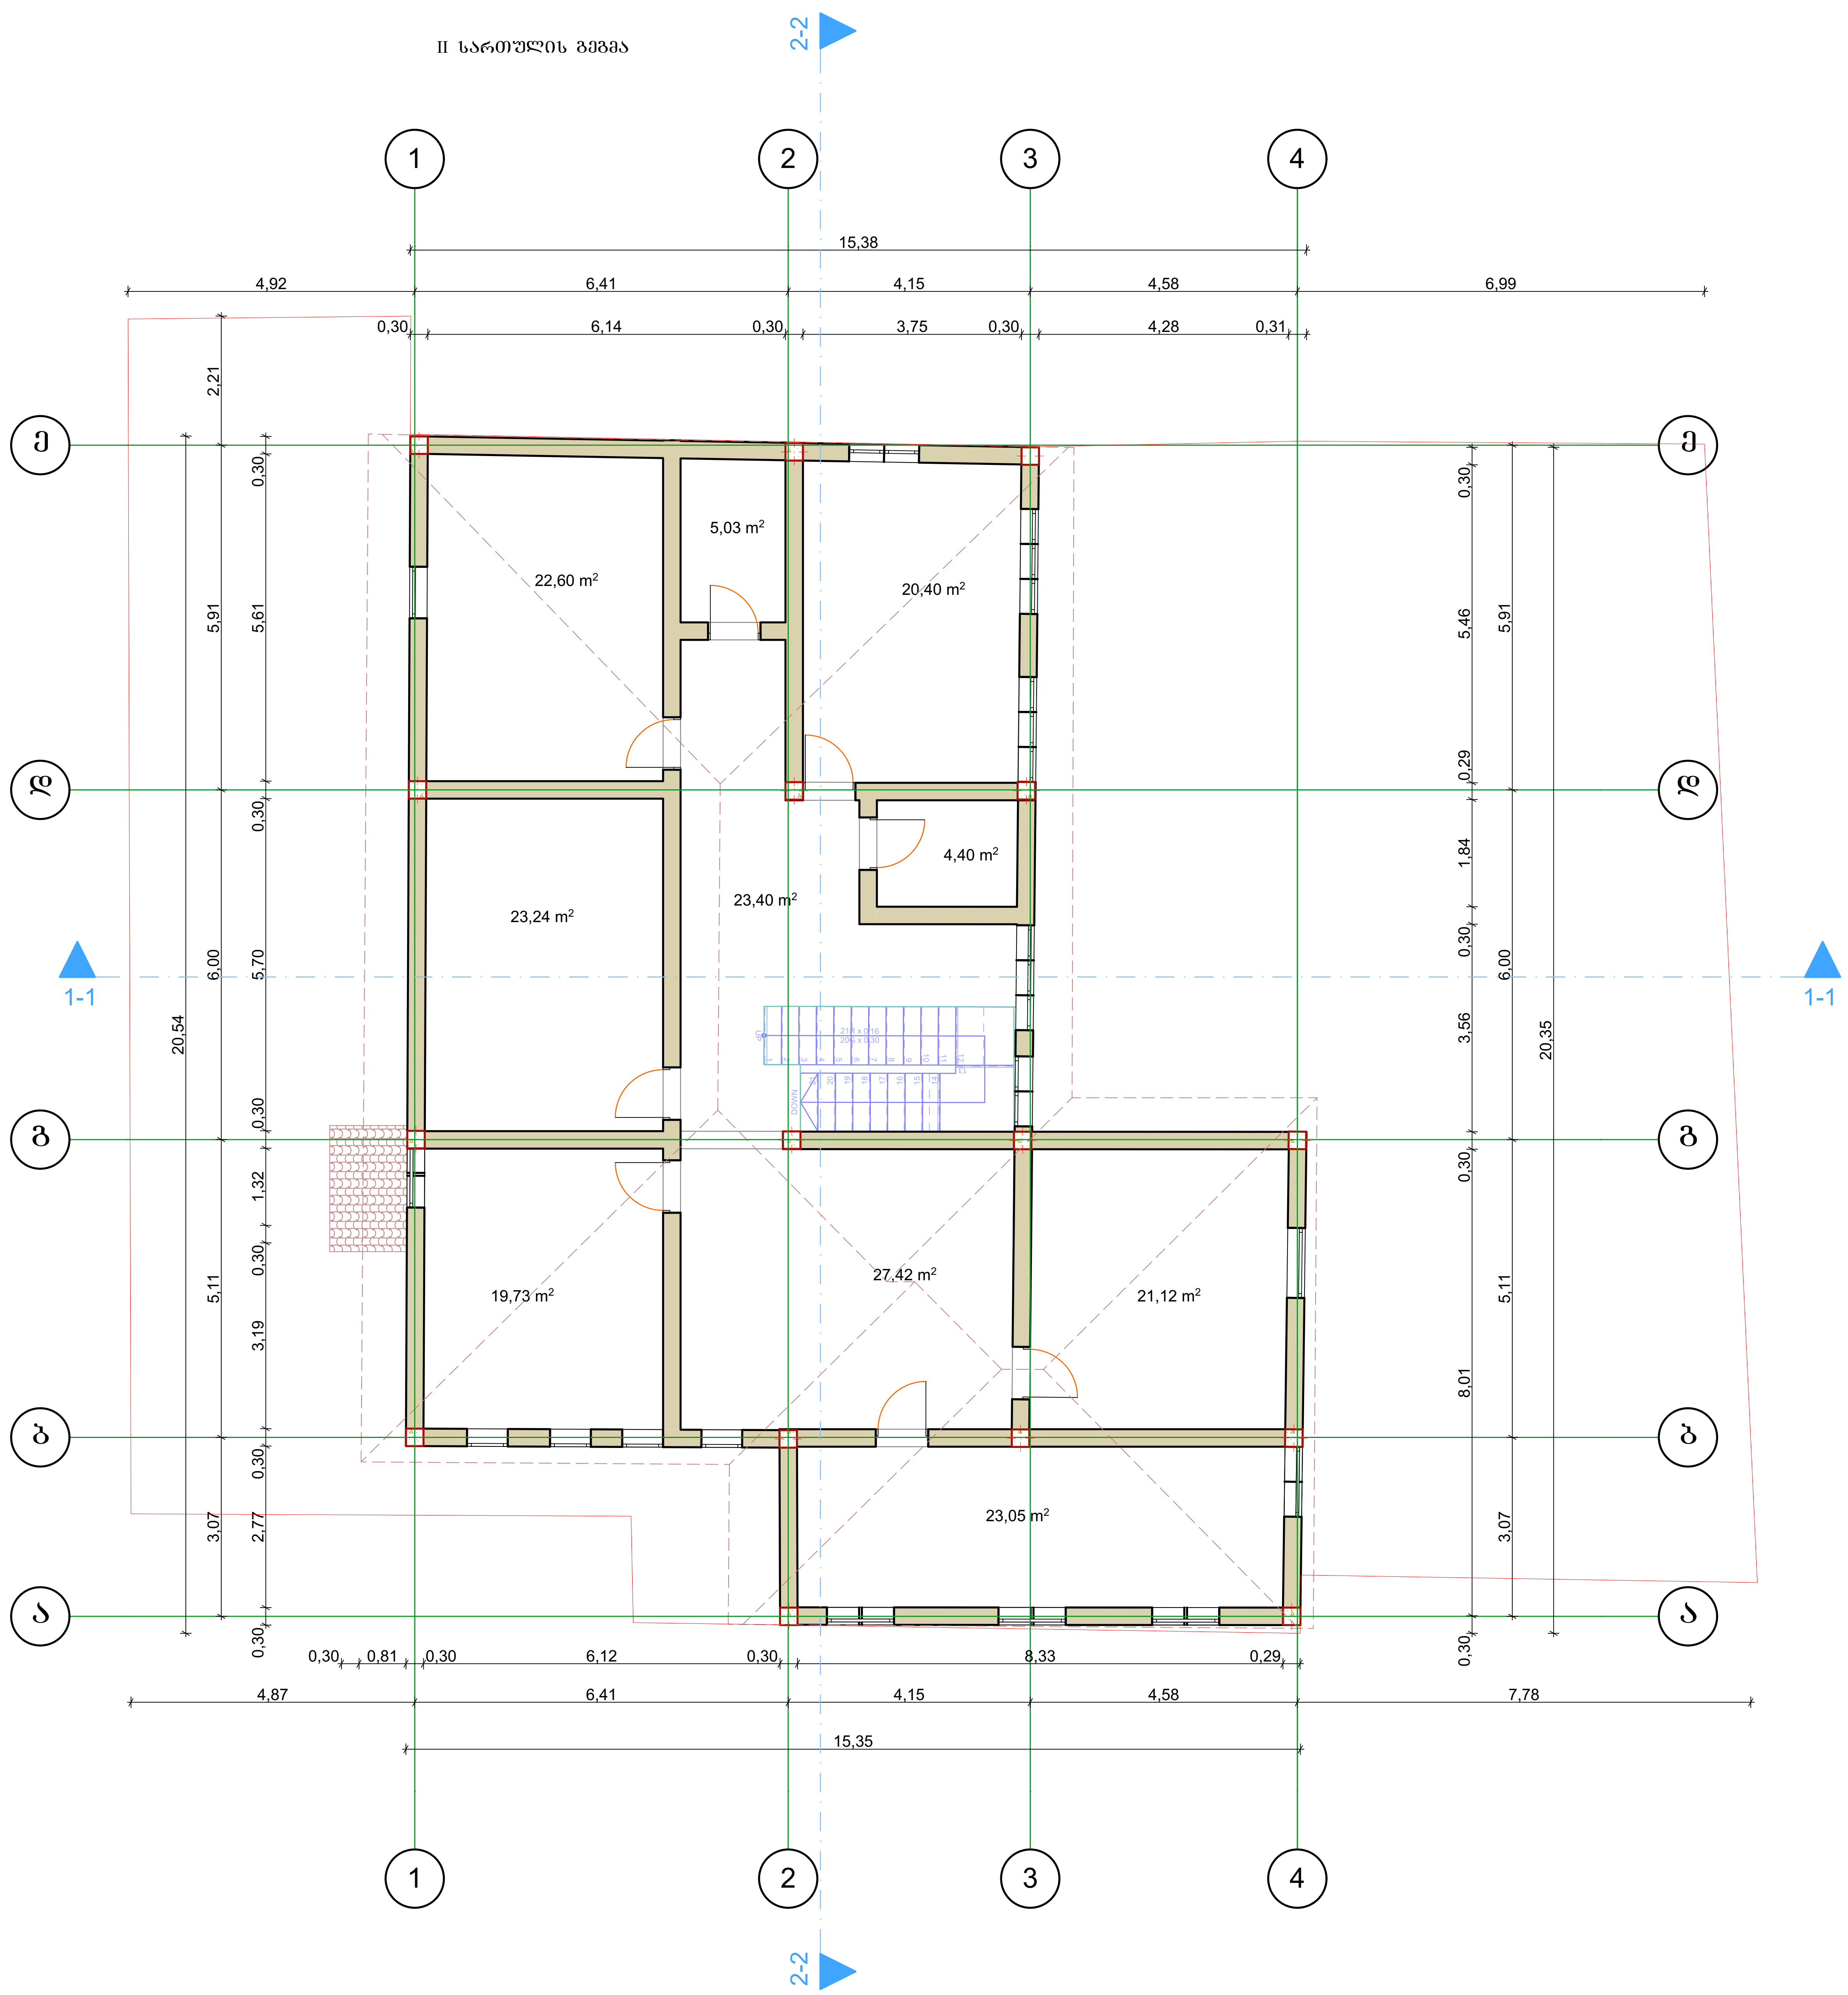

four group			მისამართი: ქ. თბილისი, თორნიკე ერისთავის ქ. №38 ს.კ. 01.12.08.037.085
დირექტორი		მ. ხვედელიძე	კლინიკის დემონტაჟის პროექტი
არქიტექტორი		მ. სესიაშვილი	
დამკვეთი		შ.პ.ს. „№1 ქალთა კონსულტაცია“	ფურცელი / რაოდენობა / მასშტაბი 1:100 / თარიღი 2024 წ.

სახურავის გეგმა

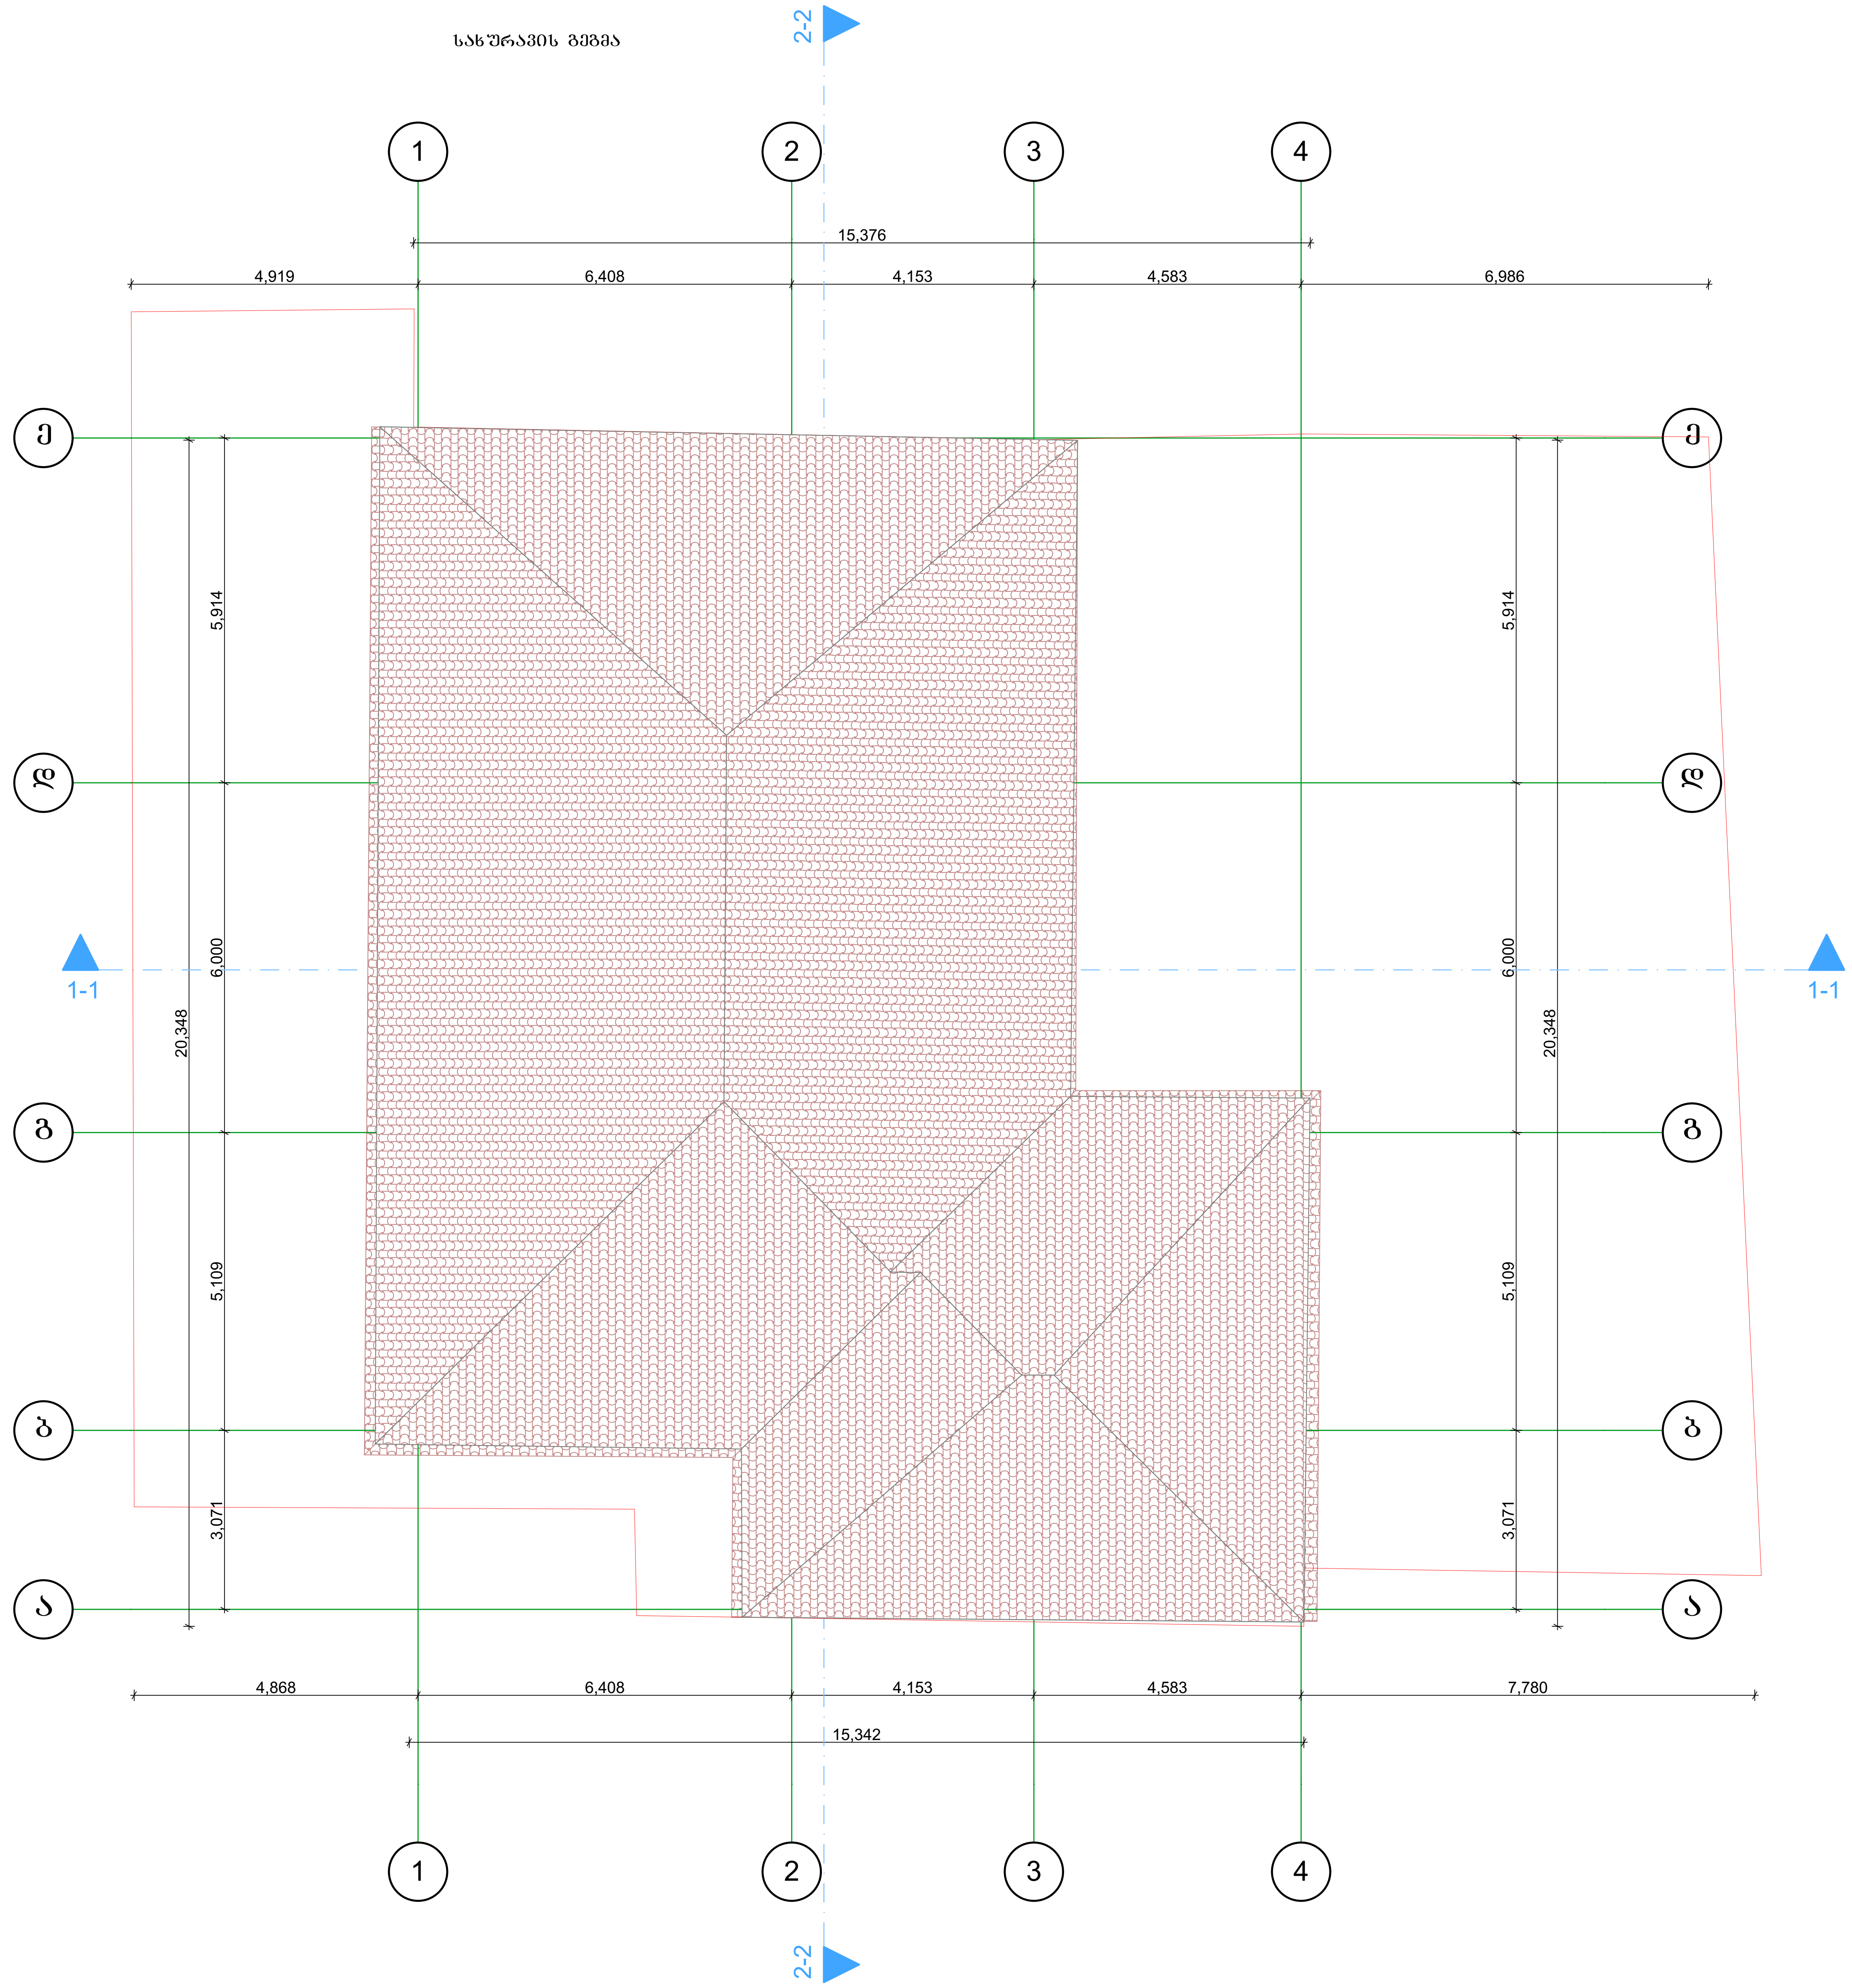

four group		მისამართი: ქ. თბილისი, თორნიკე ერისთავის ქ. №38 ს.კ. 01.12.08.037.085	
დირექტორი	მ. ხვედელიძე	კლინიკის დემონტაჟის პროექტი	
არქიტექტორი	მ. სესიაშვილი		
დამკვეთი	შ.პ.ს. „№1 ქალთა კონსულტაცია“	ფურცელი	რაოდენობა
		მასშტაბი 1:100	თარიღი 2024 წ.

ფასადი ა-ე ღერძებს შორის



East Elevation

four group			მისამართი: ქ. თბილისი, თორნიკე ერისთავის ქ. №38 ს.კ. 01.12.08.037.085
დირექტორი		მ. ხვედელიძე	კლინიკის დემონტაჟის პროექტი
არქიტექტორი		მ. სესიაშვილი	1:100
დამკვეთი		შ.პ.ს. „№1 ქალთა კონსულტაცია“	ფურცელი / რაოდენობა / მასშტაბი 1:100 / თარიღი 2024 წ.

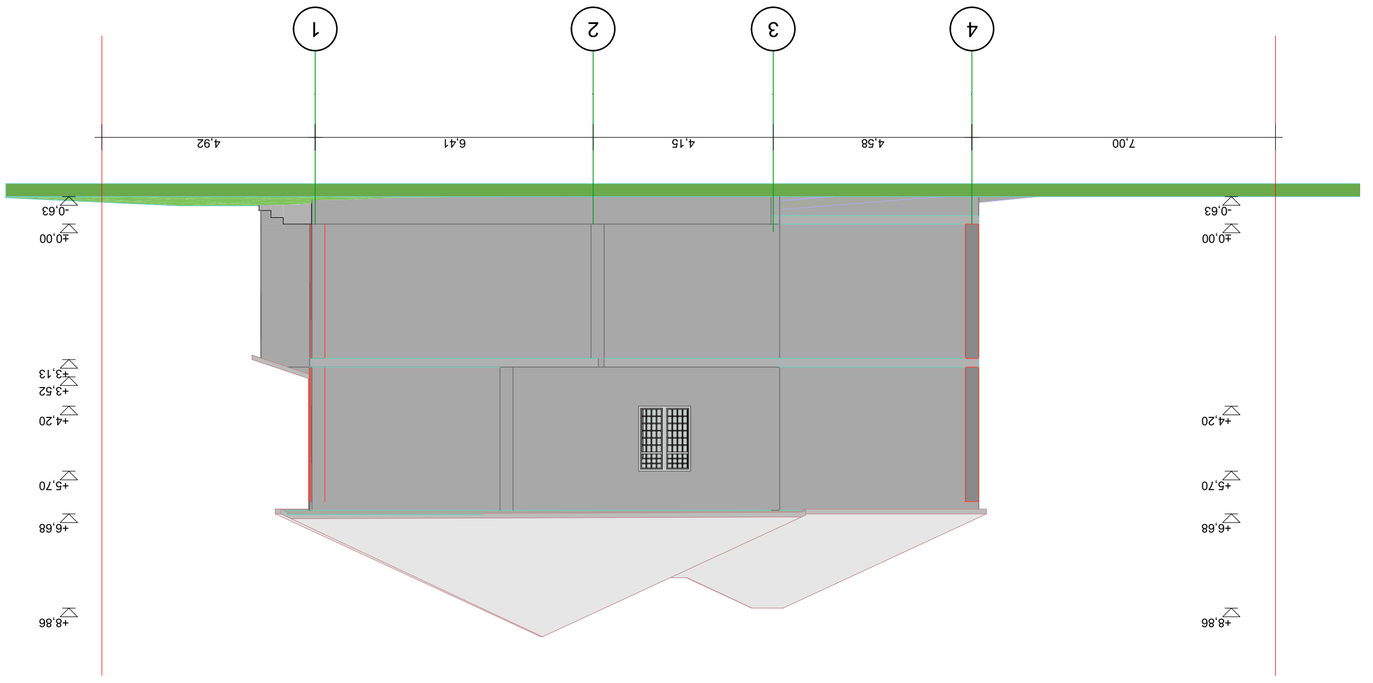

Фасада 4-1 с разбивка по оси

ЗОЛА ЕООД, гр. Пловдив, ул. Васил Левски 38, ет. 1, ап. 1
тел. 0888 123 456, e-mail: office@zola.bg

Изпълнителен проект		Жилищна сграда с 4 апартамента и 4 паркоместа			
Фасада 4-1 с разбивка по оси		ул. „Тракия" №12, гр. Пловдив			
Фасади					
Възложител: Иван Петров Георгиев					
Проектант: арх. Мария Стефанова Димитрова					
Дата: 14.03.2024 г.	Мащаб: 1:100	Лист: 5	Листа: 12	Формат: A1	Ревизия: 0

ფასადი 1-4 ღერძებს შორის



			მისამართი: ქ. თბილისი, თორნიკე ერისთავის ქ. №38 ს.კ. 01.12.08.037.085			
დირექტორი		მ. ხვედელიძე	კლინიკის დემონტაჟის პროექტი			
არქიტექტორი		მ. სესიაშვილი				
დამკვეთი		შ.პ.ს. „№1 ქალთა კონსულტაცია“	ფურცელი	რაოდენობა	მასშტაბი 1:100	თარიღი 2024 წ.

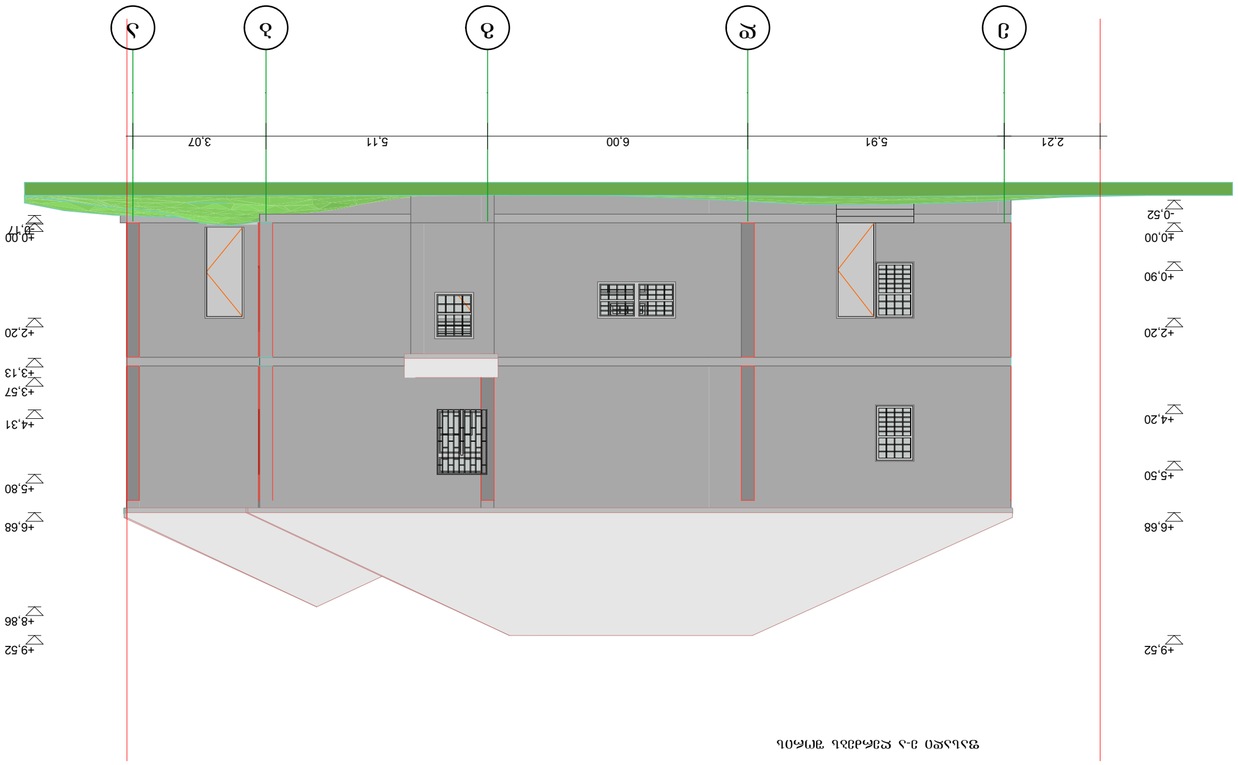

Изм.	Кол.уч.	№док.	Подп.	Дата	ЖК «Новый Свет»	
ГИП	Ахмедов				Стадия	Лист	Листов
Н.контр.	Ахмедов				Р	3	
Разраб.	Ахмедов				ООО «ПОЛЕ»		

Фасад 1-5 с разбивкой по осям

ჭრილი 1-1

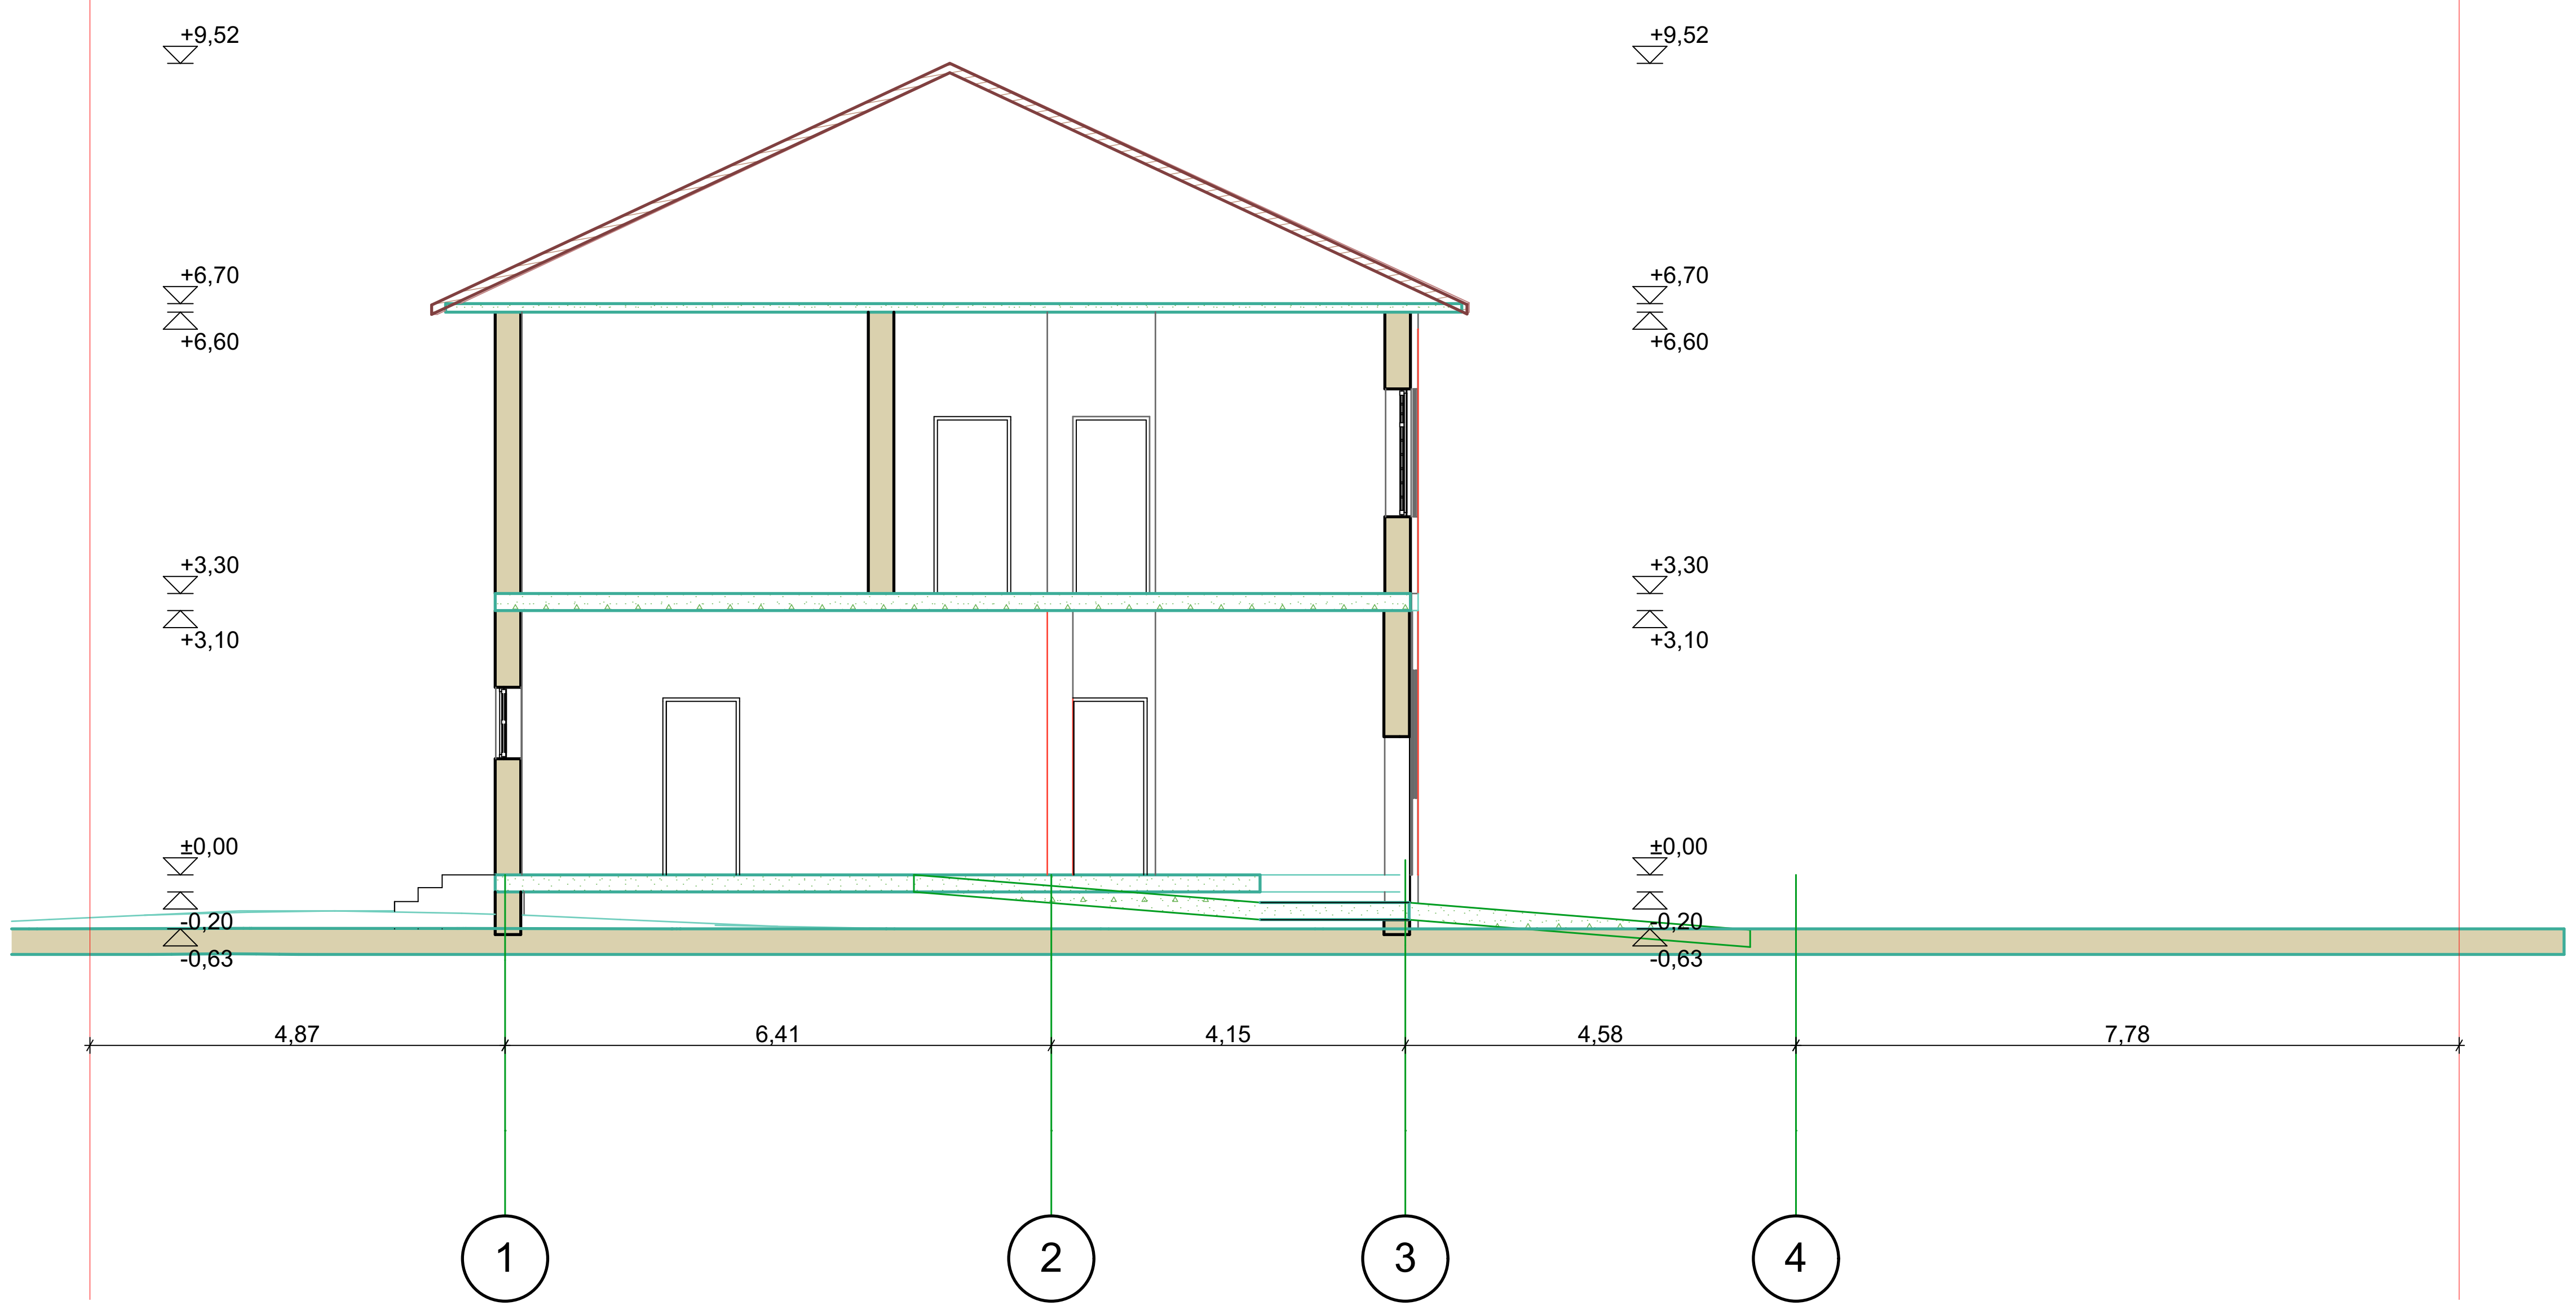

			მისამართი: ქ. თბილისი, თორნიკე ერისთავის ქ. №38 ს.კ. 01.12.08.037.085			
დირექტორი		მ. ხვედელიძე	კლინიკის დემონტაჟის პროექტი			
არქიტექტორი		მ. სესიაშვილი				
დამკვეთი		შ.პ.ს. „№1 ქალთა კონსულტაცია“	ფურცელი	რაოდენობა	მასშტაბი 1:100	თარიღი 2024 წ.

ჭრილი 2-2

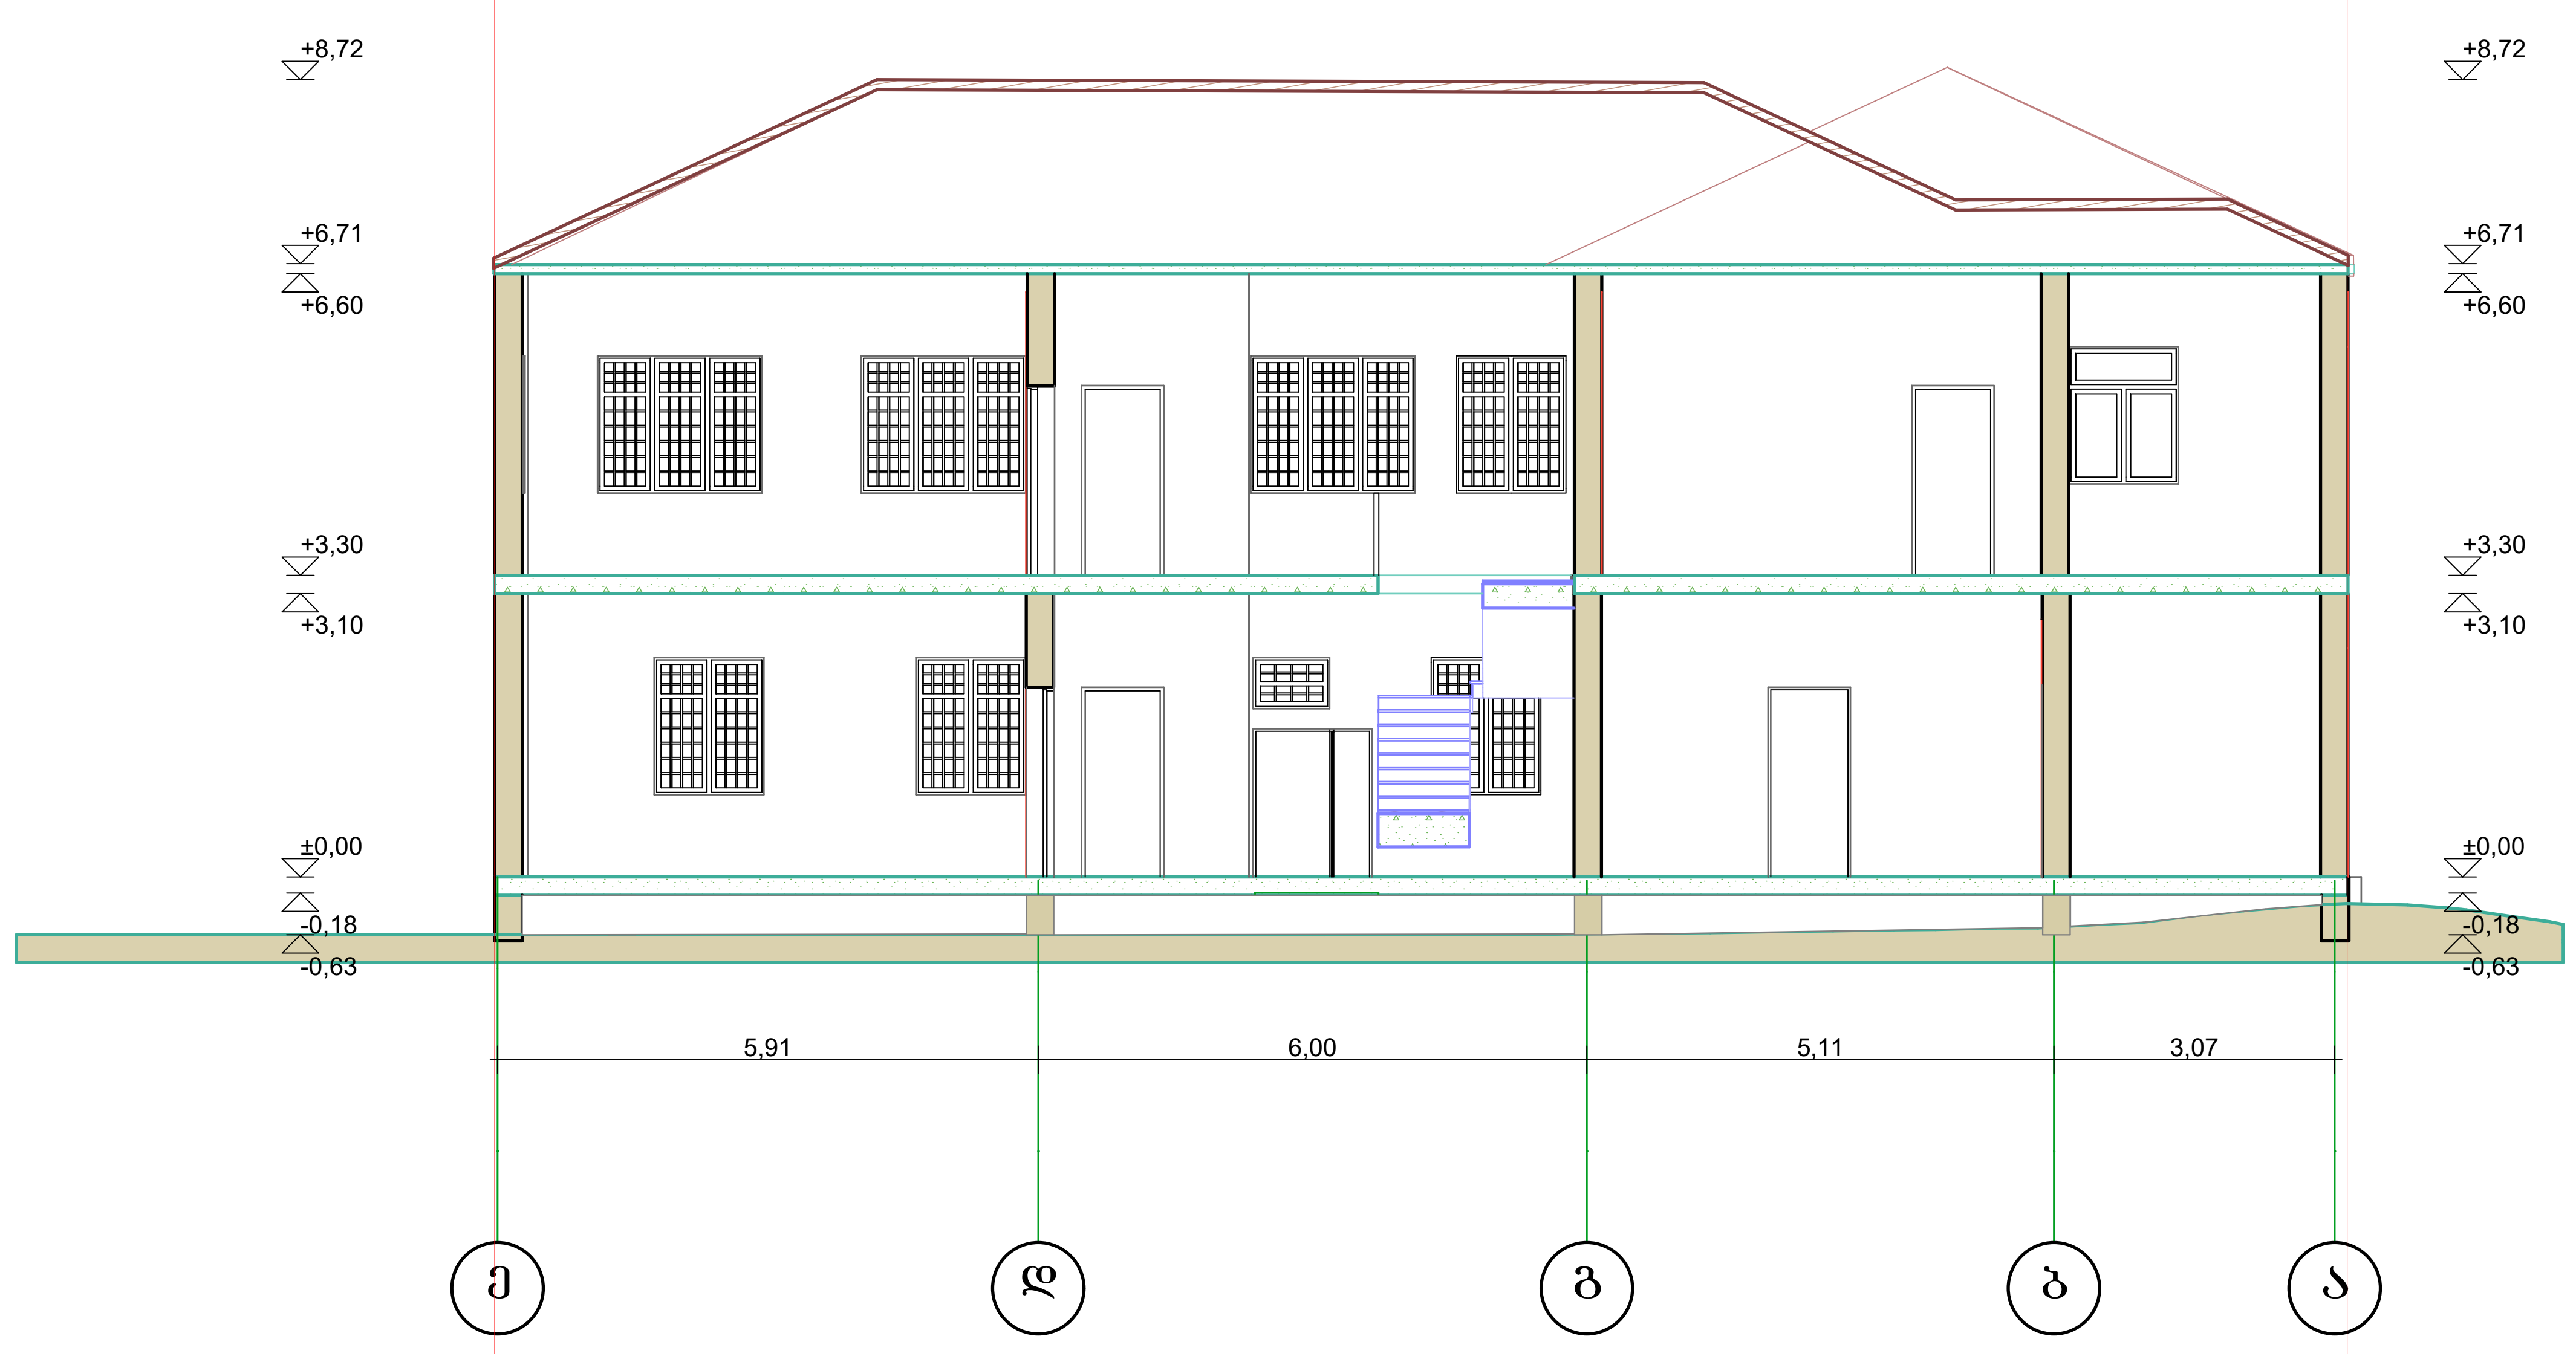

			მისამართი: ქ. თბილისი, თორნიკე ერისთავის ქ. №38 ს.კ. 01.12.08.037.085			
დირექტორი		მ. ხვედელიძე	კლინიკის დემონტაჟის პროექტი			
არქიტექტორი		მ. სესიაშვილი				
დამკვეთი		შ.პ.ს. „№1 ქალთა კონსულტაცია“	ფურცელი	რაოდენობა	მასშტაბი 1:100	თარიღი 2024 წ.

ქ. თბილისი, თორნიკე ერისთავის ქ. №38 - 546კვ.მ.

არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ს/კ01.12.08.037.085

ტოპოგრაფიული გეგმა

გენ. გეგმა

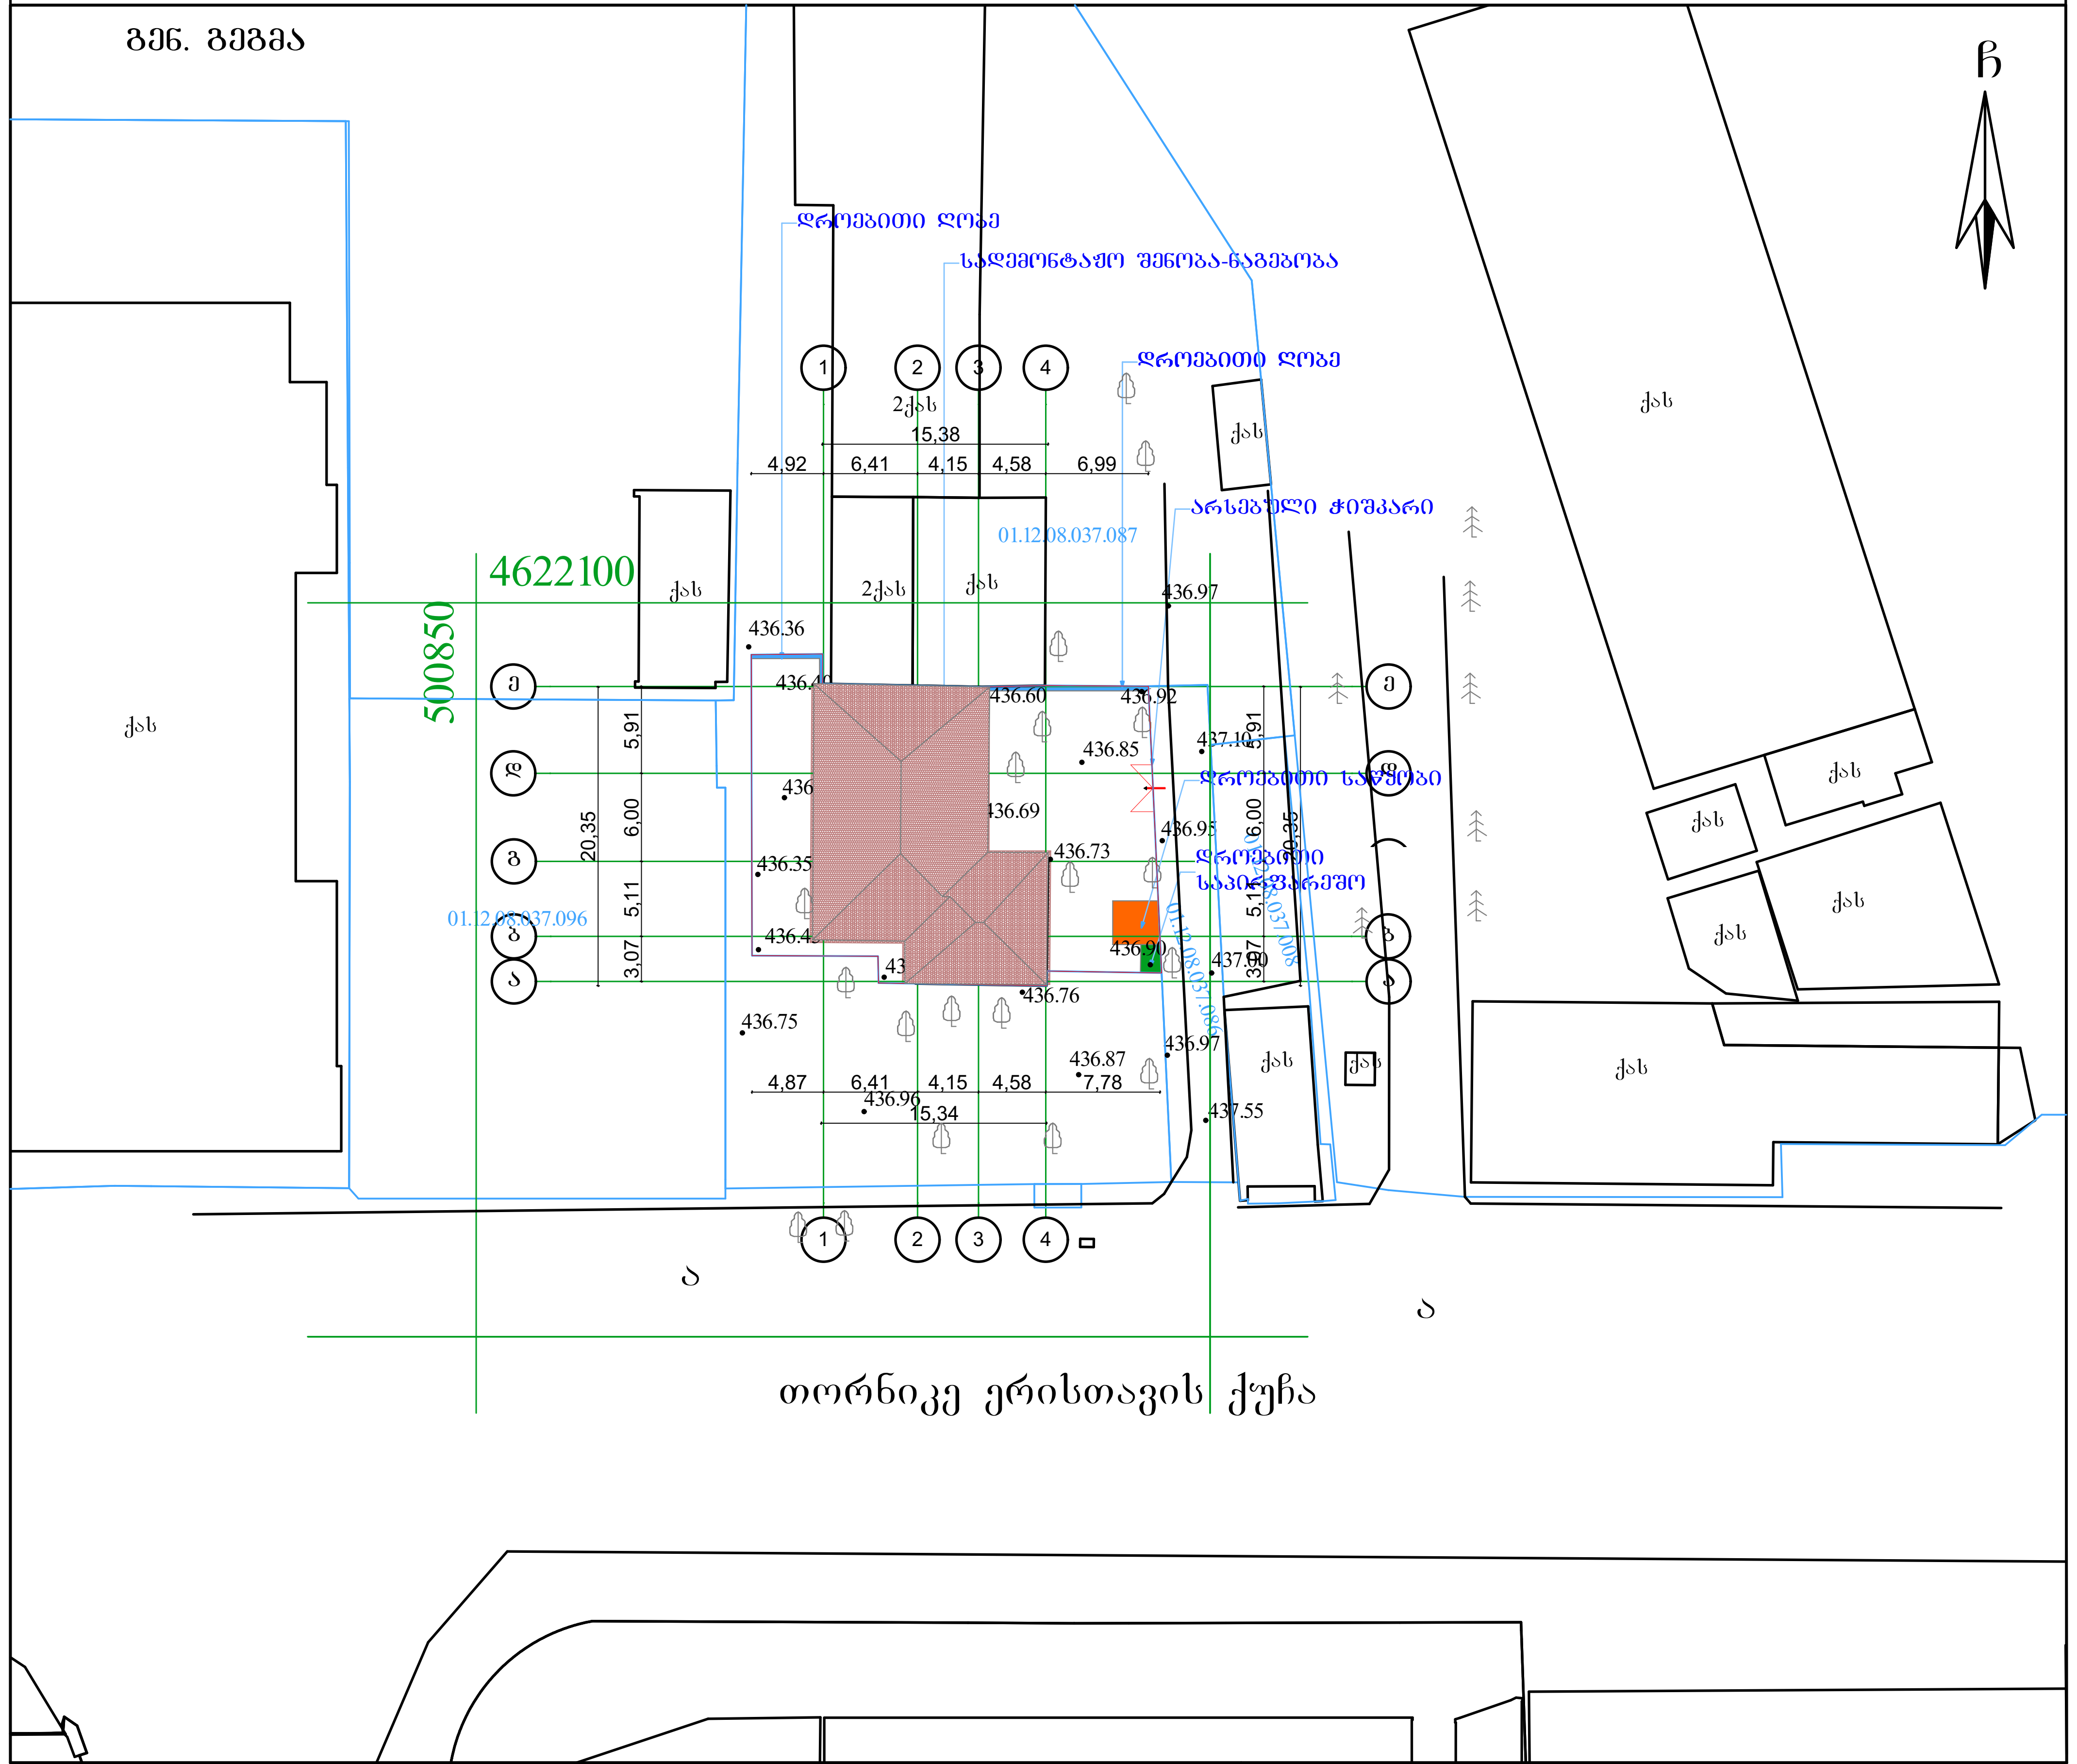

პირობითი აღნიშვნები

WGS 1984 -ის კოორდინატთა სისტემის UTMპროექცია

საცხ. შენობა	ბორდიული	ჭიშკარი
არასაცხ. შენობა	ხის ღობე	ბეტონი
ფარდული	ღობე	წყალგაყვანილობა
მშენებარე შენობა	ქვის კედელი	გაზი
სატრანსფორ. ჯიხური	კედელი	კანალიზაცია
ხეები	ფლატე	სანიაღვრე
გარე განათება	რკინიგზა	კავშირგაბმულობა
	სამეთვალყურეო ჭები	ელ. ქსელები
		გათბობა
სერვიტუტი	ბუჩქნარი	გაზონი

შენიშვნა:1) ——— ნაკვეთის საზღვარი (თუ იგი არის ნახაზზე) მითითებულია დამკვეთის მიერ

2) მიწის სამუშაოების შესრულებისას შეატყობინეთ კომუნიკაციის წარმომადგენლებს

შპს „იმედი – R “

საქართველო, თბილისი, შარტავას ქუჩა 14ა ტელ.: 551 11 14 12

დირექტორი:		რ. ხვედელიძე
აზომა:		რ. ხვედელიძე
დახაზა:		მ. ხვედელიძე
დამკვეთი:		შპს "№1 ქალთა კონსულტაცია"

მაშტაბი: 1:500 | 02.07.2024 წ.

			მისამართი: ქ. თბილისი, თორნიკე ერისთავის ქ. №38 ს.კ. 01.12.08.037.085			
დირექტორი		მ. ხვედელიძე	კლინიკის დემონტაჟის პროექტი			
არქიტექტორი		მ. სესიაშვილი				
დამკვეთი		შ.პ.ს. „№1 ქალთა კონსულტაცია“	ფურცელი	რაოდენობა	მასშტაბი 1:100	თარიღი 2024 წ.

3 ივლ. 2024 12:22:12

3 ივლ. 2024 12:19:44



3 ივლ. 2024 12:22:25

3 ივლ. 2024 12:20:32

3 ივლ. 2024 12:20:08

3 ივლ. 2024 12:21:59

3 ივლ. 2024 12:19:33

3 ივლ. 2024 12:19:40

3 ივლ. 2024 12:21:37

3 ივლ. 2024 12:19:50

არსებული სიტუაციის ფოტოები













არსებული სიტუაციის ფოტოები











