ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

მუნიციპალური ინსპექცია

წერილის ნომერი: **17-01240583017**
თარიღი: **27/02/2024**

ადრესატი: შპს სითი და კოს
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 404398077
მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი 52

თქვენი 05.02.2024წ. N10/01240362213-17 განცხადების პასუხად გაცნობებთ, რომ ,,მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების წესისა და პირობების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის N31 მაისის N255 დადგენილების შესაბამისად მუნიციპალურ ინსპექციაში წარმოდგენილია ქ. თბილისში, დასახლება ვაშლიჯვარი, ქუჩა სარაჯიშვილი, N17-ში (ს/კ №01.10.10.003.005) მიმდინარე მშენებლობის სსიპ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის 10.08.2023წ. N6608338 ბრძანებით განსაზღვრული I-III ეტაპების დასრულების შესახებ შედგენილი საეტაპო ოქმები.

ზაზა კვიციანი

მუნიციპალური ინსპექცია-პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე (მუნიციპალური ინსპექციის უფროსის მოადგილე)

გამოყენებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა/ელექტრონული შტამპი
მერია
024 405026877

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

მუნიციპალური ინსპექცია

წერილის ნომერი: **17-01241651689**
თარიღი: **13/06/2024**

ადრესატი: შპს სითი და კოს
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 404398077
მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი 52

თქვენი 08.06..2024წ. N10/01241605-17 განცხადების პასუხად გაცნობებთ, რომ ,,მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების წესისა და პირობების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის N31 მაისის N255 დადგენილების შესაბამისად მუნიციპალურ ინსპექციაში წარმოდგენილია ქ. თბილისში, დასახლება ვაშლიჯვარი, ქუჩა სარაჯიშვილი, N17-ში (ს/კ №01.10.10.003.005) მიმდინარე მშენებლობის სსიპ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის 11.03.2024წ. N6926226 ბრძანებით განსაზღვრული IV ეტაპის დასრულების შესახებ შედგენილი საეტაპო ოქმი.

ზაზა კვიციანი

მუნიციპალური ინსპექცია-პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე (მუნიციპალური ინსპექციის უფროსის მოადგილე)

გამოყენებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა/ ელექტრონული შტამპი

სამედიცინო დაწესებულება

ქ. თბილისი, სარაჯიშვილის ქ. #17

მშენებლობის ორგანიზების პროექტი

კორექტირება

შპს "სითი და კო"

თბილისი
2024

განმარტებითი ბარათი

მშენებლობის ორგანიზების პროექტი ითვალისწინებს ქ. თბილისში, პ. სარაჯიშვილის ქ №17-ში (ს/კ 01.10.10.003.005) საავადმყოფოს კორექტირებული პროექტის მიხედვით მშენებლობის ორგანიზების დაგეგმვას რიგითობის და ეტაპების მიხედვით. მშენებლობის ორგანიზების პროექტი დამუშავებულია საქართველოს მთავრობის დადგენილება №255 მუხლების 18-20-ის თანახმად.

ტერიტორიაზე განთავსება ერთი ექვს სართულიანი შენობა საპროექტო შენობის კონსტრუქციას წარმოადგენს - რკინა-ბეტონის კარკასი, რომელიც შევსებულია სამშენებლობლოკით. შენობას აქვს ბრტყელი სახურავი.

მშენებლობის ხანგრძლივობა განსაზღვრულია 24 თვით, 2 რიგით და 9 ეტაპით.

ტექნო-ეკონომიკური მაჩვენებლები

N	მაჩვენებელი	ერთ. გან	რაოდენობა
1	**განაშენიანების ფართი**	**მ2**	**6852,35**
2	**საერთო ფართი**	**მ2**	**6118,90**
3	**საოფისე ფართი**	**მ2**	**267,76**
4	**საზაფხულო ფართი**	**მ2**	**247.20**
5	**კიბის უჯრედის და სადარბაზოს ფართი**	**მ2**	**1488,70**
6	**დამხმარე ფართი**	**მ2**	**440,71**
7	**სასწავლო აუდიტორიის ფართი**	**მ2**	**267.60**
8	**პალატების ფართობი**	**მ2**	**2388,14**
9	**საორდინატოროს ფართობი**	**მ2**	**1018,79**

გეოლოგიური დასკვნის საფუძველზე საკვლევი უბანი წარმოადგენს ხელოვნურად მოსწორებულ მოედანს, რომელიც გადაფარულია ტექნოგენური გრუნტით და მეოთხეული ნალექებით (ძირითადად თიხნარებით). ტერიტორიაზე გავრცელებულია შემდეგი ფენები:

- **ფენა №1 ტექნოგენური ნაყარი გრუნტი**, ფენის სიმძლავრე 2.0-4.8მ. ტექნოგენურ გრუნტზე, მისი არაერთგვაროვანი შემადგენლობის გამო კვლევები არ ჩატარებულა. სავარაუდოდ ეს ფენა ქვაბულის გახსნისას მოცილებული იქნება
- **ფენა №2 სგე I - თიხნარი** ყავისფერი, ძნელპლასტიკური, ღორღის 10%-მდე ჩანართებით, სიმძლავრით 1.7-3.0 მ.;

- **ფენა №3 სგე II – თიხნარი**, ყავისფერი, მყარი, ღორღის 10%-მდე ჩანართებით. სიმძლავრით 4.4-6.9 მ
- **ფენა №4 ძლიერ გამოფიტული, ყავისფერი თხელშრეებრივი ქვიშაქვების და არგილიტების მორიგეობა,** გამოვლენილია მხოლოდ №1 ჭაბურღილში 3.5მ სიმძლავრით. ფრაგმენტული გამოსავლის გამო ლაბორატორიული კვლევები ამ ფენაზე არ ჩატარებულა.

საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობის განისაზღვრება. СниП 1.04.03-85

N	შენობა-ნაგებობა	ერთ გან	СниП 1.04.03-85		
			ანალოგი	გვ 4 პ 17-ის მიხედვით	სადემონტაჟო სამუშაოების გათვალისწ.
1	საპროექტო შენობა	თვე	გვ 487. პ 1 T=28.00	T=28.00x1.15=33.00	T=33.00+3.00=36.00

მოსამზადებელ პერიოდში უნდა მოხდეს:

- ხეების გადანერგვა;
- სამი შენობა-ნაგებობის აღება;
- ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი ღობით;
- დროებითი "შენობა-ნაგებობების"განლაგება თავისუფალ, უსაფრთხო ტერიტორიაზე;
- სამშენებლო ნაგვის გატანა;
- საპროექტო ქსელების გაყვანა;
- სამშენებლო მოედნის უზრუნველყოფა დროებითი წყლით და ენერგიით საპროექტო ქსელებიდან;
- სამშენებლო მასალების შემოტანა სამშენებლო მოედანზე;
- ხანძრისგან დაცვის სისტემის გათვალისწინება.

1. სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელება უნდა მოხდეს ზემოდან ქვევით სათანადო კომისიის დასწრებით. **უსაფრთხოების მენეჯერი/სპეციალისტის** მიერ სადემონტაჟო სამუშაოების დაწყებამდე მოხდეს საფრთხეების იდენტიფიცირება, რისკების შეფასება და პრევენციული ზომების შემუშავება!

აკრძალულია: <u>**ორი-სამი კონსტრუქციის სადემონტაჟო სამუშაოების ერთად განხორციელება!**</u>

სამუშოების დროს გათვალისწინებული უნდა იყოს:

2.კონსტრუქციის დროებითი გამაგრება (საჭიროების შემთხვევაში), მუშების სათანადო ინსტრუქტაჟი და უზრუნველყოფა: სპეციალური ქამრებით, რესპირატორებით, დამცავი სათვალეებით, ხმაურდამხშობი საყურისებით, ხელთათმანებით და სპეც. ტანსაცმლით,

დემონტირებული კონსტრუქციების დროებითი დასალაგებელი ადგილი.

ავარიული სიტუაციის შემთხვევაში უნდა მოხდეს სამუშაოების შეჩერება და ყველა სადემონტაჟო კონსტრუქციის გამაგრება. ყველა საშიში ადგილი უნდა იყოს შემოღობილი სათანადო განათებით ღამის საათებში. ყველა შიდა და გარე ქსელი (არსებობის შემთხვევაში) უნდა იქნას გამორთული. სამშენებლო ნაგავი დროულად უნდა იქნას გატანილი. ქვესადგურის ანაკრები ფილების დემონტაჟი განხორციელდეს საავტომობილო ამწის საშუალებით (იხ. ნახაზი მოპი-2).

3. გრუნტის დამუშავება მოხდეს უკუჩამჩიანი ექსკავატორით და ხელით მთლიანი მოცულობის დატვირთვით და გატანით. არსებულ ქსელებთან გრუნტის დამუშავება მოხდეს მარტო ხელით. გრუნტის და ბალასტის უკუჩაყრა მოხდეს ხელით და ბულდოზერით. საჭირო მოცულობა უნდა იქნას შემოტანილი ადგილზე. ქვაბულის დამუშავებისას გათვალისწინდეს წყალქცევითი სამუშაოები.

გრუნტის დამუშავება მოხდეს СНиП-III-4-80, ცხრ№4-ის თანახმად. დამუშავების სიღრმე 1.5მ-მდე, გრუნტი დამუშავდეს:

- ნაყარი 1:0.67;
- კენჭნარი 1:0.5

დამუშავების სიღრმე 3,20-მდე, გრუნტი დამუშავდეს:

- ნაყარი 1:1;
- კენჭნარი 1:1

დამუშავების სიღრმე 4.0მ-მდე, გრუნტი დამუშავდეს:

- ნაყარი 1:1.25;
- კენჭნარი 1:1

ფენა №№3,4-ის დამუშავება მოხდეს წინასწარი გაფხვიერებით.

1. სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება ითვალისწინებს კოშკური ამწე იებჰერრ-სა (იხილე გრაფიკული ნაწილი, ნახ. მოპი 2 და მოპი 4) და სტაციონალური ბეტონის ტუმბოს გამოყენაბას.

2. კოშკური ამწე იებჰერრ 132 ჩ- 10 მუშაობისას უნდა მოხდეს:

- მექანიზმის დაყენება“ზ-თ” და 1-1 ღერძებს შორის, ქვაბულის ძირზე მოჩარჩოებულ მონაკვეთში;
- ურიკის მოძრაობის შეზღუდვა;
- უკანა ნაწილის ზომის გათვალისწინება საშიში ზონის განსაზღვრის დროს; (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
- მარეგულირებელი მემონტაჟის დაყენება;
- ლიფტიანი სამშენებლო საწევლა შჩ1432-ის დაყენება (მუშების გადაადგილებისათვის);
- ურიკის შეზღუდული მოძრაობის გამო, თითოეული სართულზე სამშენებლო

მასალების ნაწილობრივი განაწილება ხელით;

- მოჩარჩოებული მონაკვეთის გადახურვების აღდგენა ამწის დემონტაჟის შემდეგ

3. მშენებლობის განხორციელების პროცესის რიგები და ეტაპები:

პირველი რიგი - მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები:

- პირველი ეტაპი - მოედნის მოწესრიგება.....0 დღე;
- მეორე ეტაპი - შენობა-ნაგებობის გრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი ღერძების დაფიქსირება.....0 დღე;

მეორე რიგი - ძირითადი პერიოდის სამუშაოები:

- მესამე ეტაპი - შენობა-ნაგებობის მიწის სამუშაოები, ფუძის მოწყობა.....0 დღე;
- მეოთხე ეტაპი - საძირკვლისა და ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა ნულოვან ნიშნულამდე.....0 დღე;
- მეხუთე ეტაპი - ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა ნულოვანი ნიშნულიდან.....180 დღე;
- მეექვსე ეტაპი - არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა.....120 დღე;
- მეშვიდე ეტაპი - ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო ქსელებისა და ტექნოლოგიური მოწყობილობების მოწყობა.....150 დღე;
- მერვე ეტაპი -შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები .60 დღე;
- მეცხე ეტაპი - მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები.....30 დღე;

4. უსაფრთხოების ტექნიკა

სამშენებლო მოედანზე სამუშაოთა წარმოების ყველა ეტაპზე უნდა იყოს დაცული უსაფრთხოების ნორმები მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად (მშენებლობის უსაფრთხოების წესები დადგენილება №361, თარიღი 27.05.2014 წ.);

ბეტონის ჩასხმა ქარგილებში უნდა მოხდეს ერთ მეტრზე ნაკლები სიმაღლიდან; მშენებლობის დროს საჭიროა სერტიფიცირებული მასალებისა და ნაკეთობების გამოყენება მათი ტოქსიკურობის გათვალისწინებით დაშვებულ ნორმებში;

ადვილად აალებადი სამღებრო, საიზოლაციო და სხვა მსგავსი მასალების, ასევე მომწამვლელი ნივთიერებების დღიური რაოდენობა სამშენებლო სამუშაოთა წარმოების ზონაში არ უნდა აღემატებოდეს დღიურ მოთხოვნილებას;

სხვადასხვა სამუშაოების შესრულებისას მუშები უნდა იყენებდნენ სპეცტანსაცმელს, სპეცფეხსაცმელს, რესპირატორებსა და ჩაფხუტებს;

ელექტრო სადენები და მოწყობილობები უნდა იყოს იზოლირებული ჩაკეტილ მდგომარეობაში, დაუშვებელია გაშიშვლებული სადენების გამოყენება.

გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმცვლელებზე უნდა მოხდეს ან მანქანის გვერდიდან ან მანქანის უკანა ნაწილიდან.

სამუშაო ადგილები მუშაობის პირობებისა და ტექნოლოგიურობის გათვალისწინებით უზრუნველყოფილ უნდა იყოს კოლექტიური დაცვისა და სიგნალიზაციის საშუალებით.

ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოთა შესრულებისას და ზოგიერთ სხვა სამუშაოზე მუშები უნდა იყენებდნენ სპეცტანსაცმელს, რესპირატორებს და თავსაბურებს.

მასალებისა და ნაკეთობების დასაწყობება უნდა მოხდეს მათზე ტექნოლოგიური პირობათა გათვალისწინებით; ამავე დროს ისინი უნდა დაეწყოს მოსწორებულ ადგილზე, რომ მათი მოცურება არ მოხდეს.

გაშიშველი სადენების გამოყენება აკრძალულია. იკრძალება ვიბრატორის სხვა ადგილას გადატანა მისი ელექტროქსელიდან გამორთვის გარეშე.

სამონტაჟო მექანიზმის მუშაობის პერიოდში მის ქვეშ ან სიახლოვეს უცხო და სამშენებლო ოპერაციებში დაუსაქმებელ პირთა ყოფნა აკრძალულია.

5. გარემოს დაცვის ღონისძიებები

გარემოს დაცვის ღონისძიებები ქმნის პირობებს დამახასიათებელი ეკოსისტემებისა, მცენარეთა და ცხოველთა სახეობების, ბუნებრივი წარმონაქმნებისა და კულტურული არეალების დასაცავად და აღსადგენად.

პროექტირების დროს და შემდგომ მშენებლობაში გამოყენებული იყოს ნაკლებად ტოქსიკური სამშენებლო მასალები. წინამდებარე პროექტში აღნიშნულია მშენებლობის მოქმედების არეალი (სამშენებლო მოედანი) აუცილებლად უნდა იქნას შემოღობილი დროებითი ღობით.

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში იხილავს პირდაპირი და არაპირდაპირი ზემოქმედების ფაქტორებს გარემოს სხვადასხვა კომპონენტებზე:

- ადამიანის ჯანმრთელობის და უსაფრთხოება;
- მცენარეთა საფარი, ბიოლოგიური ეკოსისტემა;
- ატმოსფერული ჰაერის მოსალოდნელი დაბინძურების დონეები;
- ხმაურის მოსალოდნელი დონეები და მისი ზემოქმედება ადამიანის საცხოვრებელ გარემოზე.

არსებობს შემდეგი კანონები:

- კანონი "გარემოს დაცვის შესახებ" 1996წ. - განსაზღვრას იმ ზოგად მოთხოვნებს, რომელიც უკავშირდება ჰაერის დაბინძურებას, წყლის აღებას და ჩაშვებას, ნარჩენებს, ხმაურს და სხვა საკითხებს.
- ანონი "წყლის შესახებ" 1997წ. – შეეხება ზედაპირულ წყლებს, მიწისქვეშა წყლებს, მიმდებარე სანაპირო წყლებსა და ტერიტორიულ ზღვარს და განსაზვრავს წყლის აღებისა და ჩაშვების ლიცენზირებასთან დაკავშირებულ წესებს.

- კანონი “ატმოსფერული ჰაერის შესახებ” 1997წ. - ითვალისწინებს ჰაერის კონტროლის და დაბინძურების შეზღუდვის დროებითი მეთოდოლოგიას, ჰაერის ხარისხის შედარებას სტანდარტებთან, რომელიც სახსტანდარტს ეფუძნება.
- კანონი “მავნე ქიმიური ელემენტების შესახებ” 1998წ. - მოიცავს მავნე ნივთიერების კლასიფიკაციას და უსაფრთხო მოხმარებას.

გარემოს დაცვის სამსახურის ნებართვის გარეშე მშენებლობის სიახლოვეს იკრძალება მრავალწლიანი ხეებისა და ნარგავების მოჭრა-განადგურება.

ბეტონის შემოტანა უნდა მოხდეს სასაქონლო წესით ---ბეტონის მიქსერის საშუალებით.

საბათქაშო და მოსახვითი სამუშაოების შესრულებისას ფასადებს უნდა ჩამოეფაროს ფარად, რათა არ მოხდეს მტვრის გაბნევა.

მშენებლობის დამთავრების პერიოდში შენობიდან სამშენებლო ნაგვის ჩამოყრა ღიად დაუშვებელია, რათა ამ შემთხვევაშიც არ მოხდეს მტვრის გაბნევა. შენობა საჭიროა აღჭურვოს კონუსური ტიპის ნაგავგამტარით, ნაგვის ჩამოცვლა კი მოხდეს უშუალოდ ავტოთვითმცლელი ავტომანქანების ძარაში.

6. წინამდებარე განმარტებითი ბარათი იხილე ნახ მოპი 1, მოპი 2, მოპი 3 და მოპი 4-თან ერთად.

SC1432---ის ტექნიკური დახასიათება

- ტვირთამწეობა ---------- 1400.00კგ
- აწევის სიმაღლე ---------- 200.00მ

Liebherr 132EC-H10---ის ტექნიკური დახასიათება

- ისრის სიგრძე ---------- 40.00მ
- აწევის სიმაღლე მაქსიმალური ---------- 70.00მ
- მაქსიმალური ტვირთამწეობა ---------- 8.00ტნ

სტაციონალური ბეტონის ტუმბო Putzmeister 715-ის ტექნიკური დახასიათება

- დანადგარის ზომები ----------3.00x1.39x1.39m
- მექანიზმის წონა ---------- 1700.00კგ

წვდომა

- ვერიკალურად ---------- 60.00მ
- ჰორიზონტალურად ---------- 200.00მ

შენიშვნა: მექანიზმის მარკა შეიძლება ჩნაცვლდეს ანალოგიურ მარკაზე სამშენებლო ორგანიზაციის სურვილის თანახმად.

მშენებლობის ორგანიზების პროექტი

ეტაპები	მშენებლობის განხორციელების პროცესის რიგები და ეტაპები	მშენებლობის ორგანიზების პროექტი - კალენდარული გრაფიკი																							
		თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდის მიხედვით																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	კლინიკა																								
	I რიგის სამუშაოები																								
1	მოსამზადებელი სამუშაოები, რომელიც დაკავშირებულია სამშენებლო მოედნის მოწესრიგებასთან, მათ შორის, ამორტიზებული ან სხვა არსებული ნაგებობის დაშლასთან და სამშენებლო ნაგვის მოცილებასთან; შესანარჩუნებელი მწვანე ნარგავების დაცვასა და მიწისქვეშა საინჟინრო კომუნიკაციების გადატანასთან.																								
2	შენობა-ნაგებობის გრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი ღერძების დაფიქსირება																								
	II რიგის სამუშაოები																								
3	შენობა-ნაგებობის ფუძის მოწყობის სამუშაოები																								
4	შენობა-ნაგებობის საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები																								
5	ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა ნულიდან ნიშნულიდან ზემოთ																								
6	არამზიდი კონსტრუქციის მოწყობა																								
7	შენობა-ნაგებობების ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო-ტექნიკური ქსელებისა და ტექნოლოგიური მოწყობილობების მოწყობა																								
8	შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																								
9	მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები																								

ფორმატი A-3

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

სიტუაციური სქემა

დამკვეთი

შპს "სითი და კო"

პროექტი

საავადმყოფო

მისამართი

ქ. თბილისი,
სარაჯიშვილის ქ. #17

შპს "სითი და კო"
ქ. თბილისი,
მ. გელოვანის გამზ. #52

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ი. ანთაძე	
ავტორი	ე. ედიშერაშვილი	
არქიტექტორი	ე. ედიშერაშვილი	
არქიტექტორი	თ. გალოგრე	

არქიტექტურული ნაწილი

სტადია: პროექტის კორექტირება

ნახაზი:

მშენებლობის ორგანიზების პროექტი

მასშტაბი:	თარიღი:	ფურცელი:
	14/08/2024	A-703

მშენებლობის ორგანიზების პროექტი

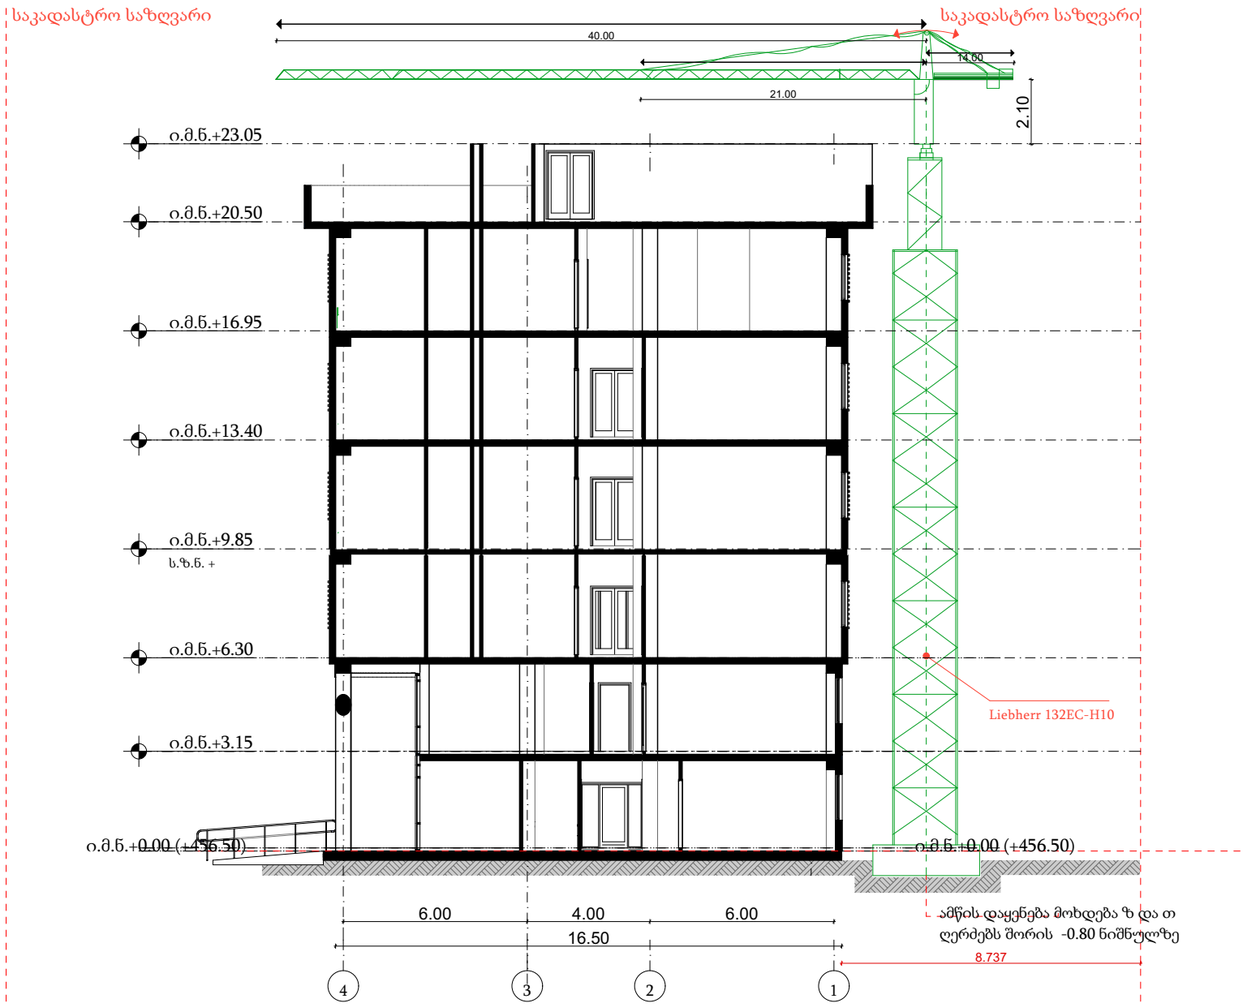

ფორმატი	A-3

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

სიტუაციური სქემა

დამკვეთი

შპს "სითი და კო"

პროექტი

საავადმყოფო

მისამართი

ქ. თბილისი,
სარაჯიშვილის ქ. #17

შპს "სითი და კო"

ქ. თბილისი,
მ. გელოვანის გამზ. #52

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ი. ანთაძე	
ავტორი	ე. ედიშერაშვილი	
არქიტექტორი	ე. ედიშერაშვილი	
არქიტექტორი	თ. გალოგრე	

არქიტექტურული ნაწილი

სტადია: პროექტის კორექტირება

ნახაზი:

მშენებლობის ორგანიზების პროექტი

მასშტაბი:	თარიღი:	ფურცელი:
	31/01/2024	A-702

მშენებლობის ორგანიზების პროექტი

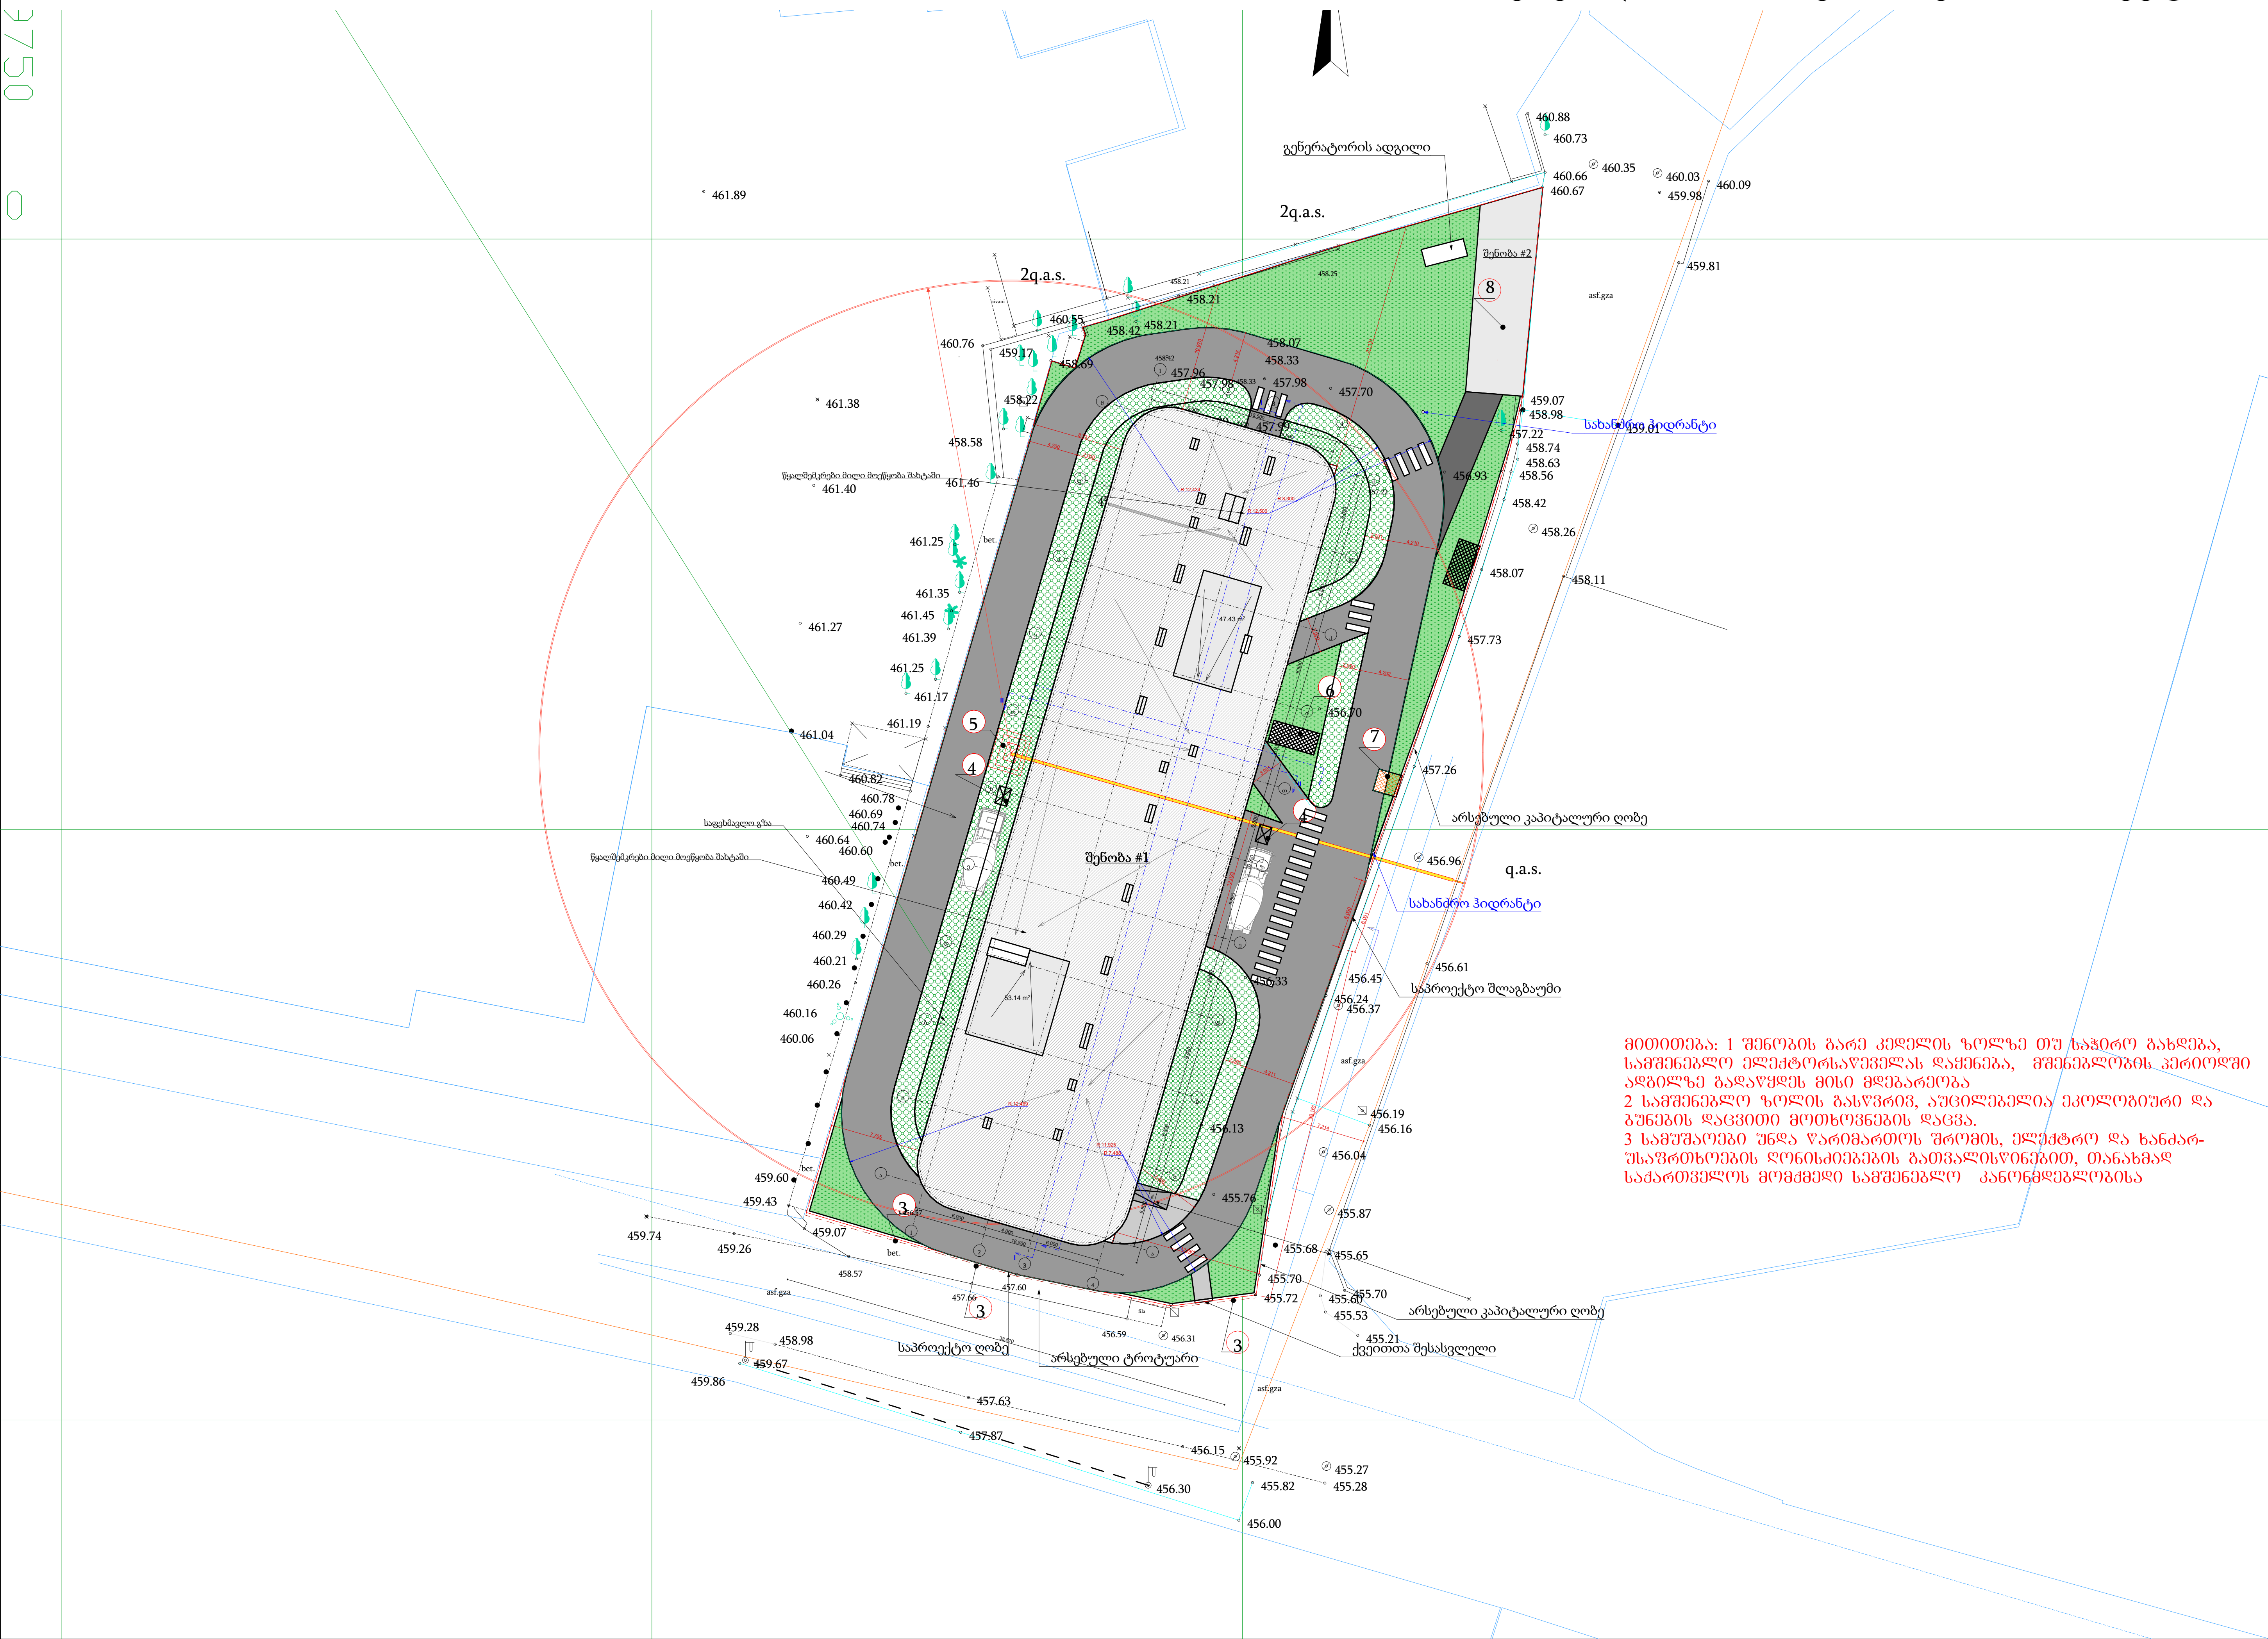

მითითება: 1 შენობის გარე კედლის ზოლზე თუ საჭირო გახდება, სამშენებლო ელექტროსაწეველას დაყენება, მშენებლობის პერიოდში ადგილზე გადაწყდეს მისი მდებარეობა
2 სამშენებლო ზოლის გასწვრივ, აუცილებელია ეკოლოგიური და ბუნების დაცვითი მოთხოვნების დაცვა.
3 სამუშაოები უნდა წარიმართოს შრომის, ელექტრო და ხანძარ-უსაფრთხოების ღონისძიებების გათვალისწინებით, თანახმად საქართველოს მოქმედი სამშენებლო კანონმდებლობისა

ფორმატი	A-3

პირობითი აღნიშვნები

ექსპლიკაცია:
1. შენობა #1
2. შეობა #2
3. სამშენებლო ღობე
4. სამშენებლო ტექნიკის სადგომი მოედანი
5. მობილური ამწე
6. მასალა-ნაკეთობათა დროებითი განსათავსებელი ღია მოედანი
7. დაცვის ჯიხური
8. საწყობი

შენიშვნები

სიტუაციური სქემა

დამკვეთი
შპს "სითი და კო"

პროექტი
საავადმყოფო

მისამართი
ქ. თბილისი, სარაჯიშვილის ქ. #17

შპს "სითი და კო"
ქ. თბილისი, მ. გელოვანის გამზ. #52

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ი. ანთაძე	
ავტორი	ე. ედიშერაშვილი	
არქიტექტორი	ე. ედიშერაშვილი	
არქიტექტორი	თ. გალოგრე	

არქიტექტურული ნაწილი

სტადია: პროექტის კორექტირება

ნახაზი: მშენებლობის ორგანიზების პროექტი

მასშტაბი:	თარიღი:	ფურცელი:
1:500	31/01/2024	A-704
