პასუხები შენიშვნებზე:

1. ბინის ფართში შახტები და სვეტები არ უნდა იანგარიშოთ (მაგ. ბინა N 009 გადაზომვის შემდეგ შიდა ფართი არ ემთხვევა გეგმებზე მითითებულს).
    a. **პასუხი: ბინის ფართში ნაანგარიშევი არაა შახტები და სვეტები (იხ. 009 ბინის მაგალითის სნიპი) - სავარაუდოდ დაბნეულობა გამოიწვია ამ ნაწილმა:**

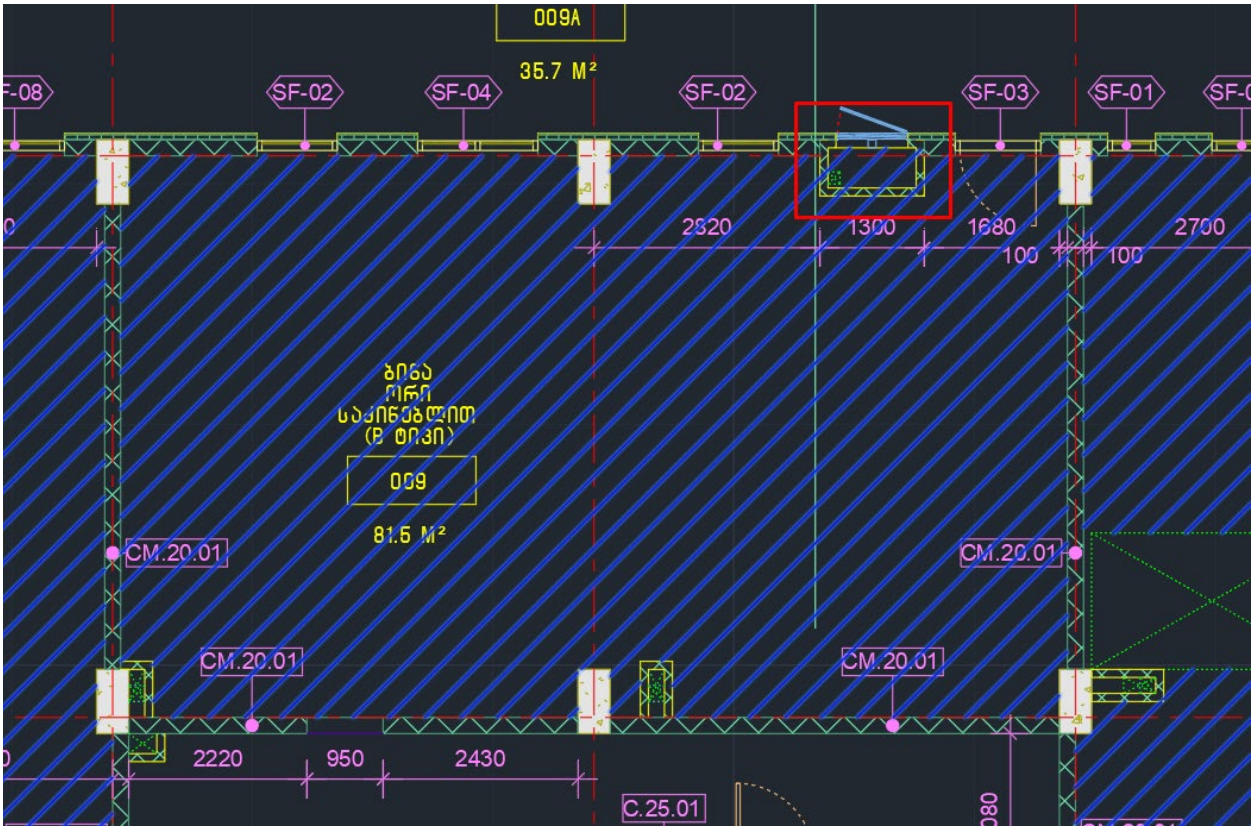

ვაზუსტებთ, რომ ეს სათავსო რომელიც ყველა ბინას აქვს, არაა შახტა არამედ სათავსია რომელშიც განთავსდება წყლის გამაცხელებელი ქვაბი და კონდიციონერი. თითოეულ სათავსს გააჩნია კარი რომელიც იღება აივნის მხარეს

2. N 41 დადგენილების ექსპერტიზა განახლებული თარიღით უნდა წარმოადგინოთ.
    a. **პასუხი: გთხოვთ იხილოთ განახლებული 41-ე დადგენილების ფაილი**
3. +9.75 ნიშნულზე კონსტრუქციული ნაწილით (ფურც.28,29 pdf გვერდი 30,31) „A” და „D” ღერძს გარეთ გათალისწინებული აივნები და +16.55 ნიშნული არ არის დატანილი არქიტექტურულ ნაწილში წარმოდგენილ ყველა გეგმაზე.
    a. **პასუხი: გთხოვთ იხილოთ განახლებული გეგმების ფაილი, გთხოვთ ასეევე გაითვალისწინოთ რომ +9.75 ნიშნულზე კონსტრუქციული ნაწილით**

(ფურც.28,29 pdf გვერდი 30,31) „A” და „D” ღერძს გარეთ გათალისწინებული სივრცეები არაა აივნები, არამედ ქვედა დონის აივნების გადახურვები



მადლობა
