საპროექტო ორგანიზაცია: ი.ბ.ა "ვაშლივაშლარი"

ს/კ 205394633

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ქ. თბილისი, მუხრან მაჭავარიანის №18, ნუცუბიძე-ვაშლივაშლის დამაკავშირებელი გზა /საკ. 01.10.18.006.221/

დამკვეთი: ამხანაგობა "ვაშლივაშლარი" ს/კ 205394633

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
/დარჩენილი სამუშაოები/

თავჯდომარე: დ. ახვლედიანი

არქიტექტორი: ვ. ტატიშვილი

დაამუშავა: ბ. გოგოლაური

ქ. თბილისი 2025წ

შინაარსი

ა/--განმარტებითი ბარათი;

ბ/--კალენდარული გეგმა;

გ/--გრაფიკული ნაწილი: ნახაზი მო-1

ა/ განმარტებითი ბარათი

1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია СниП 3.01.01-85 თანახმად და "საქართველოს მთავრობის დადგენილება №255, მუხლი №№18, 20"-ის თანახმად.

საპროექტო ობიექტი არის მრავალბინიანი ორბლოკიანი საცხოვრებელი სახლი ვაშლიჯვარში /ს.კ 01.10.18.006.221/. საპროექტო ტერიტორია არასწორი ფორმის და რთული რელიეფის. შენობის კონსტრუქციის ჩონჩხედი წარმოადგენს რკინაბეტონის კარკასს, რომლის ელემენტები-კოლონები, რიგელები და გადახურვები მონოლითური რკინაბეტონისაა. სახურავი არის ქანობიანი. წინამდებარე პროექტში განიხილება დარჩენილი სამუშაოების განხორციელება.

2. დარჩენილ და კორექტირებულ სამუშაოებზე /კალენდარული გეგმის თანახმად/ <u>მშენებლობის ხანგრძლივობა</u> მიღებულია **11.00თვე.**

3. გრუნტის სამუშაოები დამთავრებულია.

4. წინამდებარე პროექტი ითვალისწინებს სამუშაოების განხორციელება ხელით.
დარჩენილი სამუშაოების თანმიმდევრობა რიგის და ეტაპების მიხედვით:

მშენებლობის მეორე რიგი:

--მეშვიდე ეტაპი--------- შენობა-ნაგებობის ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო-ტექნიკური ქსელების მოწყობა----------**90 დღე;**

--მერვე ეტაპი----------ტექნოლოგიური მოწყობილობის მონტაჟი----------**90 დღე;**

--მეცხრე ეტაპი----------შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები----------**120 დღე;**

--მეათე ეტაპი----------მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები----------**60 დღე**

5. **უსაფრთხოების ტექნიკა**

სამუშაო ადგილები მუშაობის პირობებისა და ტექნოლოგიურობის გათვალისწინებით უზრუნველყოფილ უნდა იყოს კოლექტიური დაცვისა და სიგნალიზაციის საშუალებით.

საჰიდროიზოლაციო სამუშაოთა შესრულებისას და ზოგიერთ სხვა სამუშაოზე მუშები უნდა იყენებდნენ სპეცტანსაცმელს, რესპირატორებს და თავსაბურებს.

მასალებისა და ნაკეთობების დასაწყობება უნდა მოხდეს მათზე ტექნოლოგიური პირობათა გათვალისწინებით; ამავე დროს ისინი უნდა დაწყოს მოსწორებულ ადგილზე, რომ მათი მოცურება არ მოხდეს.

"გაშიშველი" სადენების გამოყენება აკრძალულია. იკრძალება ვიბრატორის სხვა ადგილას გადატანა მისი ელექტროქსელიდან გამორთვის გარეშე.

6. გარემოს დაცვის ღონისძიებები

გარემოს დაცვის ღონისძიებები ქმნის პირობებს დამახასიათებელი ეკოსისტემებისა, მცენარეთა და ცხოველთა სახეობების, ბუნებრივი წარმონაქმნებისა და კულტურული არეალების დასაცავად და აღსადგენად.

პროექტირების დროს და შემდგომ მშენებლობაში გამოყენებული იყოს ნაკლებად ტოქსიკური სამშენებლო მასალები. წინამდებარე პროექტში აღნიშნულია მშენებლობის მოქმედების არეალი /სამშენებლო მოედანი /აუცილებლად უნდა იქნას შემოღობილი დროებითი ღობით.

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში იხილავს პირდაპირი და არაპირდაპირი ზემოქმედების ფაქტორებს გარემოს სხვადასხვა კომპონენტებზე:

-ადამიანის ჯანმრთელობის და უსაფრთხოება;
-მცენარეთა საფარი, ბიოლოგიური ექოსისტემა;
-ატმოსფერული ჰაერის მოსალოდნელი დაბინძურების დონეები;
-ხმაურის მოსალოდნელი დონეები და მისი ზემოქმედება ადამიანის საცხოვრებელ გარემოზე.

არსებობს შემდეგი კანონები:

კანონი "გარემოს დაცვის შესახებ" 1996წ განსაზღვრას იმ ზოგად მოთხოვნებას , რომელიც უკავშირდება ჰაერის დაბინძურებას, წყლის აღებას და ჩაშვებას, ნარჩენებს, ხმაურს და სხვა საკითხებს.

კანონი "წყლის შესახებ" 1997წ შეეხება ზედაპირულ წყლებს, მიწისქვეშა წყლებს, მიმდებარე სანაპირო წყლებსა და ტერიტორიულ ზღვარს და განსაძვრავს წყლის აღებისა და ჩაშვების ლიცენზირებასთან დაკავშირებულ წესებს.

კანონი "ატმოსფერული ჰაერის შესახებ" 1997წ ითვალისწინებს ჰაერის კონტროლის და დაბინძურების შეზღუდვის დროებითი მეთოდოლოგიას, ჰაერის ხარისხის შედარება სტანდარტებთან, რომელიც სახსტანდარტს ეფუძნება.

კანონი " მავნე ქიმიური ელემენტების შესახებ" 1998წ მოიცავს მავნე ნივთირების კლასიფიკაციას და უსაფრთხო მოხმარებას.

გარემოს დაცვის სამსახურის ნებართვის გარეშე მშენებლობის სიახლოვეს იკრძალება მრავალწლიანი ხეებისა და ნარგავების მოჭრა-განადგურება.

საბათქაშო და მოსახვითი სამუშაოების შესრულებისას ფასადებს უნდა ჩამოეფაროს ფარად, რათა არ მოხდეს მტვრის გაბნევა.

მშენებლობის დამთავრების პერიოდში შენობიდან სამშენებლო ნაგვის ჩამოყრა ღიად დაუშვებელია, რათა ამ შემთხვევაშიც არ მოხდეს მტვრის გაბნევა. შენობა საჭიროა აღჭურვოს კონუსური ტიპის ნაგავგამტარით, ნაგვის ჩამოცვლა კი მოხდეს უშუალოდ ავტოთვითმცლელი ავტომანქანების ძარაში.

7. წინამდებარე განმარტებითი ბარათი იხილე ნახ. მო-1 ერთად.

ბ/ კალენდარული გეგმა 11.00 თვე

№ ეტ	მშენებლობის განხორციელების პროცესის რიგები და ეტაპები	დღე	თვეები																					
			1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	მშენებლობის მეორე რიგი																							
	მშენებლობის განხორციელების ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																							
VII	შენობა-ნაგებობის ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო–ტექნიკური ქსელების მოწყობა	90																						
VIII	ტექნოლოგიური მოწყობილობების მონტაჟი	90																						
IX	შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	120																						
X	მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები	60																						

შენიშვნები:
1. მშენებლობის განსაზღვრული ვადის ათვლა განხორციელდება მშენებლობის ნებართვის აღების შემდგ.
2. ნებართვის მფლობელი ვალდებულია შეატყობინოს საჯარო ზედამხედველობის ორგანოს მშენებლობის ეტაპის დასრულების შესახებ 10 დღით ადრე.

დაამუშავა: / ბ. გობოლაური /

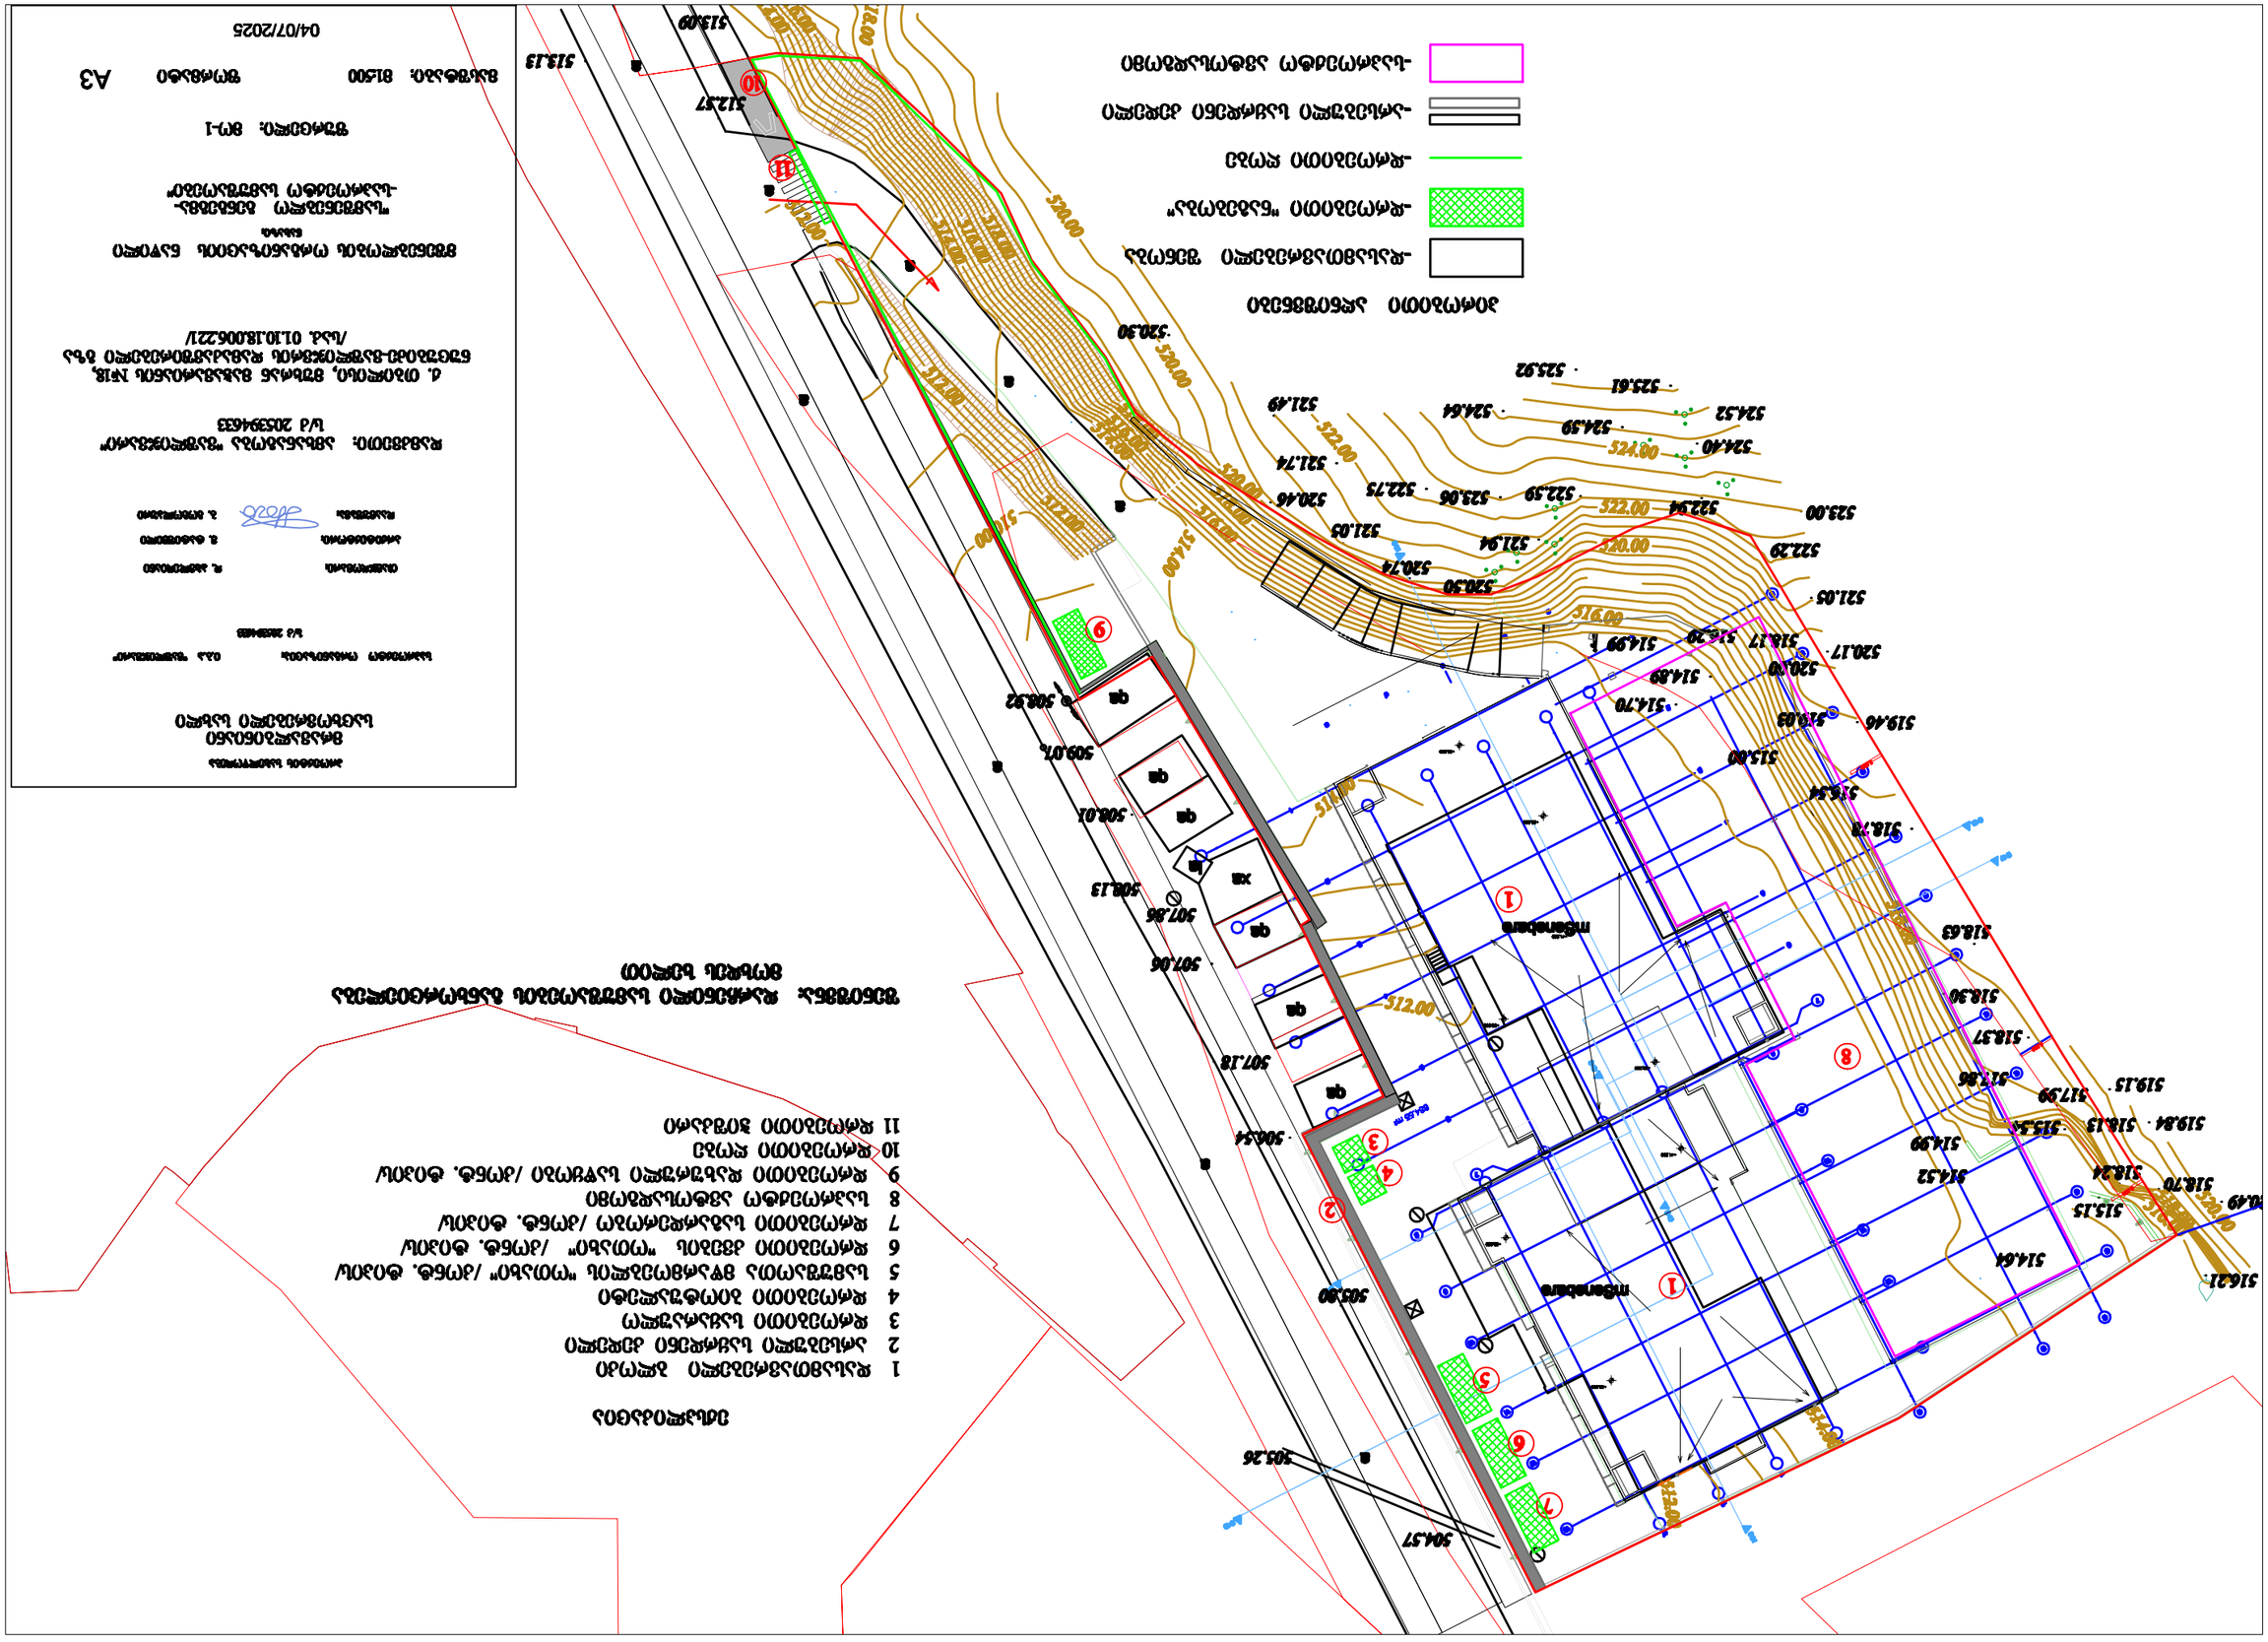
ЗОНИРОВОЧНЫЙ ПЛАН
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ЗОНА ЗАСТРОЙКИ "ГОСТИНИЦА"
ЗОНА ОТСТУПА ОТ ГРАНИЦЫ УЧАСТКА ДЛЯ ПРОЕЗДА
ЗОНА ОТСТУПА ОТ ГРАНИЦЫ УЧАСТКА ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ
ЗОНА ОГРАНИЧЕНИЯ ЗАСТРОЙКИ ПО ВЫСОТЕ
ЗОНА ОГРАНИЧЕНИЯ ЗАСТРОЙКИ ПО ПЛОТНОСТИ
ЗОНА ОГРАНИЧЕНИЯ ЗАСТРОЙКИ ПО ПЛОЩАДИ
ЗОНА ОГРАНИЧЕНИЯ ЗАСТРОЙКИ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ
ЗОНА ОГРАНИЧЕНИЯ ЗАСТРОЙКИ ПО ПЛОЩАДИ ЗАСТРОЙКИ
