„შეთანხმებულია“


ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

ვ. აბულაძე

„შეთანხმებულია“

ქ. თბილისის საპატრულო პოლიციის მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე

ლ. ჯოხაძე

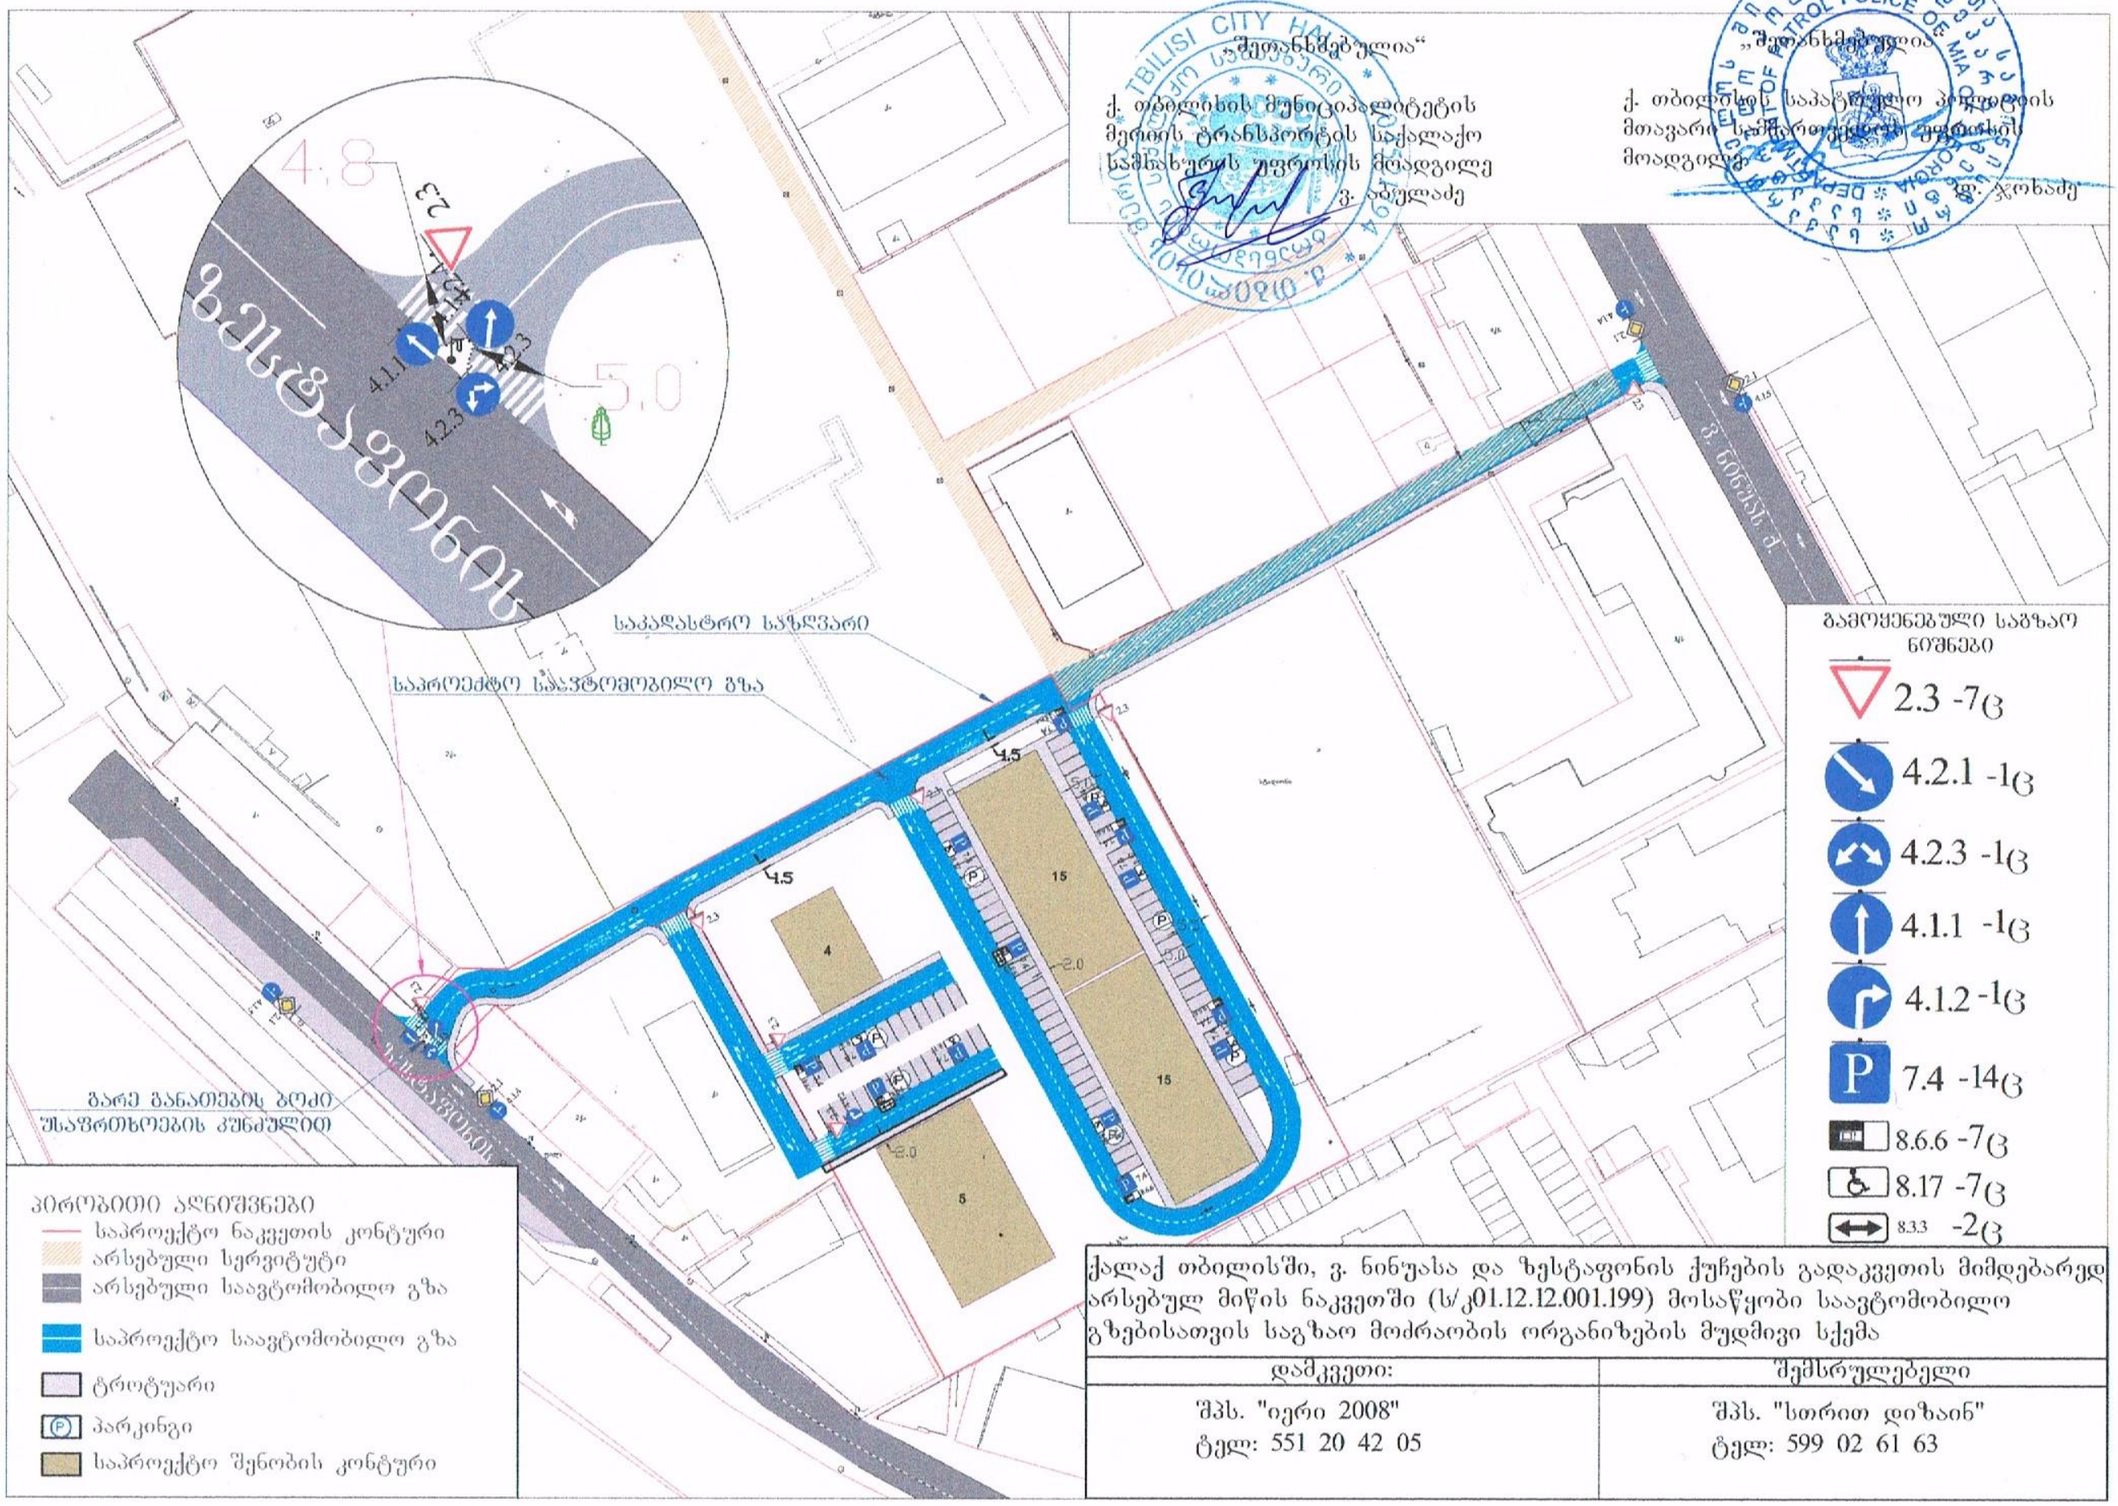

ქალაქ თბილისში, ვ. ნინუასა და ზესტაფონის ქუჩების გადაკვეთის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთში (ს/კ01.12.12.001.199) მოსაწყობი საავტომობილო გზებისათვის საგზაო მოძრაობის ორგანიზების მუდმივი სქემა

დამკვეთი:	შემსრულებელი
შპს. "იერი 2008" ტელ: 551 20 42 05	შპს. "სთრით დიზაინ" ტელ: 599 02 61 63

„შეთანხმებულია“

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის სააქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

ვ. აბულაძე

„შეთანხმებულია“


ქ. თბილისის საპატრულო პოლიციის მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე

ლ. ჯოხაძე

საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები

- 1.26 - 2ც.
- 1.21.2 - 1ც.
- 3.24 - 1ც.
- 3.24 - 1ც.
- 4.2.2 - 1ც.
- 3.20 - 1ც.
- 3.31 - 1ც.
- 8.2.1 - 1ც.
- შეკნინანი-ტ7 - 2ც

უსაფრთხოების ღობე
ქვეითთა მოძრაობა
ქვეითთა ბილიკი
საშენებლო პოლიგონი
არსებული საავტომობილო გზა
ბუფერული ზონა

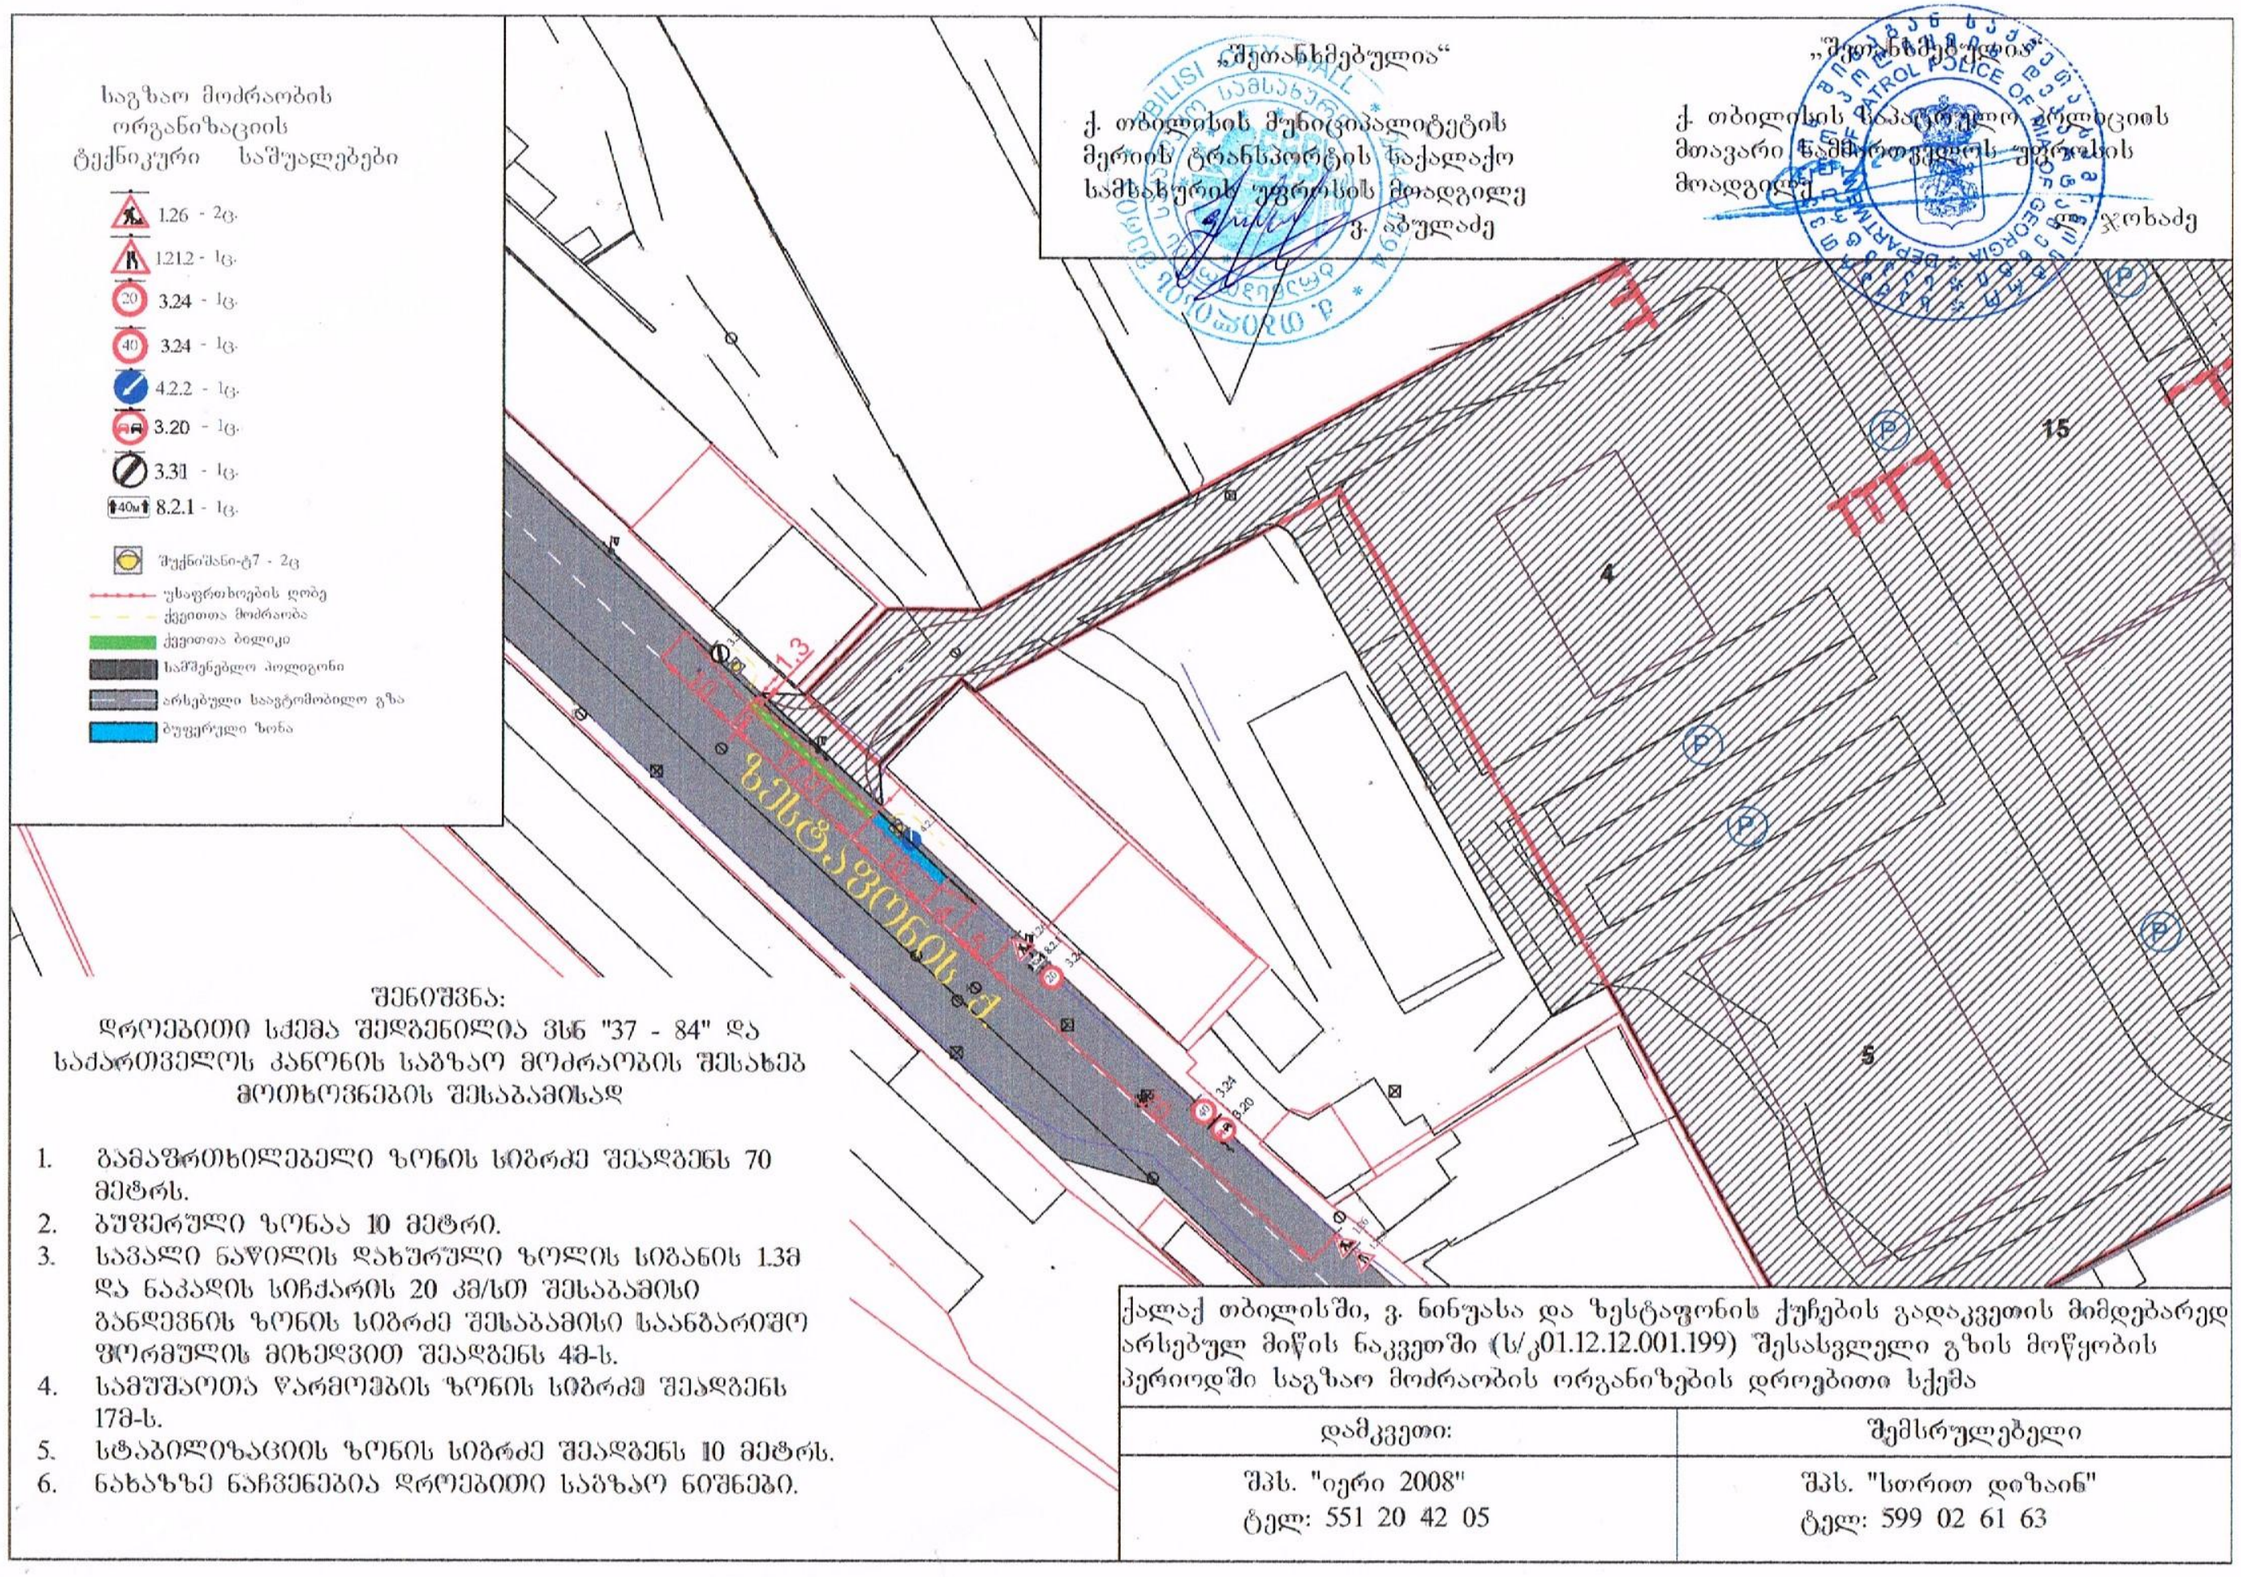

შენიშვნა:

დროებითი სქემა შედგენილია ვსნ "37 - 84" და საქართველოს კანონის საგზაო მოძრაობის შესახებ მოთხოვნების შესაბამისად

1. გამაფრთხილებელი ზონის სიგრძე შეადგენს 70 მეტრს.
2. ბუფერული ზონაა 10 მეტრი.
3. სავალი ნაწილის დახურული ზოლის სიგანის 1.3მ და ნაკადის სიჩქარის 20 კმ/სთ შესაბამისი განდევნის ზონის სიგრძე შესაბამისი საანგარიშო ფორმულის მიხედვით შეადგენს 4მ-ს.
4. სამუშაოთა წარმოების ზონის სიგრძემ შეადგენს 17მ-ს.
5. სტაბილიზაციის ზონის სიგრძე შეადგენს 10 მეტრს.
6. ნახაზზე ნაჩვენებია დროებითი საგზაო ნიშნები.

ქალაქ თბილისში, ვ. ნინუასა და ზესტაფონის ქუჩების გადაკვეთის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთში (ს/კ01.12.12.001.199) შესასვლელი გზის მოწყობის პერიოდში საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა

დამკვეთი:	შემსრულებელი
შპს. "იერი 2008" ტელ: 551 20 42 05	შპს. "სთრით დიზაინ" ტელ: 599 02 61 63

„შეთანხმებულია“

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

გ. ბაბულაძე

„შეთანხმებულია“

ქ. თბილისის პატრულის პოლიციის მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე

ლ. ჯოხაძე

შენიშვნა:

დროებითი სქემა შედგენილია მუხლი "37 - 84" და საქართველოს კანონის საგზაო მოძრაობის შესახებ მოთხოვნების შესაბამისად

1. გამაფრთხილებელი ზონის სიგრძე შეადგენს 70 მეტრს.
2. ბუფერული ზონაა 10 მეტრი.
3. საჭალი ნაწილის დახურული ზოლის სიგანის 1.3მ და ნაკადის სიჩქარის 20 კმ/სთ შესაბამისი განლევნის ზონის სიგრძე შესაბამისი საანგარიშო ფორმულის მიხედვით შეადგენს 4მ-ს.
4. სამუშაოთა წარმოების ზონის სიგრძე შეადგენს 11მ-ს.
5. სტაბილიზაციის ზონის სიგრძე შეადგენს 10 მეტრს.
6. ნახაზზე ნაჩვენებია დროებითი საგზაო ნიშნები.

საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები

- 1.26 - 2ც.
- 1.21.2 - 1ც.
- 3.24 - 1ც.
- 3.24 - 1ც.
- 4.2.2 - 1ც.
- 3.20 - 1ც.
- 3.31 - 1ც.
- 8.2.1 - 1ც.
- შუქნიშანი-ტ7 - 2ც
- უსაფრთხოების ღობე
- ქვეითთა მოძრაობა
- ქვეითთა ბილიკი
- სამშენებლო პოლიგონი
- არსებული საავტომობილო გზა
- ბუფერული ზონა

ქალაქ თბილისში, ვ. ნინუასა და ზესტაფონის ქუჩების გადაკვეთის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთში (ს/კ01.12.12.001.199) შესასვლელი გზის მოწყობის პერიოდში საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა

დამკვეთი:	შემსრულებელი
შპს. "იერი 2008" ტელ: 551 20 42 05	შპს. "სთრით დიზაინ" ტელ: 599 02 61 63

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური

წერილის ნომერი: **16-01180683949**

თარიღი: **09.03.2018**

ადრესატი:
ომარ ჯაფარიძე
პირადი ნომერი: 01024053648
მისამართი: საქართველო, ქალაქი თბილისი, ვიქტორ დოლიძეს ქუჩა, N 11, კორპუსი 1, ბინა 2-3

ბატონო ომარ,

თქვენი მ/წლის 27 თებერვლის განცხადებით (მერიაში რეგისტრაციის №19/01180582508-16; 27.02.2018წ.) წარმოდგენილი ტრიკოტაჟის ქ. 3/ვ და ნინუას ქ.3 არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 01.12.12.001.199) შესასვლელ-გამოსასვლელის მოწყობის პერიოდში დროებითი საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა შეთანხმებულია.

სამუშაოს დასრულების შემდეგ დემონტაჟი უნდა გაუკეთდეს დროებით დამონტაჟებულ საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკურ საშუალებებს და ქუჩის სავალი ნაწილი მოყვანილი იქნას პირვანდელ მდგომარეობაში.

ასევე, ნაკვეთთან მისასვლელი გზის საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა შეთანხმებულია იმ პირობით, რომ საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ცვლილების შემთხვევაში სქემა ხელახლა საჭიროებს შეთანხმებას სამსახურთან.

დანართი: 9 ფურცელი.

პატივისცემით,

ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის (საქალაქო სამსახურის უფროსი) მოვალეობის შემსრულებელი

ვასილ აბულაძე

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი

MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF GEORGIA
PATROL POLICE DEPARTMENT

MIA 0 18 00583956

13/03/2018

შპს „ბამბის ნართის“ წარმომადგენელს
ბ-ნ ომარ ჯაფარიძეს
მის. ქ. თბილისი, დოლიძის ქ. N11, კორ. 1, ბ.23
ტელ. 551 204205

ასლი: საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის
ქ. თბილისის მთავარი სამმართველოს
უფროსის მოადგილეს ბატონ **ლაშა ჯოხაძეს**

ბატონო ომარ,

შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტში განხილულ იქნა თქვენი მ/წლის 12 მარტის განცხადება, რომელიც ეხება ქ. თბილისში, ვ. ნინუას ქუჩა N3-ის და ზესტაფონის ქუჩების გადაკვეთის მიმდებარედ (ს/კ 01.12.12.001.199) არსებულ მიწის ნაკვეთზე მშენებლობასთან დაკავშირებით შესასვლელ-გამოსასვლელი გზის მოწყობას და ითხოვთ ა/ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციის დროებითი სქემების (სამუშაოს წარმოებისა და დასრულებული ვარიანტების) შეთანხმებას.

ვითვალისწინებთ რა, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ „არქიტექტურის სამსახურის“ 2018 წლის 15 თებერვლის N 3824037 გადაწყვეტილებას და ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის 09.03.2018 წ. N16-01180683949 თანხმობას, საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი ითანხმებს სამუშაოთა წარმოებისა და ა/ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციის თქვენს მიერ წარმოდგენილ სქემებს და არ არის წინააღმდეგი განახორციელოთ ზემოთ აღნიშნული სამუშაოები შემდეგი პირობების დაცვით:

- სამუშაოთა წარმოების ადგილზე მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებები განთავსდეს ჩვენთან შეთანხმებული სქემის შესაბამისად;
- დაცული იქნას გზის სავალი ნაწილის სისუფთავე, არ დაუშვათ სამშენებლო მასალისა და ტექნიკის გზის სავალ ნაწილზე განთავსება;
- ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხოების მიზნით არსებული ფეხით მოსიარულეთა ბილიკი ე.წ. „ზებრა გადასასვლელი“ გადატანილ იქნა მიმდებარე ტერიტორიაზე;
- სამუშაოების დასრულებისთანავე დროებითი მოძრაობის რეგულირების ტექნიკურ საშუალებებს გაუკეთდეს დემონტაჟი და გზის მიერთების ადგილები აღიჭურვოს მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებებით შეთანხმებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის სქემის შესაბამისად;
- სამუშაოების დაწყების და დამთავრების შესახებ წინასწარ ეცნობოს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის სამორიგეო ნაწილს (ტელ. 241-85-04; 241-85-05);

0190, თბილისი, ნოე რამიშვილის ქ. №38
№38, Noe Ramishvili St. 0190, Tbilisi, Georgia

ტელ./Tel.: (+995 032) 2 41 85 02
ფაქსი/Fax: (+995 032) 2 41 85 02
E-mail: ushba@mia.gov.ge

მეორე ადრესატს: გთხოვთ უზრუნველყოთ კონტროლის დაწესება მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებების განთავსების მდგომარეობაზე თანდართული სქემების შესაბამისად. შეუსრულებლობის შემთხვევაში არ დაუშვათ სამუშაოების დაწყება და იმოქმედეთ საქართველოს ასკ 134–ემუხლის მოთხოვნების შესაბამისად.

დანართი: “ “ ფურცლად;

პატივისცემით,

საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი /
საორგანიზაციო სამმართველო
სამმართველოს უფროსი
ლევან ზუზაძე
