ქ. თბილისი, ივანე იუმაშევის , #23 დ
01.19.26.004.225
საწყობი

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

შემადგენლობა:

ა) განმარტებითიბარათი;

1. შესავალი;

2. სამშენებლომოედნისადა სამონტაჟოობიექტისდახასიათება;

3. სამშენებლომოედნისორგანიზებადა მოსამზადებელისამუშაოებისაღწერა;

4. მშენებლობისსაინჟინრომომზადებადა მითითებები სამონტაჟოსამუშაოთაწარმართვაზე და ფარული სამუშაოებისაქტებისჩამონათვალი;

5. სამშენებლო-სამონტაჟოსამუშაოთახანგრძლივობა;

6. სამშენებლო-სამონტაჟოსამუშაოთარიგითობა და ეტაპები;

7. უსაფრთხოებისტექნიკა;

8. ბუნებისდაცვა და ეკოლოგია;

9. რეკომენდირებული მანქანამექანიზმების, სპეც. ავტო-ტრანსპორტისადა ხელსაწყოების უწყისი;

ბ) სამშენებლო-სამონტაჟოსამუშაოთაწარმოებისკალენდარულიგეგმა „მოპ-1“

გ) სამშენებლომოედანზე სამშენებლომანქანა-მექანიზმებისადა სპეც. ავტო-ტრანსპორტის გადაადგილებისგრაფიკულინაწილი;

ა) განმარტებითიბარათი

1. შესავალი

ქ. თბილისი, ივანე იუმაშევის ქუჩა , #23 დ-ში საწყობის

სამშენებლო სამუშაოების ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია კობა სურმავას მიერ.

მშენებლობის პროექტის დამუშავებას საფუძვლად დაედო ნაკვეთის მესაკუთრის დავალება პროექტირებაზე, მის კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების ჩატარებასთან დაკავშირებით. გამოყენებულ იქნა პროექტით მიღებული არქიტექტურული და კონსტრუქციული გადაწყვეტები,მშენებლობისრაიონის სიტუაციური გეგმა,ნაკვეთისსაინჟნრო-გეოლოგიურიცვლევა,ნაკვეთისგეოდეზიური მონაცემები.

წინამდებარე „მშენებლობისორგანიზაციის პროექტი“ დამუშავებულიაშემდეგი მოქმედი სამშენებლონორმებისადა წესების

სამშნებლონორმებიდა წესებისდა ტექნიკურნორმატიულიდოკუმენტებისსაფუძველზე

1. სნდაწ3.01.01-85*- „სამშენებლოწარმოებისორგანიზაცია“

2. სნდაწ1.04.03-85– „მშენებლობისხანგრძლივობისნორმები“

3. სნდაწ III-4-80- „უსაფრთხოებისტექნიკამშენებლობაში”-კრებული სამახსოვროქართულ ენაზე-მოქმედი სნ და წ ამონაკრები -საქართველოს ურბანიზაციისა და მშენებლობის სამინისტროსგამოცემა.თბილისი 1987წ.

4. შ.ბაქანიძე,მ.ლორთქიფანიძე,- „ტექნიკურიზედამხედველობამშენებლობაზე“ქ.თბილისი 2006წ.

5. სნდაწ3.01.01-85* „სამშენებლოსაქმიანობისწარმოება“

6. სნდაწ3.01.01-85* „ტექნიკურიუსაფრთხოებამშენებლობაში“

7. N361 27.05.2014 წ. „მშენებლობისუსაფრთხოებისშესახებ ტექნიკურიზედამხედველობის შესახებტექნიიკურირეგლამენტი“

8.N477 27.10. 2017წ. „სიმაღლეზე მუშაობისუსაფრთხოებისშესახებტექნიკურირეგლამენტი;

9.საქართველოსმთავრობის დადგენილება N255 2019 წლის 31 მაისი ქ. თბილისი მშენებლობისწებართვისგაცემისადა შენობანაგებობისექსპლუატაციაშიმიღების წესისადა პირობებისშესახებ;

10. სნდაწ3.03.01-87–„მზიდი და შემომფარგლავიკონსტრუქციები“

11. სნ და წ 3.03.01-87_ “მზიდი და შემომფარგლავიკონსტრუქციები”

12.სნდა წ 3.03.01-74_”ბურულები, ჰიდროიზოლაცია, ორთქლიზოლაცია”

13.სნდა წ 3.03.21-74_ “სამშენებლოკონსტრუქციებისმოსაპირკეთებელიძამუშაოები”

14.სნდა წ 3.04.03-85_ “კოროზიისგან სამშენებლოკონსტრუქციებისდა ნაგებობებისდაცვა”

ასევესხვამეთოდურნორმატიულიდამხმარედოკუმენტაციისაფუძველზე.

სნ და წ 3.01.01-85*ის „სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია“ მოთხოვნის თანახმად სადემონტაჟო სამუშაოების დაწყებამდე, აუცილებლად უნდა დამუშავდეს სამუშაოთა წარმოების პროექტი აკრძალულია მშენებლობის დაწყება დამტკიცებული სამუშაოთა წარმოებისპროექტისგარეშე (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

სადემონტაჟო სამუშაოების წარმოებაზე დამკვეთმა აუცილებლად უნდა განახორციელოს ტექნიკური ზედამხედველობა შესაბამის უფლებამოსილი და გამოცდილების მქონე სუბიექტისმეშვეობით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

2. სამშენებლომოედნისადა სამონტაჟოობიექტისდახასიათება

საპროექტოტერიტორია განთავსებულია ქ. თბილისი, ივანე იუმაშევის ქუჩა, #23დ -ში. საპროექტოშენობაწარმოადგენსარასასოფლოსამეურნეომიწის ნაკვეთზე განსათავსებელ საწყობს. შენობისმზიდი ელემენტებიგანხორციელდებაშემდეგი

კონსტრუქციებისგან

საძირკვლები – რკინაბეტონის საძირკვლი;

მზიდი კარკასი – ლითონის კონსტრუქციას;

კედლების შემავსებელი – ე.წ. "სენდვიჩ-პანელი;

სახურავი- ე.წ. "სენდვიჩ-პანელი;

სამშენებლო მოედანზე საინჟინრო კომუნიკაციების ასევე სხვა რაიმე ქსელის არსებობის შემთხვევაში სამუშაოების დაწყებამდე აუცილებელია მათი ჩაჭრა საექსპლუატაციო ორგანიზაციების მეთვალყურეობისქვეშ, დადგენილი ნორმატიული და კანონმდებლობითი პირობებისგათვალისწინებით, უსაფრთხოებისწესებისმაქსიმალურიდაცვით.

სამუშაოთა მწარმოებელმა განუხრელად უნდა იხელმძღვანელოს დამტკიცებული საპროექტო დოკუმენტაციით, სამონტაჟო ან სხვა საპროექტო გადაწყვეტილებებში ცვლილებების შეტანა ავტორებთანშეთანხმებისგარეშე დაუშვებელია, ცვლილებები უნდა მოხდეს დადგენილი წესით, შესაბამისიხელმოწერებითავტორებისადა დამკვეთისმიერ.

3. სამშენებლომოედნისორგანიზებადა მოსამზადებელისამუშაოებისაღწერა;

სამშენებლო მოედანი მდებარეობს კეძო საკუთრებაშიარსებულ ნაწილობრივ შემოღობილ ტერიტორიაზე. მისი რელიეფი ქანობიანია, თუმცა სამონტაჟო სამუშაოები რაიმე განსაკუთრებულიპირობებით არ ხასიათდება. სამშენებლომოედანზეარ ფიქსირდებარაიმე სახის შენობა-ნაგებობაან/და ხე ნარგავები, შესაბამისადმათი გატანა, დემონტაჟიდა მოჭრა არ იგეგმება;

სამუშაოების ციკლი იწყება ტერიტორიაზე სამუშაოთა მწარმოებლის ოთახის და მუშა-პერსონალის გასახდელისთვის მოწყობით, ტერიტორიაზე საინჟინრო კომუნიკაციები არ ფიქსირდება, ამიტომ ისინი ეწყობადროებითი გადამყვანებით(იხ. თავი 4).

მოედანზე უცხო პირთა და იმ მუშა-პერონალის დაშვება, რომელიც არ არიან ჩართული სამონტაჟო-სამშენებლოსამუშაოებში აკრძალულია, მოედანზე უნდა მოეწყოს საშენ-

მასალებათა დასაწყობებისთვის განკუთვნილი ლოკაცია, რომლიც უნდა შეიზღუდოს სასიგნალო ლენტებისსაშუალებთ, ღობეზე და ტერიტორიაზე გაიკრას გამაფრთხილებელი, საინფორმაციოდა ამკრძალავიბანერები.

4. ობიექტის საინჟინრომომზადებადა მითითებები სამონტაჟოსამუშაოთაწარმართვაზედა ფარულისამუშაოებისაქტებისჩამონათვალი

მიიღებს თუ არა დამკვეთისაგანდამტკიცებულ საპროექტო დოკუმენტაციას სამშენებლო ორგანიზაცია საჭიროების შემთხვევაშიამუშავებსსამუშაოთაწარმოებისპროექტს, რომლის შედგენაც უნდა მოხდეს მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად მშენებლობა უნდა განხორციელდეს საავტორო და ტექნიკურიზედამხედველობისქვეშ;

ფარული სამუშაოების მიღება შესაბამის უფლებამოსილი პირების კონტროლის ქვეშ, დადგენილი წესით აუცილებელია. სამუშაოთა დაწყება დაიშვება საპროექტო დოკუმენტაციისაფუძველზე

მოსამზადებელისამუშაოებისციკლი იწყება- სამშენებლომოედნისმოწესრიგებით:

1.ტერიტორიის შემოღობვა, შესასვლელში შესაბამისი გამართხილებელი ბანერების გაკვრა; სამუშაოთა მწარმოებლისდროებითი შენობის მონტაჟი, სამშენებლომასალის დასაწყობება ხანძარსაწინააღმდეგოღონისძიებებისგატარებით;

ნაკვეთზე საინჟინრო კომუნიკაციები არ გადის, ამიტომ მათი გადატანა შესაბამისად არ ხდება. მაგრამ ნაკვეთზე საჭიროა დროებითი წყლის გადამყვანების, და კანალიზაციის, დროებითი ელ.მომარაგებისმოწყობა;

2.საპროექტოშენობისგეოდეზიური დაკვალვა;

მიწის სამუშაოებისდაწყება;

ძირითადი სამშენებლოსამუშაოებითვალისწინებსშემდგომმუშა-პროცესსკერძოდ:

1.რკ/ბეტონისსამუშაოები- შენობისფუძე-საძირკვლების მოწყობა;

2. ძირითადი კარკასის მოწყობა (ლითონკონსტრუქცია);

3.არამზიდი კონსტრუქციებისშენება,საინჟინროკომუნიკაციებისმონტაჟი;

4.სახურავისმოწყობა,შენობისკედლებისშევსება-შეფუთვა;

5.ტერიტორიისკეთილმოწყობა,სამშენებლონარჩენებისგატანა;

ბოლო კვირებშიგანხორციელდებადარჩენილი მასალის, არსებობისშემთხვევაშიდროებითი ნაგებობების საბოლოო გატანა მოედნიდან და ტერიტორიის გასუფთავება მომზადება ექსპლუატაციაშიჩაბარებისათვის

5. სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოთა ხანგრძლივობა

სამუშაოების ხანგრძლივობისა და სამშენებლო სამუშაოების წარმართვის თავლსაზრისით ობიექტები - მოცულობითი და კონსტრუქციული გადაწყვეტითი სირთულის მიხედვით საშუალო მარტივი კატეგორიისაა.

სამონტაჟო სამუშაოების ხანგრძლივობის ვადებისა და მისი განხორციელების ცალკეული პერიოდების დასადგენად ხელმძღვანელობენ სნ. და წ. 1.04.03-85 – „მშენებლობის ხანგრძლივობის ნორმები“; ასევე დამხმარე „სარეკონსტრუქციოდა სამონტაჟო სამუშაოთა ხანგრძლივობის განსაზღვრა“ კალენდარული გეგემით გათვალისწინებული ფინანსური უზრუნველყოფისდა შესაძლებლობებისაფუძველზე

სამუშაოების განხორციელების გეგმიური ხანგრძლივობა აღნიშნული ნორმების გათვალისწინებით, ასევე რეალური სიტუაციის შესწავლის საფუძველზე დადგინდა სამუშაოთა წარმოების ხანგრძლივობა T=24 თვის პერიოდით. მისი დაცვა შესაძლებელია უწყვეტი ფინანსირების პირობებში, რასაც ხელი უნდა შეუწყოს რბილმა და ზომიერმა კლიმატურმაპირობებმა

კალენდარულ გეგმაზე ობიექტის დემონტაჟის შემოთავაზებული თანმიმდევრობა რეკომენდირებულიხასიათისაა, მისი კორექტირებაშესაძლებელია სამუშაოთა წარმართვის პროცესში დამკვეთის ინტერესების გათვალისწინებითსამშენებლოპროცესში აღმოჩენილი სხვადასხვაგარემოებებით

6. სამშენებლოსამუშაოებისრიგითობადა ეტაპები

მოცემული სამშენებლო სამუშაოები იყოფა ორ რიგად – <u>მოსამზადებელი სამუშაოები და ძირითადი სამშენებლოსამუშაოები</u>;

მოსამზადებელისამუშაოებისციკლი იწყება- სამშენებლომოედნისმოწესრიგებით:

სამშენებლოსამუშაოებისპროცესის წარმოებისრიგითობის მიხედვით სამონტაჟოობიექტზე განისაზღვრაშემდეგისამშენებლოეტაპები:

მოსამზადებელისამუშაოებიწარმოდგენილია ორი ეტაპით:

ეტაპიN 1 - შემოღობვა, დროებითი შენობების განთავსება, დროებითი ქსელების მოწყობა (შესრულებულია);

ეტაპი N 2 - დაკვალვა და გრუნტის სამუშაოები;

ძირითადი სამშენებლო სამუშაოები ითვალისწინებს შემდგომ მუშა-პროცესს. კერძოდ სამუშაოებისთვისგამოიყო ხუთი ეტაპი,რომლებშიც გაერთიანდა ერთი შინაარსის მქონე სამუშაოები:

ეტაპიN 3 - შენობის ფუძის, საძირკვლის და მზიდი კედლების მოწყობა, 0.00 ფილის და პარაპეტის მოწყობა;

ეტაპი N 4 - სახურავის მოწყობა, არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა, საინჟ. კომუნიკაციების მონტაჟი;

ეტაპი N 5 - ძირითადი კარკასის მოწყობა (ლითონ-კონსტრუქცია);

ეტაპი N 6 - ტექნოლოგიური მოწყობილობების მონტაჟი, გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაობი;

ეტაპი N 7 - ტერიტორიის კეთილმოწყობა, სამშენებლო ნარჩენების გატანა;

სულ 7 ეტაპი - ხანგრძლივობით - 24 თვე

სამუშაოებიუნდაწარიმართოს კალენდარულიგეგმისმიხედვით.იხ. მოპ-1;

ეტაპებისდასრულებამდე10დღით ადრე ნებართვისმფლობელივალდებულიაშეატყობინოს საჯაროზედამხედველობისორგანოსეტაპისდასრულებისშესახებ.

*შენიშვნა– ყველა ფარული სამუშაოებისდასრულებამოხდეს შესაბამისი აქტის შედგენით, საჭიროების შემთხვევაში მოხდეს ფარული სამუშაოების ფოტოფიქსაცია. აქტებზე ხელმომწერი მხარეები – დამკვეთი, მენარდე, ობიექტზე დამოუკიდებელიზედამხედველი სუბიექტი;

ა)მოცემულ მშენებლობაზე ფარული სამუშაოების აქტები შედგეს შემდეგ ფარულ სამუშოებზე–

*მოედნისგეოდეზიურდაკვალვაზე;

*მიწისსამუშაოებისდასრულებისას,

*საძირკვლისკონსტრუქციებისარმირებაზემათდაბეტონებამდე,

*საძირკვლისჰიდროიზოლაციაზე,

*სვეტების, სართულშუა გადახურვის ფილებისა და რიგელების, მათი კვანძების, კონსტრუქციებისარმირებისდასრულებაზემათ დაბეტონებამდე;

აქტები იკინძებადა ინახებახელმომწერმხარეებთან.

ბ)მშენებლობის პროცესში სავალდებულოა ტიპიური ფორმების მიხედვით შედგეს სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი, სადაც აისახება ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი ეტაპობრივი ქმედება;ასევეტექნიკურიუსაფრთხოებისდა ტექნიკურიზედამხედველობისჟურნალები.

7. უსაფრთხოებისტექნიკა

1.უცხო პირთა, აგრეთვე სამონტაჟოოპერაციებში დაუსაქმებელიმუშა-მომსახურეთაყოფნა სამშენებლომოედანზედაუშვებელია.

2.მუშა-მომსახურე პერსონალს უნდა ჩაუტარდეს ინსტრუქტაჟი მშენებლობაზე უსაფრთხოების ტექნიკის, სიმაღლეზე მუშაობის ტექნიკური რეგლამენტის მიხედვით სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყოფის საკითხებზე, პერიოდულად უნდა ჩატარდეს გამოცდაც.

3.სამუშაოთა წარმოების უზრუნველყოფისათვისდა ტექნოლოგიების უზრუნველსაყოფად ასევე აუცილებელია მშენებლობის აღჭურვა განმარტებით ბარათში მოცემული ცხრილის მიხედვით,მანქანა- მექანიზმებით,ინსტრუმენტებითდა დანადგარებით

4.მომუშავეთა შორის უსაფრთხოების ღონისძიებები უნდა იყოს დაცული სამშენებლო _ სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების ყველა ეტაპზე, თანახმად სნ და წ III _ 4 _ 80 (უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში) და სხვა ნორმატიულ - საკანონმდებლო დოკუმენტებისმითითებებისშესაბამისობით.მათგანყურადღებამახვილდებაშემდეგზე:

5.სამუშაო ადგილები მუშაობის პირობებისა და ტექნოლოგიურობის გათვალისწინებით უზრუნველყოფილიუნდა იყოს კოლექტიურიდაცვისა და სიგნალიზაციის საშუალებით.

6.ადვილად აალებადი სამღებრო, საიზოლაციო და სხვა მასალების აგრეთვე მომწამლავი ნივთიერებების (ასეთების არსებობის შემთხვევაში) დღიური რაოდენობა სამუშაოთა წარმოებისზონაში არ უნდა აღემატებოდესიმავე დღიური რაოდენობის მოთხოვნილებების შესაბამისობას.

7.მასალებისადა ნაკეთობებისდასაწყობებაუნდა მოხდეს მათზე ტექნოლოგიურპირობათა გათვალისწინებით;ამავე დროს ისინი უნდა დაეწყოს მოსწორებულადგილზე, რომ მათი მოცურებაარ მოხდეს.

8.ელექტრო უსაფრთხოების წესები ჩამოყალიბებულია სახსტანდარტში 12.1.0.13-88. ელექტრო კარადა უნდა იყოს ჩაკეტილ მდგომარეობაში. ელექტრო კაბელები, ელექტრო სადენები და მოწყობილობები კი იზოლირებული. გაშიშვლებული სადენების გამოყენება აკრძალულია.

9.იკრძალება ვიბრატორის და სხვა ელექტრო მოწყობილობების ადგილიდან-ადგილზე გადატანა, მისი ელექტრო ქსელიდან გამორთვის გარეშე. სამუშაოთა შესრულების შემდეგ ხელსაწყოებისუფთავდებადა მშრალადიწმინდება.

8. ბუნებისდაცვა და ეკოლოგია

1) სამონტაჟოსამუშაოებიაუცილებელია განხორციელდესბუნებისდაცვით და ჰაერის გაბინძურებისსაწინააღმდეგოღონისძიებებისდაცვით.

2) გარემოსდაცვის სამსახურისნებართვისგარეშე მშენებლობისსიახლოვესიკრძალება ხეებისა და ნარგავებისმოჭრა ან განადგურება.

3) დაუშვებელიაარსებულსაკანალიზაციოჭებში ბეტონ-შემრევისდა ბეტონ-ტუმბოს მილსადენებისჩარეცხვა ან მათი დანაგვიანებასამშენებლონარჩენებით;

4) სადემონტაჟოსამუშაოებისდამთავრების პერიოდში შენობიდან სამშენებლო ნაგვის გადმოყრადაუშვებელია,სადემონტაჟოსამუშაოთაწარმოებისასმიღებული უნდა იქნას ზომები და შემუშავდესღონისძიებებიგარემოსადა გარშემომყოფთადასაცავადმტვრისგან და ხმაურისგან

9. რეკომენდირებულიმანქანამექანიზმების, სპეც.ავტო-ტრანსპორტისდა ხელსაწყოების უწყისი

სამშენებლო პროცესის უწყვეტი რითმისა და ტექნოლოგიურობის უზრუნველსაყოფად აუცილებელია მისი აღჭურვა თანამედროვე ტექნიკური საშუალებებით, მათი რეკომენდირებულიჩამონათვალიმოცემულიაცხრილში:

კობა სურმავა

01.10.2026 წელი

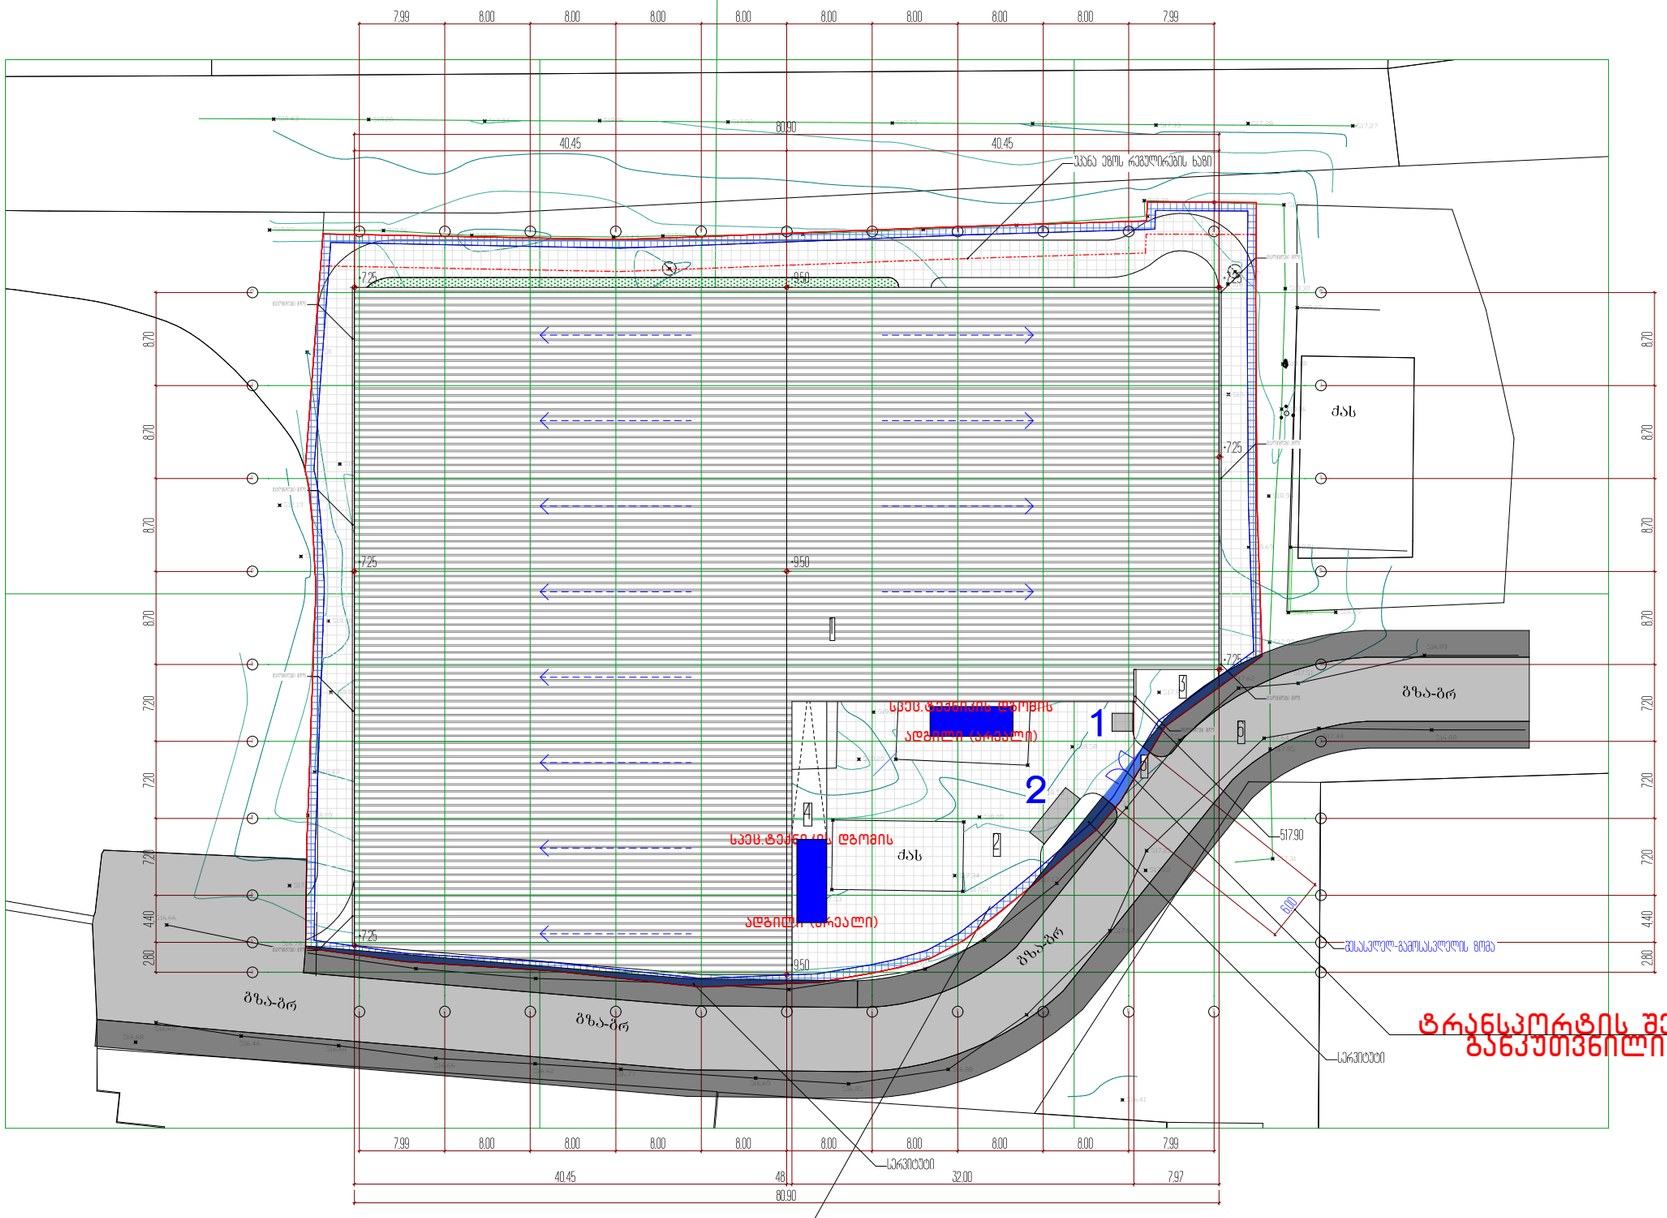
ԼՍՐՐՈՒՅՑՆԵՐԻ ՏՎՅՈՒՐԱՎՈՐՈՒՄ ՈՒՍՈՒՑԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԱՀՄՆՈՒՐԴՈՎ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ «ՀՈՒՆԻՍ ՔՆՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ»

ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉՈՒՄ ՈՒՍՈՒՑԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑԿԱՑՎՈՂ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՈՒՍՈՒՑԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՍԱՀՄԱՆՎՈՂ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՉԿԻՐԱՌՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

24 ԹԱՂԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՍԱՀՄԱՆՎՈՂ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՉԿԻՐԱՌՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

| | | |


7.99
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
7.99
80.90
40.45
40.45
ავტო ეზოს რკინეული ხიდი
7.25
9.50
8.70
8.70
8.70
8.70
7.20
7.20
7.20
4.40
2.80
ქარხანა
ქარხანა
ქარხანა

ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია

tbilisi.gov.ge ცხელი ხაზი - (+995 32) 2722222

ნომერი: 10/0126258831-17
თარიღი: 15.09.2026 11:54
ვადა: 15.10.2026

განმცხადებელი (დაინტერესებული პირი)

შპს შარავანდი საიდენტიფიკაციო კოდი : 208190125
მისამართი: საქართველო, თბილისი, სამგორის რაიონი, კახეთის გზატკეცილი, N108
საკონტაქტო ინფორმაცია: 595907675;
განცხადების N: განცხადების თარიღი:
ხელმომწერი: თანამდებობა:

განცხადების შემომტანი

წარმომადგენელი: ლადო ჭანტურია პირადი ნომერი: 01024032026
საკონტაქტო ინფორმაცია: 595907675;

განცხადება/ნომენკლატურა

მუნიციპალური ინსპექცია
შეტყობინება
სანებართვო პირობით განსაზღვრული ქმედებების შესახებ
ეტაპის ოქმის წარმოდგენა

მოთხოვნის ტექსტი

წარმოადგინა I ეტაპის ოქმი (ინსპექტირების ანგარიში), რომელიც შეასრულა ინსპექტირების ორგანომ შპს ,,თი აი ეი ჯი აუდიტესკორტი" (მშენებლობა მიმდინარეობს ს/კ 01.19.26.004.225, არქიტექტურის სამსახურის ბრძანების 8007021 საფუძველზე)

დამატებითი ინფორმაცია

- ფურცლების რაოდენობა: 7
- დანართი: I ეტაპის ოქმი (ინსპექტირების ანგარიში)
- პასუხის გაცემის ფორმა: პირადი უზრუნველყოფით ხელზე გატანა

გავეცანი, თანახმა ვარ ჩემი პერსონალური მონაცემები დამუშავებული იქნეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ

ხელმოწერა: _____

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
№ 10/0126258831-17
15.09.2026 : 11:54
ქ. თბილისი, გ.ტაბიძის ქ. N7

ხელშეკრულების დანართი

ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტის მერია

tbilisi.gov.ge ცხელი ხაზი - (+995 32) 2722222

ნომერი: 10/0126258856-17
თარიღი: 15.09.2026 11:57
ვადა: 22.09.2026

განმცხადებელი (დაინტერესებული პირი)

შპს შარავანდი საიდენტიფიკაციო კოდი : 208190125
მისამართი: საქართველო, თბილისი, სამგორის რაიონი, კახეთის გზატკეცილი, N108
საკონტაქტო ინფორმაცია: 595907675;
განცხადების N: განცხადების თარიღი:
ხელმომწერი: თანამდებობა:

განცხადების შემომტანი

წარმომადგენელი: ლადო ჭანტურია პირადი ნომერი: 01024032026
საკონტაქტო ინფორმაცია: 595907675;

განცხადება/ნომენკლატურა

მუნიციპალური ინსპექცია
შენობა - ნაგებობის ტექნიკური ზედამხედველობის სერვისი
ხელშეკრულების წარმოდგენა

მოთხოვნის ტექსტი

წარმოადგინა ხელშეკრულება

დამატებითი ინფორმაცია

- ფურცლების რაოდენობა: 8
- დანართი: -
- პასუხის გაცემის ფორმა: პირადი უზრუნველყოფით ხელზე გატანა

გავეცანი, თანახმა ვარ ჩემი პერსონალური მონაცემები დამუშავებული იქნეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ

ხელმოწერა: _____

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
№ 10/0126258856-17
15.09.2026 : 11:57
