ქალაქი თბილისი, სოფელი ახალდაბა, პეტრე მელიქიშვილის I შესახვევი , N 6

მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი: 01.20.01.229.026

დასაშლელ სამუშაოთა პროექტი



შემსრულებელი **დ.შაბურიშვილი**

თბილისი 2026 წ

მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი **N 01.20.01.229.026**

ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან

განცხადების რეგისტრაცია **მომზადების თარიღი**

N 882026092574 - 06/02/2026 12:07:51 **11/02/2026 17:57:02**

საკუთრების განყოფილება

ზონა	სექტორი	კვარტალი	ნაკვეთი
თბილისი	წყნეთი		
01	**20**	**01**	**229/026**

მისამართი: ქალაქი თბილისი, სოფელი ახალდაბა, პეტრე მელიქიშვილის I შესახვევი, N 6

ნაკვეთის საკუთრების ტიპი: საკუთრება

ნაკვეთის დანიშნულება: სასოფლო-სამეურნეო (საკარმიდამო)

დაზუსტებული ფართობი: 536.00 კვ.მ.

ნაკვეთის წინა ნომერი:**81.23.00.466;**

შენობა-ნაგებობის ჩამონათვალი:N1 - საერთო ფართი:75.22; N2 - სამშენებლო დოკუმენტაციის გარეშე

მესაკუთრის განყოფილება

განცხადების რეგისტრაცია : ნომერი 882026092574 , თარიღი 06/02/2026 12:07:51
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 11/02/2026

უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი:

- ნასყიდობის ხელშეკრულება N260143022 , დამოწმების თარიღი:06/02/2026 ,ნოტარიუსი ნინო მათუაშვილი

მესაკუთრეები:
რაუშან ბურკიტბაევა ,P/N: 01601135190

მესაკუთრე: **აღწერა:**
რაუშან ბურკიტბაევა

იპოთეკა

საგადასახადო გირავნობა:

რეგისტრირებული არ არის

ვალდებულება

ყადაღა/აკრძალვა:

რეგისტრირებული არ არის

მოვალეთა რეესტრი:

რეგისტრირებული არ არის

- ფიზიკური პირის მიერ არასამეწარმეო საქმიანობის ფარგლებში 2 წლამდე ვადით საკუთრებაში არსებული ქონების/აქტივის მიწოდებით ნამეტი შემოსავლის მიღების შემთხვევაში ფიზიკური პირი ვალდებულია არაუგვიანეს საანგარიშო თვის მომდევნო თვის 15 რიცხვისა საგადასახადო ორგანოს წარუდგინოს დეკლარაცია საშემოსავლო გადასახადის შესახებ და ამავე ვადაში გადაიხადოს კუთვნილი საშემოსავლო გადასახდი.
- საგადასახადო წლის განმავლობაში გადახდის წყაროსთან დაუკავებლად 1000 ლარის ან მეტი ღირებულების ქონების საჩუქრად მიღებისას საშემოსავლო გადასახადი გადახდას ექვემდებარება საანგარიშო წლის მომდევნო წლის 1 აპრილამდე, რის შესახებაც აღნიშნული ფიზიკური პირი იმავე ვადაში წარუდგენს დეკლარაციას საგადასახადო ორგანოს.
- აღნიშნული ვალდებულების შეუსრულებლობა წარმოადგენს საგადასახადო სამართალდარღვევას, რაც იწვევს პასუხისმგებლობას საგადასახადო კოდექსის XL თავის მიხედვით.
- დოკუმენტის ნამდვილობის გადამოწმება შესაძლებელია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ ვებ–გვერდზე www.napr.gov.ge;
- ამონაწერის მიღება შესაძლებელია ვებ–გვერდზე www.napr.gov.ge, ნებისმიერ ტერიტორიულ სარეგისტრაციო სამსახურში, იუსტიციის სახლებსა და სააგენტოს ავტორიზებულ პირებთან;
- ამონაწერში ტექნიკური ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: 2 405405 ან პირადად შეავსეთ განაცხადი ვებ–გვერდზე;
- კონსულტაციის მიღება შესაძლებელია იუსტიციის სახლის ცხელ ხაზზე 2 405405;
- საჯარო რეესტრის თანამშრომელთა მხრიდან უკანონო ქმედების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე: 2 405405
- თქვენთვის საინტერესო ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით მოგვწერეთ ელ-ფოსტით: info@napr.gov.ge

საკადასტრო გეგმა

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

საკადასტრო კოდი:	**01.20.01.229.026**	ნაკვეთის დანიშნულება:	**სასოფლო-სამეურნეო(საკარმიდამო)**
განცხადების ნომერი:	**892023308207**	ფართობი:	**536 კვ.მ (WGS 84 / UTM zone 38N)**
მომზადების თარიღი:	**15/11/2024**		

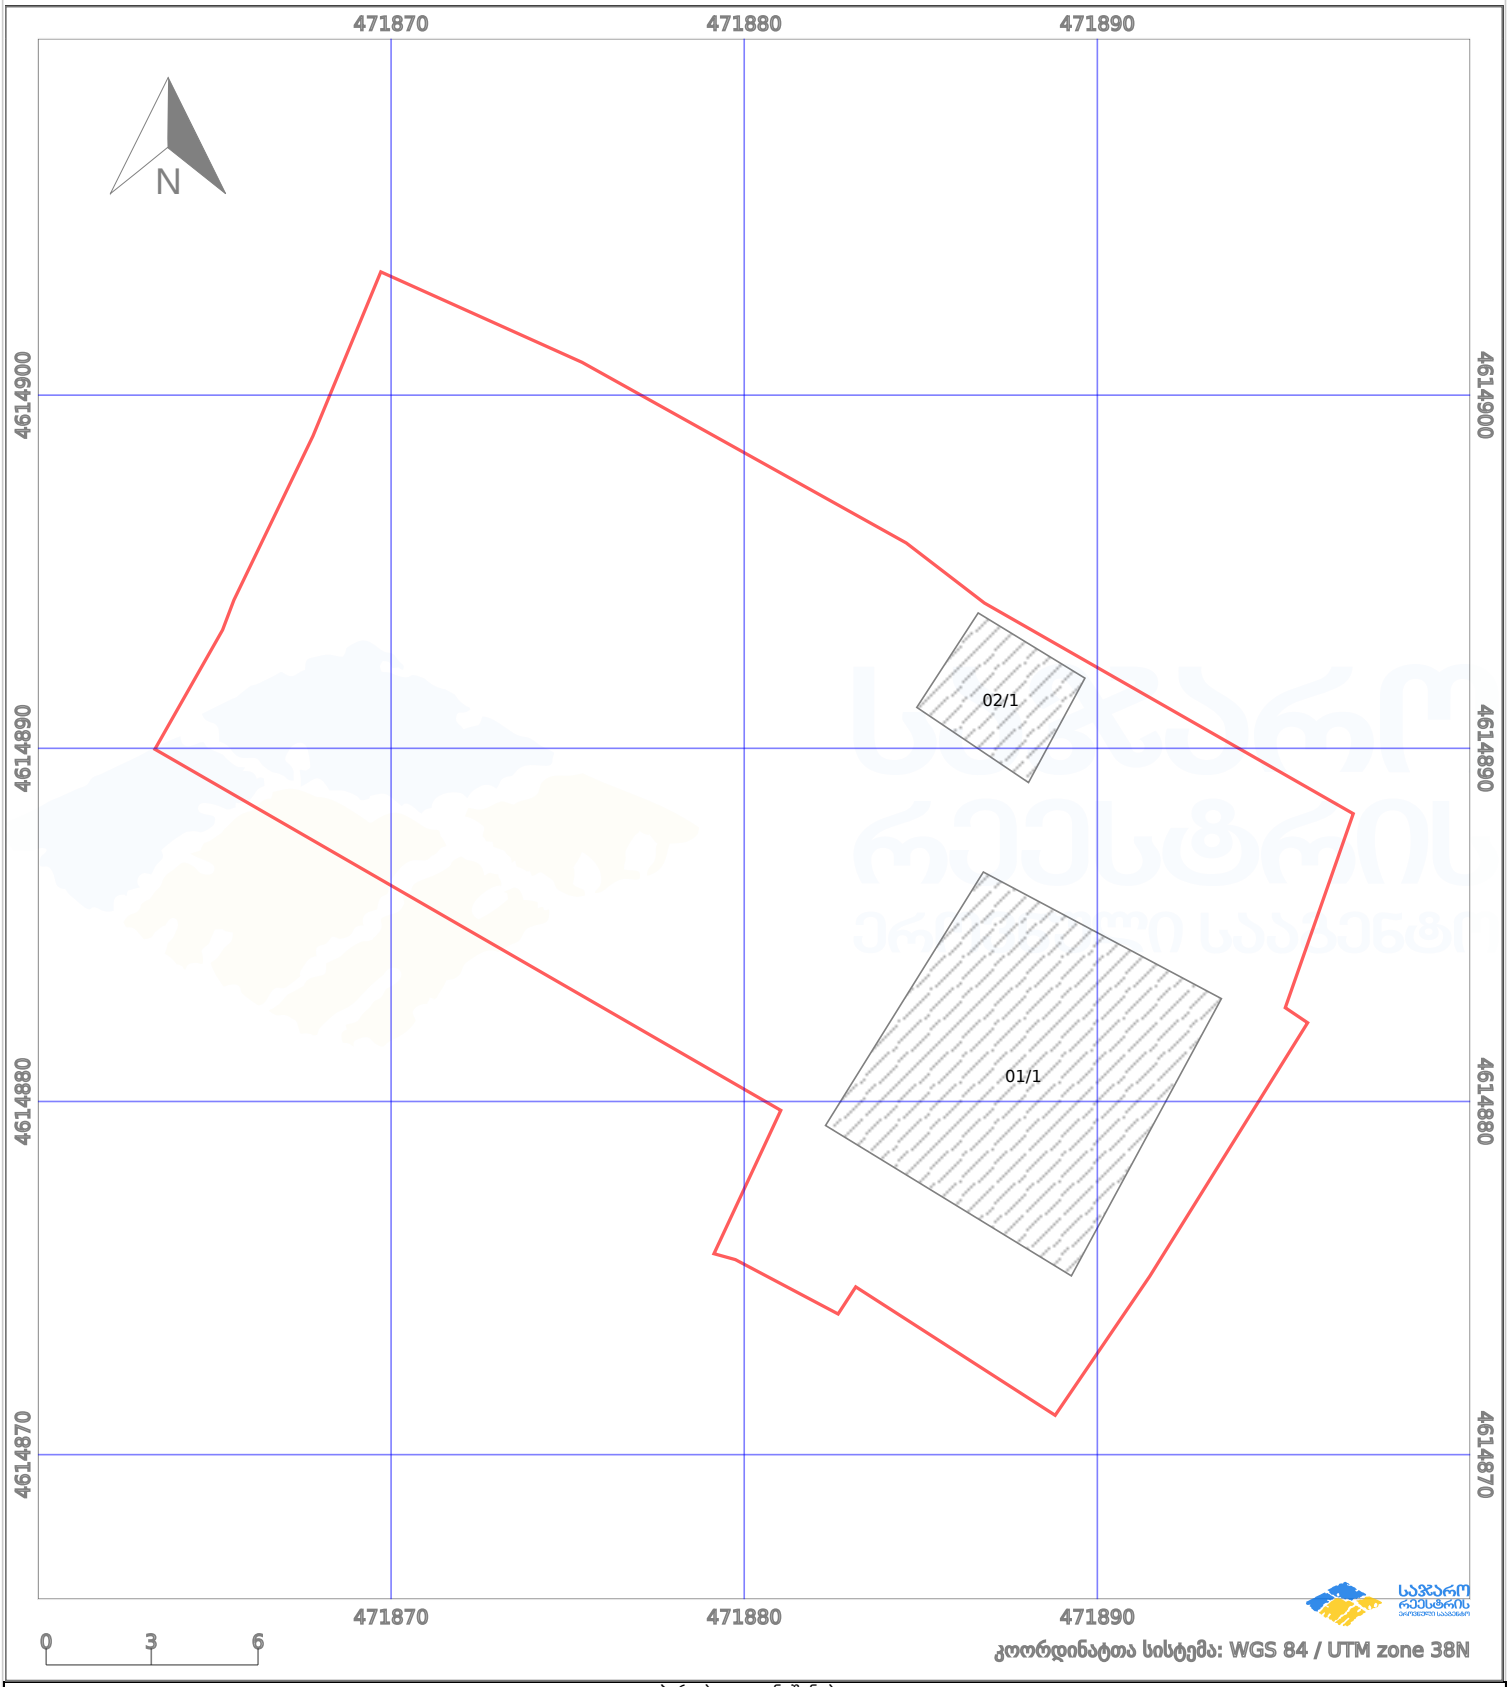

პირობითი აღნიშვნები:

ნაკვეთის საზღვარი		მშენებარე ნაგებობა	02/4	აშენებული ნაგებობა		მიწისქვეშა ნაგებობა
ხაზობრივი ნაგებობა		ტყის ფონდი		ვალდებულება		ქარსაფარი ზოლი

ქალაქი თბილისი, სოფელი ახალდაბა, პეტრე მელიქიშვილის I შესახვევი , N 6

ს/კ 01.20.01.229.026

დემონტაჟის სამუშაოთა ორგანიზაციის პროექტი

დემონტაჟის სამუშაოთა ორგანიზაციის პროექტს საფუძვლად დაედო საკადასტრო გეგმა, ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, ტერიტორიის დათვალიერება და შესწავლა.

დასაშლელია ერთ (1) სართულიანი შენობები, შენობების საერთო ფართობი შეადგენს 85 კვადრატულ მეტრს და მოცულობით 437 კუბურ მეტრს. შენობა ნაგებობები მდებარეობს ქალაქ თბილისის ფარგლებში შემავალი სოფლის(ახალდაბა) ტერიტორიაზე. მიწის ნაკვეთის საკადასტრო გეგმაზე სადემონტაჟო შენობები მოცემულია 01/1 და 02/1 აღნიშვნით. ამ შენობებთან მისასვლელად არსებობს სამანქანო გზა , რომელიც აღნიშნულია დემონტაჟის პროექტის გენერალურ გეგმაზე. დასაშლელ სამუშაოთა წარმოება სასურველია განხორციელდეს ძირითადად განხორციელდეს ხელით და სხვადასხვა ხელსაწყოების მეშვეობით რაც არ გამოიწვევს მომიჯნავედ განლაგებული შენობების კონსტრუქციულ დაზიანებას.

დმონტაჟის პროექტი დამუშავებულია დამოუკიდებლად და სამშენებლო გრაფიკში ასახულია ობიექტის სადემონტაჟოდ საჭირო ქმედებები

დემონტაჟის სამუშაოების ეტაპები

1) შენობების სახურავების დაშლა

2) შენობების კარ-ფანჯრების მოხსნა

3) შენობების კედლების დაშლა

4) შენობების საძირკვლების დაშლა

5) ტერიტორიიდან სამშენებლო ნაგვის გატანა-დასუფთავება.

დასაშლილი სამშენებლო მასალებისა და ნაგვის დასატვირთად გამოყენებული იქნას თვითმცლელი ავტოტრანსპორტი. სადემონტაჟო სამუშაოების წარმოების პერიოდში დროებითი ღობის ფარგლებში უნდა განხორციელდეს გადარჩეული მასალა-ნაკეთობების (ხის ,აგურის ,მეტალის და სხვა) დაშტაბელება. ამშენებლო ნარცენებისა და ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე გათვალისწინებულია თვითმცლელი ავტოტრანსპორტისთ. მათი ნუსხა მოყვანილია ცხრილში მომდევნო ფურცელზე. სამუშაოთა წარმოების დროს სავალდებულოა შრომის უსაფრთხოების წესების სრული დაცვა, ასევე შენობების დაშლისას სელიტებურ ზონაში მტვრის გაფანტვისაგან დამცავი ღონისძიებების უზრუნველყოფა. შენობების დემონტაჟის პროცესი აუცილებელია წარიმართოს შრომის ტექნიკური უსაფრთხოების ინჟინრის მეთვალყურეობის ქვეშ. სამშენებლო მოედანზე შექმნილი უნდა იქნას შრომის უსაფრთხოების ჟურნალი. სადემონტაჟო სამუშაოებზე დამკვეთის მიერ დადგენილია გეგმიური ხანგრძლივობა 6 თვის პერიოდში.

შენობის დასაშლელ სამუშაოთა წარმოების პროექტის შესადგენი ნორმატივები

საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“.

საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის კოდექსი“

ტექნიკური რეგლამენტი 477. „სიმაღლეზე მუშების უსაფრთხოების მოთხოვნის შესახებ“.

საქართველოს მთავრობის 27.05.2014 წ . დადგენილება 361 „ტექნიკური რეგლამენტი მშენებლობის უსაფრთხოების შესახებ“.

ტექნიკური რეგლამენტი „შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების წესები“ დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის 20.01.2016წ. 41 დადგენილება.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება „სამუშაო დროის აღრიცხვის ფორმისა და მისი წარმოების წესების დამტკიცების თაობაზე“. (ქ.თბილისი)

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის N 01-15/ნ ბრძანება „სამუშაო სივრცეში რისკის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე . (ქ.თბილისი. ცვლილება 01-21/ნ).

საქართველოს მთავრობის N429 დადგენილება ტექნიკური რეგლამენტი „ამწე მოწყობილობების მოწყობისა და უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“.

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N 127/ნ (2003 წლის 6 ივნისი ქ.თბილისი) „საქართველოს ტერიტორიის სანიტარული დაცვის წესების დამტკიცების შესახებ“.

საქართველოს მთავრობის N 370 დადგენილება (2015 წლის 23 ივლისი ქ.თბილისი). „სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“.

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N17 „გარემოს დაცვითი ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“.

საქართველოს მთავრობის N457 დადგენილება (2022 წლის 16 სექტემბერი ქ.თბილისი). „სამუშაო სივრცეში უსაფრთხოების ან/და ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირეული ნიშნების მინიმალური მოთხოვნები“. (დადგენილების ამოქმედების ვადა 2023 წლის 1 იანვარი).

საქართველოს მთავრობის N590 დადგენილება (2022 წლის 23 დეკემბერი ქ.თბილისი) „ტექნიკური რეგლამენტის - სამუშაო სივრცეში ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გამოყენებისას უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებული მინიმალური მოთხოვნების დამტკიცების თაობაზე“.

დასაშლელი ობიექტის დახასიათება

სადემონტაჟო შენობები ერთ 01/1 წარმოადგენს 1 სართულიან სახლსა ნაწილობრივ მიწის ქვეშ განთავსებულ სარდაფით ხოლო ნაგებობა 02/1 არის მიწისპირა ერთსართულიანი მცირე დამხმარე ნაგებობა . არსებული შენობების კედლები აგებულია ძირითადად აგურით(სილიკატური და თიხის) საძირკველი კომბინირებული, გადახურვა ქანობიანი, ხის კონსტრუქციის, დაფარული თუნუქის პროფილირებული სახურავებით.

მითითებები სამუშაოთა წარმოების თაობაზე

ზემოაღნიშნულის შესაბამისად სადემონტაჟო სამუშაოების წარმოება უნდა მოხდეს ძირითადად ხელით და სხვადასხვა ტიპის სამშენებლო ხელსაწყოების გამოყენებით.

სამუშაოები იწყება სახურავის მოხსნით. მოხსნილი მასალები გასუფთავდეს, გადაირჩეს და შტაბელებად დაეწყოს დროებითი ღობის ფარგლებში.

დაშლის ხანგრძლივობის შესახებ

შენობა-ნაგებობის დემონტაჟი დამკვეთის მიერ განსაზღვრულია 6 თვის ვადაში.

გეგმიურად დადგენილი ხანგრძლივობის დაცვა, შენობის დაშლაზე 6 თვის ვადაში, შესაძლებელია უწყვეტი ფინანსირების პირობებში რაც უნდა გაითვალისწინოს დამკვეთმა. ამას ხელი უნდა შეუწყოს თბილისის ზომიერმა კლიმატურმა პირობებმაც.

სამშენებლო ტექნიკის, დანადგარებისა და ინსტრუმენტების ჩამონათვალი

№	დასახელება	მარკა	რაოდენ. ცალი
1	2	3	4
1	თვითმცლელი ძარიანი და სპეც-დანიშნულების ავტოტრანსპორტი სამშენებლო ტვირთის გადასატანად	სხვადასხვა	1
2	გადასატანი კომპრესორი	სო-48	1
3	ელექტროშესადუღებელი საჭრელი აგრეგატი	კომპ.	2
4	ავტოკენური შედუღების და ჭრის აპარატი	კომპ. პკუ-35	2
5	ლითონის სახარაჩო სექციები 100 მ^2 ფართობისათვის და სიმაღლით 7მ.	კომპ.	1
6	ხელის ელექტრო პნევმატური ჩაქუჩი	კომპ.	2

მომუშავეთა შორის უსაფრთხოების წესების დაცვის შესახებ

სადემონტაჟო სამუშაოების დაწყებამდე შრომის სერტიფიცირებული უსაფრთხოების სპეციალისტის მიერ მოხდეს საფრთხეების იდენტიფიკაცია, რისკების შეფასება და პრევენციული ღონისძიებების შემუშავება.

მომუშავეთა შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვა სადემონტაჟო სამუშაოს ყველა ცალკეულ ეტაპზე აუცილებელია სნ და წ III-4-80* „უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე“ და სხვა ნორმატიულ-საკანონმდებლო დოკუმენტების შესაბამისობით. მათგან ყურადღებას ვამახვილებ შემდეგზე:

სამუშაო ადგილები მუშაობის პირობებისა და ტექნოლოგიურობის გათვალისწინებით უზრუნველყოფილი უნდა იყოს კოლექტიური დაცვისა და სიგნალიზაციის საშუალებებით.

ელექტრო უსაფრთხოების წესები ჩამოყალიბებულია სახელმწიფო სტანდარტში 12.013-88 ელექტრო კარადა ყოველთვის უნდა იყოს ჩაკეტილ მდგომარეობაში, ელექტრო კაბელები, ელექტრო სადენები და ელექტრო მოწყობილობები კი უნდა იმყოფებოდეს იზოლირებულ მდგომარეობაში. „გაშიშვლებული ან არასათანადოდ იზოლირებული სადენების გამოყენება აკრძალულია სამუშაო გარემოში“.

ღამის პერიოდში აუცილებელია განთავსდეს უსაფრთხოების ზონის აღმნიშვნელი ფირნიშნები და განათდეს.

სამუშაოთა უწყვეტობისა და ტექნოლოგიურობის, აგრეთე შრომის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად აუცილებელია სადემონტაჟო ცხრილში მოცეული და ჩვენს მიერ რეკომენდირებული მანქანა-მექანიზმებით, ინსტრუმენტებითა და დანადგარ-სამარχვებით აღჭურვა. ცხადია შესაძლებელია მათი შეცვლაც უფრო თანამედროვე მაგრამ შესაბამისი ანალოგებით.

სამუშაო ოპერაციების განმახორციელებელი პირები აღჭურვილნი უნდა იყვნენ პირადი დაცვის საშუალებებით (ჩაფხუტები, დამცავი ქამრები, სპეც ფეხსაცმელი, დამცავი სათვალეები, სამშენებლო რესპირატორები, ხმაურდამხშობი საყურეები , ხელთათმანები) საქართველოს მთავრობის N590 დადგენილების შესაბამისად.

დაუშვეელია ზედამხედველობის გარეშე მანქანების, ხელსაწყოებისა და მოწყობილობების დატოვება ჩართულ მდგომარეობაში . ასევე მათი ტექნიკური მომსახურეობა უნდა მოხდეს ძრავის გამორთვის შემდეგ. ლითონის ელემენტების ჩაჭრისას ელექტრო ან აიროვანი აპარატით 5 მეტრის რადიუსის ფართობები უნდა განთავისუფლდეს წვადი და ადვილად აალებადი მასალებისგან, ხოლო 10 მეტრის რადიუსში ასაფეთქებელი (მაგალითად ჟანგბადის ბალონები, ბენზინი) მასალებისაგან სამშენებლო სამუშაოებზე დასაქმებულმა ყველა პირმა უნდა შეისწავლოს შრომის უსაფრთხოების წესები, გაიაროს შესაბამისი ინსტრუქტაჟი, ჩააბაროს გამოცდა სპეციალურ ჟურნალში და დააფიქსიროს ეს ხელმოწერით.

ბუნების დაცვითი და ჰაერის დაბინძურების საწინააღმდეგო ღონისძიებები

შენობა-ნაგებობები მდებარეობს ქ.თბილისის საგარეუბნო განაშენიანებაში. აღნიშნულის გამო აუცილებელია შენობების დაშლის პერიოდში შემდეგი ღონისძიებების დაცვა:

გარემოს დაცვის სამსახურის ნებართვის გარეშე იკრძალება მრავალწლიანი ხეებიდა და ნარგავების თვითნებური მოჭრა ამოძირკვა და განადგურება.

არსებული კედლების, ტიხრებისა და იატაკის დაშლის პროცესში მოსალოდნელია მტვრის გაფანტვა გარე სივრცეში, რის გამოც შენობებს უნდა ჩამოეფაროს დროებითი დამცავი ფარდა და დაინამოს .

დაუშვებელია არსებული საკანალიზაციო თუ სანიაღვრე ჭების დანაგვიანება სამშენებლო ნარჩენებით. ასევე დაუშვებელია ამოსახაპი ორმოების მოწყობა. სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება ფხვიერ მდგომარეობაში აკრძალულია. ავტომანქანების ძარებში სამშენებლო ნარჩენების ჩატვირთვის შემდეგ მათი ზედაპირი უნდა დაინამოს, გადაეფაროს დამცავი ბადე და მოხდეს გატანა ნაგავსაყრელზე დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე, შესაბამის სამსახურებთან შეთანხმების შემდეგ.

დასაშლელ შენობა-ნაგებობათა ფოტოსურათები (24.10.2026)

ფოტოებზე შენობები აღნიშნულია საკადასტრო გეგმაზე მოცემული ნომრების შესაბამისად 01/1 და 02/1




01/1


01/1


01/1


01/1


01/1


02/1


02/1


02/1

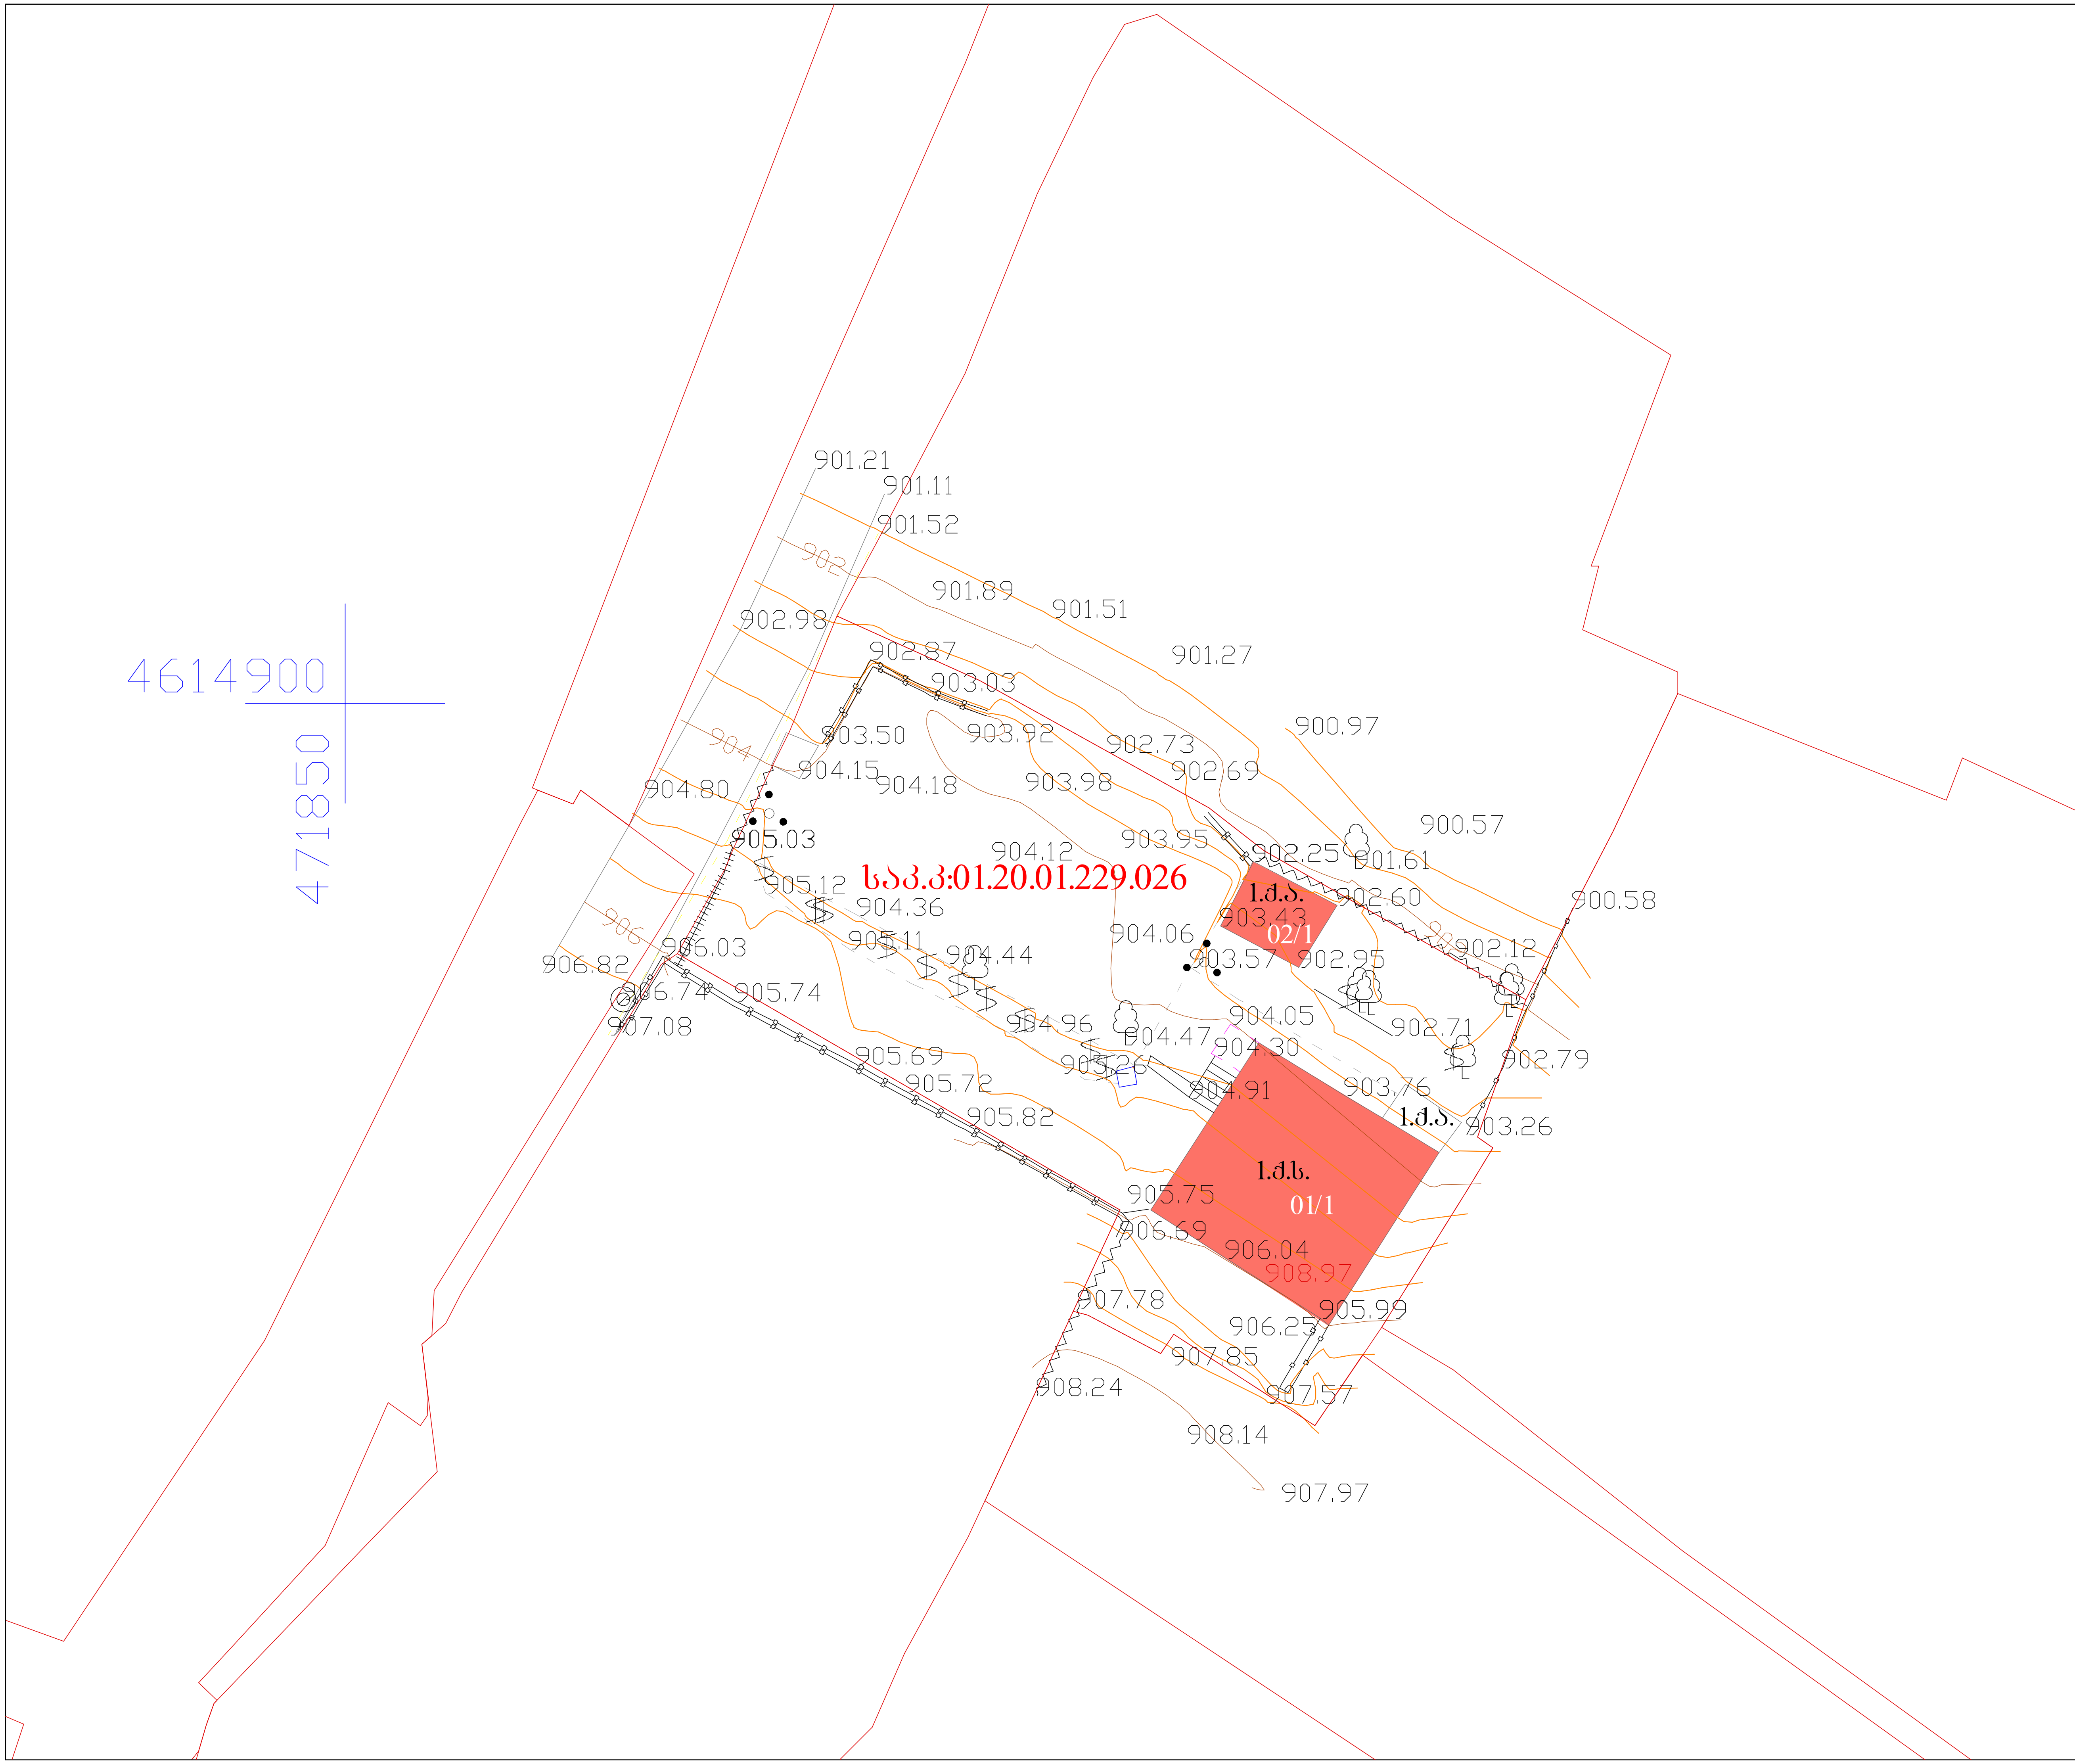

A-4

ექსპლიკაცია

პირობითი ნიშნები

პირობითი აღნიშვნები

- დასაშლელი შენობა
- კიბე
- აივანი
- ონკანი
- ნაკვეთის საზღვარი
- ასფალტის გზა
- ბორდიური
- ბეტონის ღობე
- ლითონის ღობე
- ჭიშკარი

დირექტორი		
შეასრულა		დ. შაბურიშვილი

ქ.თბილისი, სოფელი ახალდაბა, პ. მელიქიშვილის I შესახვევი N 6 . საკადასტრო კოდი 01.20.01.229.026	2026წ.		
დემონტაჟის ორგანიზაციის პროექტი	სტადია	ფურ-ლი	სულ
	მ.ო.		
სადემონტაჟო გეგმები			

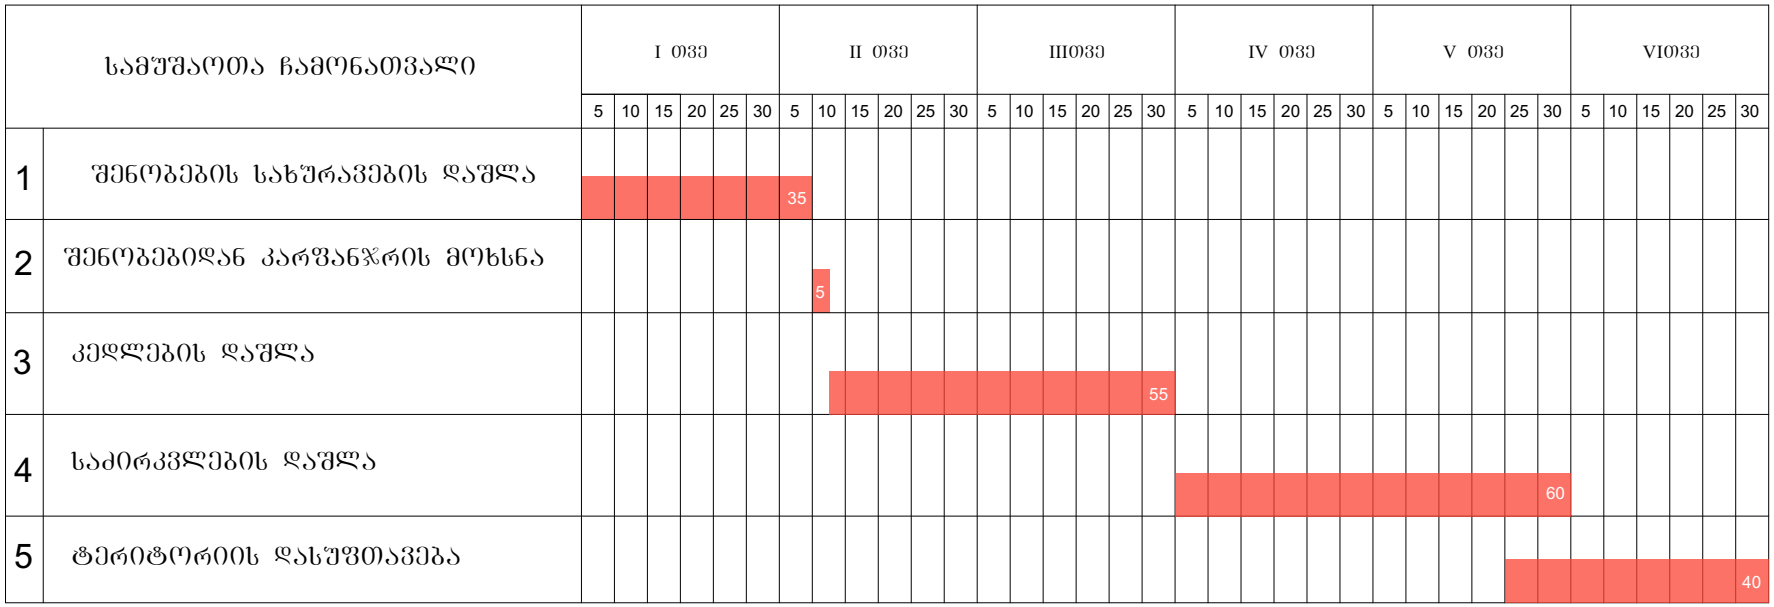

A-4

ექსპლიკაცია

პირობითი ნიშნები

დირექტორი		
შეასრულა	ლუსტრი	დ. შაბურიშვილი

ქ.თბილისი, სოფელი ახალდაბა, პ. მელიქიშვილის I შესახვევი N 6 . საკადასტრო კოდი 01.20.01.229.026

2026წ.

დემონტაჟის ორგანიზაციის პროექტი	სტადია	ფურ-ლი	სულ
	მ.ო.		
დემონტაჟის გრაფიკი			

საინფორმაციო დაფა





ქალაქი თბილისში, სოფელ ახალდაბაში, პეტრე მელიქიშვილის I შესახვევი , N 6

შენობის სადემონტაჟო პროექტის საექსპერტო შეფასება

მესაკუთრე: რ. ბურკიტბაევა

შემსრულებელი: დ . შაბურიშვილი

ექსპერტი: გ. შაბურიშვილი

ექსპერტიზაზე წარმოდგენილია ,თბილისში ახალდაბაში პეტრე მელიქიშვილის პირველი შესახვევი N 6 ში ,არსებული შენობების დემონტაჟის დამუშავებული პროექტი.

წარმოდგენილ პროექტში განხილულია ტერიტორია, რომლის საკადასტრო კოდია 01.20.01.229.026 . მესაკუთრე რაუშან ბურკიტბაევა. აღნიშნული სადემონტაჟო შენობები საკადასტრო გეგმაზე 01/1 და 02/1 ნომრებითაა მოცემული.

ტერიტორიის ფართობი შეადგენს 536 კვადრატულ მეტრს. სადემონტაჟო შენობების საერთო ფართი შეადგენს 85 კვადრატულ მეტრს ხოლო მალებს შორის სიგანე 5.4 მეტრია. შენობის მაქსიმალური სიმაღლე 5.5 მეტრია, გამომდინარე აქედან შენობა განეკუთვნება მეორე კლასს.

ორივე შენობა მართკუთხა ფორმისაა. შენობა 01/1 ერთ სართულიანია, სარდაფით რომელიც ნაწილობრივ მიწის ქვეშ არის განთავსებული. ლენტური კომბინირებული საძირკვლით. კედლები აგურით და ბლოკით არის ამოყვანილი. გადახურვა ხის ნივნივებზე თუნუქის პროფილირებული ფურცლით. შენობა 02/1 წარმოადგენს აგურით აშენებულ მართკუთხა დამხმარე ნაგებობას რომლის სიმაღლეც არ აღემატება 2.4 მეტრს. მას აქვს ერთ მხარეს ხის ნივნივებზე დახურული სახურავი რომელიც შედგება თუნუქის პროფილირებული ფურცლისგან.

როგორც ზემოთ აღინიშნა სადემონტაჟო შენობების საერთ ფართი შეადგენს 85 კვადრატულ მეტრს

სადემონტაჟო სამუშაოების ჩასატარებლად პროექტით გათვალისწინებულია ხელის საწეველა და სხვა ტიპის სამშენებლო ტექნიკა.აღნიშნული მექანიზმები მუშაობის პროცესი დატანილია სამშენებლო გენგეგმაზე, აგრეთვე პროექტში მოცემულია სამშენებლო მექანიზმების ჩამონათვალი. პროექტში გათვალისწინებულია შრომის უსაფრთხოების წესები, რომლებიც უნდა იქნას დაცული მუშაობის პროცესში.

პროექტში მოცემულია სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარების კალენდარული გრაფიკი, რომელიც 6 თვეს შეადგენს. ჩვენი აზრით აღნიშნული დრო სავსებით საკმარისია.

დასკვნა

თბილისში, სოფელ ახალდაბაში, პ მელიქიშვილის პირველი შესახვევი N6 . ს/კ 01.20.01.229.026 არსებული შენობების დემონტაჟის პროექტი დამუშავებულია დამაკმაყოფილებლად და რეკომენდაცია ეძლევა მასთან შესაბამისობით ჩატარდეს სადემონტაჟო სამუშაოები

ექსპერტ-ინჟინერი გ. შაბურიშვილი პ/ნ 01024076097 ტელ: 571771971
