თბილისი დიდი დიღომი 01.10.08.006.217 6194 მ^2

მშენებლობის ორგანიზების პროექტი

2026

მშენებლობის ორგანიზების პროექტი

განმარტებით ბარათი:

1. *წესებით განსაზღვრული მშენებლობის რიგითობის, ეტაპების და მათი ხანგრძლივობის აღწერა:*

რიგი 1 ეტაპი N1

- *ტერიტორიაზე არსებული საძირკვლის დემონტაჟი. მოსამზადებელი სამუშაოები, (სამშენებლო მოედნის შემოღობვა)*

ეტაპი დასრულებულია

რიგი 1 ეტაპი N2

- *შენობა-ნაგებობის გრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი ღერძების დაფიქსირება.*

ეტაპი დასრულებულია

რიგი 1 ეტაპი N3

- *შეცვლილი ზედაპირის შემდგომ შენობის გრუნტზე დაკვალვა და ძირითად ღერძებზე დაფიქსირება.*

ეტაპი დასრულებულია

რიგი 2 ეტაპი N1

- *შენობა-ნაგებობების მიწის სამუშაოები;*
- *შენობა-ნაგებობების ფუძის მოწყობის სამუშაოები;*
- *ქვაბულის მოწყობის სამუშაოები;*
- *შენობა-ნაგებობების საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები;*

ეტაპი დასრულებულია

რიგი 2 ეტაპი N2

- *ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა შენობა-ნაგებობის მიწის პირის ნიშნულამდე;*

ეტაპი დასრულებულია

რიგი 2 ეტაპი N3

შენობის მიწის პირის ნიშნულიდან პირველი სართულის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის (არამზიდი კონსტრუქციების გამოკლებით) მოწყობა.

ეტაპი დასრულებულია

რიგი 2 ეტაპი N4

- *შენობა-ნაგებობის მეორე და მესამე სართულის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის (არამზიდი კონსტრუქციების გამოკლებით) მოწყობა.*

ეტაპი დასრულებულია

რიგი 2 ეტაპი N5

- *შენობა-ნაგებობის მეოთხე და მეხუთე სართულის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის (არამზიდი კონსტრუქციების გამოკლებით) მოწყობა.*

ეტაპი დასრულებულია

რიგი 2 ეტაპი N6

- *შენობა-ნაგებობის მეექვსე და მეშვიდე სართულის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის (არამზიდი კონსტრუქციების გამოკლებით) მოწყობა.*

ეტაპი დასრულებულია

რიგი 2 ეტაპი N7

· შენობა-ნაგებობის მერვე და მეცხრე სართულის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის (არამზიდი კონსტრუქციების გამოკლებით) მოწყობა.

ეტაპი დასრულებულია

რიგი 2 ეტაპი N8

· შენობა-ნაგებობის მეათე და მეთერთმეტე სართულის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის (არამზიდი კონსტრუქციების გამოკლებით) მოწყობა.

ეტაპის დასრულება შესაბამისი წესით ეცნობოს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეტაპი დასრულებულია

რიგი 2 ეტაპი N9 - 8თვეზე მეტი 15.08.2027 წლამდე

· შენობა-ნაგებობის მეთორმეტე; მეცამეტე; მეთოთხმეტე და მეთხუთმეტე სართულის მოწყობა, სახურავისა და გადახურვის მოწყობა. არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა.
შენობა-ნაგებობის საინჟინრო-ტექნიკური ქსელების მოწყობა

ეტაპის დასრულება შესაბამისი წესით ეცნობოს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ინსპექციის სამსახურს.

2. *არსებობის შემთხვევაში, დაფარული სამუშაოების, დათვალიერებისა და გამოცდის აქტების ჩამონათვალი, რაც მშენებლობის პროცესის დროს უნდა შედგეს:*

- ისეთი ფარული სამუშაოები როგორიცაა ბალასტ-ხრეშის ტკეპნილის მოწყობა, მონოლითური რკინა-ბეტონის კონსტრუქციის არმირების მოწყობის სამუშაოები დათვალიერებული და შემოწმებული იქნას კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოხდეს ფარული სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში გაზომვა, აღწერა, დასურათება და საჭიროების შემთხვევაში ლაბორატორიული ანალიზების წარმოება. შედგეს შესაბამისი სტატუსის აქტი.
- აქტების შედგენის მიზანია დადგინდეს ბალასტის სისქის, არმატურის კვეთის და რაოდენობის ასევე მისი ქსოვის სისწორის, ბეტონის მარკის და მონოლითური კარკასის კვეთის შესაბამისობა კონსტრუქციულ პროექტთან.
- სხვა ფარული სამუშაოები (შემავსებლის ხარისხი, ლესვის სისქე და სხვა) სეისმური მდგრადობის კუთხით უსაფრთხოა ამიტომ მათი კონტროლი არასავალდებულოა და განხორციელდება მხოლოდ დამკვეთის სურვილის შემთხვევაში.

3. *უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მეთოდების და ღონისძიებების აღწერა.*

- ტერიტორია დაცულია არსებული საყრდენი კედლებით, არსებული ღობეებით და დროებითი სამშენებლო ღობეებით, რომლიდანაც სამშენებლო სამუშაოები მოშორებულია და არ საჭიროებს გადახურვის მოწყობას. ღობის დამცავი სახურავი გათვალისწინებულია ტერიტორიაზე შესასვლელთან.
- უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე და პროცესში, კანონმდებლობის შესაბამისად მოხდება მუშა-პერსონალის სწავლება.
- იწარმოებს სააღრიცხვო ღურნალი.
- ტერიტორიაზე განთავსდეს უსაფრთხოების საინფორმაციო ბანერები.
- ტერიტორიაზე უცხო პირთა ყოფნის რეგულირება.
- გატარებულ იქნას სამშენებლო სამუშაოების წარმოების პროცესში, დემონტაჟისას მტვრის გაფანტვის თავიდან არიდების ღონისძიებები ნაგებობების ხელით დაშლით ან სამშენებლო ნაგვის დანამვით.
- ხმაურის კონტროლი სამეზობლო თმენის ნორმების დაცვით.

4. სამშენებლო მოედნის გაფართოება ან/და დროებითი გზის მოწყობა არ არის გათვალისწინებული.
საპროექტო ობიექტი მეოთხე კლასის 15 კონსტრუქციულ სართულიანი შენობაა, რომელიც საკუთარი საკადასტრო საზღვარიდან მომიჯნავე საკ. ერთეულის მხარეს მინ. 10-მ.-ზე მეტადაა დაშორებული.

მომიჯნავე შენობებზე სამშენებლო სამუშაოების ზეგავლენა შეფასდეს კონსტრუქციული კვლევით და დაიწეროს დასკვნა შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პირის მიერ. შესაძლო საჭირო ღონისძიებები სამშენებლო მოედნის გამაგრების მიზნით ასახულ იქნას საპროექტო დოკუმენტაციაში, რომელიც გასათვალისწინებელი იქნება ძირთადი სამშენებლო, ან გრუნტის გაჭრის სამუშაოების დაწყების მომენტისთვის.

სამუშაოთა წარმოება მოხდება მძიმე და მსუბუქი სამშენებლო ტექნიკის გამოყენებით. მძიმე ტექნიკა გამოიყენება გრუნტის გაჭრისას და ბალასტის ფენილის მოსწორება-დატკეპნის პერიოდში, ასევე პერიოდულად ბეტონის და სხვა სამუშაოებისას. სხვა უმეტეს შემთხვევაში სამშენებლო სამუშაოების ძირითადი ნაწილი იწარმოებს ხელით.

დამატებითი საჭიროება:

5. სამშენებლო მოედნის მომიჯნავე მიწის ნაკვეთზე ან/და საზოგადოებრივი სივრცის მიმართ განსახორციელებელი ღონისძიებები:

- არ იგეგმება სამშენებლო მოედნის გაფართოება. სამშენებლო მოედანი მთლიანად მოქცეულია საკადასტრო საზღვრების შიდა მხარეს.

- მომიჯნავე შენობა-ნაგებობის მიმართ განსახორციელებელი სპეციალური ღონისძიებები, რომლებიც უზრუნველყოფს მშენებლობის პროცესში მის მდგრადობას/სიმტკიცეს ან/და არ გამოიწვევს მათი მდგრადობის/სიმტკიცის გაუარესებას.
  საჭიროების შემთხვევაში ქვაბულის ამოღების პროცესში შესაძლოა განსახორციელებელი გახდეს გრუნტის გამაგრებითი სამუშაოები, მომიჯნავე შენობების კონსტრუქციული კვლევის და დასკვნის საფუძველზე.

გაფრთხილება მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების წესისა და პირობების შესახებ საქართველოს მთავრობის №255 (31.05.2019) დადგენილების შესაბამისად:

- ***(მუხლი 20; პუნქტი 5)*** *მოსამზადებელი სამუშაოები მოიცავს როგორც ორგანიზაციულ ღონისძიებებს, ისე სამშენებლო მოედნის გარე და შიდა სამუშაოებს, რომლებიც უნდა შესრულდეს მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტების შესაბამისად.*

- ***(მუხლი 20; პუნქტი 8)*** *მშენებლობის ორგანიზების პროექტში შესაძლებელია მშენებლობის განხორციელების ძირითადი რიგის ეტაპების გაერთიანება, დაყოფა ან/და ამოღება (სამუშაოების არარსებობის შემთხვევაში) ამ დადგენილებით განსაზღვრულ შენობა-ნაგებობათა კლასების შესაბამისად.*

- ***(მუხლი 20; პუნქტი 9)*** *სანებართვო პირობებით გათვალისწინებული მშენებლობის ეტაპის დასრულებამდე 10 დღით ადრე ნებართვის მფლობელი ვალდებულია შეატყობინოს საჯარო ზედამხედველობის ორგანოს მშენებლობის ეტაპის დასრულების შესახებ.*

- ***(მუხლი 20; პუნქტი 10)*** *კოდექსით განსაზღვრული პირის მიერ მშენებლობის დასრულების შესახებ ოქმი დგება სამშენებლო მოედანზე წარმოებული სამუშაოების დათვალიერებისა და სანებართვო პირობებთან შესაბამისობის დადგენის საფუძველზე.*

- ***(მუხლი 20; პუნქტი 11)*** *ცალკეული ეტაპის ჩაბარების წესი, ასევე, ეტაპის ჩაუბარებლობის შემთხვევაში განსახორციელებელი ღონისძიებების საკითხი წესრიგდება კოდექსის შესაბამისად.*

- ***(მუხლი 18; პუნქტი 3)*** *მშენებლობის ორგანიზების პროექტი უნდა იყოს იმდენად დეტალური, რომ იძლეოდეს მშენებლობის განხორციელებისთვის ამომწურავ ინფორმაციას.*

ა ო ხ

გენგეგმა

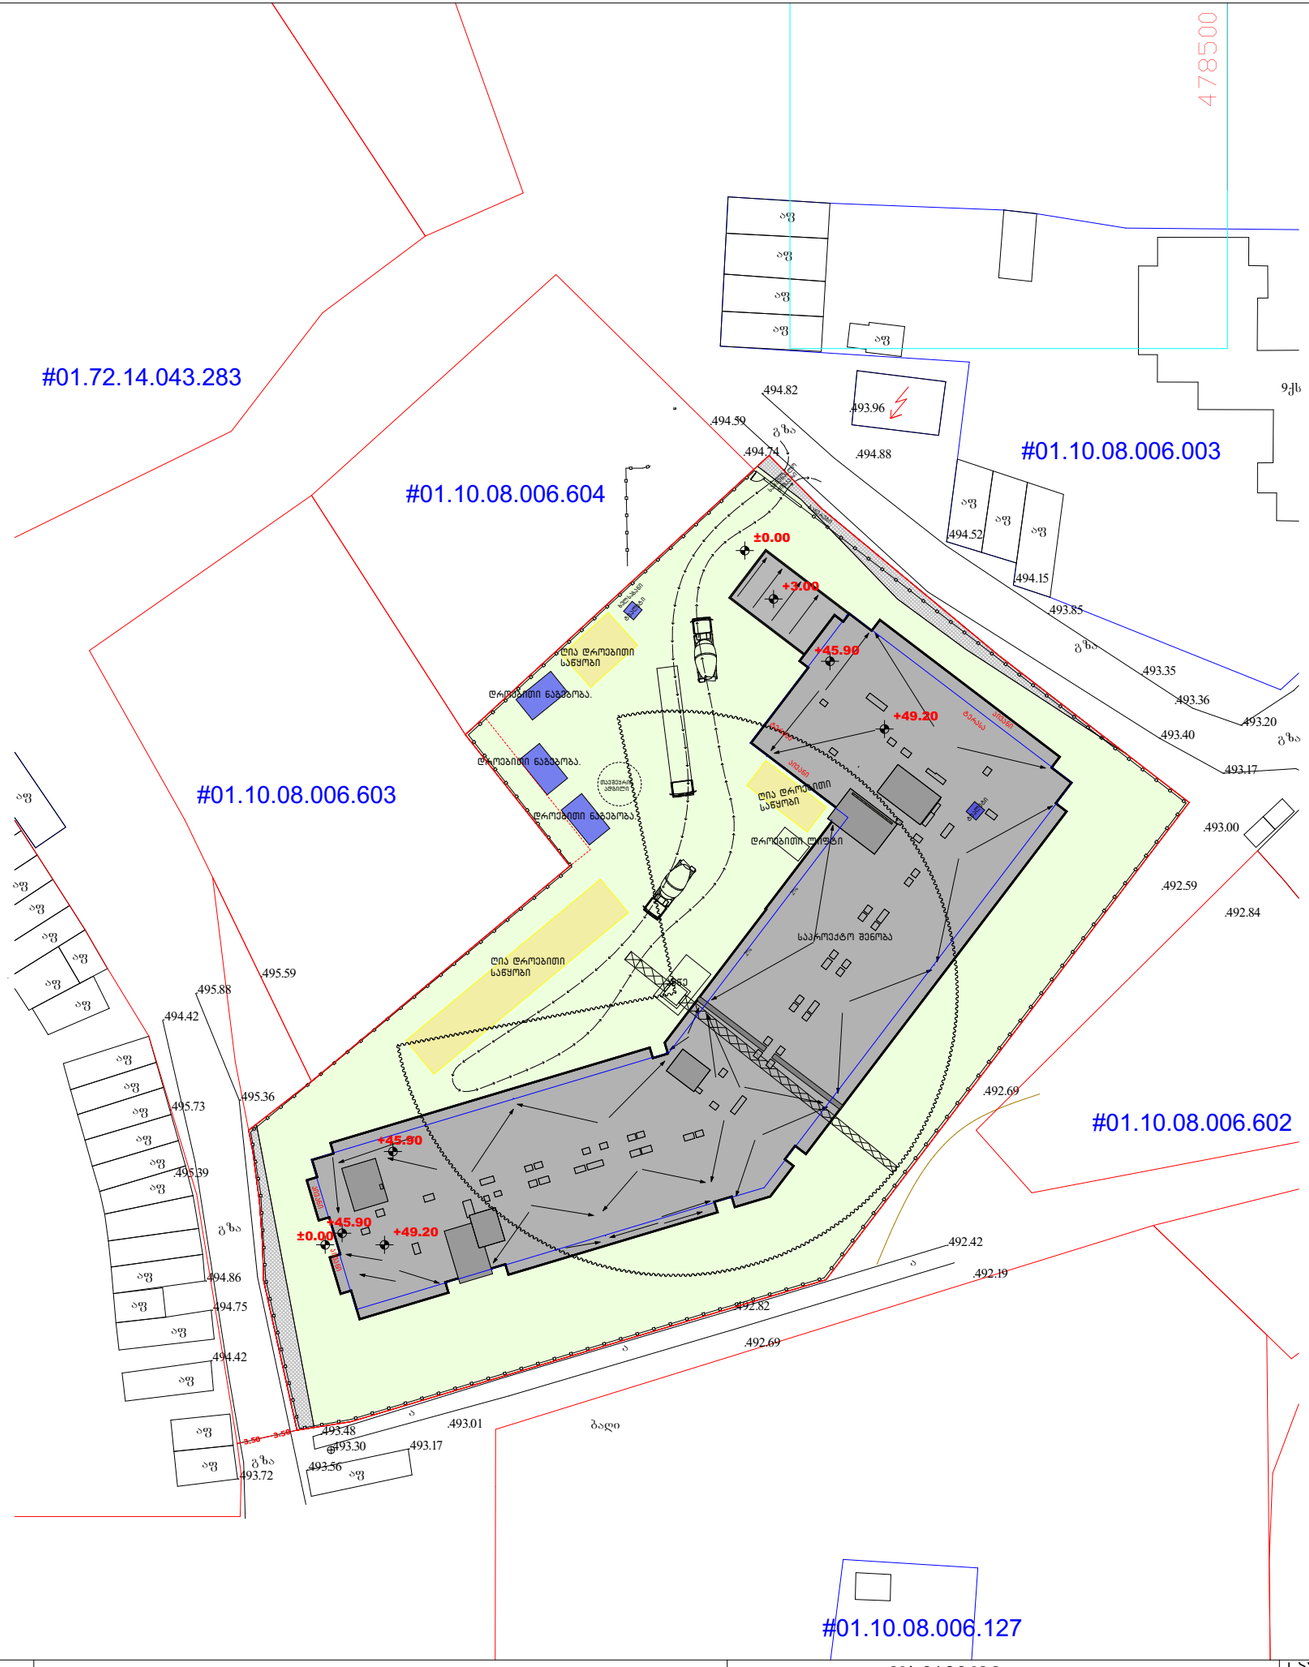

01 საპროექტო შენობა

02 პერსონალის შენობა

03 დასასანყობებელი არეალები

04 ტუალეტი ჰიგიენური სხუალებებით

05 სადეზინფექციო საშუალებების განთავსების ადგილი. სასმელი წყლის მონცვების ადგილი.

06 თავშეყრის ადგილი

07 სამშენებლო ბანერის განთავსების ადგილი

08 მძიმე ტექნიკის შესასვლელი-გამოსასვლელი
სამშენებლო მძიმე და მსუბუქი ტექნიკის მოძრაობის სქემა

ნითელი ფერით აღნიშნულია სამშენებლი მინის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი.

ტერიტორიის ორი გვერდი არსებული კაპიტალური კედლებითაა შემოღობილი. ერთ გვერდზე მომჭნავე მშენებლობის დროებითი სამშენებლო ღობეა. შემოსალობია მზის მხარე და გვერდითი გვერდის ნაწილი. გასათვალისწინებელია, რო არსებული მომჭნავე მშენებლობის დროებითი სამშენებლო ღობე შენარჩუნებული იქნება მშენებლობის დასრულებამდე.

სამშენებლო მოედანი განისაზღვრება დროებითი სამშენებლო ღობეებით და საკადასტრო საზღვარზე არსებული სამეზობლო ღობეების მეშვეობით.

სამშენებლო მოედნის საზღვრები არ სცდება საპროექტო ნაკვეთის საკადასტრო საზღვრებს. აქედან გამომდინარე დამატებითი სანებართვო წარმოება არ ხორციელდება.

სამშენებლო ტერიტორიაზე განსათავსებელმა დროებითმა ნაგებობებმა ასევე შესასვლელმა შეიძლება შეიცვალოს მდებარეობა და გაბარიტები ადგილზე არსებული გარემო პირობების გათვალისწინებით.

საპროექტო შენობის მდებარეობიდან გამომდინარე, ვერტიკალზე განსახორციელებელი სამუშაოები გზიდან მოშორებითაა ნაკვეთის სიღრმეში. ასევე დამცავი ბადის მოწყობა აუცილებელია. აქედან გამომდინარე დროებითი სამშენებლო ღობე მოეწყობა მაღმოხურვის გარეშე.

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი კორექტირება		მშენებლობის ორგანიზების პროექტი გენგეგმა	დამკვეთი შპს პერსპექტივა 2 402185407 დირექტორი: დავით მიქაძე	საპროექტო: შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო" შეთანხმებული პროექტის მთავარი არქიტექტორი: ჯირილე მორჩილაძე შპს არტეგონი 405570911 artegony@gmail.com კორექტირებული პროექტის არქიტექტორი: ნიკოლოზ დონაძე

მ ო კ

გრაფიკი

	რიგი	ეტაპი	სამუშაოთა დასახელება	თვეები 1	2	3	4	5	6	7	8	9
პირველი რიგის 1; 2; 3; ეტაპი დასრულებულია 17-01230381732 07.02.2023	I რიგის სამუშაოები	1 ეტაპი	• მტერიტორიაზე არსებული საძირკვლის დემონტაჟი. მოსამზადებელი სამუშაოები, (სამშენებლო მოედნის შემოღობვა)									
		2 ეტაპი	• შენობა-ნაგებობის გრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი ღერძების დაფიქსირება;									
		3 ეტაპი	• შეცვლილი ზედაპირის შემდგომ შენობის გრუნტზე დაკვალვა და ძირითად ღერძებზე დაფიქსირება.									
მეორე რიგის 1; ეტაპი დასრულებულია 17-01231372437 17.05.2023	II რიგის სამუშაოები	1 ეტაპი	• შენობა-ნაგებობების მიწის სამუშაოები; • შენობა-ნაგებობების ფუძის მოწყობის სამუშაოები; • ქვაბულის მოწყობის სამუშაოები; • შენობა-ნაგებობების საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები;									
მეორე რიგის 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; ეტაპი დასრულებულია 17-01243592734 24.12.2024		2 ეტაპი	• ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა შენობა-ნაგებობის მიწის პირის ნიშნულამდე;									
		3 ეტაპი	• შენობის მიწის პირის ნიშნულიდან პირველი სართულის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის (არამზიდი კონსტრუქციების გამოკლებით) მოწყობა.									
		4 ეტაპი	• შენობა-ნაგებობის მეორე და მესამე სართულის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის (არამზიდი კონსტრუქციების გამოკლებით) მოწყობა.									
		5 ეტაპი	• შენობა-ნაგებობის მეოთხე და მეხუთე სართულის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის (არამზიდი კონსტრუქციების გამოკლებით) მოწყობა.									
		6 ეტაპი	• შენობა-ნაგებობის მეექვსე და მეშვიდე სართულის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის (არამზიდი კონსტრუქციების გამოკლებით) მოწყობა.									
		7 ეტაპი	• შენობა-ნაგებობის მერვე და მეცხრე სართულის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის (არამზიდი კონსტრუქციების გამოკლებით) მოწყობა.									
		8 ეტაპი	• შენობა-ნაგებობის მეათე და მეთერთმეტე სართულის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის (არამზიდი კონსტრუქციების გამოკლებით) მოწყობა.									
მეორე რიგის 9; მიმდინარე ეტაპი		9 ეტაპი	• შენობა-ნაგებობის მეთორმეტე; მეცამეტე; მეთოთხმეტე და მეთხუთმეტე სართულების მოწყობა, სახურავისა და გადახურვის მოწყობა. არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა. შენობა-ნაგებობის საინჟინრო-ტექნიკური ქსელების მოწყობა • შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები. მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები, საყრდენი კედლების მოწყობა, სამშენებლო ნარჩენების გატანა.									15.08.2027

სულ 12 ეტაპი

●მშენებლობის ნებართვის ვადა 15.08.2027 წლის ჩათვლით

დამატებით წარმოდგენილია
პირველი რიგის 1; 2; 3; ეტაპის ჩაბარება 17-01230381732 07.02.2023
მეორე რიგის 1; ეტაპის ჩაბარება 17-01231372437 17.05.2023
მეორე რიგის 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; ეტაპის ჩაბარება 17-01243592734 24.12.2024

სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო დრო 8 თვეზე მეტი
არაუგვიანეს 2027 წლის 15 აგვისტო

(ხელშეკრულების ცვლილება ვადის გაზრდაზე 29.07.2025)

შესრულებული სამუშაოები
მუნიციპალურ ინსპექციასთან ჩაბარებული ეტაპი

შესასრულებელი სამუშაოები

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი კორექტირება	თითოეული ეტაპის დასრულებამდე ან/და დასრულებისას კანონით დადგენილი წესის შესაბამისად უნდა ეცნობოს მუნიციპალურ ინსპექციას!	მშენებლობის ორგანიზების პროექტი გრაფიკი	დამკვეთი შპს პერსპექტივა 2 402185407 დირექტორი: დავით მიქაძე	საპროექტო: შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო" — შეთანხმებული პროექტის მთავარი არქიტექტორი: კირილე მორჩილაძე შპს არტეგონი 405570911 artegony@gmail.com — კორექტირებული პროექტის არქიტექტორი: ნიკოლოზ დონაძე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

მუნიციპალური ინსპექცია

წერილის ნომერი: **17-01230381732**
თარიღი: **07/02/2023**

ადრესატი: დავით მიქაძე
პირადი ნომერი: 57001050086
მისამართი: დიდი დიღომი 3 მ/რ 19 კორპ ბინა 36

თქვენი 01.02.2023წ. N19/0123034852-17 განცხადების პასუხად გაცნობებთ, რომ ,,მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების წესისა და პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის N31 მაისის N255 დადგენილების და საქართველოს კანონის ,,საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი“-ს 141^5 მუხლის 1-ლი ნაწილის შესაბამისად შპს ,,პერსპექტივა2“-ს მიერ მუნიციპალურ ინსპექციაში წარმოდგენილია ქ. თბილისში, დასახლება დიდ დიღომში, მიკრო/რაიონი III, კორპუსი #29-ის მიმდებარედ (საკ. კოდი N01.10.08.006.217) მიმდინარე მშენებლობის სსიპ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის 19.09.03.2022წ. N6128493 განსაზღვრული I, II და III ეტაპების დასრულების შესახებ შედგენილი საეტაპო ოქმები.

ზაზა კვიციანი

მუნიციპალური ინსპექცია-პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე (მუნიციპალური ინსპექციის უფროსის მოადგილე)

გამოყენებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა/ელექტრონული შტამპი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
მუნიციპალური ინსპექცია

წერილის ნომერი: **17-01231372437**
თარიღი: **17/05/2023**

ადრესატი: შპს პერსპექტივა 2
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 402185407
მისამართი: საქართველო, თბილისი, საბურთალოს რაიონი, დიდი დიღმის დასახლება, III მიკრო/რაიონი, N 19 ა,სართული 7, ბინა 36

თქვენი 01.05.2023წ. N10/01231212488-17 განცხადების პასუხად გაცნობებთ, რომ ,,მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების წესისა და პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის N31 მაისის N255 დადგენილების შესაბამისად შპს „პერსპექტივა 2“-ს მიერ მუნიციპალურ ინსპექციაში წარმოდგენილია ქ. თბილისში, დასახლება დიდი დიღომი, მიკრო/რაიონი III, კორპუსი N29- ისმიმდებარედ (საკადასტრო კოდი: 01.10.08.006.217) მიმდინარე მშენებლობის სსიპ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის 09.02.2023წ. N6320405 ბრძანებით განსაზღვრული I ეტაპის დასრულების შესახებ შედგენილი საეტაპო ოქმი.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ინსპექციას საქმისწარმოება, საქართველოს კანონის საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსის 123-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, არ დაუწყია.

ზაზა კვიციანი

მუნიციპალური ინსპექცია-პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე (მუნიციპალური ინსპექციის უფროსის მოადგილე)

გამოყენებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა/ ელექტრონული შტამპი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

მუნიციპალური ინსპექცია

წერილის ნომერი: **17-01243592734**
თარიღი: **24/12/2024**

ადრესატი: შპს პერსპექტივა 2
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 402185407
მისამართი: საქართველო, თბილისი, საბურთალოს რაიონი, დიდი დიღმის დასახლება, III მიკრო/რაიონი, N 19 ა,სართული 7, ბინა 36

თქვენი 12.12.2024წ. N10/01243471446-17 განცხადების პასუხად გაცნობებთ, რომ ,,მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების წესისა და პირობების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის N31 მაისის N255 დადგენილების შესაბამისად მუნიციპალურ ინსპექციაში წარმოდგენილია ქ. თბილისში, დასახლება დიდი დიღომი, მიკრო/რაიონი III, კორპუსი N29-ის მიმდებარედ (საკადასტრო კოდი:01.10.08.006.217) მიმდინარე მშენებლობის სსიპ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის 18.05.2023წ. N6465960 ბრძანებით განსაზღვრული II-VIII ეტაპების დასრულების შესახებ შედგენილი საეტაპო ოქმები.

ზაზა კვიციანი

მუნიციპალური ინსპექცია-პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე (მუნიციპალური ინსპექციის უფროსის მოადგილე)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
021 405026877

გამოყენებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა/ ელექტრონული შტამპი
