დანართი 1.

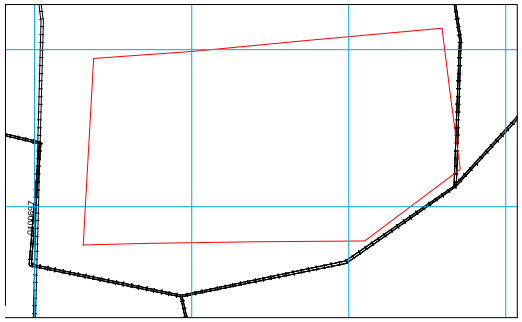

1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია შემოკლებულ ვარიანტში
2. სამშენებლო მოედანი მდებარეობს ქ. თბილისი, ქ. ახვლედიანი, მარჯვენა მხარეს 02/006
3. საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება 18 თვით

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი ჩასატარებელ სამუშაოებზე (თვეები)

	სამუშაოთა დასახელება	1 თვე	2 თვე	3 თვე	4 თვე	5 თვე	6 თვე	7 თვე	8 თვე	9 თვე	10 თვე	11 თვე	12 თვე	13 თვე	14 თვე	15 თვე	16 თვე	17 თვე	18 თვე	19 თვე	20 თვე
1	ტერიტორიის დაგვალვა																				
2	სამშრომელოების ქვეშ ბრუნტის ამოღება; გატანა																				
3	წერტილოვანი და ლენტური სამშრომელოების მოწყობა, შენობის პერიმეტრზე ბეტონის კედლების მოწყობა 0.00 ნიშნულამდე, ნელოვანი ცოკლის დასრულება																				
4	შენობის (ორი სართულის) რ-ზ კარკასის მოწყობა: წერილი სამშენებლო ბლოკის კედლების შენახვა პერიმეტრზე და მის შიგნით																				
5	ორი ქანობის გადახურვისთვის ფოლადის ფერმების დამზადება, მონტაჟი და ამ ორი ქანობის გადახურვა ბსმ. სისქის სენდვიჩ პანელით																				
6	შენობის მეორე სართულის ბეტონის გადახურვის მოწყობა, ობო და ჰიდროიზოლაციებით. ჰიმილ შენობაზე ღარ - ფოლგებების მოწყობა და ელ.მავთანელობის ჩაწყობა, მონტაჟი.																				
7	სამრდენი კედლის მოწყობა მიწისნაკვეთის წითელი საზღვრის შიგნით. მის ჰიმილ პერიმეტრზე ბრუნტის საპროექტო ნიშნულის შესაბამისად																				
8	ქვიშა ცემენტით ლესვის სამუშაოები შიგნით და გარეთ - ორივე სართულზე.																				
9	მეტალო პლასტმასის შანჯრებისა და რკინის კარების მონტაჟი შენობის პერიმეტრზე და მის შიგნით ორივე სართულზე.																				
10	შენობის შიგნით მრავალბინიო ტრაპების და სან.ქვანძებისთვის შიდ - გაყვანილობის მოწყობა																				
11	სანტექნიკური მილგაყვანილობის და გათბობის მოწყობა შეორე სართულზე																				
12	ტექნოლოგიური ბატარეების და კაფელ - მეტლახის სამუშაოები ორივე სართულზე.																				
13	შენობის ორივე სართულზე ჭერების მოწყობა																				
14	ინტერიერის და ფასტერიერის სამღებარო სამუშაოები																				
15	ტერიტორის დასუფთავება; სამუშაოების დასრულება																				

შენიშვნა: კალენდარული გრაფიკი არ ითვალისწინებს კლიმატური პირობებით გამოწვეულ შეფერხებებს

მითითება:

1. დაცულ იქნას უსაფრთხოების ღონისძიებები
2. აკრძალულ იქნას შეცხო პირთა მოხვედრა სამშენებლო მოედანზე
3. მშენებლობაზე განხორციელდეს ხარისხის კონტროლი

პროექტის დასახელება: ხორცის პროდუქტების საწარმოო შენობა - ნაგებობა	ნახაზი: მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი	თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
		მთ.არქიტექტორი	ს. პატარაია	
დამკვეთი: შ.პ.ს. 'ათენა'	შესრულა:	შეასრულა	ს. პატარაია	
მისამართი: ქ. თბილისი; ქუჩა ახვლედიანი, მარჯვენა მხარეს 02/006	შენიშვნა:			
ზონა 01 | სექტორი 19 | კვარტალი 16 | ნაკვეთი 002/006				

სამშენებლო - საპროექტო კომპანია "ვაკო-ა" ვაჟა-ფშაველას გამზირი №168/1 ტელ: 2 38 10 90 მობ: 571 42 00 11 www.vako.ge
