კალენდარული გეგმა T=3.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	თვე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება /იხილე განმარტებითი ბარათი/	15																		
	ძირითადი სადემონტაჟო სამუშაოები																			
1	არსებული არაყიშვილის ქუჩის მხრიდან ღობის აღება																			
2	სახურავიდან ანტენების და ქსელების მოხსნა	75																		
3	სახურავის აღება																			
4	კარ-ფანჯრების ამოღება																			
5	კედლების დანგრევა																			
6	გადახურვის აღება																			
7	გრუნტის დამუშავება																			
8	საძირკვლის დანგრევა და ამოღება																			
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

4617300.00

4617300.00

480550.00

სამშენებლო გენგეგმა
მ1:500

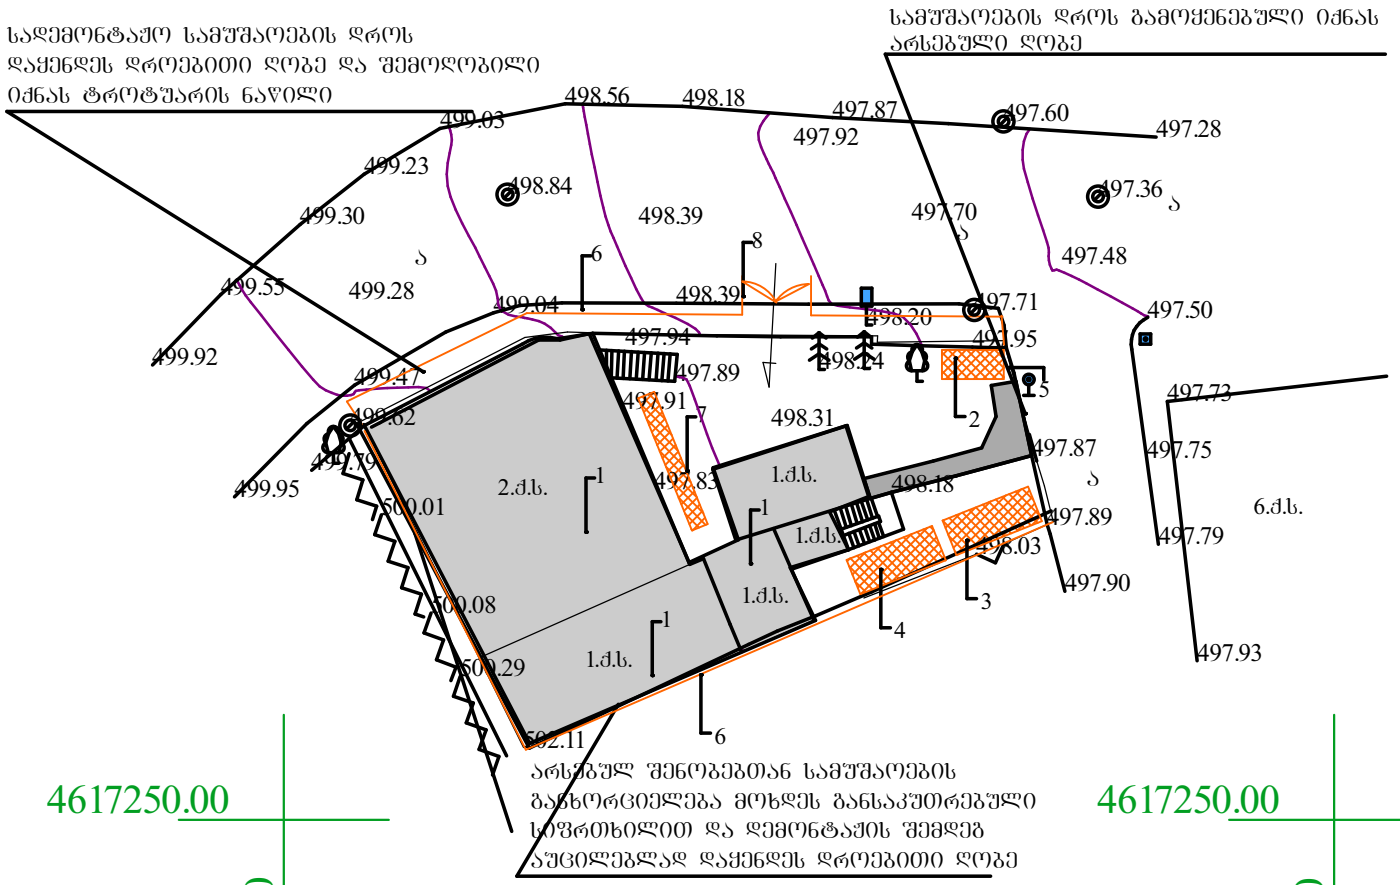

4617250.00

4617250.00

480500.00

480550.00

არსებულ შენობებთან სამუშაოების
განხორციელება მოხდეს განსაკუთრებული
სიფრთხილით და დემონტაჟის შემდეგ
აუცილებლად დაქენდეს დროებითი ღობე

შენიშვნა: მსუბუქი კონსტრუქციების გამო დემონტაჟი
განხორციელდეს ხელით
