სარეკლამო ბანერის მოწყობის სამუშაოები
განმარტებითი ბარათი

1 სარეკლამო ბანერი უნდა მოეწყოს ქ. თბილისში, კოსტავას ქუჩა №27-ში მდებარე შენობის ფასადზე. ვერის პარკის მთავარი შესასვლელის მხარეს.

კედელი აშენებულია აგურით. სართულშუა გადახურვები მოწყობილია ხის კოჭებზე. სახურავი დახურულია თუნუქის ფურცლებით.

ტექნო-ეკონომიკური მაჩვენებლები:

- მიწის ნაკვეთის ფართი ---------- 458.00მ^2
- სამონტაჟო სარეკლამო ბანერის გაბარიტებია:
სიმაღლე – 12.1მ ; სიგანე – 19.7მ.

2 სამშენებლო ორგანიზაცია ამუშავებს სამუშაოთა წარმოების პროექტს. ამ პროექტის შედგენა უნდა ხდებოდეს მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად.

ფეხმავალთა უსაბრთხოების მიზნით უნდა მოხდეს დროებითი უსაბრთხოების ლენტების მოწყობა.

3 პირველ რიგში უნდა მოხდეს ბანერის დემონტაჟი, რომელიც დამაგრებულია ლითონის კარკასზე.
შემოწმდეს და დაჭიროების შემთხვევაში შერემონტდეს ლითონის კარკასი. ამის შემდეგ განთავსდეს ახალი, იგივე გაბარიტების ბანერი.

4 მშენებლობის ხანგრძლივობა СниП 1.04.03-85 თანახმად, მივიღოთ 30 დღე

6 სამუშაოების განხორციელება მოხდეს საქართველოს მთავრობის 2007წ 28 მარტის №62 დადგენილების მიხედვით –**“ მშენებლობის უსაფრთხოების წესები ”**

მანქანა-მექანიზმების უწყისი

N	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	ერთ გან.	რ-ბა
1	ამწე-კალათა	ც	1

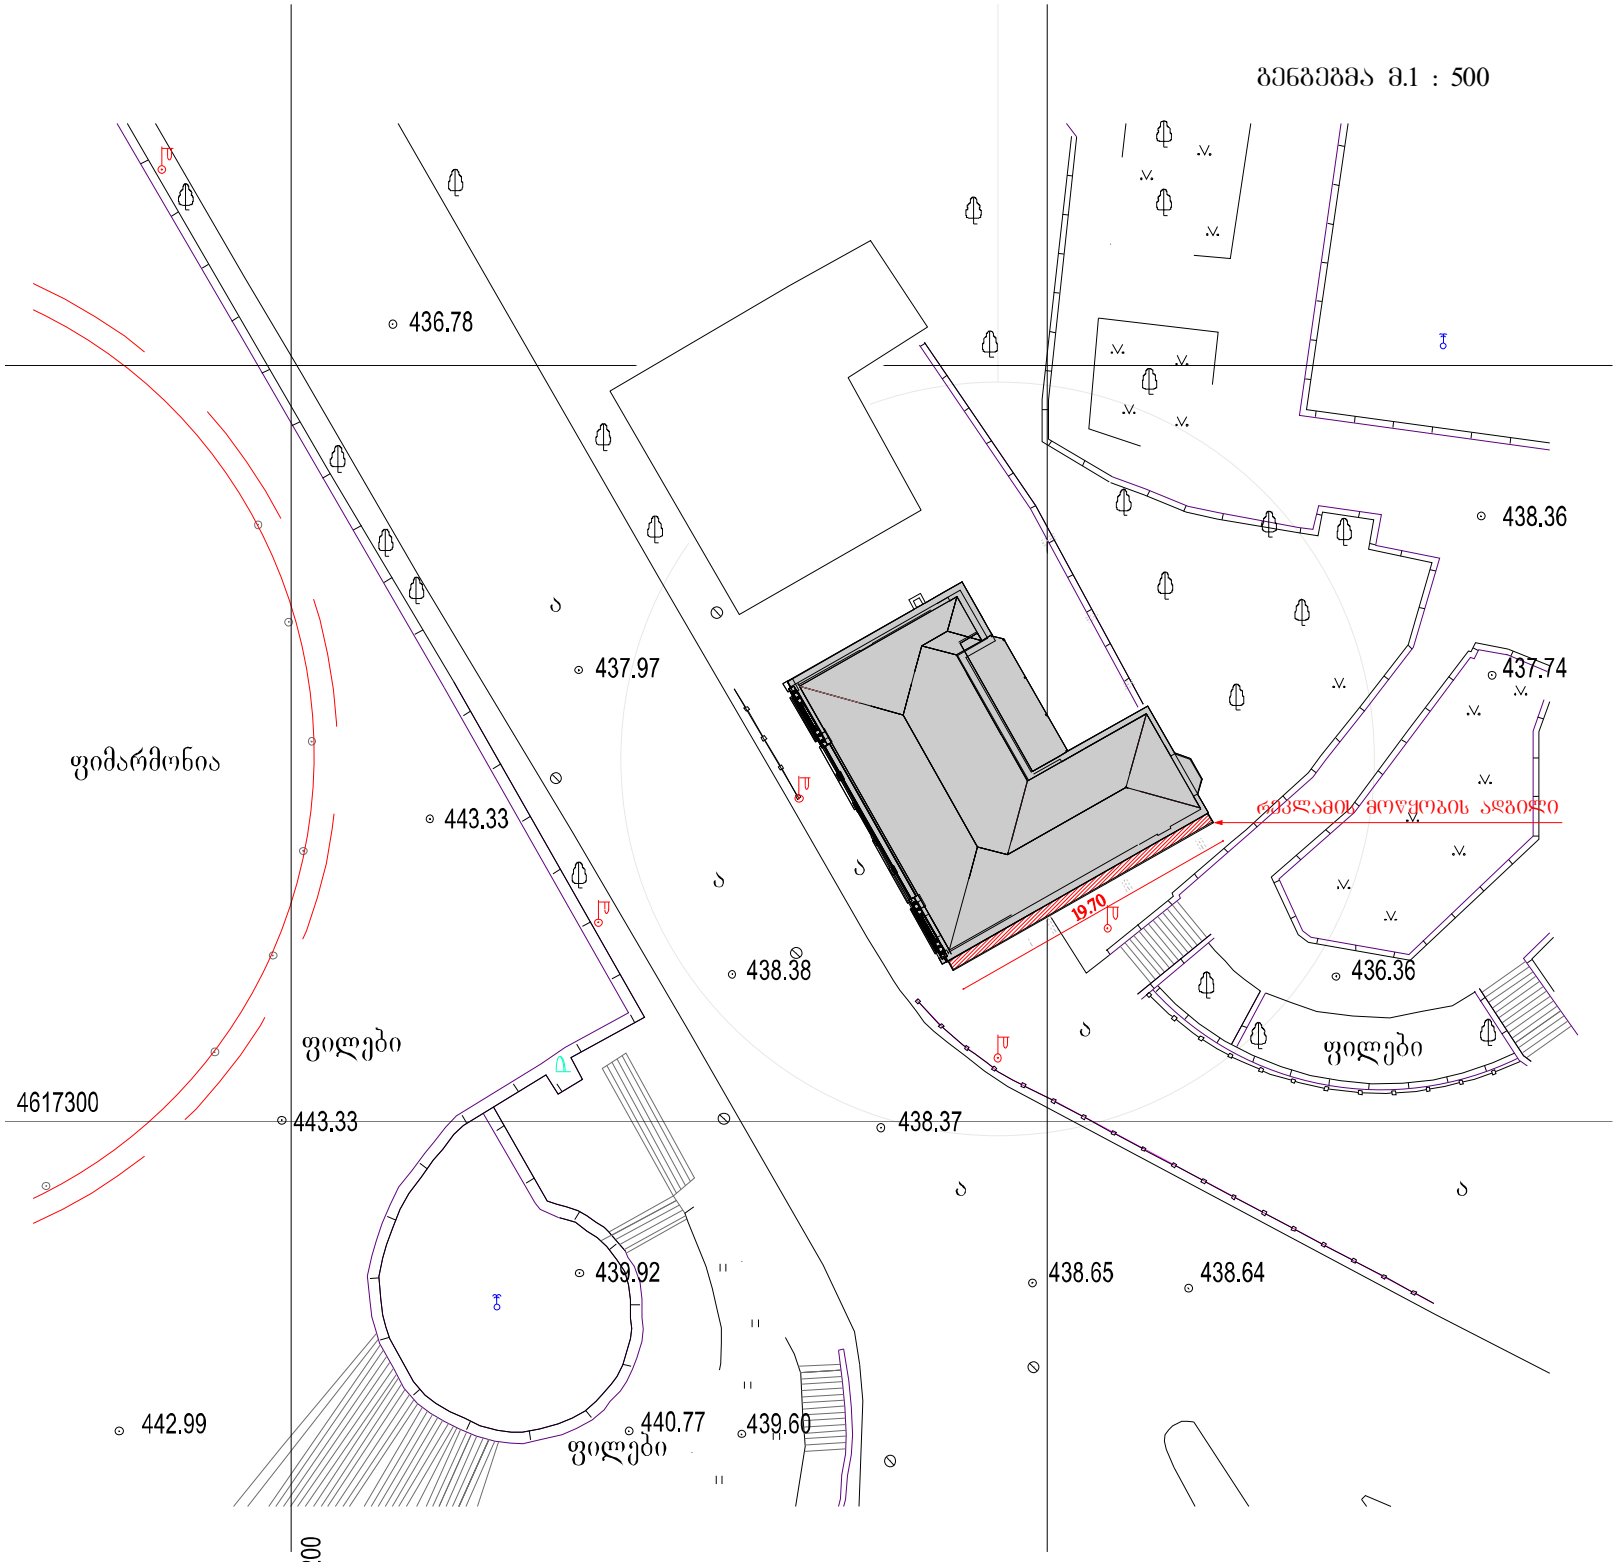
ბენგეშმა მ.1 : 500
436.78
437.97
443.33
438.38
438.36
437.74
436.36
438.37
439.92
438.65
438.64
442.99
440.77
439.60
ფიმარმონია
ფილები
ფილები
ფილები
4617300
443.33
19.70
რეკლამის მოწყობის ადგილი

კალენდარული გეგმა T=30 დღე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე					
			5	10	15	20	25	30
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	4						
2	ბანერის დემონტაჟი	2						
3	სარეკლამო ბანერის კონსტრუქციის შეკეთება	9						
3	ბანერის დამზადება-მონტაჟი	11						
3	სამშენებლო ნაგვის გატანა	3						
4	ტერიტორიის დასუფთავება	1						
