სიტუაციური გეგმგეგმა




მანქანა მექანიზმები

ავტოთვითმცლელი მაზ-55	1 ცალი
ავტოდამტვირთავი	2 ცალი
შესადუღებელი აპარატი ტდმ-500	1 ცალი
ინვენტარული ხარაჩო	450 კვმ

რეკონსტრუქციის დასრულებამდე დარჩენილი სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი
	მოსამზადებელი სამუშაოები (შემოღობვა)
	სამშენებლო სამუშაოები: იატაკის მოჭიმვები, თაბაშირ-მუყაოს და აგურის შიდა კედლების მოწყობა, კარ-ფანჯრების ჩასმა
	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები: ჭერისა და კედლების სამღებრო სამუშაოები, ხის და რბილი იატაკები, კერამიკული ფილების დაგება
	საინჟინრო სამუშაოები: წყალსადენ-კანალიზაცია, ელექტრობა, გათბობა-ვენტილაცია-ჰაერის კონდიცირება
	ტერიტორიის კეთილმოწყობა

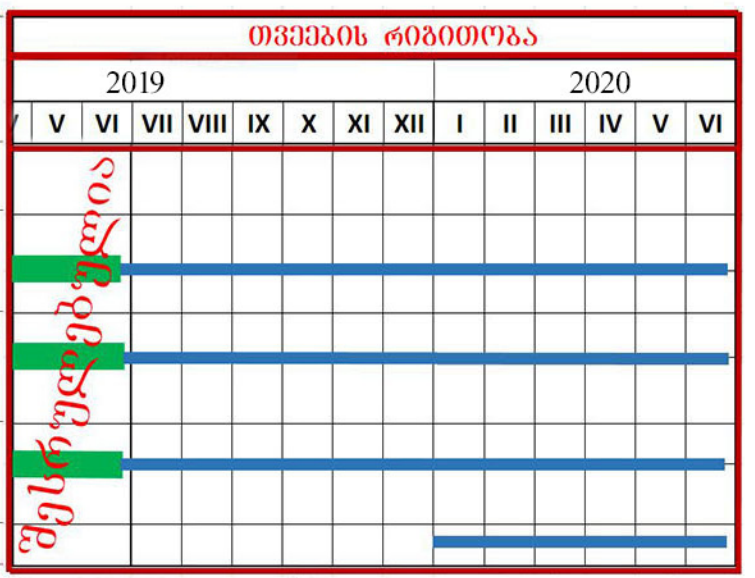

რეკონსტრუქციის მიმდინარე სამუშაოების სრულად დასრულება დაგეგმილია 2020 წლის ივნისის მეორე ნახევარში

ფორმატი	A.3
	მშენებლობის ორგანიზაცია
ფაილის სახელი:	
	მენიშვნები
	სს ღობე
	ნითელი ხაზი
	ჯიხური
	დროებითი შენობა სანიტარული
	ობიექტზე უხეშოსიმენტის მოძრაობის მიმართულება
	GS group
	ქ.თბილისში რესპუბლიკის მოედ.№31, ყოფილი ფორტა-ტრანსრენის მშენობის რეკონსტრუქციის პროექტი
	[ავტომანქანების პრისაბური დროებითი შენობა, პერიმეტრის გადუჯარედინა, შესასვლელი კიბის და სავენტილაციო ზონის რეკონსტრუქცია]
	სიტუაციური გეგმგეგმა პალენდარული გრაფიკი
თანამდებობა	სახელი, გვარი
ავტორი	AECOM
პროექტის ხელმძღვანელი	
შემოწმებულია	
შემოწმდა	
ნახაზის №	ფორმატი
თარიღი	
მასშტაბი	1:200
ნახაზის	A.3
ფურც. რედაქციები	ფურც-1
