საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი

MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF GEORGIA
PATROL POLICE DEPARTMENT

MIA 5 19 02572888
28/09/2019

შ.პ.ს. „არქიპლიუს“-ის დირექტორს
ბატონ გიორგი ხუსრციძეს
ქ. თბილისი გრ. რობაქიძის გამზ. N 7, კორპ. 5 ბინა 23;
თქვენს 2019 წლის 27 სექტემბრის განცხადებაზე

ასლი: საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის
ქ. თბილისის მთავარი სამმართველოს
უფროსის მოადგილეს ბატონ ლაშა ჯოხაძეს

შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტში განხილულ იქნა თქვენი განცხადება, რომელიც ეხება ქ. თბილისში, დიღმის მასივი, I კვ, ს/კ 01.13.04.004.032-ის მიმდებარედ შესასვლელ–გამოსასვლელი გზების მოწყობის, სამშენებლო დამცავი ღობის განთავსების და არსებული საგზაო/სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ნაკადების მიმართულების საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის დროებითი და მუდმივი სქემების შეთანხმებას.

ვითვალისწინებთ რა, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის თანხმობას, შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი ითანხმებს წარმოდგენილ დროებითი და მუდმივი მოძრაობის ორგანიზაციის სქემებს და არ არის წინააღმდეგი განახორციელოთ ზემოაღნიშნული სამუშაოები შემდეგი პირობების დაცვით:

- ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხოების მიზნით დამცავი ღობის ფარგლებში მოეწყოს ქუჩის სავალი ნაწილის მხრიდან ქვეითად მოსიარულეთა ბილიკი, ღობე გზის სავალი ნაწილის მხრიდან გადაიხუროს და ღამის საათებში განათდეს;
- სამშენებლო დამცავი ღობე შეიღებოს შავ-თეთრი ან წითელ-თეთრი ზოლებით;
- სამშენებლო ობიექტზე მისასვლელი გზა აღიჭურვოს მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებებით წარმოდგენილი სქემის შესაბამისად;
- დაცული იქნას გზის სავალი ნაწილის სისაუფთავე, არ დაუშვათ სამშენებლო მასალისა და ტექნიკის გზის სავალ ნაწილზე განთავსება;
- სამუშაოების დასრულებისთანავე ფეხით მოსიარულეთა ბილიკი მოყვანილ იქნას პირვანდელ მდგომარეობაში, დროებითი მოძრაობის რეგულირების ტექნიკურ

0190, თბილისი, წოე რამიშვილის ქ. №38
№38 Noe Ramishvili St. 0190 Thilisi, Georgia
ტელ./Tel.: (+995 032) 2 41 42 42
ფაქსი/Fax: (+995 032) 2 41 85 02

საშუალებებს გაუკეთდეს დემონტაჟი და გზის მიერთების ადგილები აღიჭურვოს მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებებით შეთანხმებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის სქემების შესაბამისად;

- სამუშაოების დაწყების და დამთავრების შესახებ წინასწარ ეცნობოს შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის სამორიგეო ნაწილს (ტელ: 241-85-04; 241-85-05);

მეორე ადრესატს: გთხოვთ, უზრუნველყოთ კონტროლის დაწესება წერილში მითითებულ პირობების შესრულებაზე და მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებების განთავსების მდგომარეობაზე. შეუსრულებლობის შემთხვევაში გაატარეთ ზომები საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 134 მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად.

დანართი: 8 ფურცლად.

საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი /
საორგანიზაციო სამმართველო / საგზაო მოძრაობის
ზედამხედველობის განყოფილება
განყოფილების უფროსი
გარბაქაძე დავით

„შეთანხმებულია“

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის
მერიის ტრანსპორტის საქალაქო
სამსახურის უფროსი
მ. მუმლაძე

თარიღი 27/09/19

„შეთანხმებულია“

ქ. თბილისის საპატრულო პოლიციის
მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე

თარიღი

საგზაო მოძრაობის
ორგანიზაციის
ტექნიკური საშუალებები

1.26	8ც
3.20	6ც
3.21	2ც
3.24 (20)	6ც
3.24 (40)	4ც
3.25	2ც
5.19.1	2ც
5.19.2	2ც
8.2.1 (20მ)	2ც
8.2.1 (70მ)	1ც
შუქ. ტ7	3ც
მედროშე	1 ადამიანი



დიღმის მასივი I კვ. (ს.კ 01.13.04.004.032)მიმდებარედ მშენებლობის პერიოდში
საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა.

SMART TRANSPORTATION SOLUTION
ტელ: 577 155575

შემსრულებელი	შ.პ.ს "STS"	ნახაზის დასახელება	თარიღი	2019 წელი
დამკვეთი	შპს „არქიპელოგი“	საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა	მასშტაბი	პირობითი

„შეთანხმებულია“

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის
მერიის ტრანსპორტის საქალაქო
სამსახურის უფროსი

მ. მუმლაძე

თარიღი

„შეთანხმებულია“

ქ. თბილისის საკრებულოს [illegible]
მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე

თარიღი

საგზაო მოძრაობის
ორგანიზაციის
ტექნიკური საშუალებები

- 1.21.2 -2ც
- 1.21.3 -1ც
- 1.26 -7ც
- 2.5 -1ც
- 2.6 -1ც
- 3.10 - 2ც
- 3.20 - 5ც
- 3.21 - 2ც
- 3.24 - 5ც
- 3.24 -4ც
- 3.25 -2ც
- 4.21 -1ც
- 4.2.2 -1ც
- 4.2.3 -1ც
- 5.19.1 - 6ც
- 5.19.2 - 6ც
- 8.2.1 - 2ც
- 8.2.1 - 1ც
- შუქ. ტ7-3ც

შენიშვნა:
დროებითი სქემა შედგენილია "ოდმ 218.6.014-2014" და საქართველოს კანონის საგზაო მოძრაობის შესახებ მოთხოვნების შესაბამისად

1. გამაფრთხილებელი ზონის სიგრძე შეადგენს 100 მეტრს.
2. ბუფერული ზონაა 15 მეტრი.
3. სავალი ნაწილის დახურული ზოლის სიგანის 0.5 მ და ნაკადის სიჩქარის 50 კმ/სთ შესაბამისი განლაგების ზონის სიგრძე შესაბამისი საანგარიშო ფორმულის მიხედვით შეადგენს 5 მ-ს.
4. შუნძიური ზონის სიგრძე შეადგენს 55 მ-ს.
5. ნახაზზე ნაჩვენებია დროებითი საგზაო ნიშნები.
6. სქემაზე დატანილია დროებითი საგზაო მონიშვნა.
7. ქვეითთა ნაკადი მოძრაობს სამშენაოთა ფარმოების ზონის მოპირდაპირე მხარეს.



დიღმის მასივი I კვ. (ს.კ 01.13.04.004.032) მიმდებარედ
შესასვლელ-გამოსასვლელის მოწყობის პერიოდში საგზაო მოძრაობის
ორგანიზების დროებითი სქემა.

შემსრულებელი	შ.პ.ს "STS"	ნახაზის დასახელება	თარიღი	2019 წელი
დამკვეთი	შპს „არქიპელიუსი“	საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა	მასშტაბი	პირობითი

SMART TRANSPORTATION SOLUTION
ტელ: 577 155575

„შეთანხმებულია“

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის
მერიის ტრანსპორტის საქალაქო
სამსახურის უფროსი
მ. შუმლაძე

თარიღი 27/09/19

„შეთანხმებულია“

ქ. თბილისის საკრებულოს პრეზიდიუმის
მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე
ლ. ჯიხაძე

თარიღი

საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები

- 1.26 -8ც
- 3.10 - 2ც
- 3.20 - 6ც
- 3.21 - 2ც
- 3.24 - 6ც
- 3.24 -4ც
- 3.25 -2ც
- 5.19.1 - 10ც
- 5.19.2 - 10ც
- 20მ — 8.2.1 - 2ც
- 70მ — 8.2.1 - 1ც
- შუქ. ტ7-3ც
- მედროშე 1 ადამიანი



დიღმის მასივი I კვ. (ს.კ 01.13.04.004.032)მიმდებარედ ღობის მოწყობის პერიოდში საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა.

SMART TRANSPORTATION SOLUTION
ტელ: 577 155575

შემსრულებელი	შ.პ.ს "STS"	ნახაზის დასახელება	თარიღი	2019 წელი
დამკვეთი	შპს „არქიპელიოსი“	საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა	მასშტაბი	პირობითი

საგზაო მოძრაობის
ორგანიზაციის
ტექნიკური საშუალებები



2.1 — 1ც

2.3 — 3ც

2.5 — 1ც

2.6 — 1ც

4.1.4 — 1ც

4.1.5 — 1ც

5.19.1 — 4ც

5.19.2 — 4ც

„შეთანხმებულია“

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის
მერიის ტრანსპორტის საქალაქო
სამსახურის უფროსი

მ. მუმლაძე

თარიღი

„შეთანხმებულია“

ქ. თბილისის საპატრულო პოლიციის
მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე

ლ. ჯორბაძე

თარიღი

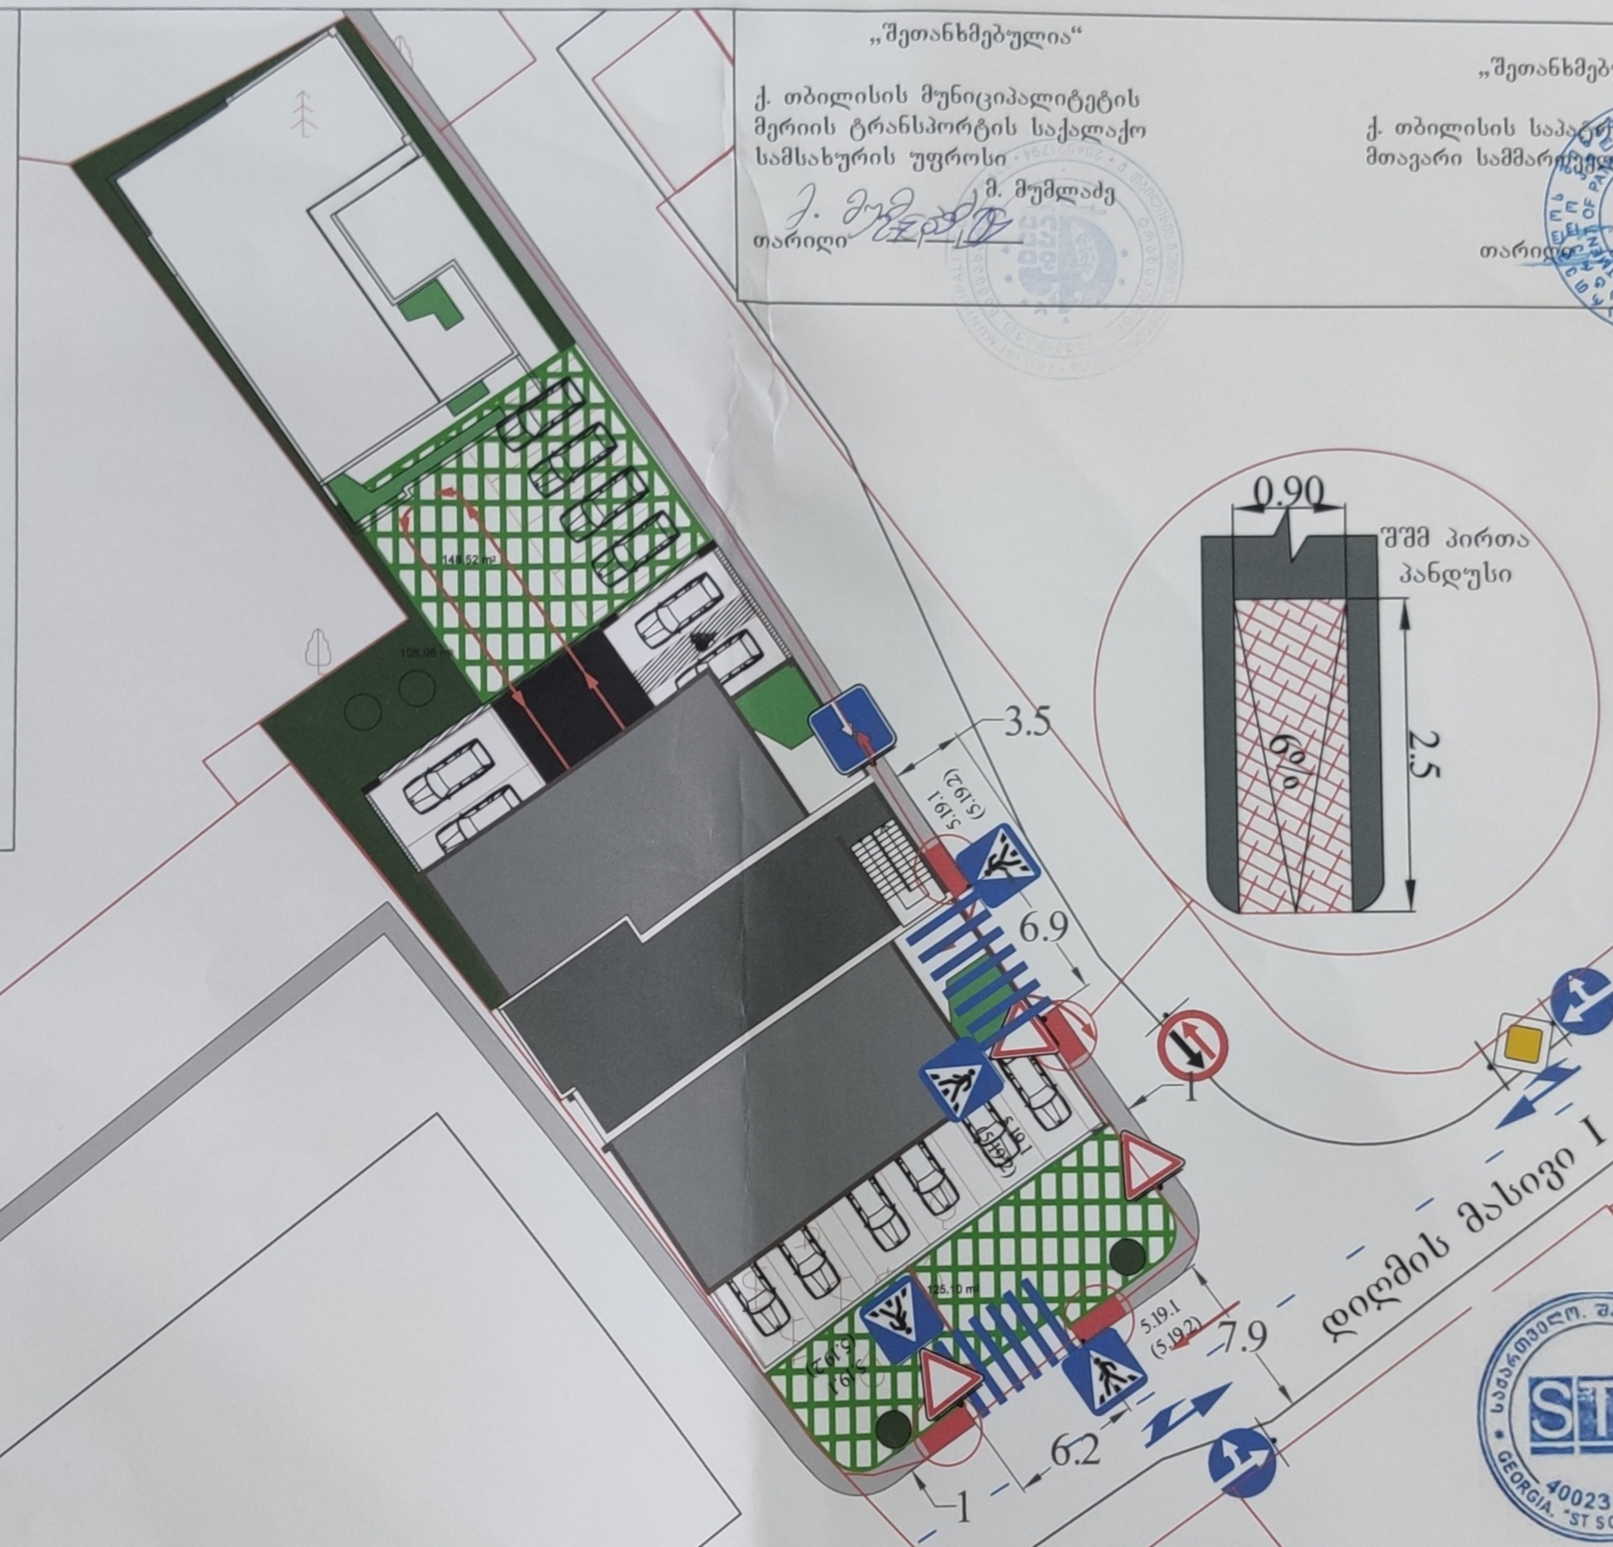

დიღმის მასივი I კვ. (ს.კ 01.13.04.004.032) მიმდებარედ საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა.			STS SMART TRANSPORTATION SOLUTION ბეჭ: 577 155575	
შემსრულებელი	შპს "STS"	ნახაზის დასახელება	თარიღი	2019 წელი
დამკვეთი	შპს „არქიპლიუსი“	საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა	მაშტაბი	პირობითი
