ქალაქ თბილისში, წურწუმისა და ნ. ირბახის ქუჩების გადაკვეთაზე (ს.კ 01.17.01.050.042 დაშლა-სადემონტაჟო სამუშაოთა განხორციელების კალენდარული გრაფიკი დარჩენილ სამუშაოთა დასრულებაზე

სამუშაოთა ხანგრძლივობა 3 თვე ანუ 90 დღე

ეტაპები	სამუშაოთა დასახელება	ხანგრძლივ. დღეებში	კალენდარული თვეები და სამუშაო დღეები																	
			პირველი თვე						მეორე თვე						მესამე თვე					
			5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
1.	ტერიტორიის დროებითი შემოღობვა, ეზოს საინჟინრო ქსელების ჩაჭრა	5	5																	
2.	საკადასტრო გეგმით №02/1 და №01/1 (ნახევრად დემონტირები) შენობების დემონტაჟი. **საერთო ფართით 271 მ²**.	20		20																
3.	საკადასტრო გეგმით №04/1 (ნახევრად დემონტირებული) და №03/1 შენოების დემონტაჟი. **საერთო ფართი 336 მ²**	40						40												
4.	საკადასტრო გეგმით №05/1 ნახავრად დემონტირებული შენობის დემონტაჟი. **საერთო ფართი 210 მ²**	25													25					
4.	ტერიტორიიდან სამშენებლო ნაგვის გატანა (ეტაპობრივად) და მოსწორება	90	90 საჭიროების მიხედვით																	


მითითებები: 1. თვეში 30 სამუშაო დღეა, გრაფიკში კალენდარული თვე შეიცვალოს სამუშოთა დაწყების თვის აღნიშვნით თანახმად გაცემული ნებართვისა.

2. სამუშაოები აუცილებელია განხორციელდეს შრომის, ელექტრო, ხანძარ-უსაფრთხოებისა და ბუნების დაცვითი ღონისძიებების გათვალისწინებით.

3. სამშენებლო ნაგვის გატანის შემდეგ აუცილებელია განთავისუფლებულ ტერიტორია მოსწორდეს.

ი/მ „რევაზ მახვილაძე, მშენეკონომეფექტი, დაპროექტება და ექსპერტიზა”			**ქალაქ თბილისში, წურწუმისა და ნ. ირბახის ქუჩების გადაკვეთაზე (ს.კ 01.17.01.050.042**	
დირექტორი	**რ. მახვილაძე**		**დაშლა-სადემონტაჟო სამუშაოთა განხორციელების კალენდარული გრაფიკი დარჩენილ სამუშაოთა დასრულებაზე**	**სტადია მპ**
შეადგინეს	**ნ. მურჯიკნელი**			**ფურც.**
	რ. მახვილაძე			**თბილისი 2017**

სადემონტაჟო სამუშაოთა გეგმა

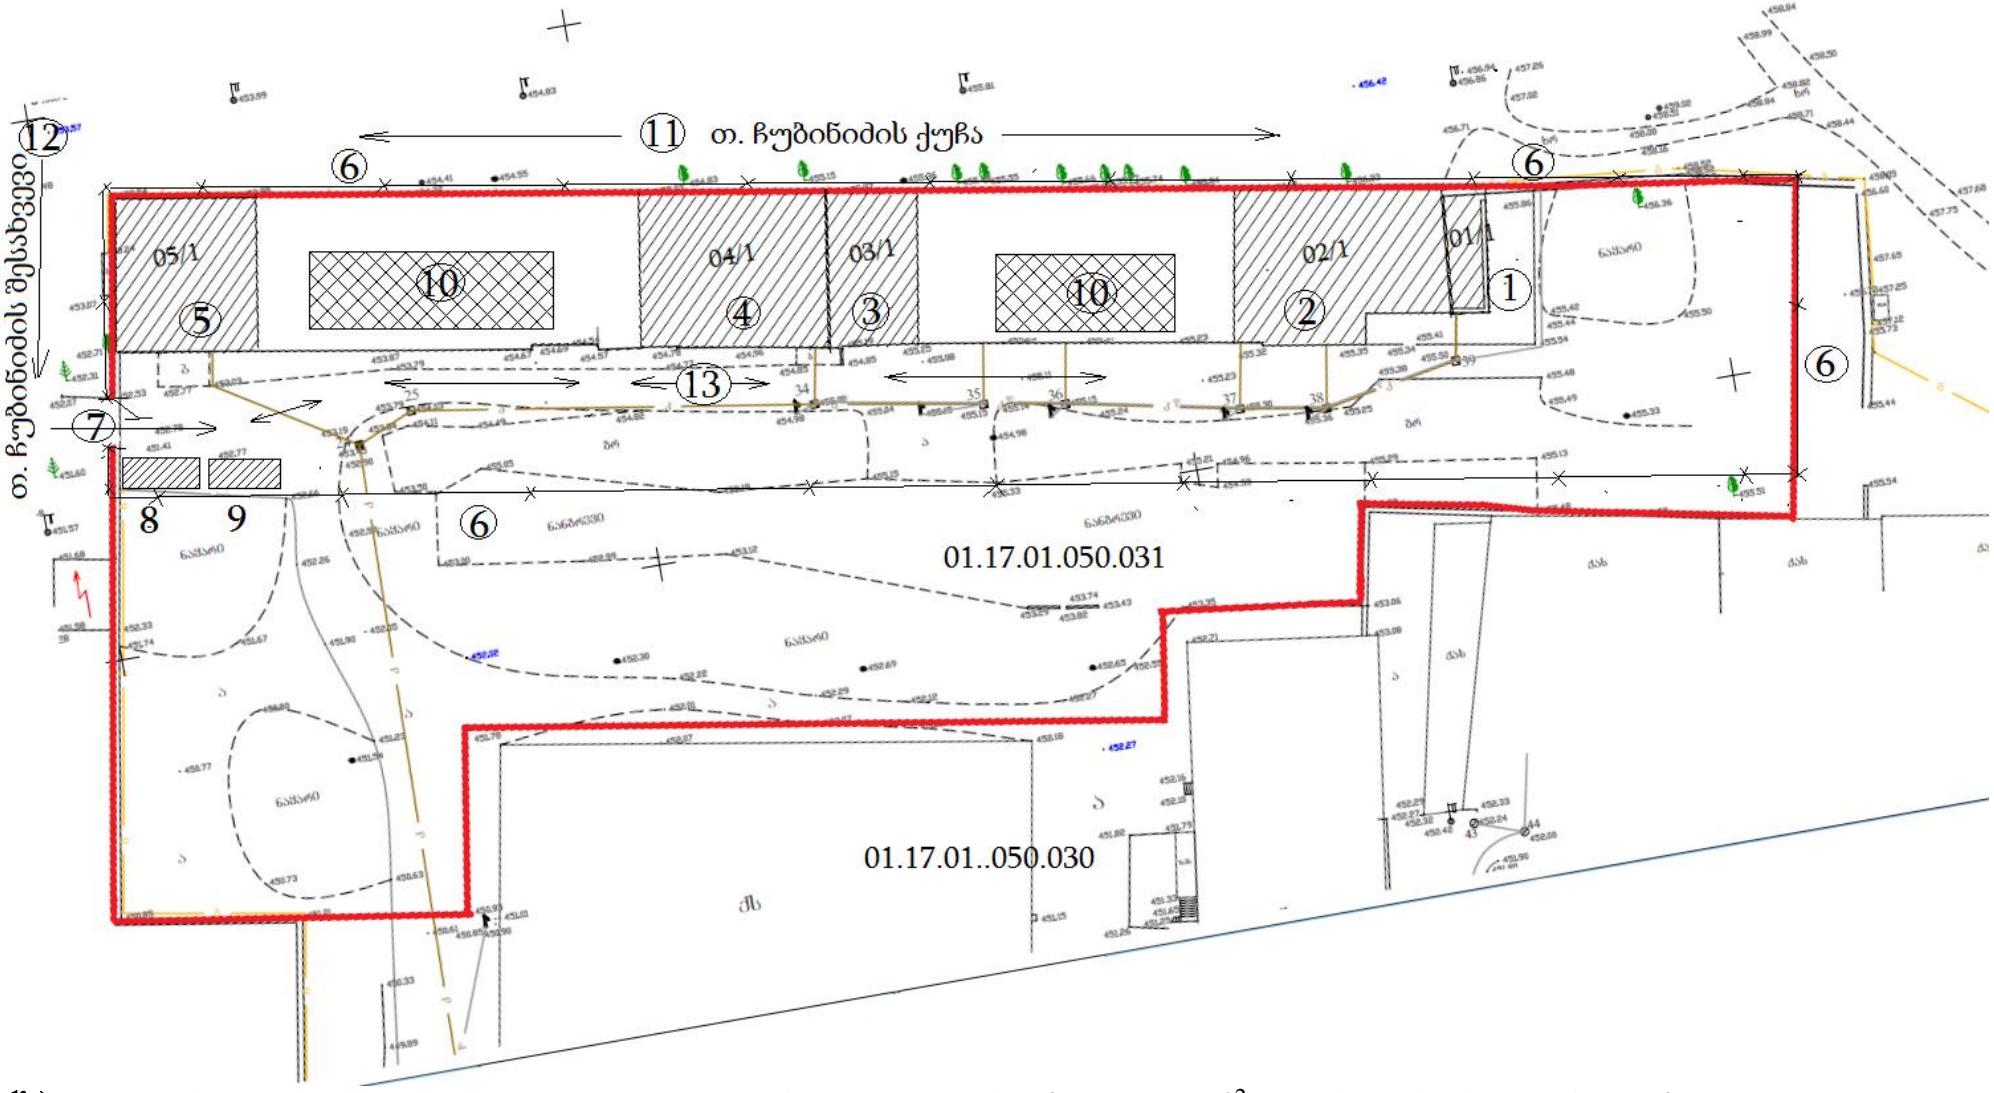

ექსპლიკაცია:საკადასტრო კოდით 01.17.01.050.042 ნაკვეთის ფართობია 7000 მ^2. ტერიტორიაზე განთავსებულია ხუთი ნახევრად დემონტირებული შენობა (საკადასტრო გეგმით - 05/1; 04/1; 03/1; 02/1 01/1) საერთო ფართობით 817 მ^2. 1. საკადასტრო გეგმით №01/1 შენობის ნანგრევი; 2. საკადასტრო გეგმით №02/1 ნახევრად დემონტირებული შენობა; 3. საკადასტრო გეგმით №03/1 შენობის დარჩენილი კედლები; 4. საკადასტრო გეგმით №04/1 ნახევრად დემონტირებული შენობა; 5. საკადასტრო გეგმით №05/1 ნახევრად დემონტირებული შენობა; 6. დროებითი ღობე; 7. დროებით ღობეში მოწყობილი ავტოჭიშკარი თ. ჩუბინიძის შესახვევის მხრიდან; 8. საპრარაბო-სადარაჯო ინვენტარული ვაგონი; 9. საყოფაც-ხოვრებო დანიშნულების ინვენტარული ვაგონი; 10. სამშენებლო ნაგვის ხანმოკლე დროით შესაგროვებელი ადგილები; 11. თ. ჩუბინიძის ქუჩა; 12. თ. ჩუბინიძის შესახვევი; 13. ავტოტრანსპორტის სამოძრაო გზა.

საკადასტრო გეგმა

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

საკადასტრო კოდი: **01.17.01.050.042**

განცხადების ნომერი: **882020171098**

მომზადების თარიღი: **04/03/2020**

ნაკვეთის დანიშნულება: **არასასოფლო სამეურნეო**

ფართობი: **7000 კვ.მ (WGS 84 / UTM zone 38N)**



05/25 მეზობარე ნაგებობა

05/25 შენობა/ნაგებობა

ტყის ფონდი

ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი

ხაზობრივი ნაგებობა

ვალდებულება
