
მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი 12 თვეზე

სამუშაოთა ჩამონათვალი	ხანგრძლიობა	I თვე		II თვე		III თვე		IV თვე		V თვე		VI თვე		VII თვე		VIII თვე		IX თვე		X თვე		XI თვე		XII თვე	
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
ტერიტორიის დაკვალვა და მისი შემოღობვა	1 თვე																								
არსებული შენობის დემონტაჟი და გატანა საძირკვლის ქვეშ ბრუნტის ამოღება	1,5 თვე																								
შენობის შუძის მოწყობა	2 თვე																								
ნულოვანი ციკლის დასრულება	4 თვე																								
შენობის რკ/ბეტონის კარკასის მოწყობა ნიშნულების შესაბამისად	4 თვე																								
სახურავის მოწყობა	2 თვე																								
შიდა და გარე კედლების ბლოკით შევსება	2 თვე																								
შენობის შასადების დამუშავება: მოპირკეთება, შელესვა, შეღებვა	2 თვე																								
ტერიტორიის კეთილმოწყობა, დასუფთავება	1 თვე																								
მშენებლობის საერთო ხანგრძლიობა 12 თვე																									

დროებითი ღობის პროფილი

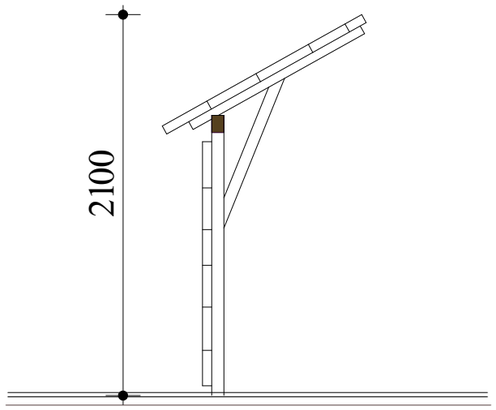

ფ/პ "არჩილ მიქუჭაძე" ს/კ 01019012603					
ქ.თბილისი, ჯავახეთის ქ.:№24;26. ჯავახეთის ქ.№26-ის მიმდებარედ (ნაკეთი №1/111) მასივი III,უბარბალი VIII,ორრბესი I მოჯირდებარედ(ნაკეთი №1/119) ჯავახეთის ქ.№26-ის მიმდებარედ. შ.პ.ს."ინვესტი-5"-სთვის მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი, მცირეული ფუნქციის მქონე (კომერციული,სასტუმრო) შენობის სასმენებლად.					
პრ. ავტორი		ა. მიქუჭაძე	მშენებლობის ორგანიზაცია	ფურცელი	
			მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი	თარიღი	2013 წ.
შესრულა		ლ. მიქუჭაძე		მასშტაბი	
