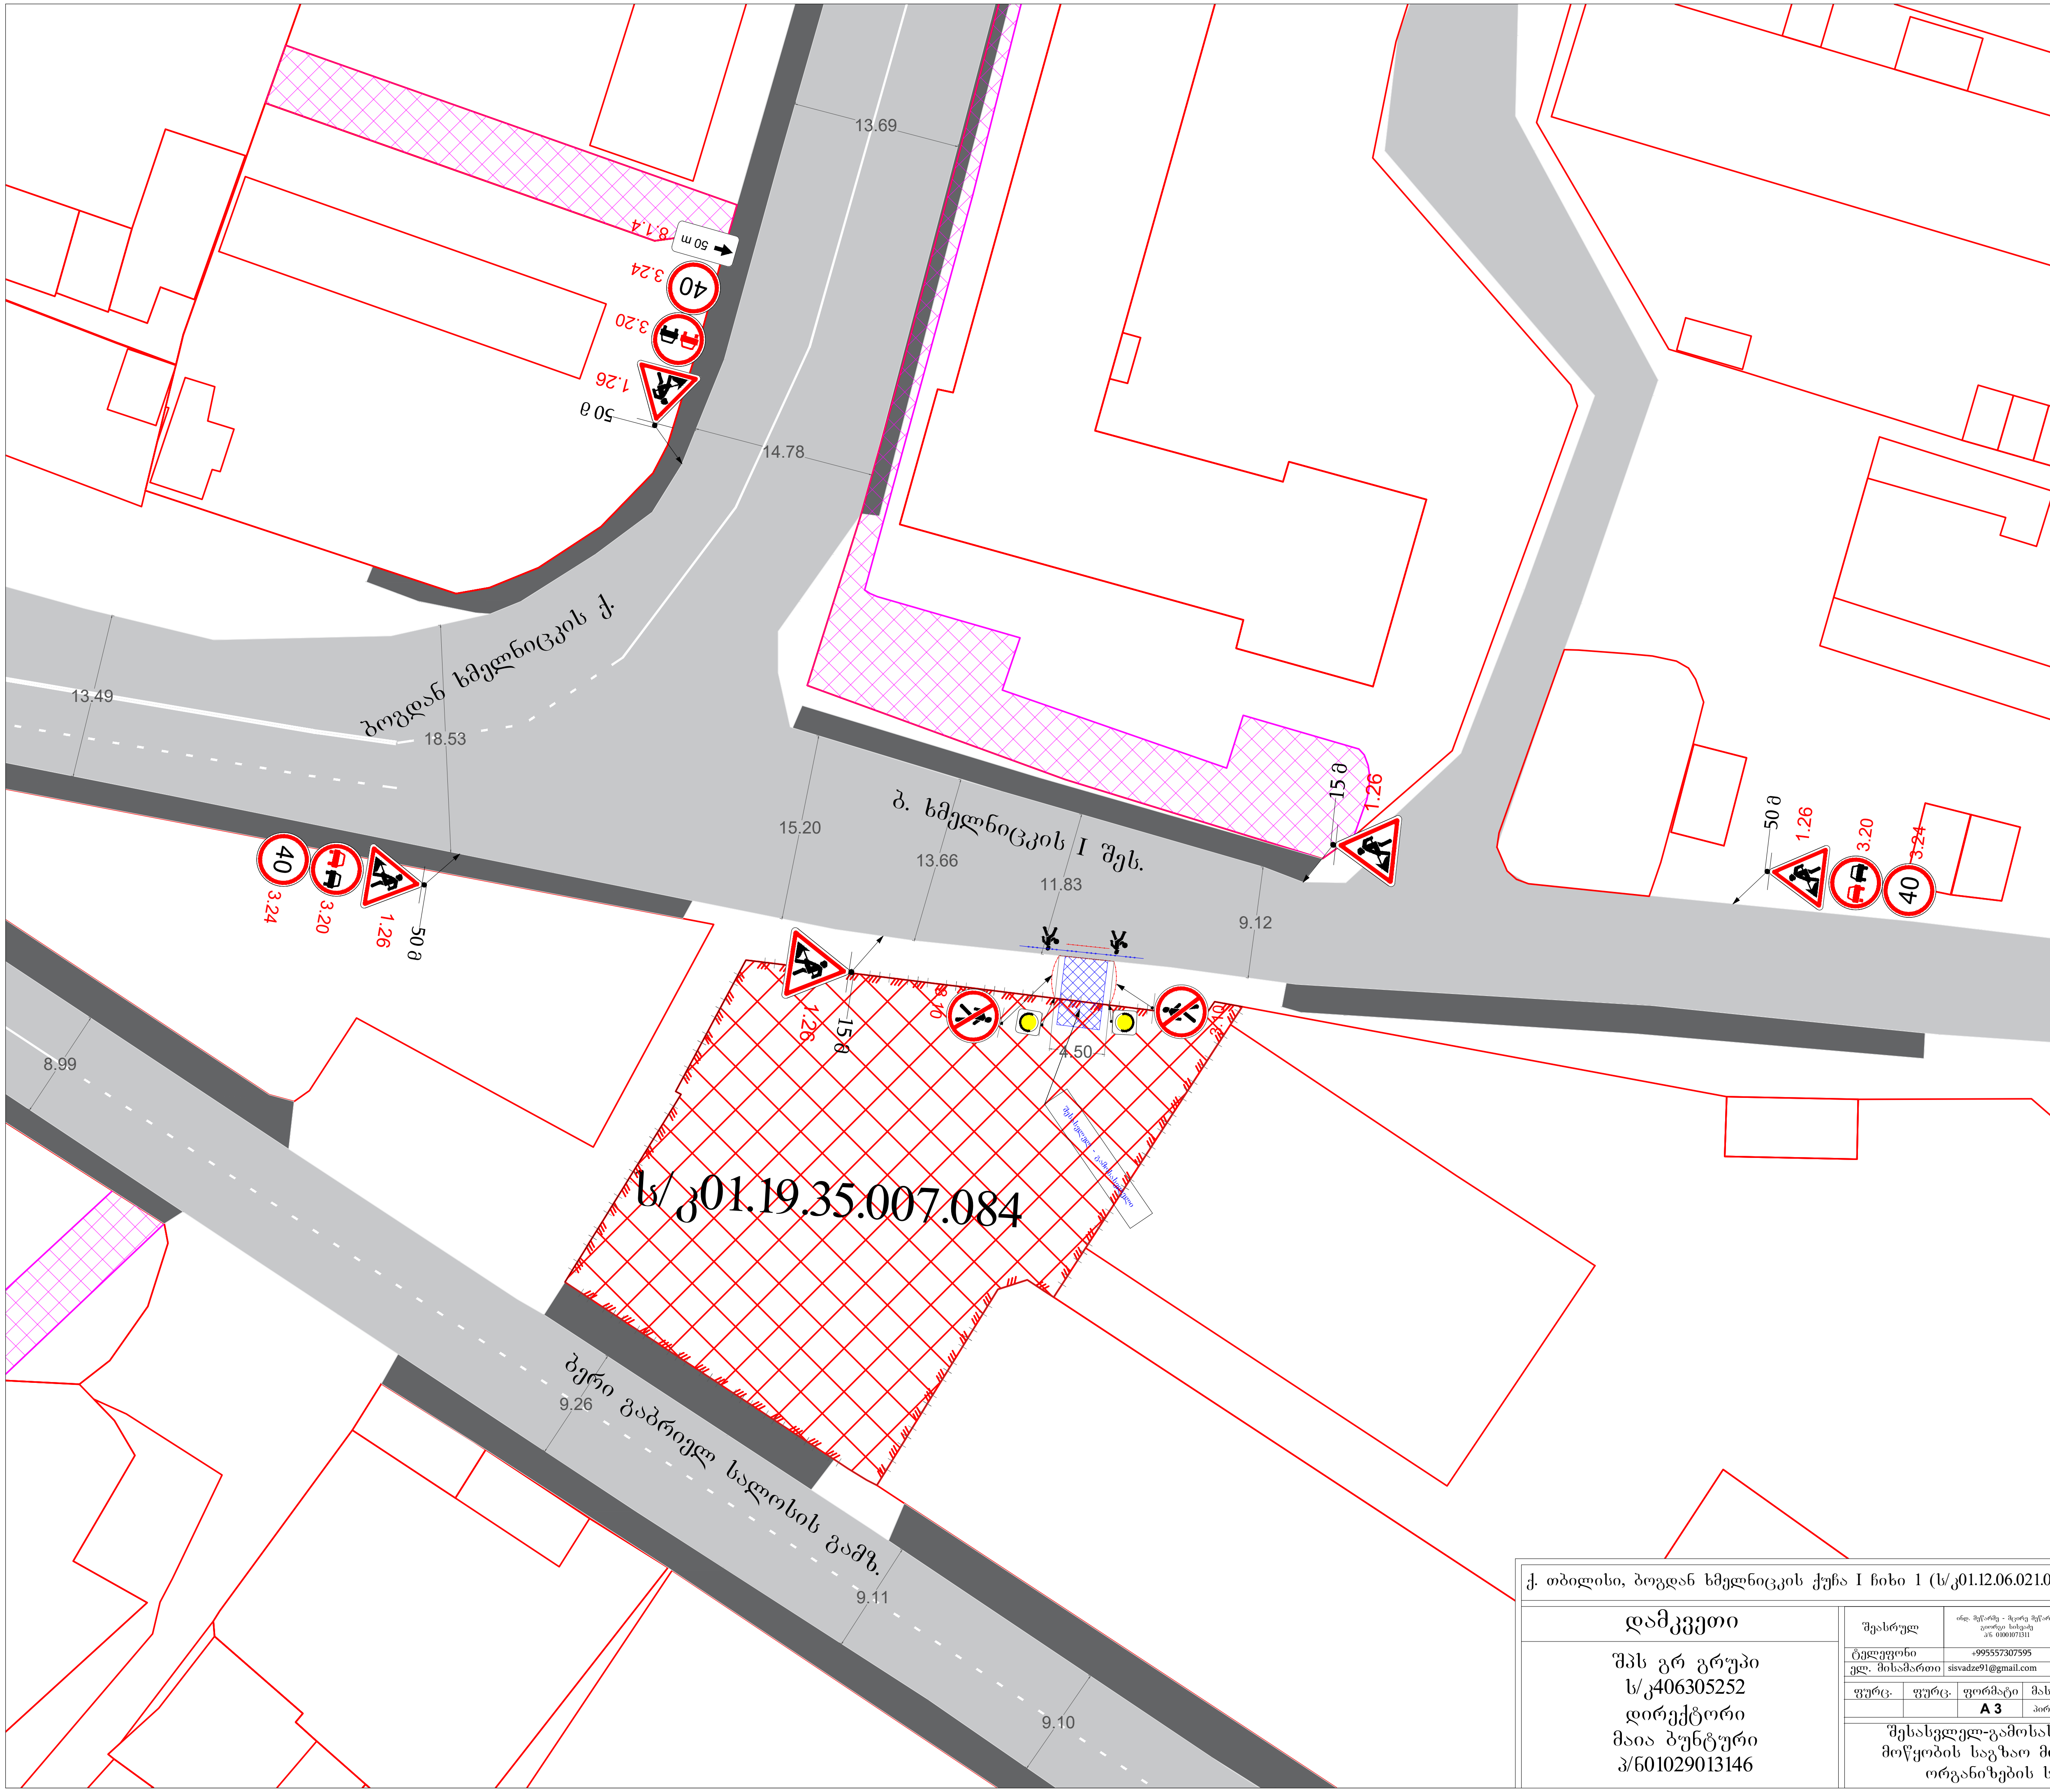

საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებები

1.26	5 - ცალი	
3.10	2 - ცალი	
3.20	3 - ცალი	
3.24	3 - ცალი	
8.1.4	1 - ცალი	
ყვითელი ციმციმა	2 - ცალი	
		მოსაწყობი შესასვლელი
		საპროექტო ტერიტორია
		საავტომობილო გზა
		საქვექვეითე ბილიკი
		სერვიტუტი
		საპროექტო ტერიტორიის წითელი ხაზი
		ქვეითთა გადაადგილება
		სამშენებლო ლენტი
		მოსაწყობი სამშენებლო ღობე
		2 მედროშე

ქ. თბილისი, ბოგდან ხმელნიცკის ქუჩა I ჩიხი 1 (ს/კ01.12.06.021.004)

დამკვეთი

შპს გრ გრუპი
ს/კ406305252
დირექტორი
მაია ბუნტური
პ/601029013146

შეასრულ	ინდ. მეწარმე - მცირე მეწარმე გიორგი სისვაძე პ/ნ 01001071311	
ტელეფონი	+995557307595	
ელ. მისამართი	sisvadze91@gmail.com	

ფურც.	ფურც.	ფორმატი	მასშტაბი	თარიღი
		A 3	პირობითი	23.04.2023

შესასვლელ-გამოსასვლელის მოწყობის საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა

შენიშვნა:
შესასვლელ-გამოსასვლელი გზის მოწყობის სამუშაოები იწარმოების მშენებლობის დაწყებიდან 6 სამუშაო დღის განმავლობაში ღამის საათებში 00:00 სთ-დან 06:00 სთ-მდე.

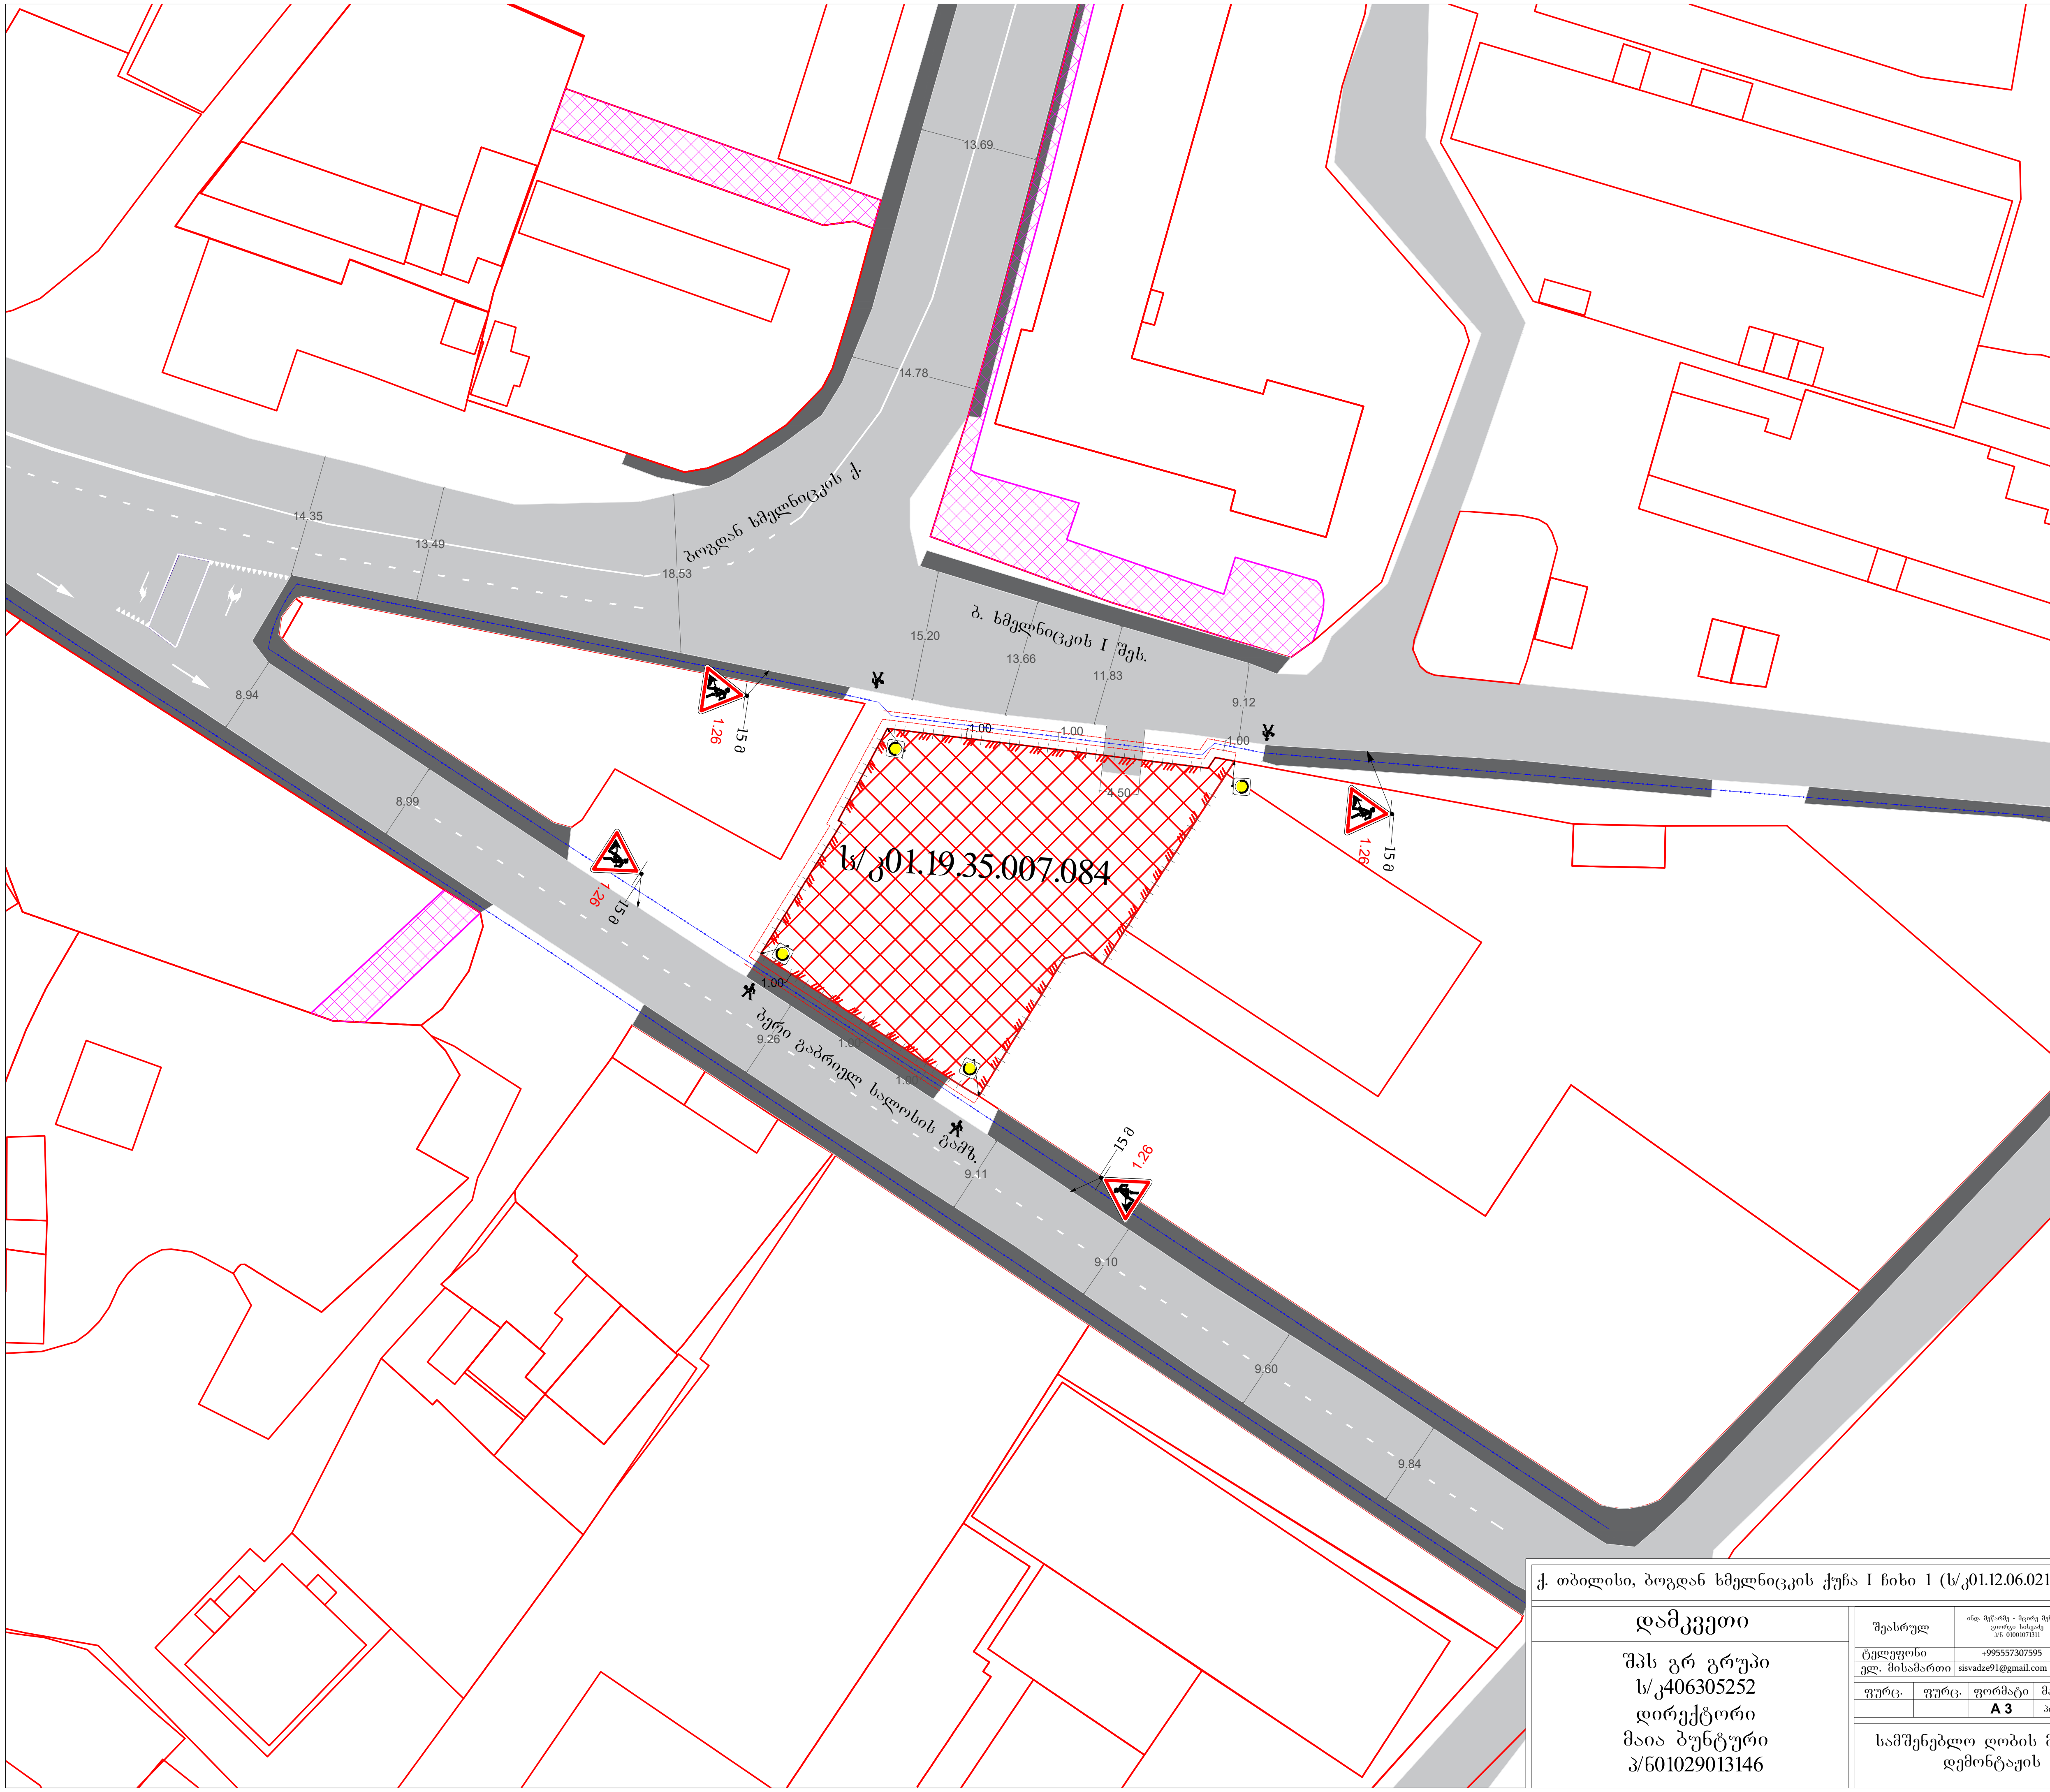

საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებები

1.26	4 - ცალი
ყვითელი ციმციმა	4 - ცალი
2.20 / 1.00	სამშენებლო ღობის განივი კვეთი
	მოსაწყობი შესასვლელი
	საპროექტო ტერიტორია
	საავტომობილო გზა
	საქვექვეითე ბილიკი
	სერვიტუტი
	საპროექტო ტერიტორიის წითელი ხაზი
	ქვეითთა გადაადგილება
	სამშენებლო ლენტი
	მოსაწყობი სამშენებლო ღობე
	4 მედროშე

ქ. თბილისი, ბოგდან ხმელნიცკის ქუჩა I ჩიხი 1 (ს/კ01.12.06.021.004)

დამკვეთი

შპს გრ გრუპი
ს/კ406305252
დირექტორი
მაია ბუნტური
პ/601029013146

შეასრულ	ინდ. მეწარმე - მცირე მეწარმე გიორგი სისვაძე პ/ნ 01001071311		
ტელეფონი	+995557307595		
ელ. მისამართი	sisvadze91@gmail.com		

ფურც.	ფურც.	ფორმატი	მასშტაბი	თარიღი
		A 3	პირობითი	23.04.2023

სამშენებლო ღობის მონტაჟისა და დემონტაჟის სქემა

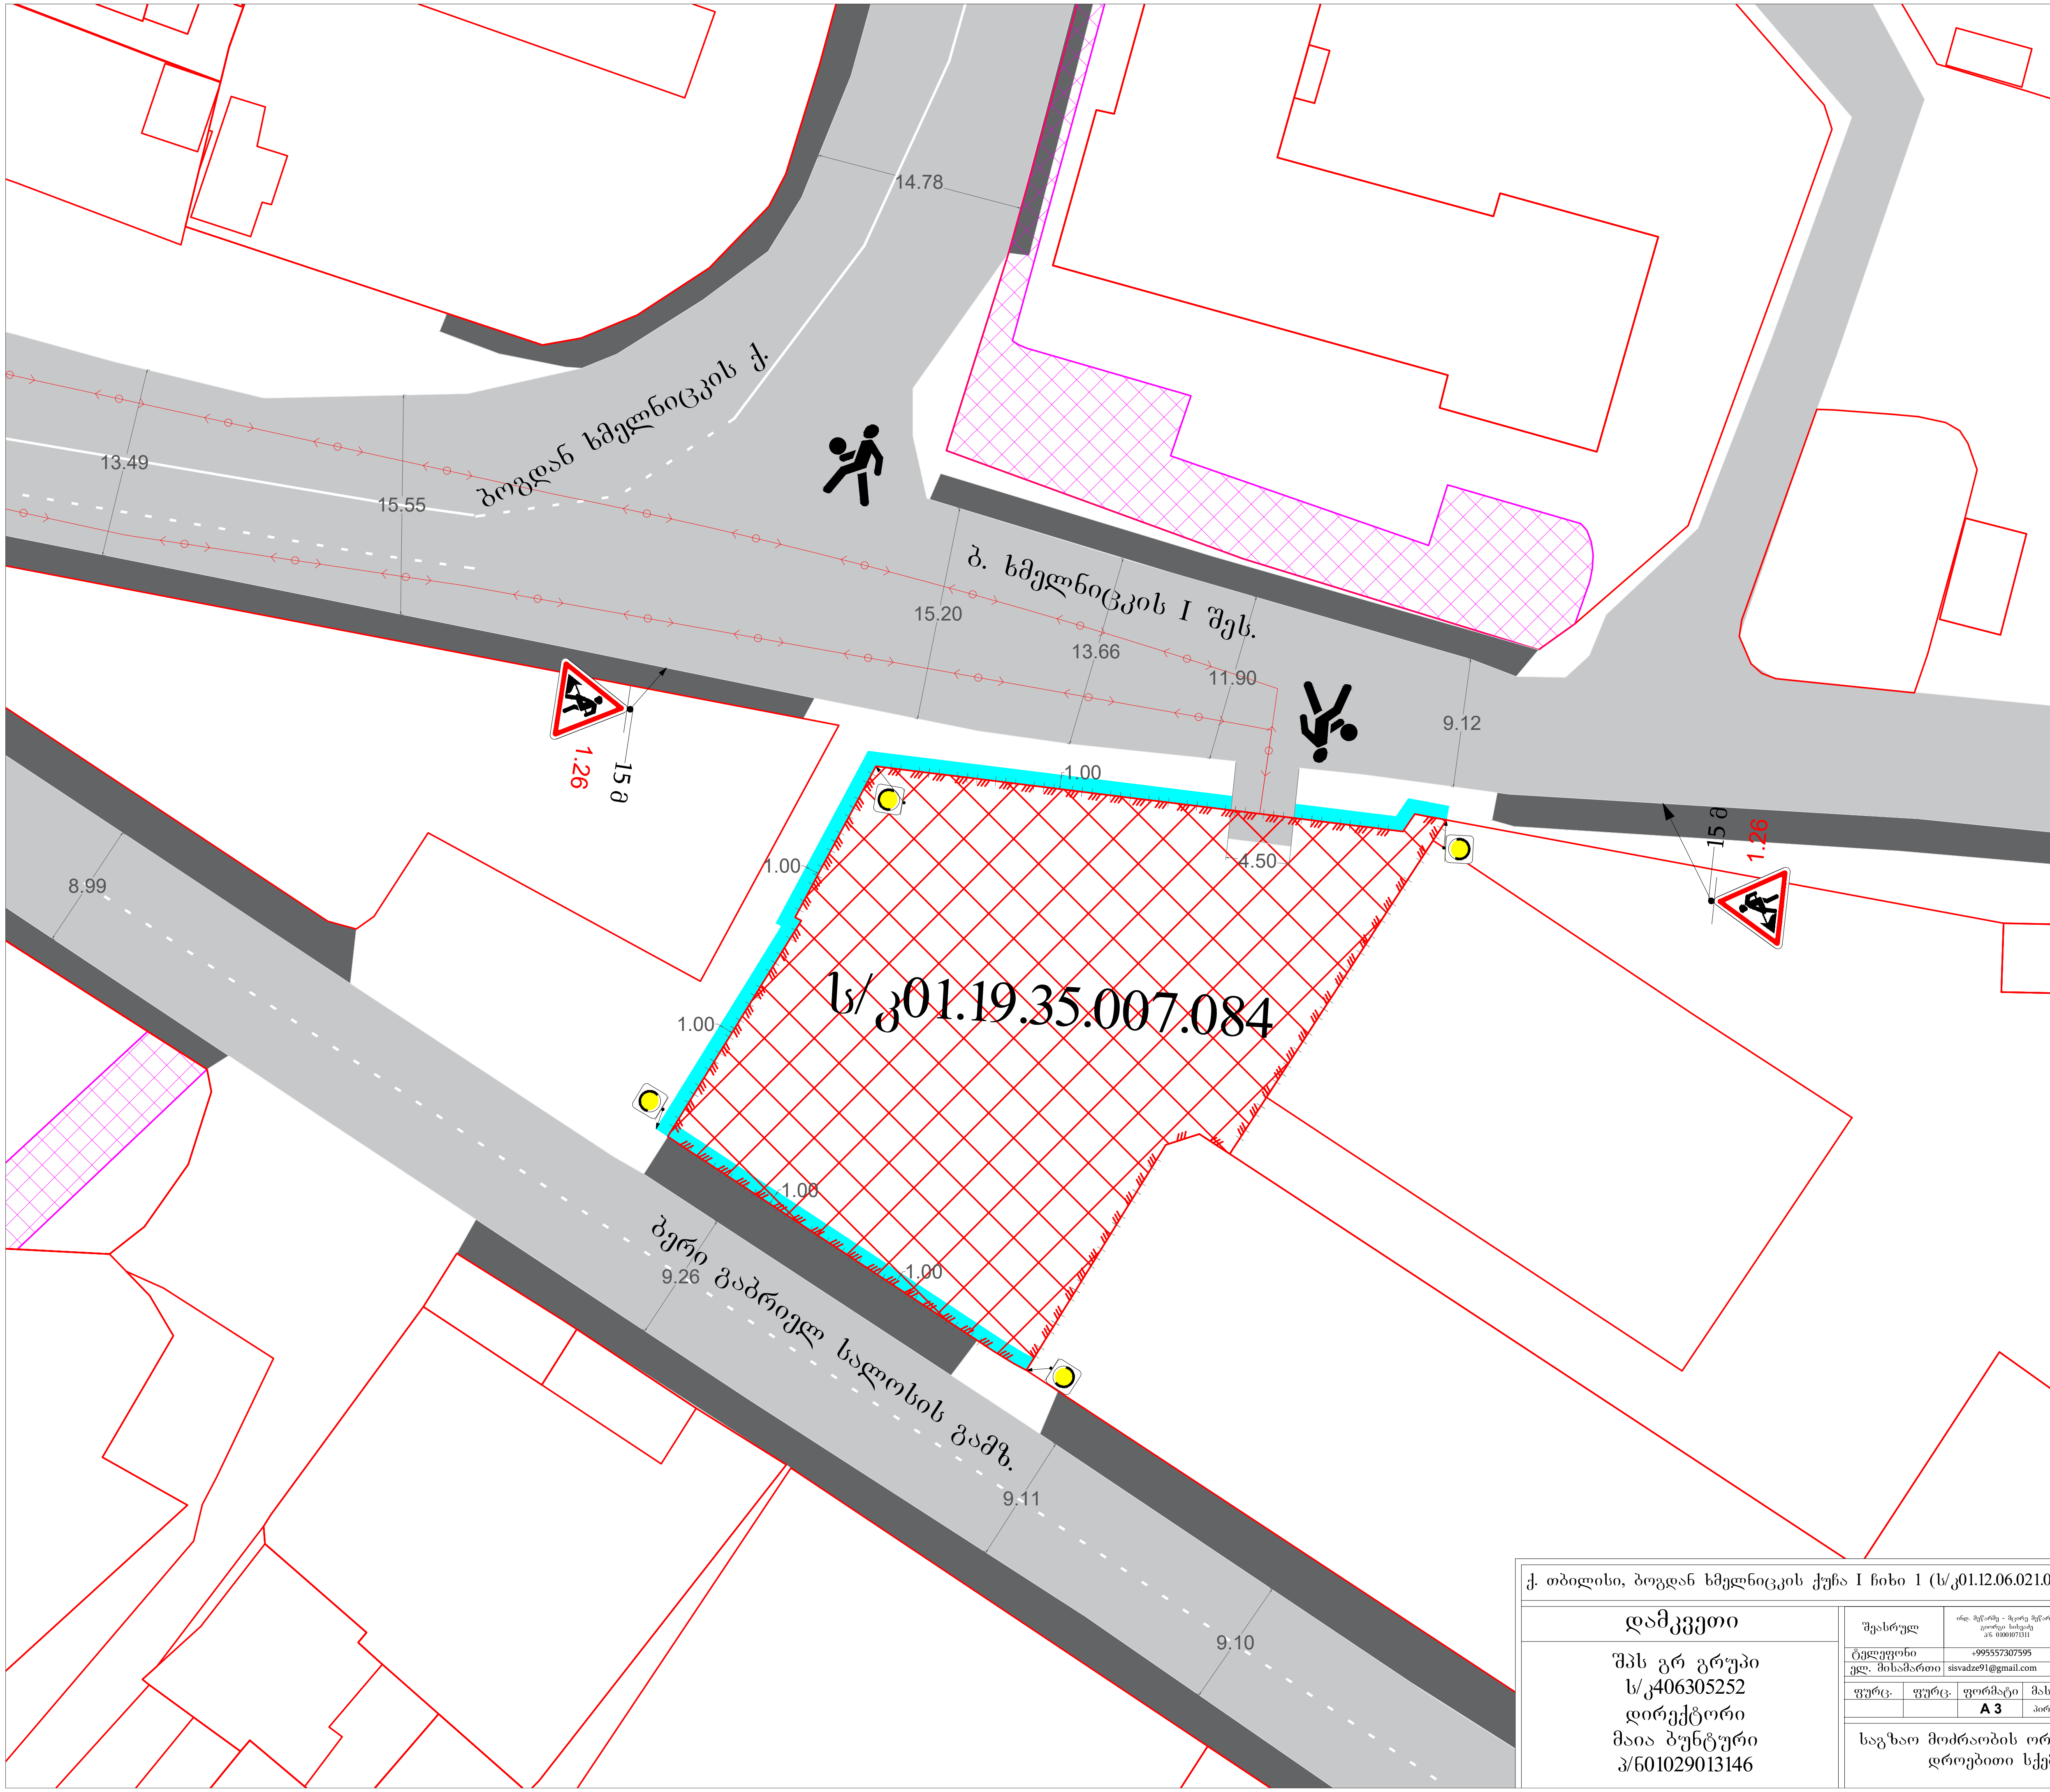

საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებები

1.26		2 - ცალი
2.20 1.00 ს/კ01.19.35.007.084 საპროექტო ტერიტორიის წითელი ხაზი		სამშენებლო ღობის განივი კვეთი
ყვითელი ციმციმა		4 - ცალი
		მოსაწყობი შესასვლელი
		საპროექტო ტერიტორია
		საავტომობილო გზა
		საქვექვეითე ბილიკი
		სერვიტუტი
		საპროექტო ტერიტორიის წითელი ხაზი
		ქვეითთა გადაადგილება
		სამშენებლო ლენტი
		სამშენებლო ტექნიკის გადაადგილება
		მოსაწყობი სამშენებლო ღობე
		სამშენებლო ქოლგა
		2 მედროშე

ქ. თბილისი, ბოგდან ხმელნიცკის ქუჩა I ჩიხი 1 (ს/კ01.12.06.021.004)

დამკვეთი

შპს გრ გრუპი
ს/კ406305252
დირექტორი
მაია ბუნტური
პ/601029013146

შეასრულ	ინჟ. მეწარმე - მცირე მეწარმე გიორგი სისვაძე პ/ნ 01001071311	
ტელეფონი	+995557307595	
ელ. მისამართი	sisvadze91@gmail.com	

ფურც.	ფურც.	ფორმატი	მასშტაბი	თარიღი
		A 3	პირობითი	23.04.2023

საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა

შენიშვნა:
სამუშაოები იწარმოებს სამშენებლო ნებართვის აღებიდან 3 წლის განმავლობაში

ბოგდან ხმელნიცკის I შეს.

ბ. ხმელნიცკის I შეს.

ბერი გაბრიელ სალოსის გაშზ.

Y=489600

1.96
1.97
1.95
1.96
15.42
14.18
12.45
10.36
9.46
9.1
2.50
2.50
2.50
4.50
2.50
2.50
2.52
9.04
2.48
9.07
2.50
9.23
2.50
9.27
2,58
2.46
9.27
9.18
2.50
3.26
3.33
2.63
8.99
2.76

ს/კ01.19.35.007.084

საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებები

	1.1	ჰორიზონტალური მონიშვნა
	1.14.1	ჰორიზონტალური მონიშვნა
	1.2.2	ჰორიზონტალური მონიშვნა
	1.26	2 - ცალი
		საპროექტო ტერიტორიის წითელი ხაზი
		საავტომობილო გზა
		საქვექვეითე ბილიკი
		სერვიტუტი
		პანდუსები შშმ პირებისათვის სიგრძე - 1.70მ სიგანე - 1მ დახრა - 5%

საპროექტო ტერიტორიის მიმდებარე გზის განივი კვეთი

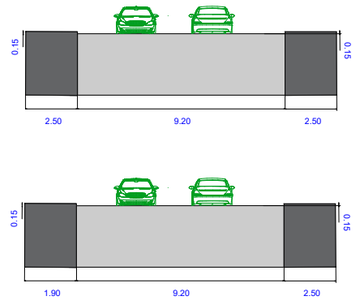

ქ. თბილისი, ბოგდან ხმელნიცკის ქუჩა I ჩიხი 1 (ს/კ01.12.06.021.004)

დამკვეთი	შპს გრ გრუპი ს/კ406305252 დირექტორი მაია ბუნტური პ/601029013146	შეასრულ	ინჟ. მშენ. - არქ. მშენ. გიორგი სისვაძე პ/ნ 61000073311	
		ტელეფონი	+995557307595	
		ელ. მისამართი	sisvadze91@gmail.com	
		ფურც.	ფურც.	ფორმატი: A 3; მასშტაბი: პირობითი; თარიღი: 23.04.2023
		საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა		

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო

წერილის ნომერი: **16-01231391802**
თარიღი: **19/05/2023**

ადრესატი: გიორგი სისვაძე
პირადი ნომერი: 01001071311
მისამართი: თბილისი გლდანი VI მ/რ კორ. 30 ბ. 129

ბატონო გიორგი,

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტომ განიხილა თქვენი, 2023 წლის 16 მაისის №01231363395-16 განცხადება, რომელთან დაკავშირებითაც გაცნობებთ შემდეგს:

დაკმაყოფილდეს 2023 წლის 16 მაისის №01231363395-16 განცხადება და შეთანხმდეს ქალაქ თბილისში, ბოგდან ხმელნიცკის ქუჩის I ჩიხის N1-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N 01.19.35.007.084) საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა თანდართულ ბმულზე არსებული დანართის შესაბამისად.

ასევე გაცნობებთ, რომ საჭიროების შემთხვევაში, სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო იტოვებს უფლებამოსილებას, მოითხოვოს სამუშაოების პერიოდში არსებული სიტუაციის საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემის ალტერნატიული ვარიანტის წარმოდგენა.

სამუშაოების მიმდინარეობის პერიოდში, საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემის მიხედვით გათვალისწინებული საგზაო ნიშნები უნდა განთავსდეს მოძრავ დგარზე, რათა არ დაზიანდეს მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა.

იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოებისათვის საჭირო დროებითი და არსებული საგზაო ნიშნები ეწინააღმდეგება/ხელს უშლის ერთმანეთს, საჭიროა უკვე არსებული საგზაო ნიშნები შეიფუთოს, ხოლო სამუშაოს დასრულებისთანავე დემონტაჟი უნდა გაუკეთდეს დროებით დამონტაჟებულ საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკურ საშუალებებს და ქუჩის სავალი ნაწილი (ყველა შეფუთული ნიშნის ჩათვლით) მოყვანილი იქნას პირვანდელ მდგომარეობაში.

დამატებით გაცნობებთ, რომ თუ მშენებლობის პერიოდში, საპროექტო ტერიტორიის მიმდებარედ, ხორციელდება სხვა სამშენებლო სამუშაოები და დროებითი საგზაო ნიშნები, რომლებიც განთავსებულია სხვა, ნებართვის მქონე, შემსრულებელი კომპანიის მიერ და კვეთს/ეწინააღმდეგება თქვენს მიერ დასამონტაჟებელ საგზაო ნიშნებს, დროებითი საგზაო ნიშნები დაიტანოთ საჭიროებისამებრ და აუცილებლობის შემთხვევაში, სამუშაოები განახორციელოთ უკვე განთავსებული დროებითი საგზაო ნიშნების გამოყენებით. ხოლო, სხვა შემსრულებლის მიერ, სამუშაოების დასრულებისა და ნიშნების დემონტაჟის შემთხვევაში, უზრუნველყოთ თქვენი საგზაო ნიშნების სრულად მონტაჟი, მოცემული პირობების შესაბამისად.

საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემის ცვლილება საჭიროებს შეთანხმებას სააგენტოსთან.

გადაწყვეტილების გასაჩივრება, დაინტერესებული მხარის მიერ, შესაძლებელია ამ გადაწყვეტილების გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერთან (მისამართი: ჟ. შარტავას ქუჩა N7) კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

დანართი: სსიპ - ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს მიერ შეთანხმებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემები იხილეთ თანდართულ ბმულზე :

https://cloud.tbilisi.gov.ge/index.php/s/LqibOn1t4x6jVMA

პატივისცემით,

ვიქტორ წილოსანი

სააგენტოს უფროსი

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი

MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF GEORGIA
PATROL POLICE DEPARTMENT

MIA 6 23 01416536

19/05/2023

მოქ: სისვაძე გიორგი
თბილისი სამტრედიის ქ. 50კორპ. ბ . ბინა 4
თქვენს 2023 წლის 19 მაისის განცხადებაზე

ასლი: შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის
ქ. თბილისის მთავარ სამმართველოს

შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტში განხილულ იქნა თქვენი განცხადება, რომელშიც ითხოვთ ქ.თბილისი, ბოგდან ხმელნიცკის ქუჩის I ჩიხის N1-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N 01.19.35.007.084) შესასვლელ-გამოსასვლელი გზის, სამშენებლო დამცავი ღობის მოწყობის და საგზაო-სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ნაკადების მიმართულების საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის წარმოდგენილი დროებითი და მუდმივი სქემების შეთანხმებას.

ვითვალისწინებთ რა, ს.ს.ი.პ. ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს (19.05.23წ 16-01231391802) თანხმობას შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი ითანხმებს (საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების კუთხით) წარმოდგენილ დროებითი და მუდმივი მოძრაობის ორგანიზაციის სქემებს და არ არის წინააღმდეგი განახორციელოთ აღნიშნული სამუშაოები შემდეგი პირობების დაცვით:

- ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხოების მიზნით დამცავი ღობის ფარგლებში მოეწყოს ქუჩის სავალი ნაწილის მხრიდან ქვეითად მოსიარულეთა ბილიკი, ღობე გზის სავალი ნაწილის მხრიდან გადაიხუროს და ღამის საათებში განათდეს;
- სამშენებლო ობიექტზე მისასვლელი გზა (სამუშაოების განხორციელების პროცესში) აღიჭურვოს მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებებით შეთანხმებული სქემების შესაბამისად, ხოლო მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ მოძრაოის ორგანიზების ტექნიკურ საშუალებებს გაუკეთდეს დროებით დემონტაჟი ან შეიფუთოს;
- საგზაო მოძრაობის რეგულირებისთვის და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილების მიზნით სამუშაოების მწარმოებლის მიერ გამოყოფილ იქნეს სპეც. ტანსაცმლით და ალმით აღჭურვილი საჭირო რაოდენობის თანამშრომელი;
- დაცული იქნას გზის სავალი ნაწილის სისაუფთავე, არ დაუშვათ სამშენებლო მასალისა და ტექნიკის გზის სავალ ნაწილზე განთავსება;

0190, თბილისი, ნოე რამიშვილის ქ. №38
№38, Noe Ramishvili St. 0190, Tbilisi, Georgia
ტელ./Tel.: (+995 032) 2 41 42 42
ფაქსი/Fax: (+995 032) 2 41 85 02
E-mail: patrolinfo@mia.gov.ge

- სამუშაოების დასრულებისთანავე ფეხით მოსიარულეთა ბილიკი მოყვანილ იქნას პირვანდელ მდგომარეობაში, დროებითი მოძრაობის რეგულირების ტექნიკურ საშუალებებს გაუკეთდეს დემონტაჟი და გზის მიერთების ადგილები აღიჭურვოს მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებებით შეთანხმებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის სქემების შესაბამისად;
- სამუშაოების დაწყების შესახებ წინასწარ ეცნობოს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს და შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის სამორიგეო ნაწილს (241–85–04; 241–85–05).

მეორე ადრესატს: გთხოვთ, უზრუნველყოთ კონტროლის დაწესება წერილში მითითებულ პირობების შესრულებაზე და მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებების განთავსების მდგომარეობაზე. შეუსრულებლობის შემთხვევაში გაატარეთ ზომები საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 134 მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად.

დანართი: სქემა 1 ფაილად

საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი /
საორგანიზაციო სამმართველო / საგზაო მოძრაობის
ზედამხედველობის განყოფილება
განყოფილების უფროსი
ბარბაქაძე დავით
