ც ნ ო ბ ა

დამკვეთი: ს.ს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია" ტელ: 599-94-00-05

საფუძველი: 23.07.2013 წ. №12/1320421-16

მისამართი: ქ. თბილისი, სექტორი-ვაკე, ნუცუბიძის ქ. №60

საკ.კოდი: №01.14.03.007.002

პროექტის შეთანხმების და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ ბრძანება – 26.07.2011წ. №01/2003; 26.07.2011 წ. №6/2120-1 მშენებლობის სანებართვო მოწმობა.

ფუნქციური დანიშნულება: ავტოგასამართი სადგურის რეკონსტრუქცია (სავარაუდოდ II კლასი)

ობიექტის ადგილზე შემოწმებით (29.07.2013) დადგინდა:

დარღვევები:

შენობის ქვეშ ამოღებულია გრუნტი და დამატებით შექმნილია 3 მ სიმაღლის 43 კვ.მ შიდა ფართი „ბ-გ" მონაკვეთში კარით, მსუბუქი კონსტრუქციის საჩრდილობლით და გარე კიბეებით, ხოლო „3-1" ფასადის მხრიდან 2 ფრამუგით.

+0.00 ნიშნულზე გაზრდილია შენობის სიგრძე 0.25 მ-ით, ხოლო სიგანე 0.2 მ-ით. **„3-3" ღერძის გარეთ მოწყობილია მოაჯირები და განთავსებულია გენერატორი, რომლებიც ცდება ზითელ ხაზს.** „3-1" ფასადის მხარეს მოწყობილია ფრამუგა, საჰაერო ღიობი, 2 კონდიციონერი და წყალშემკრები მილები. შეცვლილია საწვავის მარიგებელი სვეტების გაბარიტები, მდებარეობები და მათ ძირებზე მთლიანის ნაცვლად მოწყობილია ცალ-ცალკე ბაქნები. აღნიშნულ სვეტებთან მოწყობილია ლითონის დამცავი ჯებირები. არსებული კაპიტალური ღობის ნაწილი და „B-A" მონაკვეთში არსებული ფასების მაჩვენებელი დაფა არ შეესაბამება პროექტში მითითებულს. სახანძრო სტენდს მონაცვლებული აქვს ადგილი. **აღნიშნული დაფა ცდება ციოელ ხაზს.**

„1-3" ფასადზე: შეცვლილია რელიეფის დონე. „1-2" მონაკვეთში გაზრდილია ვიტრაჟის სიგანე 0.25 მ-ით, ხოლო სიმაღლე გაზრდილია ორივე ვიტრაჟის 0.4 მ-ით და შეცვლილია მათი ნახატი. გაზრდილია ფარდულის სიმაღლე 0.6 მ-ით და გაზრდილია ვინილის სიმაღლე 0.2 მ-ით. შეცვლილია ფარდულის ფორმა, მოპირკეთება და ფარდულზე რენდერით გათვალისწინებულია სარეკლამო სტენდის მდებარეობა.


შეამოწმა: დ.მანჯგალაძე

478450

N

W E

S

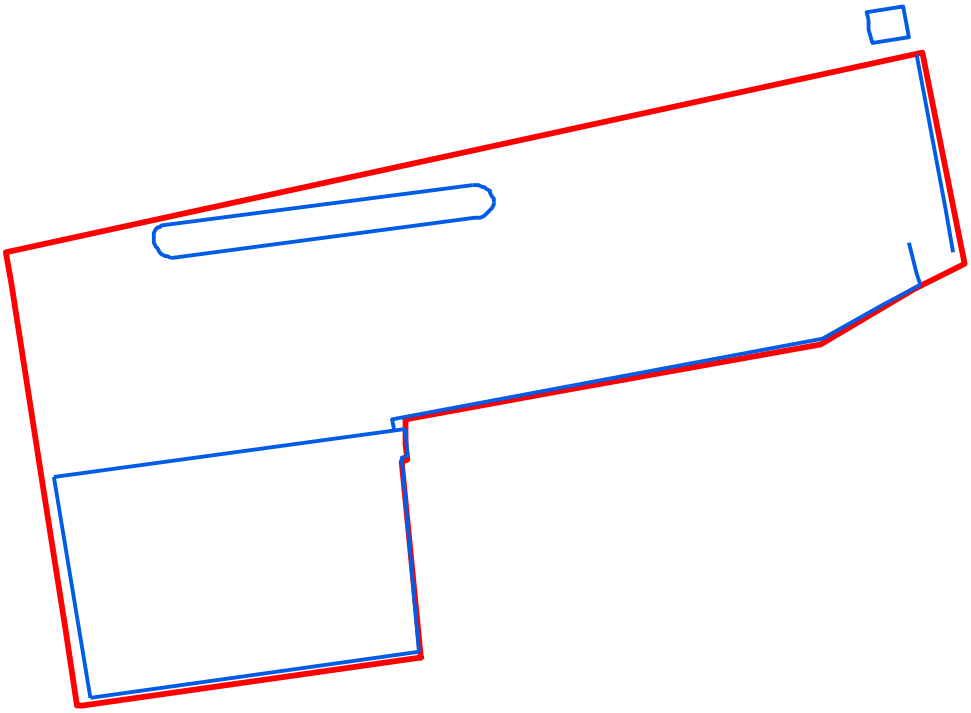

4619550

4619550

შუთა ასათიანი	25.07.2013
მისამართი: ქ. თბილისი, ნუცუბიძის ქ. №60	მასშტაბი: 1:200
