მრავალფუნქციონალური საცხოვრებელი სახლი.

საპროექტო ტერიტორია

მის.: ქალაქი, თბილისი , წულუკიძის ქუჩა #6 ს/კ 01,17,10,008,153

არასასოფლო _სამუერნეო, საერთო ფართობი -4225 მ^2

გასამწვანებელი ფართობი - 775.2 მ^2

ნებართვის გამცემი ორგანო: ქ. თბილისისი მუნიციპალიტეტის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური

დენდროლოგიური პროექტის შეთანხმების თარიღი 2026 წელი

დენდროლოგიური პროექტის დასრულების თარიღი: 2029 წელი.

ინფორმაცია მოსაჭრელი და გადასარგავი ხეების შესახებ:

არსებულ ტერიტორიაზე ხე-მცენარების საერთო რაოდენობა შეადგენს 200 ძირს.

მოსაჭრელია სულ ხე-მცენარე სულ 3 ძირი::

აქედან ხმობადი ხე-მცენარეები სულ 1 ძირი:-- N 44.

აქედან ზეხმელი ხე-მცენარეები სულ 2 ძირი: -- N 47.48;

ადგილზე რჩება 29 ხე-მცენარე. N – 2;3;4;5;6;7;8;10;11;12;13;15;16;17;18;19;20; 21;22;24;25;26;27;45;49;50;51;52;69;

დასარგავია სულ 3 ხე-მცენარე მათ შორის:

1.მჩხვლეტავი ნაძვი-(picea pungens)-2 ძირი.

2. არიზონის კვიპაროზი-(cupressus arizonica)-1 ძირი.

დენდროლოგიური პროექტი

თბილისი

2026

ხე-მცენარეების დარგვა:

1. გადასარგავ ადგილზე არანაკლებ 5 დღით ადრე ამოღებულ უნდა იქნას ორმო; სარგავი ორმოს დიამეტრი სასურველია გაითხაროს 0.5-0.9 მ. - ით მეტი, ხოლო სიმაღლე 0.2-0.25 მ. - ით მეტი ვიდრე გადასარგავი ხის კომი;
2. ამოღებულ ორმოს უნდა ჩაუტარდეს დეზინფექცია ნიადაგის მავნებლების და ნიადაგის პათოგენური სოკოების საწინააღმდეგოდ თანამედროვე პესტიციდების და ფუნგიციდების გამოყენებით, რათა თავიდან იქნას აცილებული რიგი დაზიანებები და დაავადებები, რომელსაც მცენარე იღებს მხოლოდ ნიადაგიდან;
3. კომსა და ორმოს კედლებს შორის სივრცე უნდა შეივსოს ნაყოფიერი ნიადაგის ნაზავით.
4. სარგავი ორმოს ფსკერი უნდა გაფხვიერდეს 10-15 სმ. სიღრმეზე, შემდგომ კი მოხდეს 0.2-0.25 მ. სისქის ნაყოფიერი ნიადაგის შეტანა;
5. ხე სარგავ ორმოში უნდა მოთავსდეს ამწეს (სპეცტექნიკის) გამოყენებით, ისე რომ ხის კომი 5-10 სმ-ით ამოწეული იყოს ნიადაგის ზედაპირიდან;
6. კომი უნდა განთავისუფლდეს შესაფუთი მასალისგან;
7. ჩარგვის დროს არ უნდა დაზიანდეს მცენარის ფესვთა სისტემა, ღერო და ვარჯი;
8. ხის მოთავსება ორმოში უნდა განხორციელდეს ხის პირვანდელი სივრცითი ორიენტაციის გათვალისწინებით;
9. ხის დარგვის შემდგომ აუცილებელია ხის ღეროს ფიქსირება არანაკლებ 3 მხრიდან;
10. სარგავ ორმოში ცარიელი სივრცე ივსება ნიადაგის ნაზავით და ფრთხილად იტკეპნება, რათა არ დაიშალოს კომი და არ მოხდეს ფესვთა სისტემის დაზიანება;
11. ნერგის ირგვლივ უნდა გაკეთდეს სარწყავი ჯამი;
12. ხის დარგვის შემდგომ უნდა მოხდეს ხის მორწყვა ნიადაგის სრულ გაჯირჯვებამდე

ხე-მცენარის დარგვის შემდგომი მოვლა-პატრონობა:

1. ხის მოვლა უნდა განხორციელდეს დარგვიდან (გადარგვიდან) 3 წლის განმავლობაში;
2. გახმობის შემთხვევაში მცენარის ჩანაცვლება ხორციელდება მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად;
3. მაისიდან სექტემბრის ჩათვლით თვეში ერთხელ უნდა განხორციელდეს სარწყავი ჯამების გამარგვლა-გაფხვიერება-განახლება;
4. გადარგვიდან მეორე და მესამე წელს, ვეგეტაციის დაწყებამდე, ადრე გაზაფხულზე უნდა განხორციელდეს სერთიფიცირებული მინერალური სასუქების (NPK) შეტანა და მორწყვა;
5. მორწყვა უნდა განხორციელდეს მაისიდან სექტემბრის ჩათვლით, კვირაში ერთხელ;
6. დამატებითი მორწყვა უნდა განხორციელდეს წლის გვალვიან პერიოდში, საჭიროების მიხედვით;
7. შესაძლებელია სპეციალური სარწყავი (ავტომატური) სისტემის მოწყობა მცენარის მუდმივი მორწყვის უზრუნველსაყოფად;
8. ხის დარგვისთანავე მცენარეებზე უნდა განხორციელდეს მცენარეთა მავნებელ-დაავადებების წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებები;

9. პერიოდულად ჩატარდეს ვარჯის სხვლა-ფორმირების სამუშაოები.

მწვანე მოლის დათესვა -504 მ^2

მოლს ჰყოფენ ორ ძირითად ჯგუფად: დეკორატიული და სასპორტო. ჩვენს შემთხვევაში გამოიყენება დეკორატიული მოლი. დასათესად გამოიყენება მრავალწლოვანი კოინდარი, რომელიც კარგად ხარობს, როგორც ღია მზიან, ისე დაჩრდილულ ადგილებში, უყვარს ნოყიერი ნიადაგი. ნათესარი სწრაფად ვითარდება და პირველსავე წელს იძლევა ელასტიურ და კარგად შეკრულ მოლს.

ნიადაგის მომზადება მოლისათვის

დეკორატიული მოლის მისაღებად უპირველეს ყოვლისა საჭიროა ნიადაგის მომზადება და მისი ზედმიწევნით კარგად დამუშავება, რაზედაც დამოკიდებულია მოლის ხარისხი და გამძლეობა. ამისათვის საჭიროა შეიქმნას ხელოვნურად ნიადაგი შემდეგი თანაფარდობით: 1/3 ტორფი, 1/3 ორგანული სასუქი და 1/3 ტყის ნეშომპალიანი მიწა(გაცრილი). ნიადაგი უნდა გაიშალოს ფართობში არა ნაკლებ 15-20 სმ-ისა.

თესვის ვადა და წესი

ნიადაგის შეტანის შემდეგ, ხელის ფოცხით ხდება მისი გასწორება და სარეველების მოცილება. თესვის ყველაზე ხელსაყრელი დროა გაზაფხული (მარტი,აპრილი) ან გვიანი შემოდგომა. თესვა ხდება ხელით, თესლის მობნევით, წყნარ უქარო ამინდში. თესლი თანაბრად რომ განაწილდეს ფართობზე, დასათესი თესლი იყოფა ორ თანაბარ ნაწილად და თესვა ხდება ორი მიმართულებით, გარდიგარდმო. ერთი კილოგრამი კოინდარი ითესება 15-20 მ^2 ფართობზე. თესვის დამთავრების შემდეგ საჭიროა თესლის წაბურვა-ჩაფვლა, ხელის ფორცხით 0.5-2 სმ სიმაღლეზე. წაბურვის შემდეგ აგროტექნკური თვალსაზრისით აუცილებელია მოთესილი ფართობის მსუბუქი საგორებელი სატკეპნით დატკეპნა, რის შემდეგაც აუცილებელია მორწყვა. ჩვენს შემთხვევაში 504 მ^2 ფართობის მოსათესად საჭიროა 34კგ. თესლი.

მოლის მოვლა

მოლის კარგი მოვლა განაპირობებს ბალახის ნორმალურ ზრდა-განვითარებას, მოუვლელობის შედეგად მარცვლოვანი ბალახი იჩაგრება და იდევნება ფართოფოთლოვანი სარეველებისაგან, ხოლო მწირ და მჟავე ნიადაგზე ჩნდება ხავსი, მოტიტვლებული ადგილები.

თანაბარი, ლამაზი და მწვანე ბალახნარის მისაღებად, საჭიროა მოლის ბალახის დროული და სისტემატიური თიბვა, რის შემდეგ მცენარე უკეთ ბარტყობს და იქმნება შეკრული და მკვრივი კორდი. თიბვის შემდეგ მცენარე ინვითარებს ყლორტებს, ხოლო ერთწლიანი სარეველა ბალახები ისპობა. მოლის გათიბვა უნდა მოხდეს მას შემდეგ, რაც მცენარე მიაღწევს სიმაღლეში 10-12 სმ-ს. ფართობის გათიბვა უნდა მოხდეს თვეში 4-6 ჯერ. განსაკუთრებულ რეგულარულ რწყვას მოითხოვს მოლი დათესვის შემდეგ გაღივების პერიოდში და ბალახის აღმოცენების პირველ ხანებში. მორწყვა უნდა მოხდეს ყოველდღიურად დილით ადრე და საღამოს. მორწყვითი პროცედურები წარმოებს მანამ სანამ ნიადაგის ზედა ფენა არ გაიჟღინთება 5-12 სმ. სიღრმემდე. გვალვიან რაიონებში მთელი სეზონის განმავლობაში 1მ^2 მოლის მოსარწყავად საშუალოდ 0,8-1მ^3 წყალია საჭირო

აღწერის ჩატარების თარიღი	15/06/2026
დასკვნის გაცემის თარიღი	16/06/2026
მისამართი	ქალქი თბილისი, პეტრე ხვედელიძის ქუჩა ,N8 ს/კ:01.17.10.008.153
ფართობი	4245კვ.მ
მესაკუთრე	ქალაქი თბილისის მუნიციპალიტეტი შპს“ტიბინი ჯგუფი“, ID ნომერი:406117492
აღწერილი ნარგავების რაოდენობა	200

ცხრილი N1

N	სახეობა	დიამეტრი მიწის პირიდან 10 სმ ზე	მდგომარეობა	შენიშვნა
1	ჭყორი-Ilex cornuta Lindi	13	ჯანსაღი	ექვემდებარაბა გადარგვას და გახარებას
2	უნაყოფო თუთა-Morus platanifolia fruitless	8	ჯანსაღი	ექვემდებარაბა გადარგვას და გახარებას
3	თეთრი ვერხვი-Populus alba	7	ჯანსაღი	ექვემდებარაბა გადარგვას და გახარებას
4	უნაყოფო თუთა-Morus platanifolia fruitless	9	ჯანსაღი	ექვემდებარაბა გადარგვას და გახარებას
5	თეთრი ვერხვი-Populus alba	7	ჯანსაღი	ექვემდებარაბა გადარგვას და გახარებას
6	უნაყოფო თუთა-Morus platanifolia fruitless	7.5	ჯანსაღი	ექვემდებარაბა გადარგვას და გახარებას

7	თეთრი ვერხვი- Populus alba	7.5	ჯანსაღი	ექვემდებარაბა გადარგვას და გახარებას
8	მუხა Quercus Robur	9	ჯანსაღი	ექვემდებარაბა გადარგვას და გახარებას
9	ჭყორი- Ilex cornuta Lindi	10	ჯანსაღი	ექვემდებარაბა გადარგვას და გახარებას
10	შავი ფიჭვი- Pinus nigra	9	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
11	შავი ფიჭვი- Pinus nigra	9	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
12	პავლონია- Paulownia	29	ჯანსაღი	არ ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
13	შავი ფიჭვი- Pinus nigra	8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
14	ტუია- Thuja occidentalis	1-6	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
15	შავი ფიჭვი- Pinus nigra	9.5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
16	შავი ფიჭვი- Pinus nigra	8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
17	შავი ფიჭვი- Pinus nigra	9	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
18	შავი ფიჭვი- Pinus nigra	9	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
19	შავი ფიჭვი- Pinus nigra	8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
20	შავი ფიჭვი- Pinus nigra	8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
21	შავი ფიჭვი- Pinus nigra	10	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
22	შავი ფიჭვი- Pinus nigra	44	ჯანსაღი	არ ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
23	კვიდო- Ligustrum vulgare	11-12	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
24	შავი ფიჭვი- Pinus nigra	30	ჯანსაღი	არ ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
25	შავი ფიჭვი- Pinus nigra	40	ჯანსაღი	არ ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას

26	შავი ფიჭვი-Pinus nigra	41	ჯანსაღი	არ ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
27	შავი ფიჭვი-Pinus nigra	34	ჯანსაღი	არ ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
28	ტუია-Thuja occidentalis	8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
29	ტუია-Thuja occidentalis	9	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
30	ტუია-Thuja occidentalis	7	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
31	ტუია-Thuja occidentalis	10	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
32	ტუია-Thuja occidentalis	7	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
33	ტუია-Thuja occidentalis	9	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
34	ტუია-Thuja occidentalis	10	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
35	ტუია-Thuja occidentalis	8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
36	ტუია-Thuja occidentalis	12	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
37	ტუია-Thuja occidentalis	9	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
38	ტუია-Thuja occidentalis	9	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
39	ტუია-Thuja occidentalis	12	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
40	ტუია-Thuja occidentalis	11	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას

41	ტუია- Thuja occidentalis	10	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
42	კვიდო- Ligustrum vulgare	18	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
43	კვიდო- Ligustrum vulgare	0.5-2	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
44	კვიდო- Ligustrum vulgare	11-12	ხმობადი	
45	კედარი- Cedrus deodara	52	ჯანსაღი	არ ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
46	კვიდო- Ligustrum vulgare	13	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
47	აღმოსავლური ბიოტა- Platycladus orientalis	11	ზეხმელი	
48	აღმოსავლური ბიოტა- Platycladus orientalis	15	ზეხმელი	
49	შავი ფიჭვი- Pinus nigra	43	ჯანსაღი	არ ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
50	შავი ფიჭვი- Pinus nigra	43	ჯანსაღი	არ ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
51	თუთა- Morus	48	ჯანსაღი	არ ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
52	შავი ფიჭვი- Pinus nigra	38	ჯანსაღი	არ ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
53	კვიდო- Ligustrum vulgare	10	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
54	ჭყორი- Ilex cornuta Lindi	12	ჯანსაღი	ექვემდებარაბა გადარგვას და გახარებას
55	ნანდინა - Nandina domestica	1-2	ჯანსაღი	ექვემდებარაბა გადარგვას და გახარებას

56	ფოტინია- Photinia red robin	1-7	ჯანსაღი	ექვემდებარაბა გადარგვას და გახარებას
57	ნანდინა - Nandina domestica	1-2	ჯანსაღი	ექვემდებარაბა გადარგვას და გახარებას
58	ფოტინია- Photinia red robin	3-5	ჯანსაღი	ექვემდებარაბა გადარგვას და გახარებას
59	ნანდინა - Nandina domestica	1-2	ჯანსაღი	ექვემდებარაბა გადარგვას და გახარებას
60	ფოტინია- Photinia red robin	2-5	ჯანსაღი	ექვემდებარაბა გადარგვას და გახარებას
61	ნანდინა - Nandina domestica	1-2	ჯანსაღი	ექვემდებარაბა გადარგვას და გახარებას
62	ფოტინია- Photinia red robin	2-7	ჯანსაღი	ექვემდებარაბა გადარგვას და გახარებას
63	ნანდინა - Nandina domestica	1-2	ჯანსაღი	ექვემდებარაბა გადარგვას და გახარებას
64	ნანდინა - Nandina domestica	0.5-1	ჯანსაღი	ექვემდებარაბა გადარგვას და გახარებას
65	ნანდინა - Nandina domestica	0.5-1	ჯანსაღი	ექვემდებარაბა გადარგვას და გახარებას
66	ნანდინა - Nandina domestica	0.5-1	ჯანსაღი	ექვემდებარაბა გადარგვას და გახარებას
67	ნანდინა - Nandina domestica	0.5-1	ჯანსაღი	ექვემდებარაბა გადარგვას და გახარებას
68	ნანდინა - Nandina domestica	0.5-1	ჯანსაღი	ექვემდებარაბა გადარგვას და გახარებას
69	პავლონია- Paulownia	5	ჯანსაღი	ექვემდებარაბა გადარგვას და გახარებას
70 - 200	ჭანჭყატი- Euonymus japonicus Aureus	0.5-2	ჯანსაღი	ცოცხალი ღობე(131 ძირი) ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას

აღწერილი ნარგავების რაოდენობა	200
ხილ კენკროვანი ნარგავების რაოდენობა	0
ზეხმელი ნარგავების რაოდენობა	2
ხმობადი ნარგავების რაოდენობა	1
ფაუტი ნარგავების რაოდენობა	0

ტერიტორიის მდგომარების ამსახველი ფოტო-მასალა იხილეთ დანართის სახით.

მწვანე ნარგავების (მერქნიანი მცენარეების) ვიზუალური დათვალიერება განახორციელა თეიმურაზ ნაფეტვარიძემ, რომელიც ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის 2024 წლის 18 იანვრის N 1-28 ბრძანებით დარეგისტრირდა გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის მონაცემთა ბაზაში მწვანე ნარგავების ხარისხობრივი შეფასებაზე დასკვნის გამცემ უფლებამოსილ პირად.

შემსრულებელი თეიმურაზ ნაფეტვარიძე

ექსპერტი-დენდროლოგი: Teimurazi Napetvaridze 01027069659 Digitally signed by Teimurazi Napetvaridze Date: 2026.06.29 21:44:14

Tel: 599 599 24 42 95

ნარგავი N 1



ნარგავი N 2



ნარგავი N 3



ნარგავი N 4



ნარგავი N 5



ნარგავი N 6



ნარგავი N 7



ნარგავი N 8

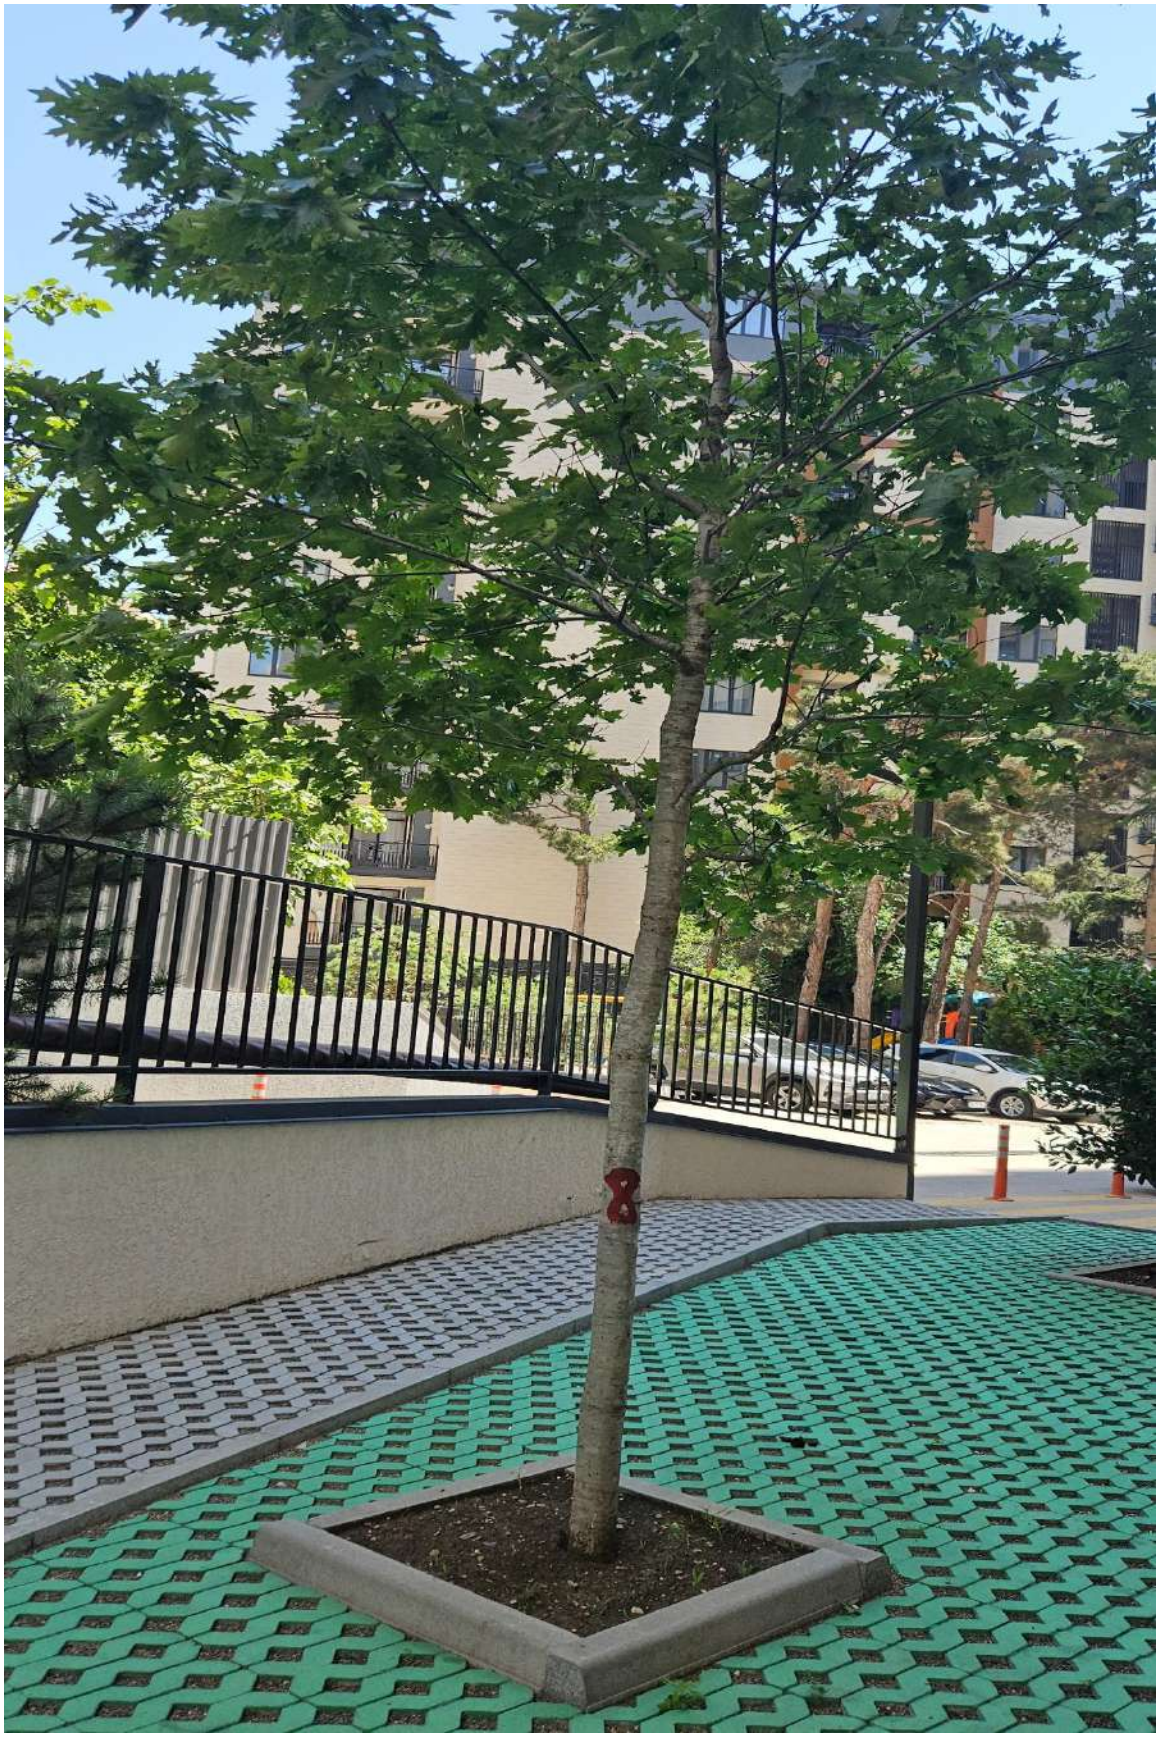

ნარგავი N 9



ნარგავი N 10



ნარგავი N 11

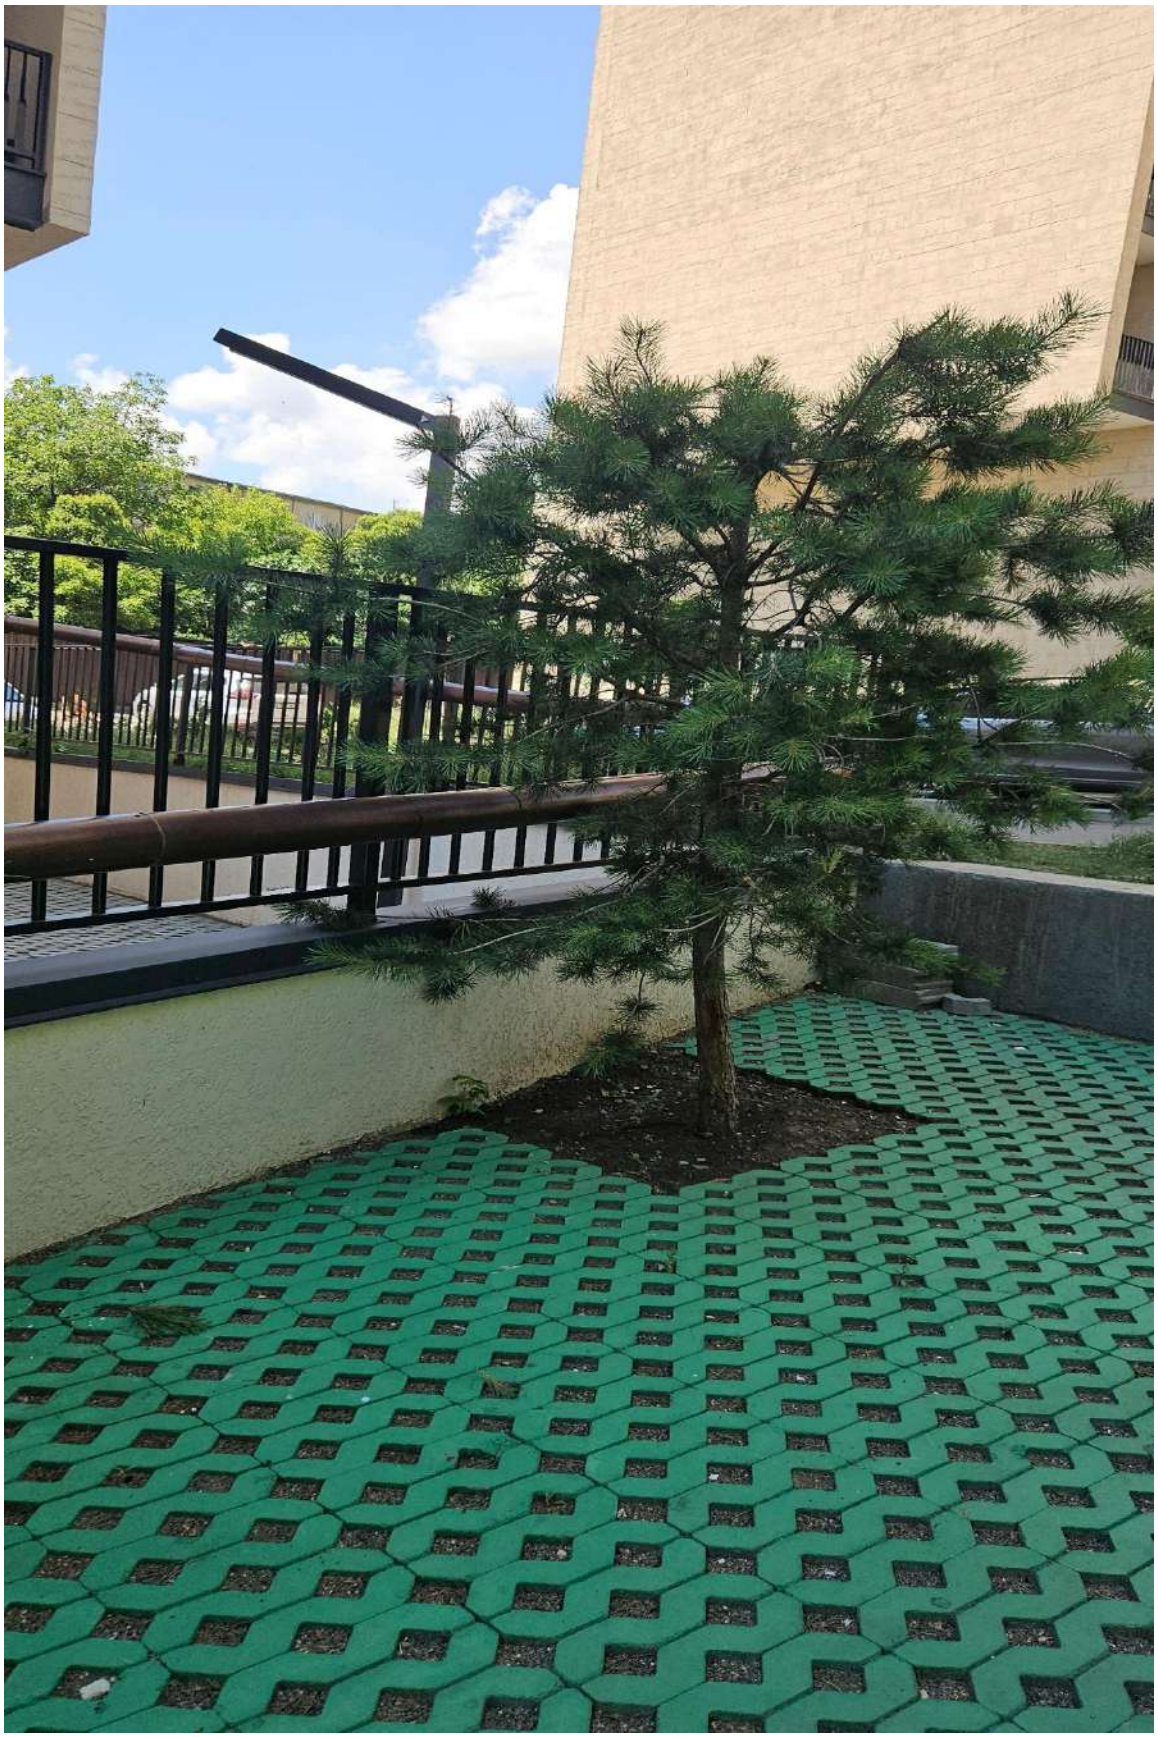

ნარგავი N 12



ნარგავი N 13

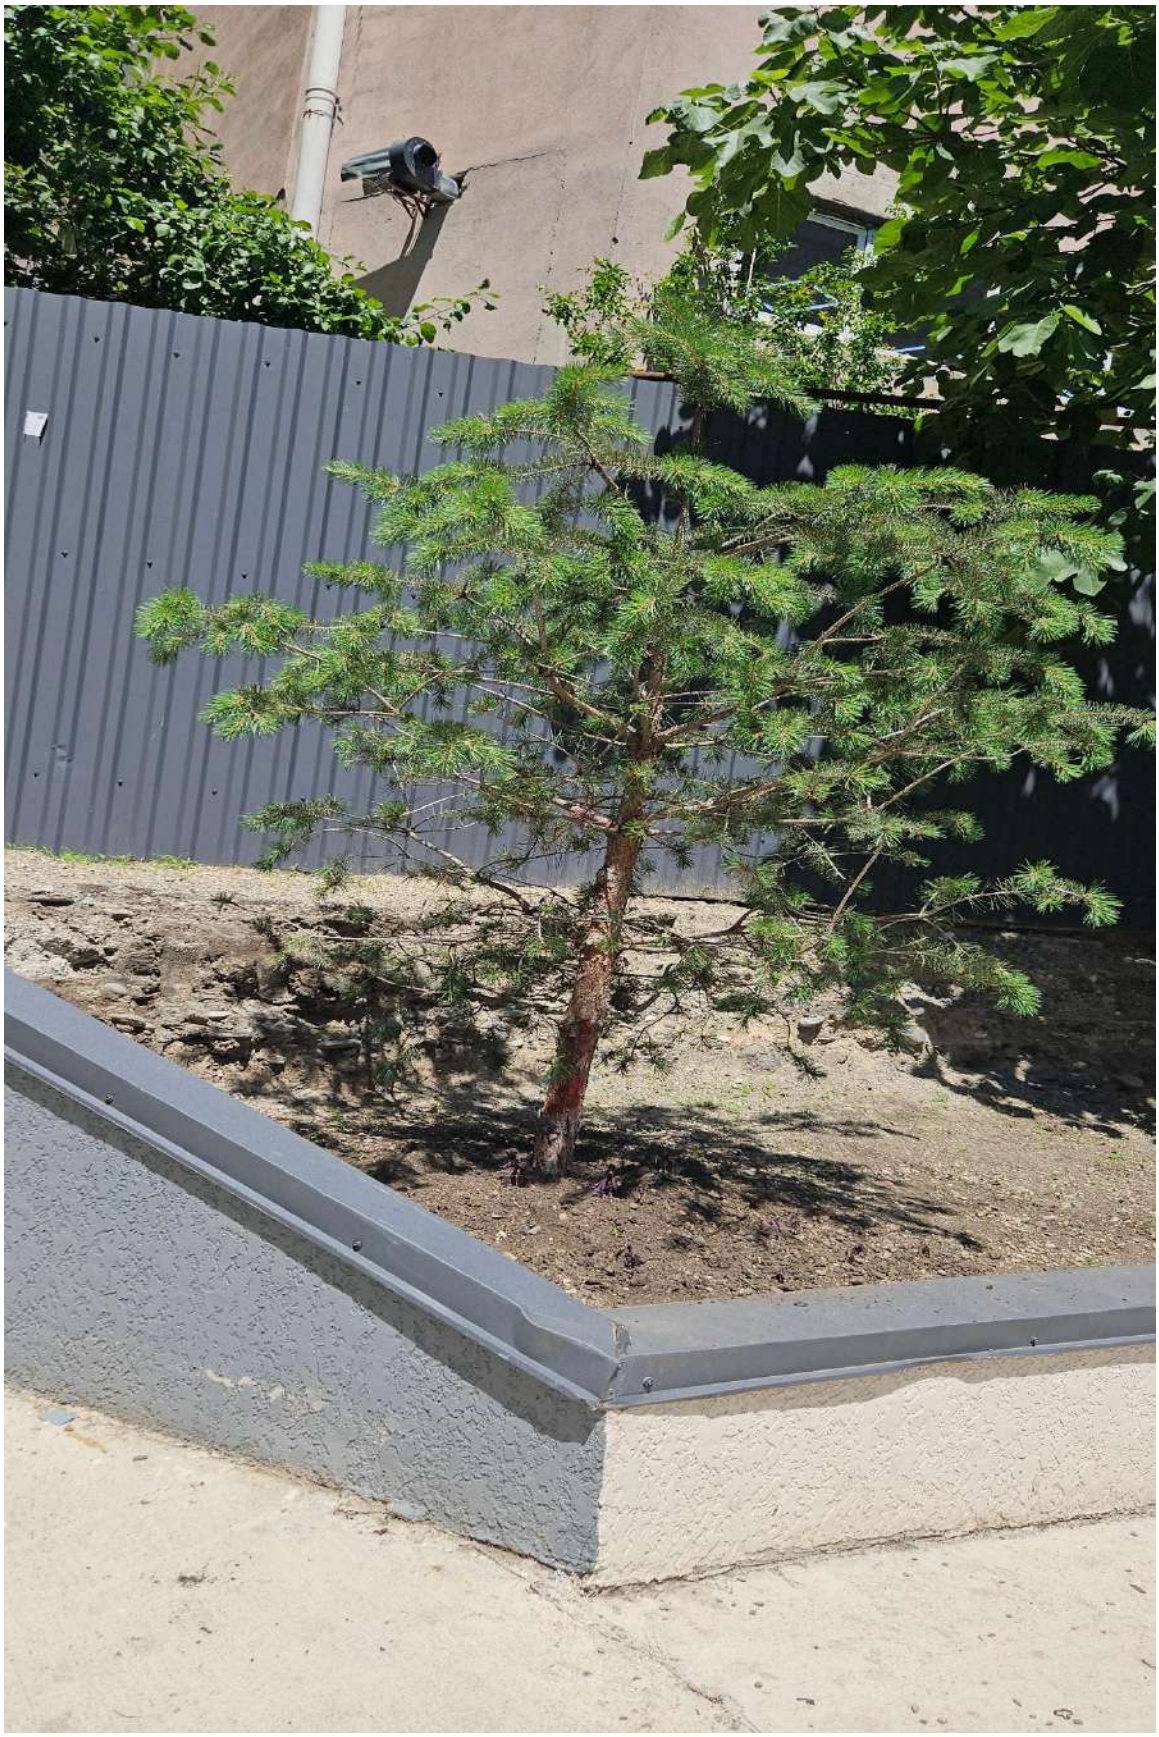

ნარგავი N 14



ნარგავი N 15



ნარგავი N 16



ნარგავი N 17



ნარგავი N 18

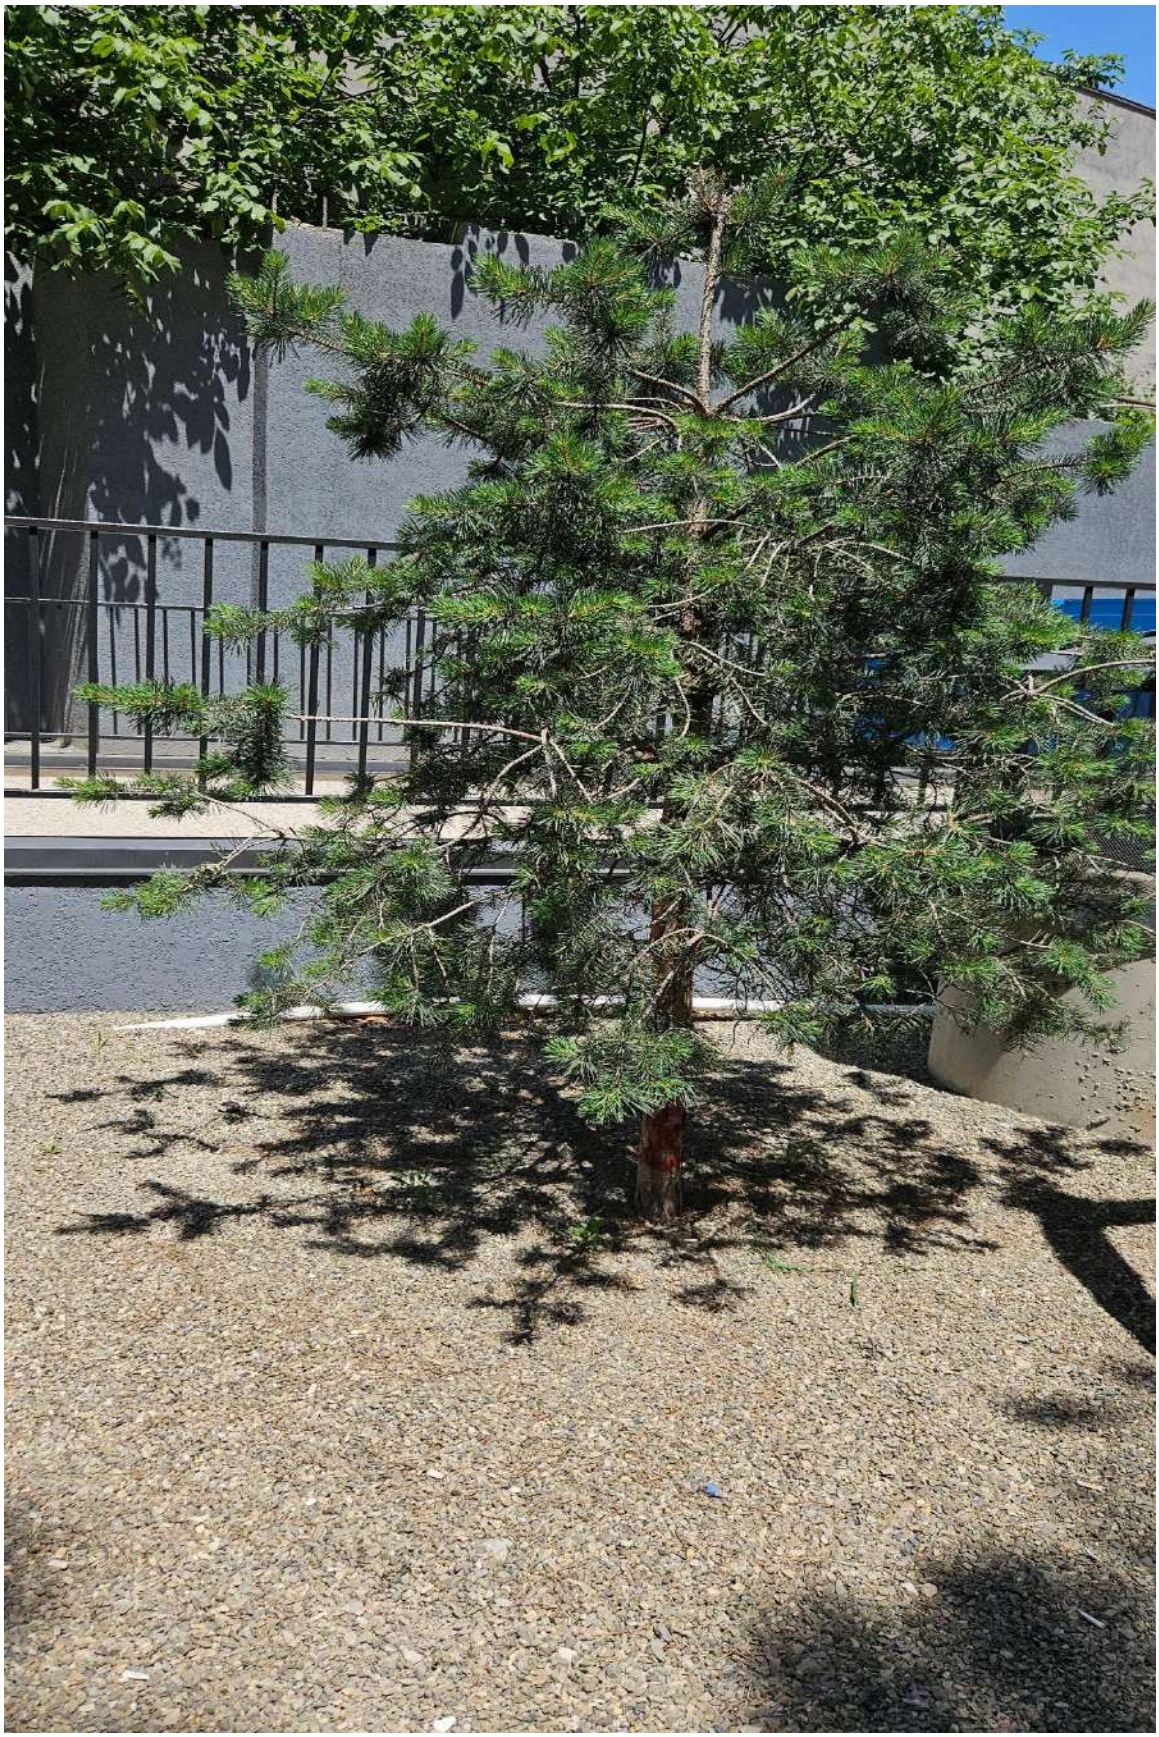

ნარგავი N 19



ნარგავი N 20

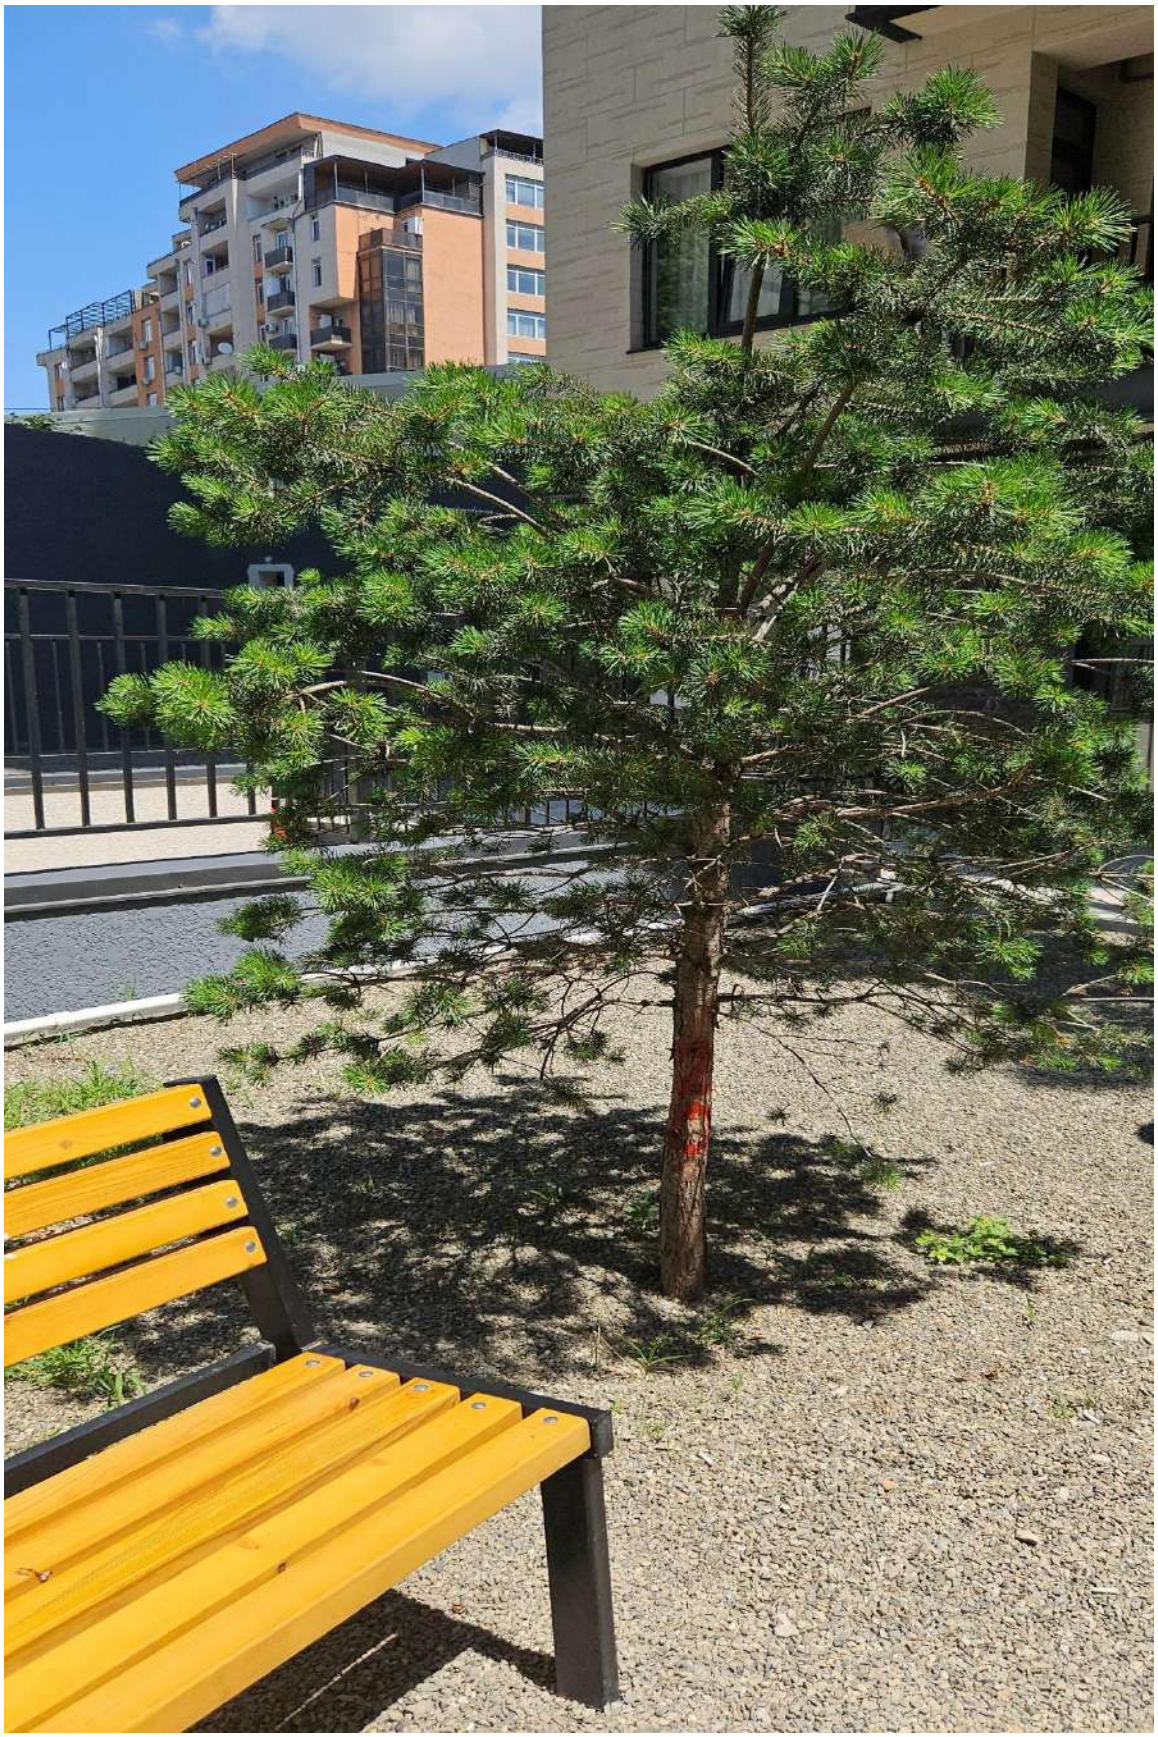

ნარგავი N 21



ნარგავი N 22

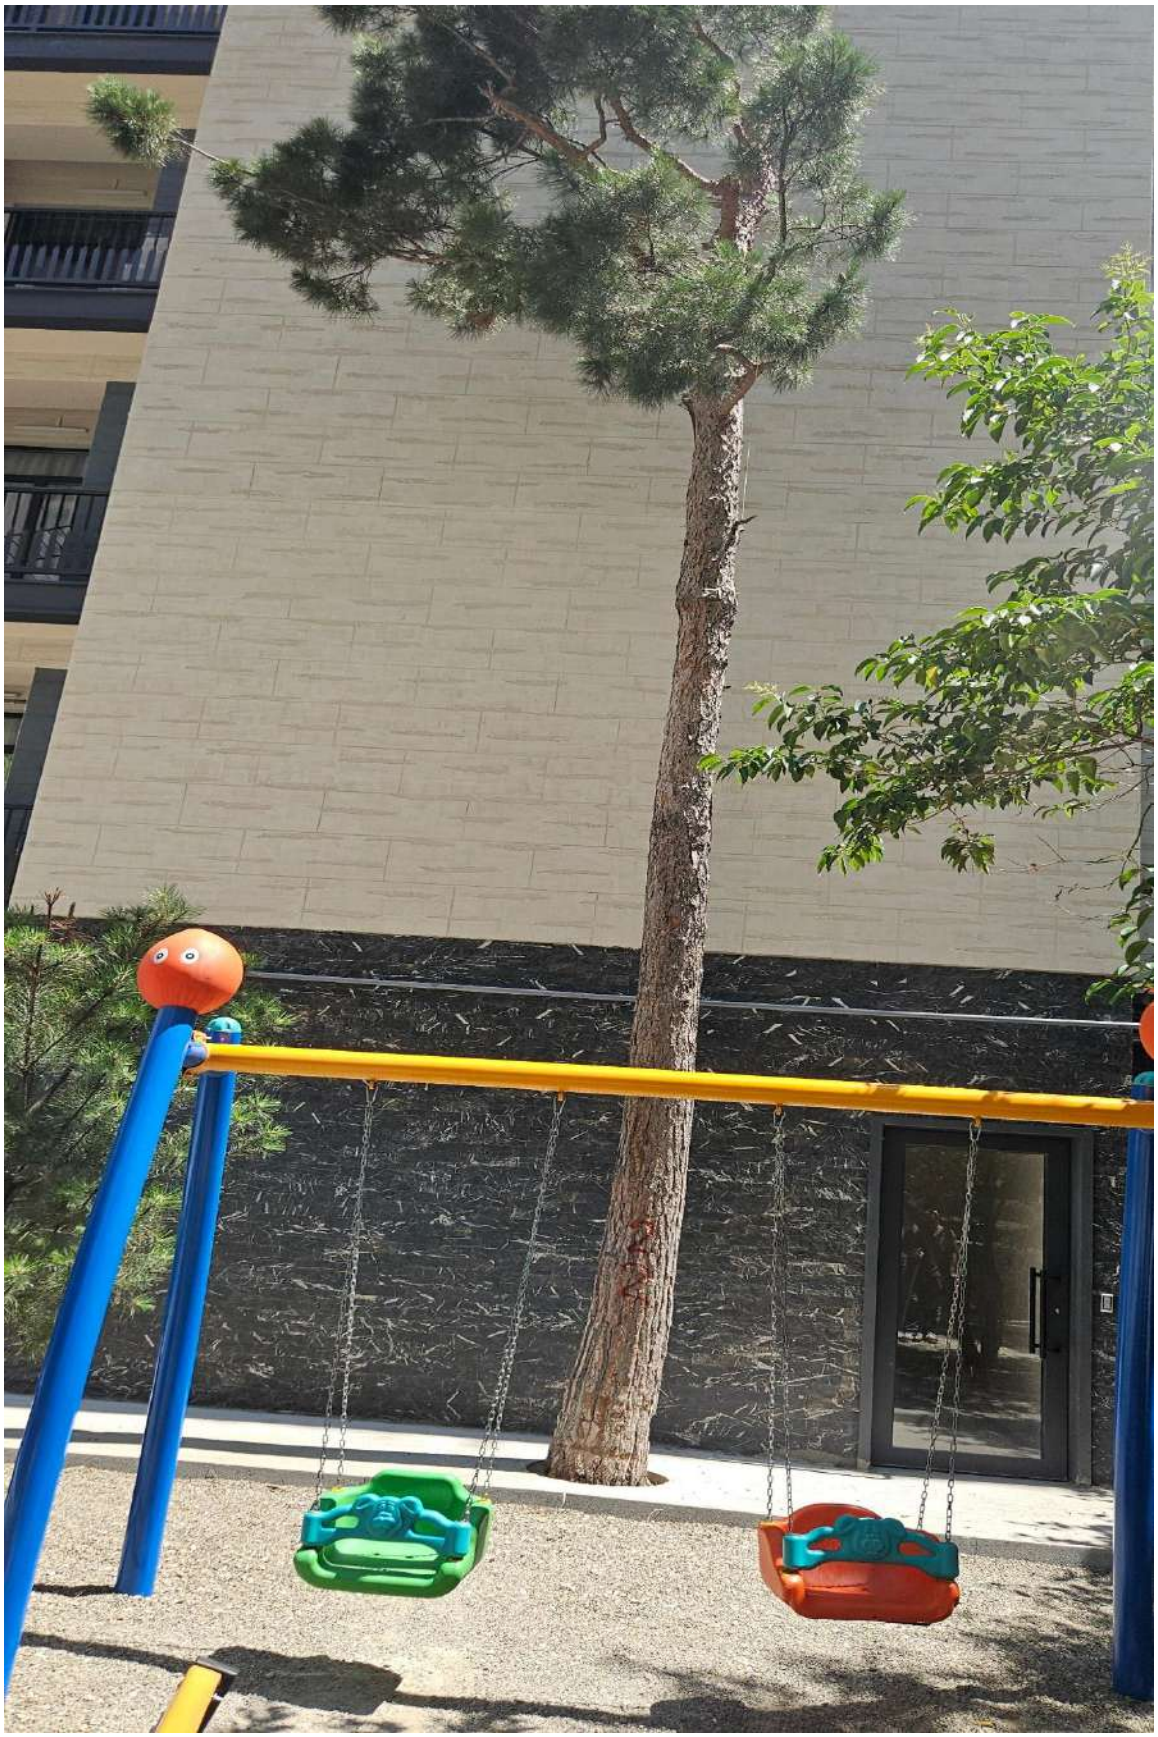

ნარგავი N 23

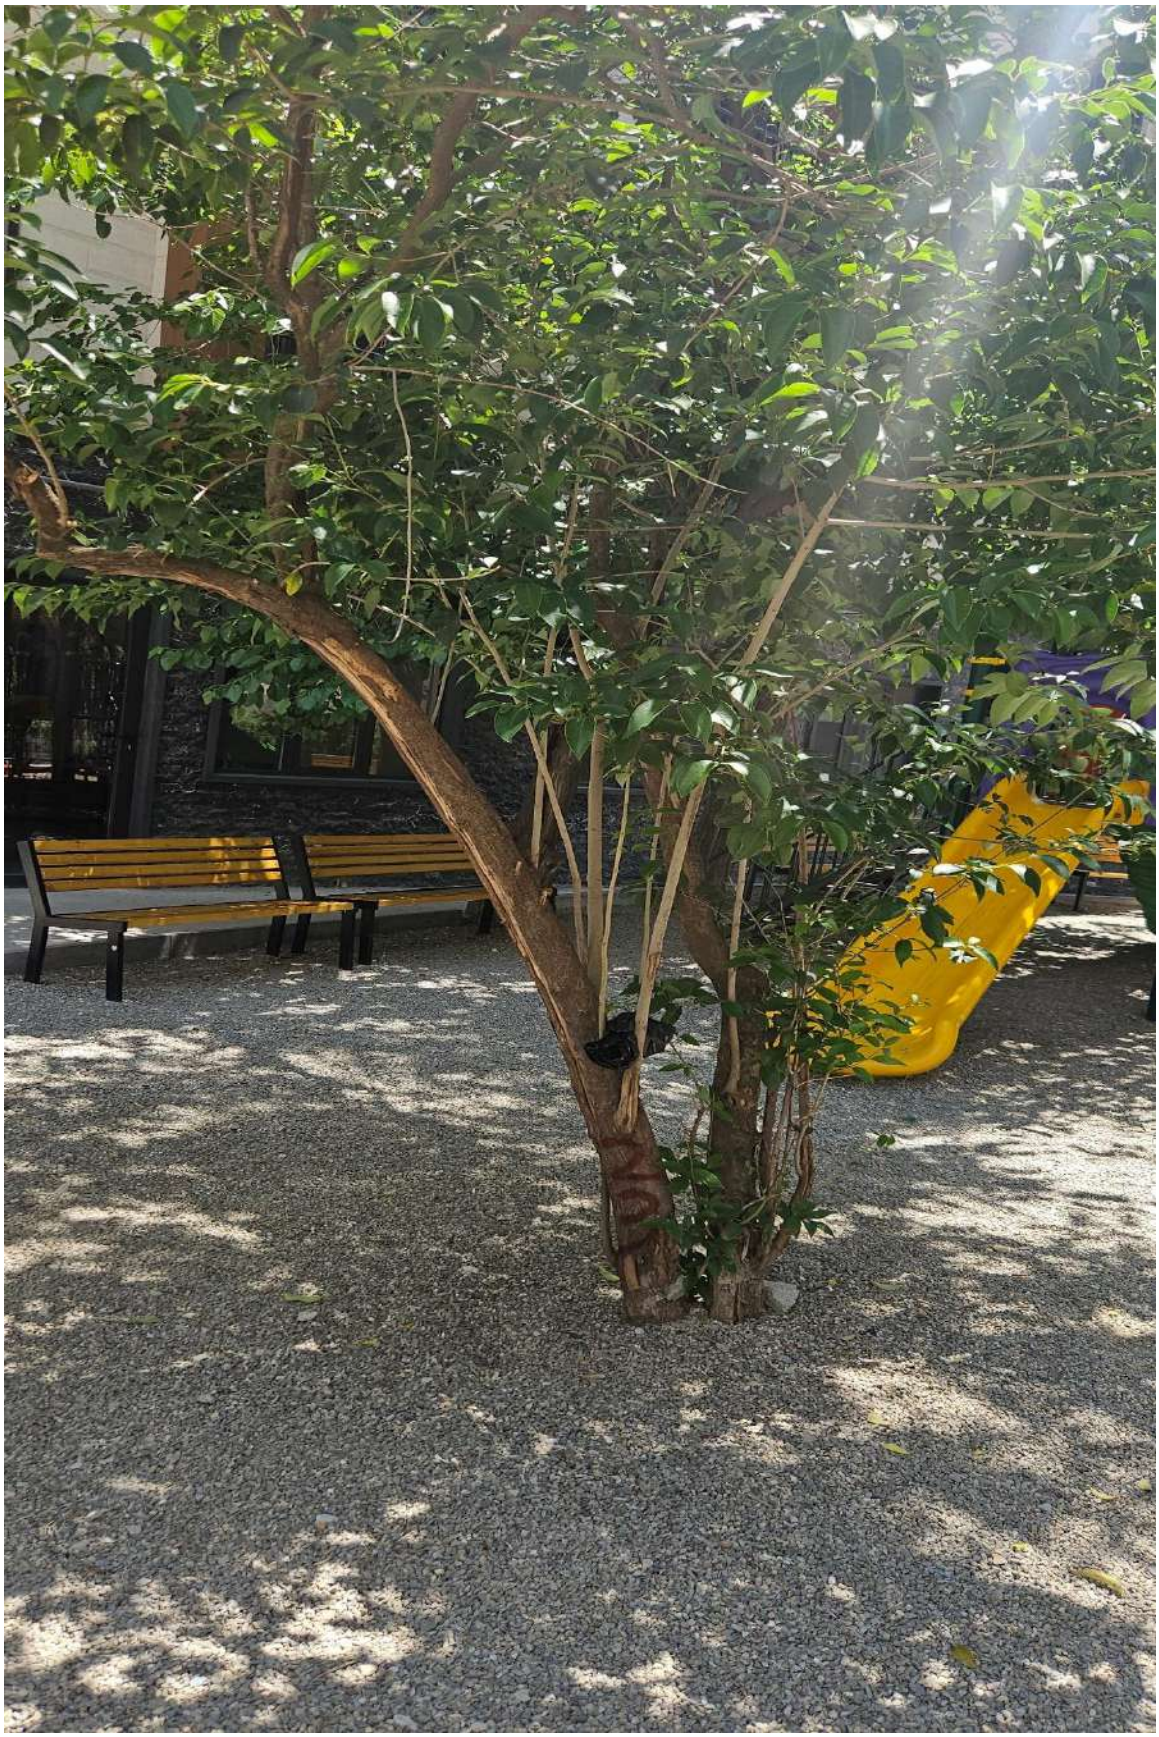

ნარგავი N 24



ნარგავი N 25

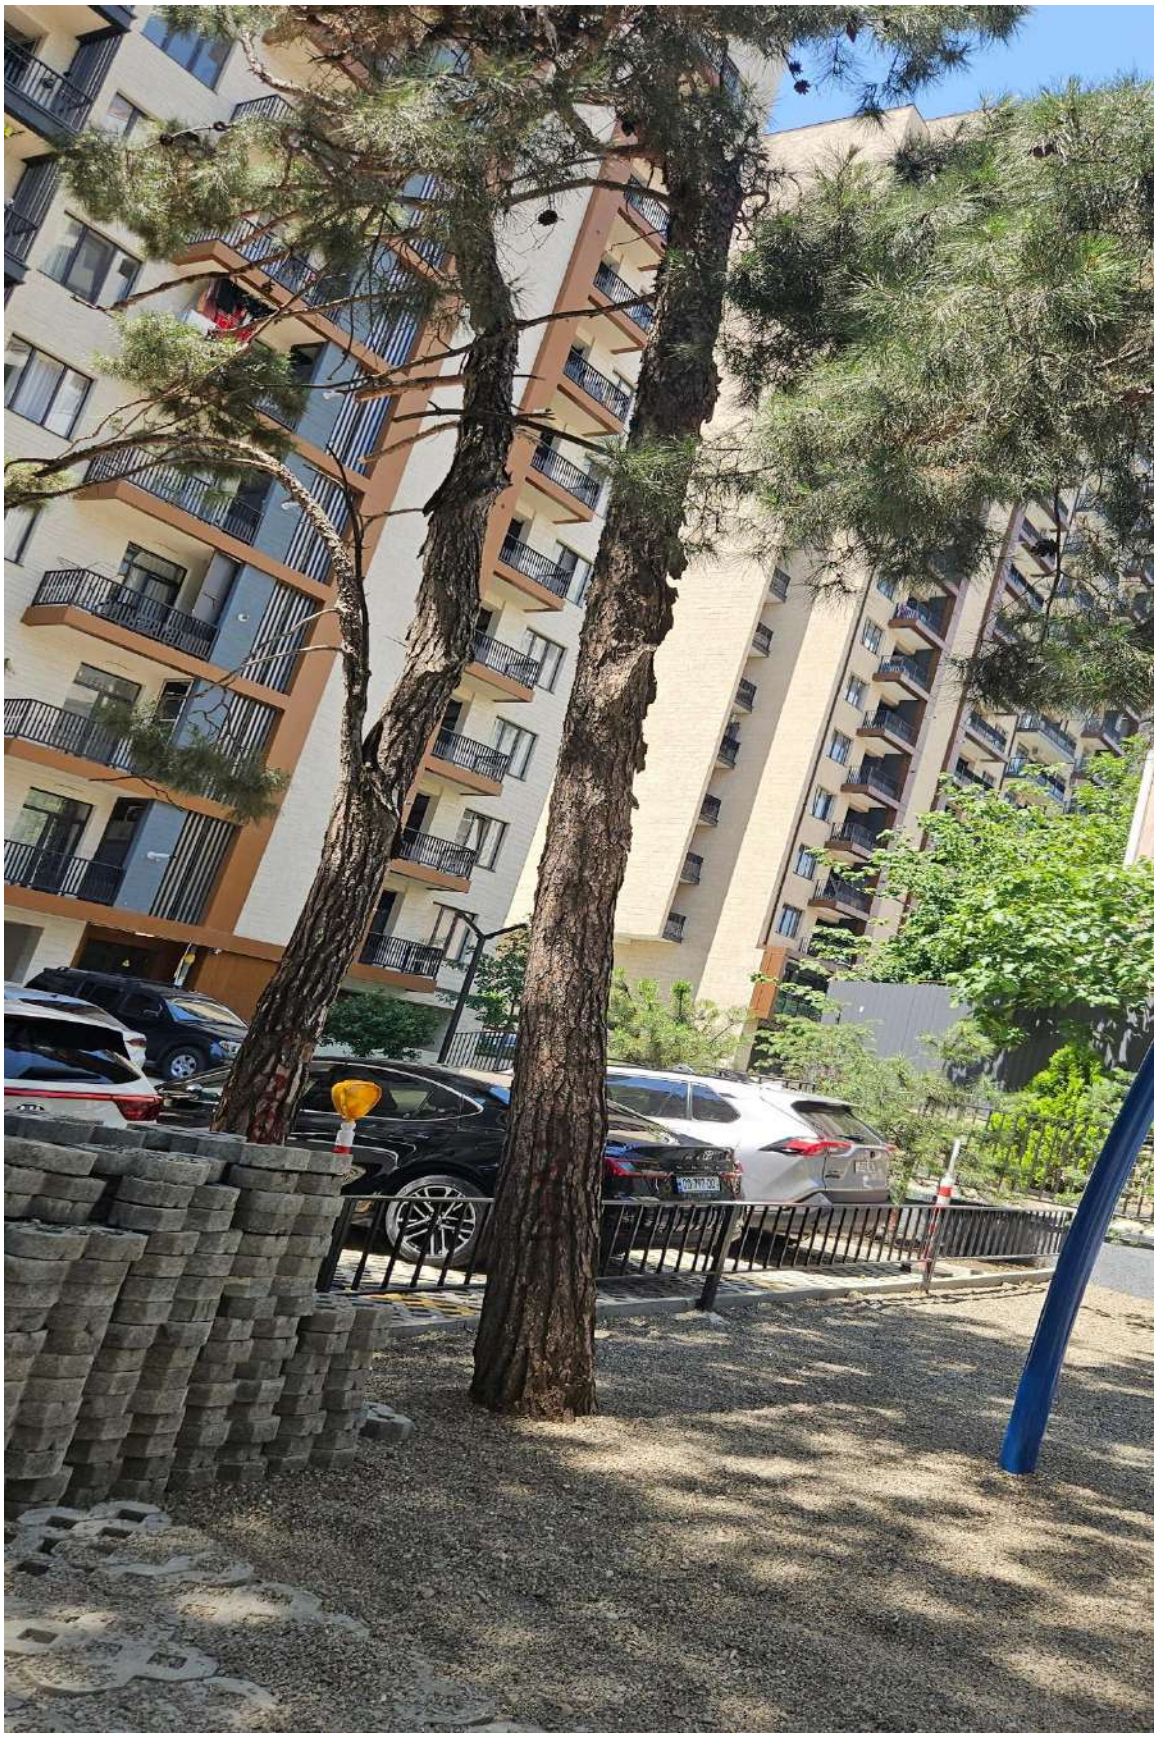

ნარგავი N 26



ნარგავი N 27

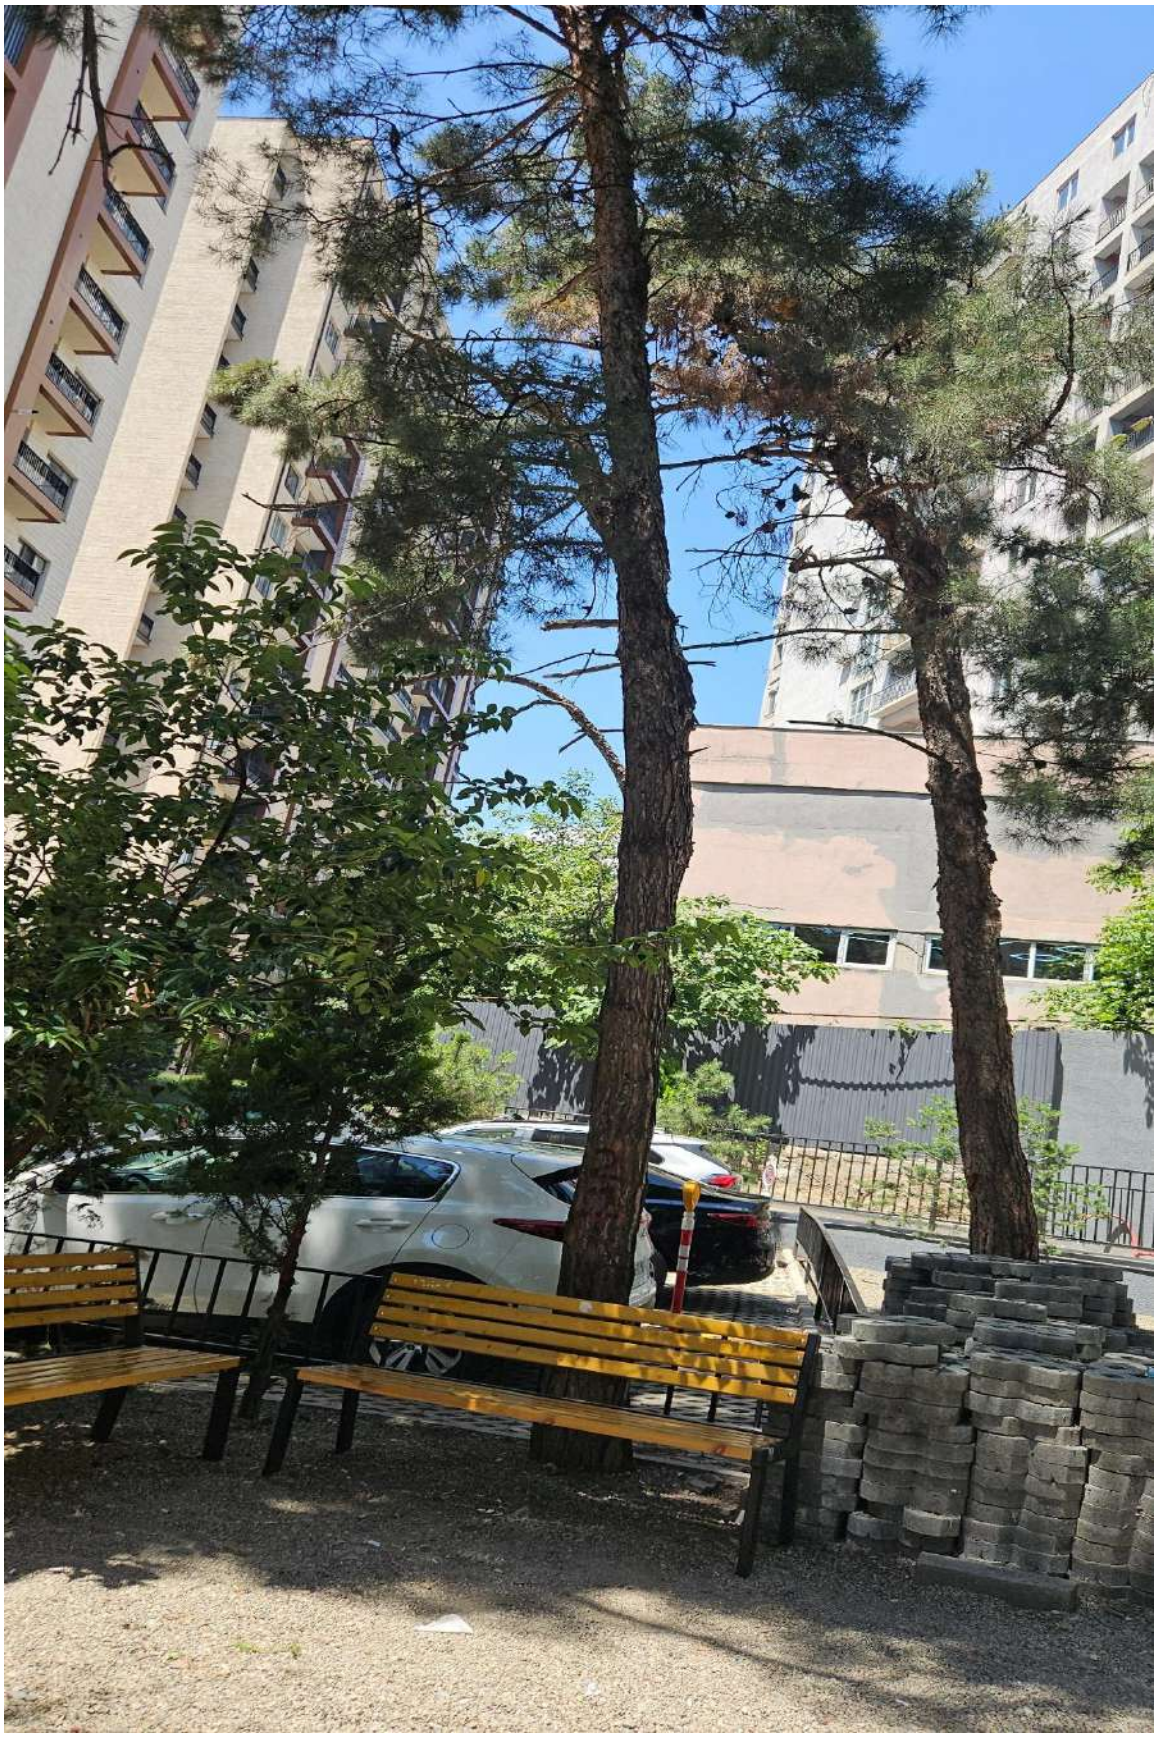

ნარგავი N 28

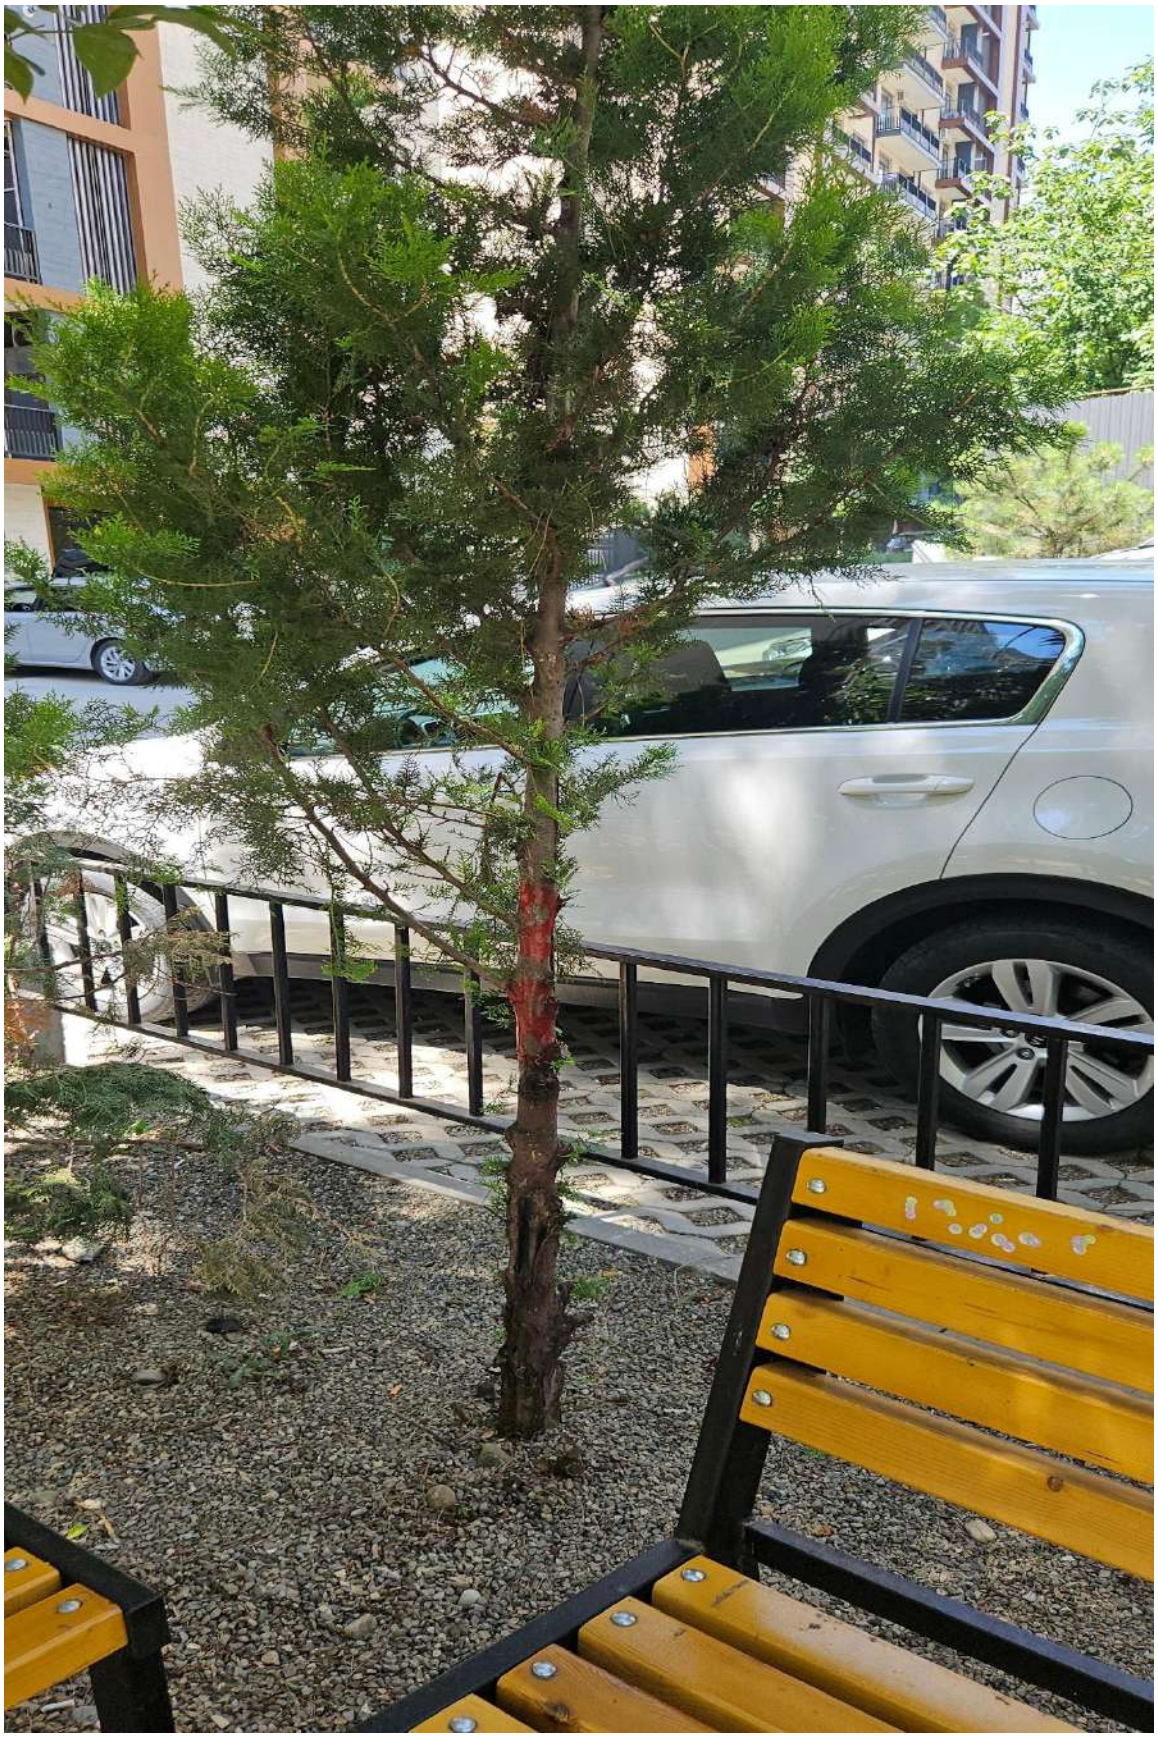

ნარგავი N 29

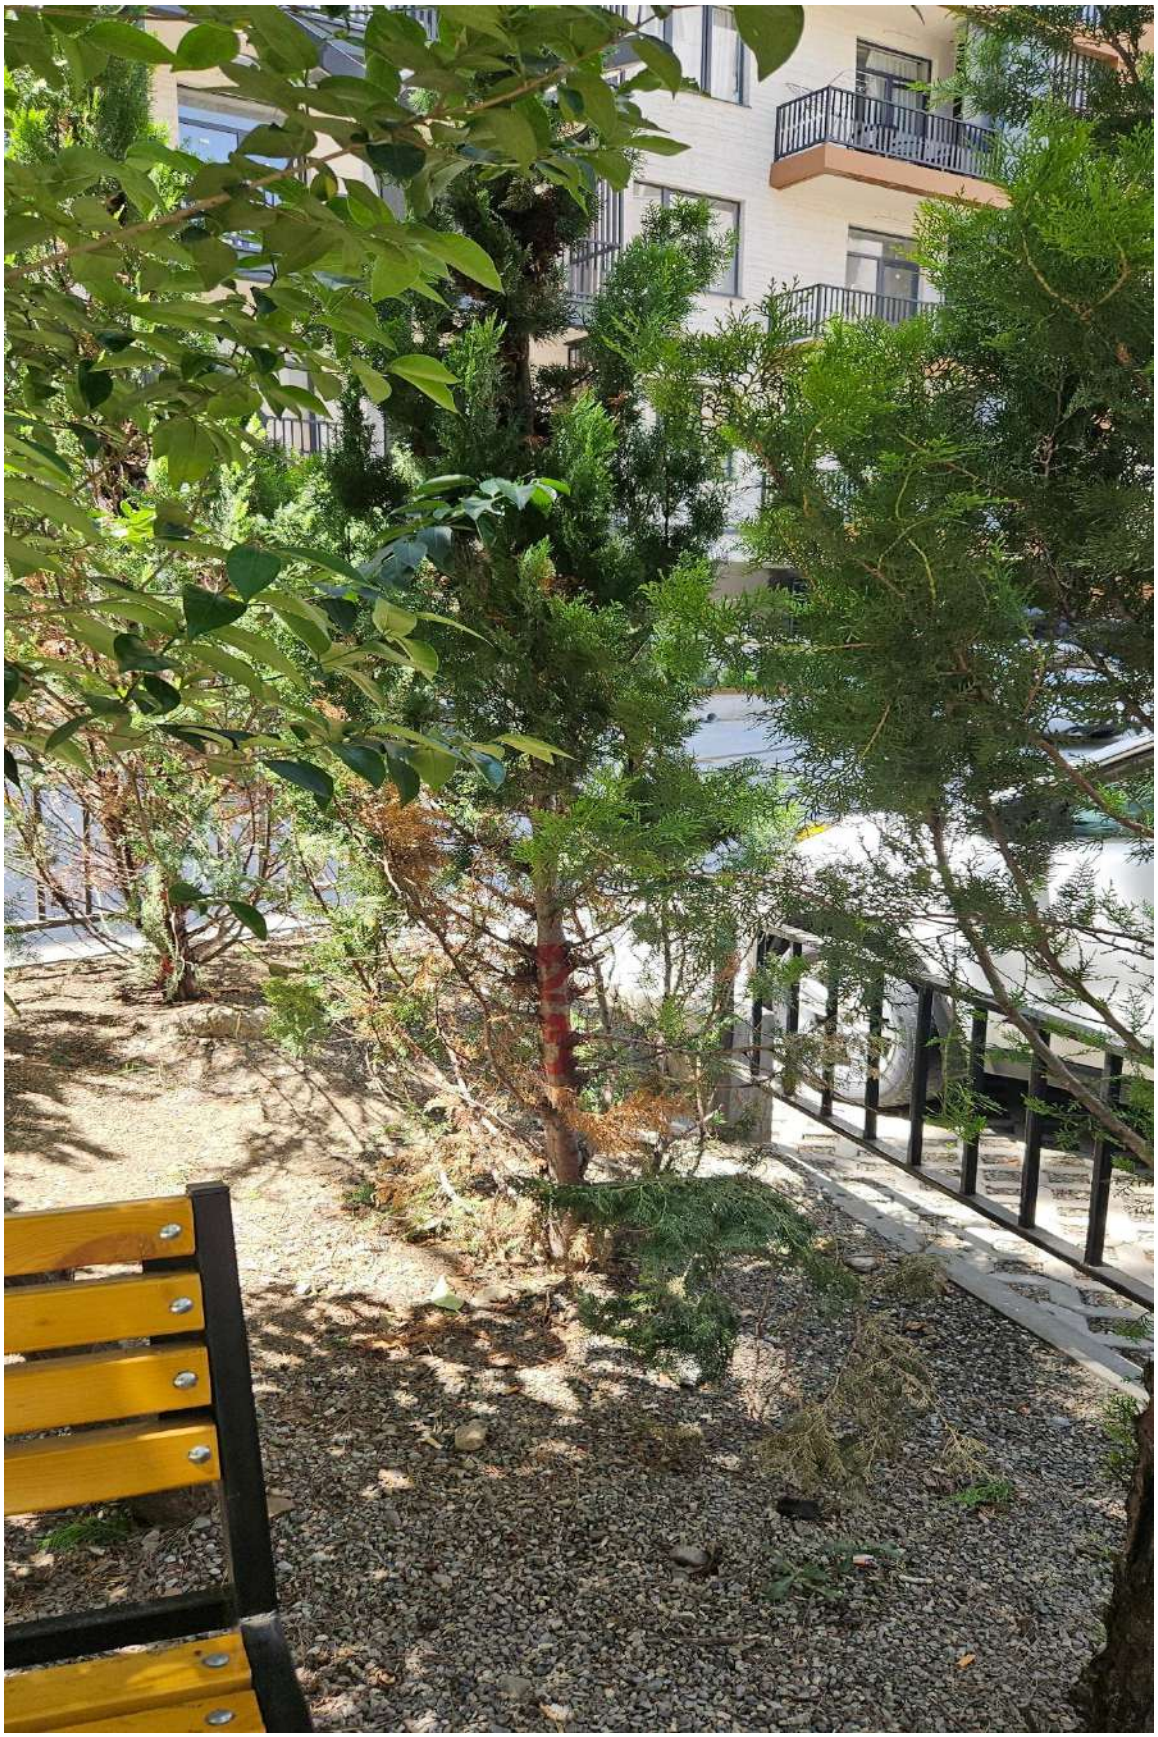

ნარგავი N 30



ნარგავი N 31



ნარგავი N 32



ნარგავი N 33



ნარგავი N 34



ნარგავი N 35



ნარგავი N 36



ნარგავი N 37



ნარგავი N 38



ნარგავი N 39



ნარგავი N 40



ნარგავი N 41



ნარგავი N 42

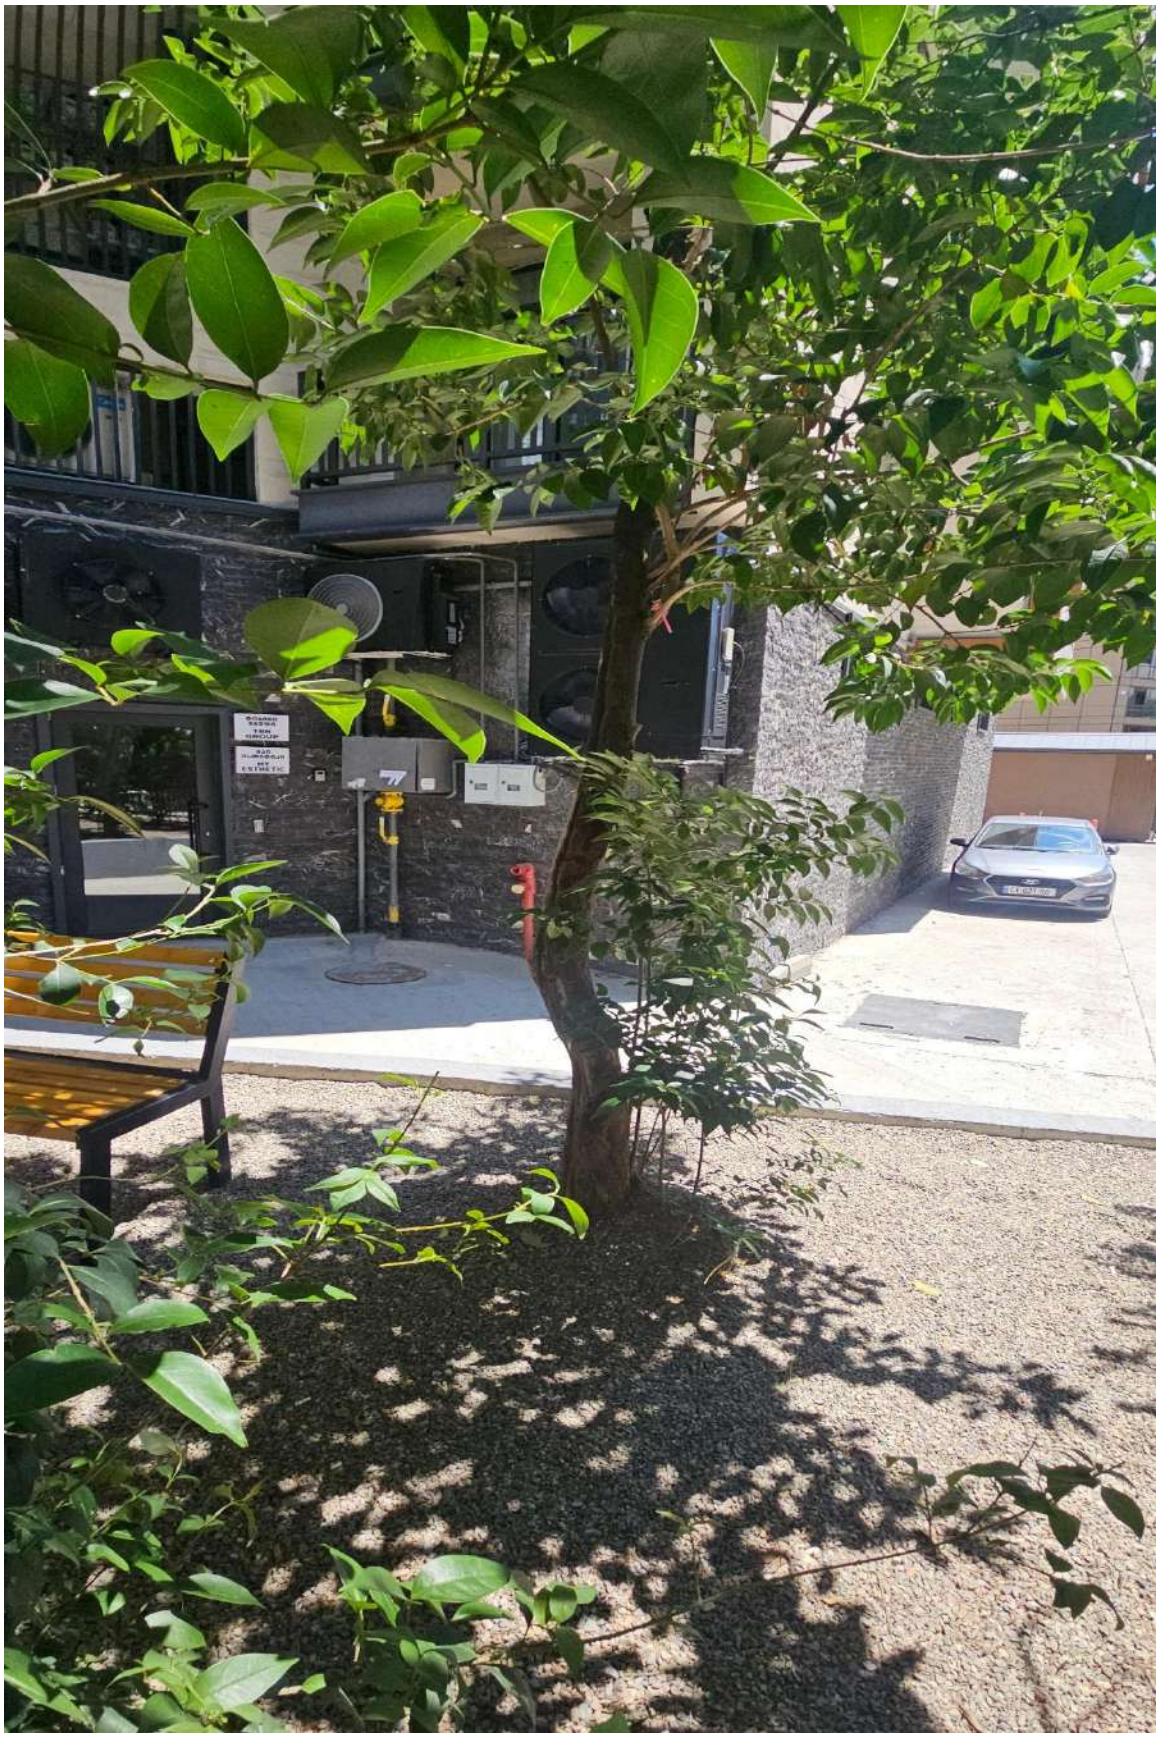

ნარგავი N 43



ნარგავი N 44



ნარგავი N 45

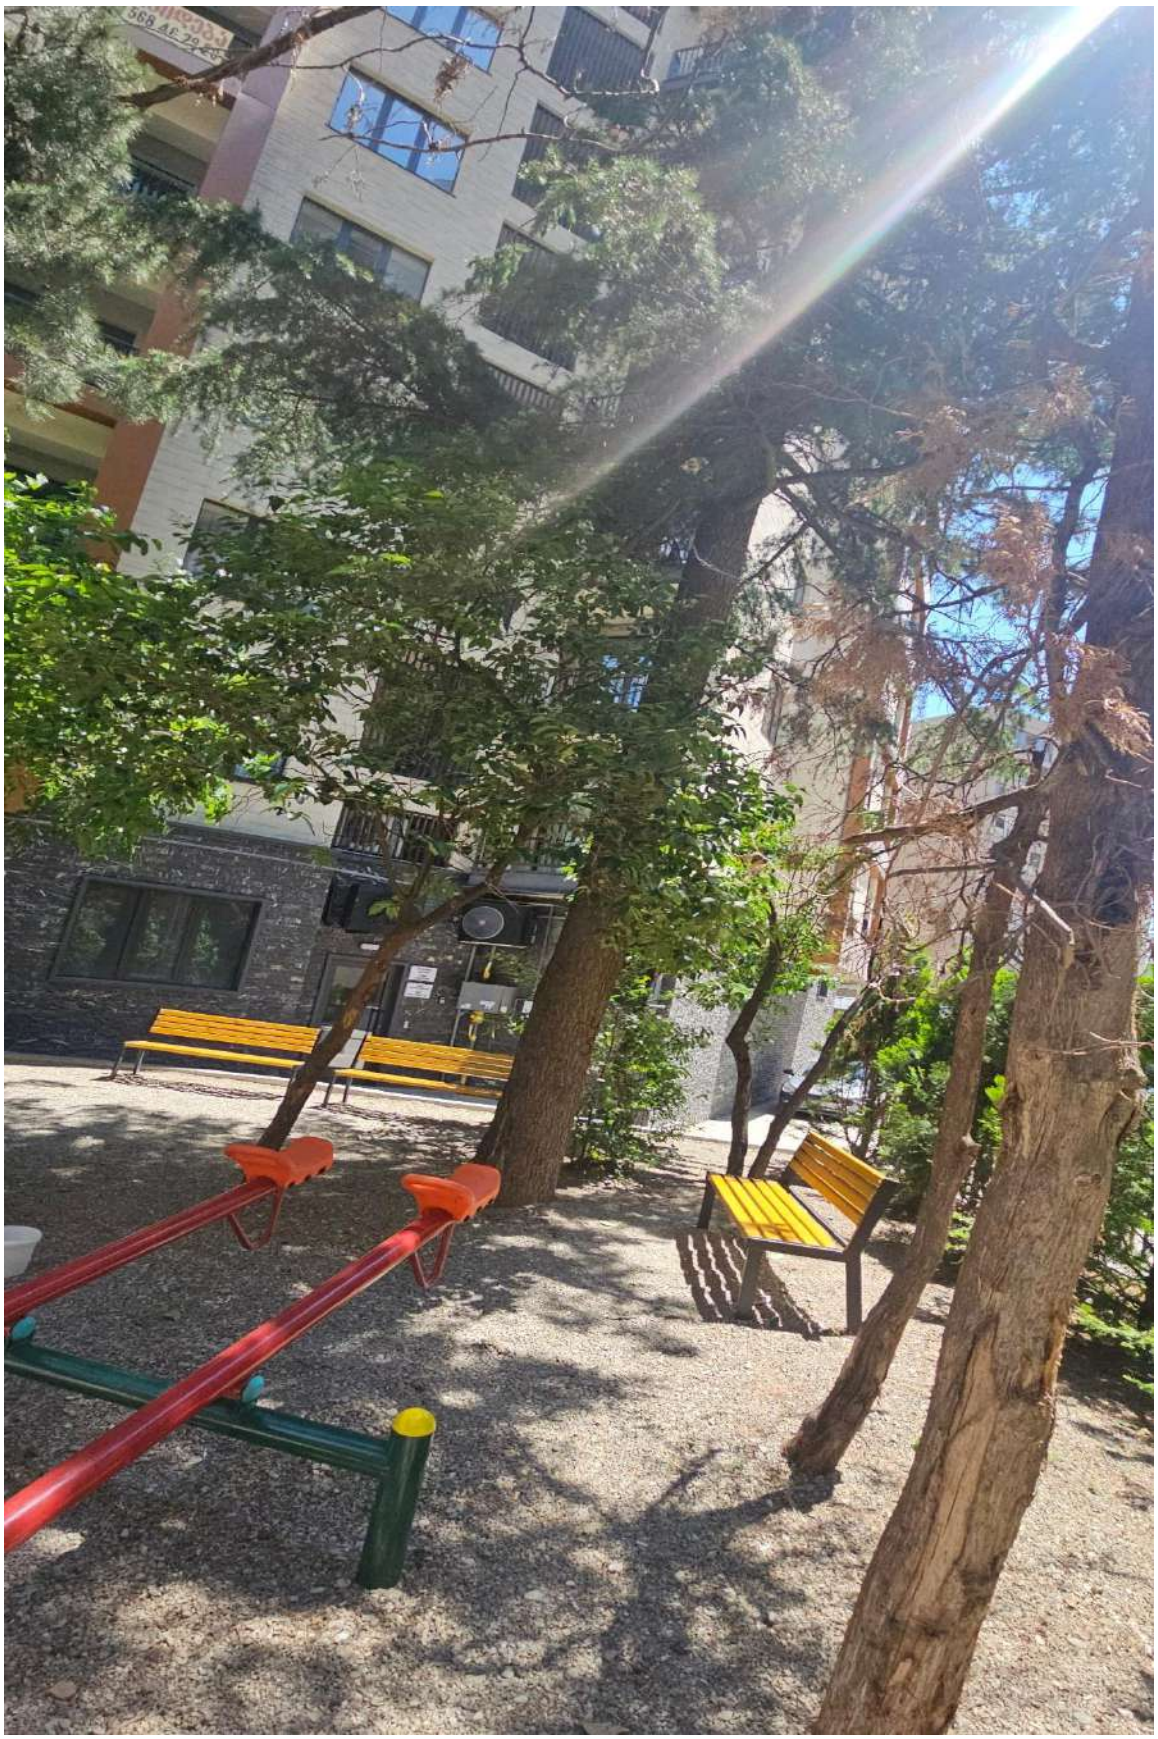

ნარგავი N 46



ნარგავი N 47

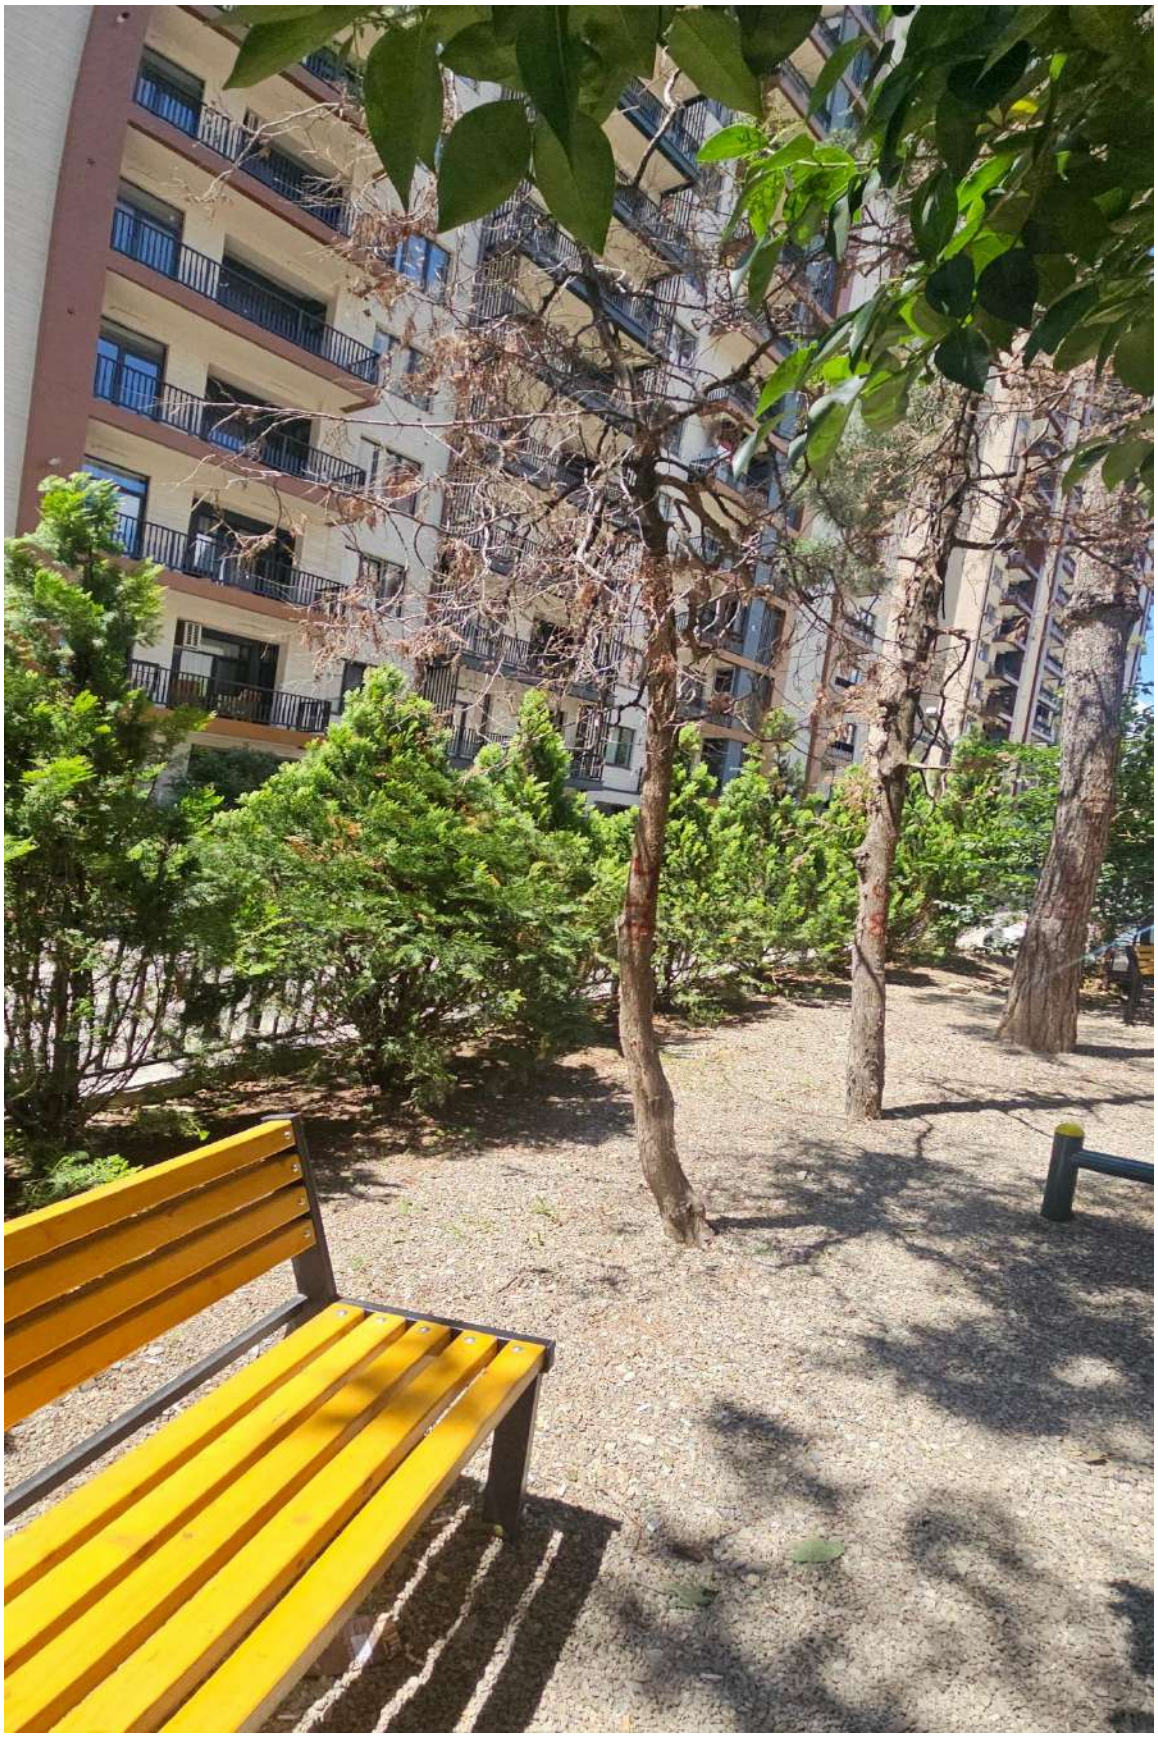

ნარგავი N 48



ნარგავი N 49



ნარგავი N 50



ნარგავი N 51

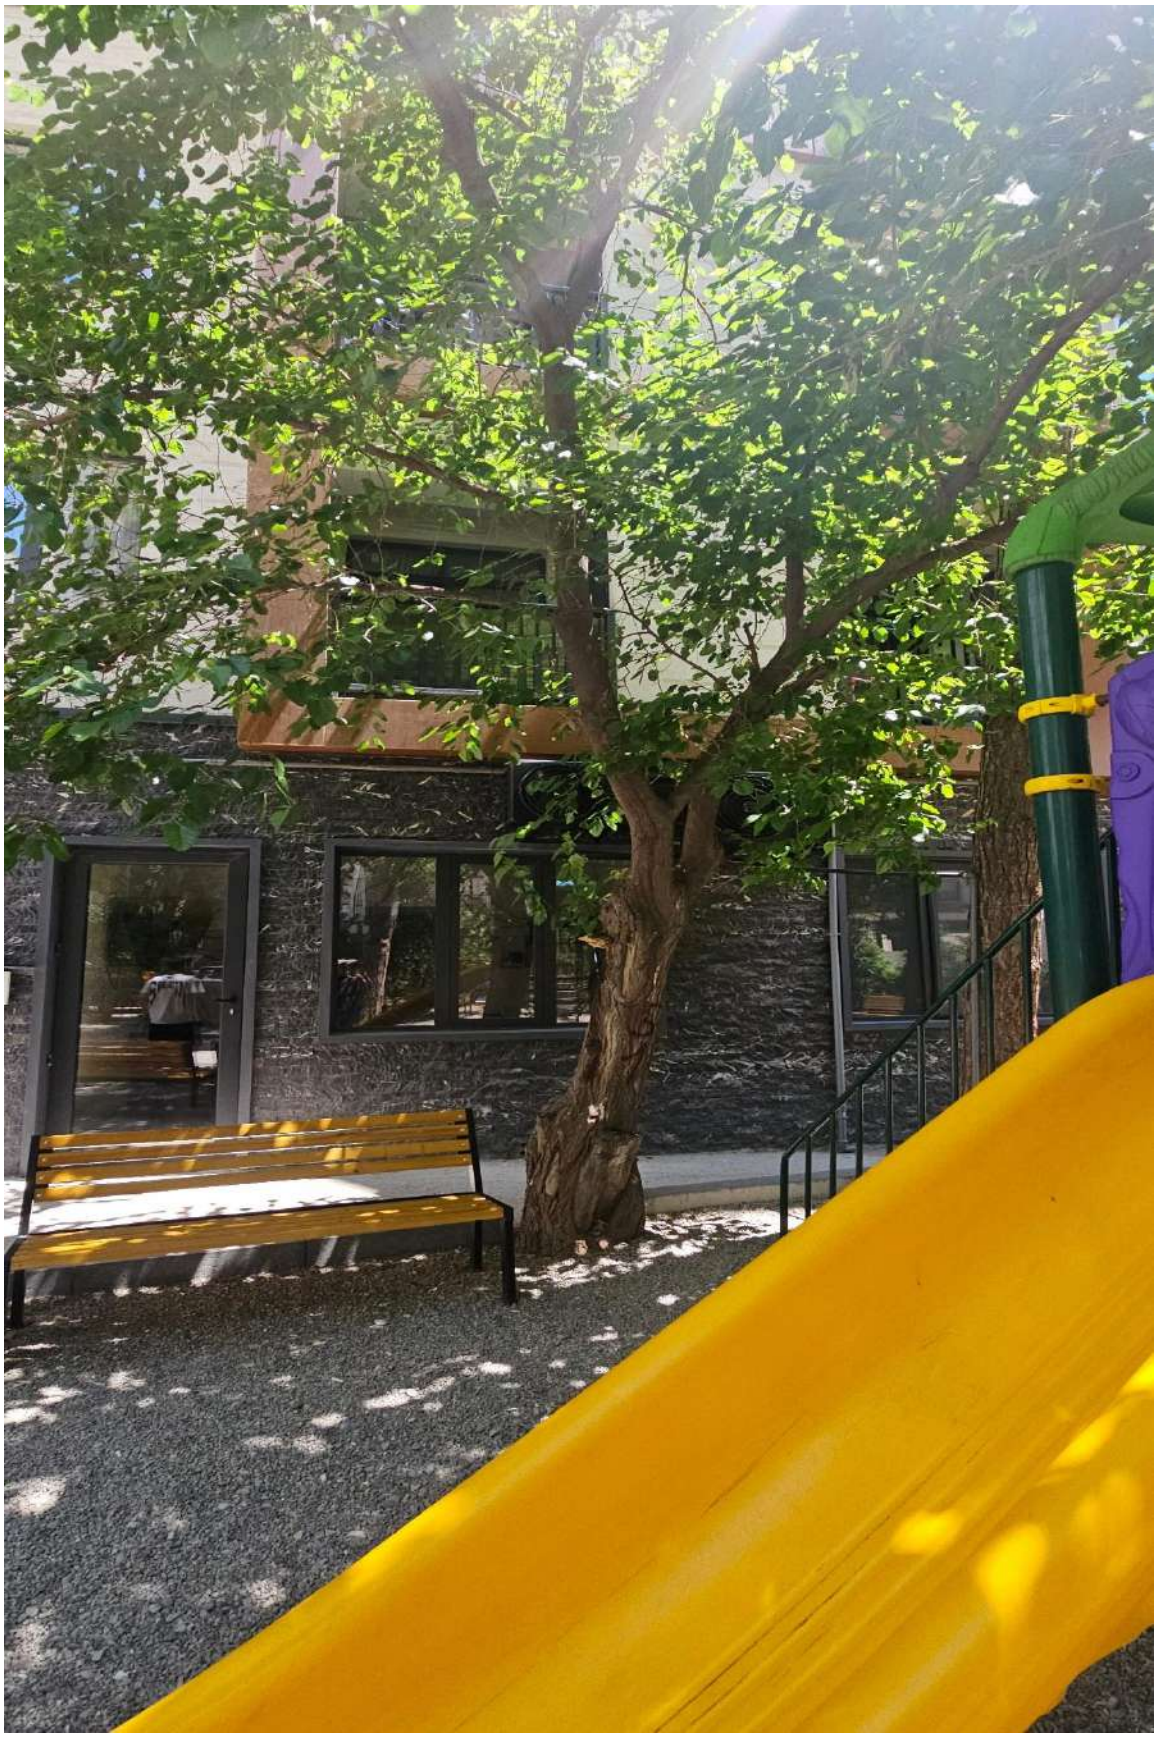

ნარგავი N 52

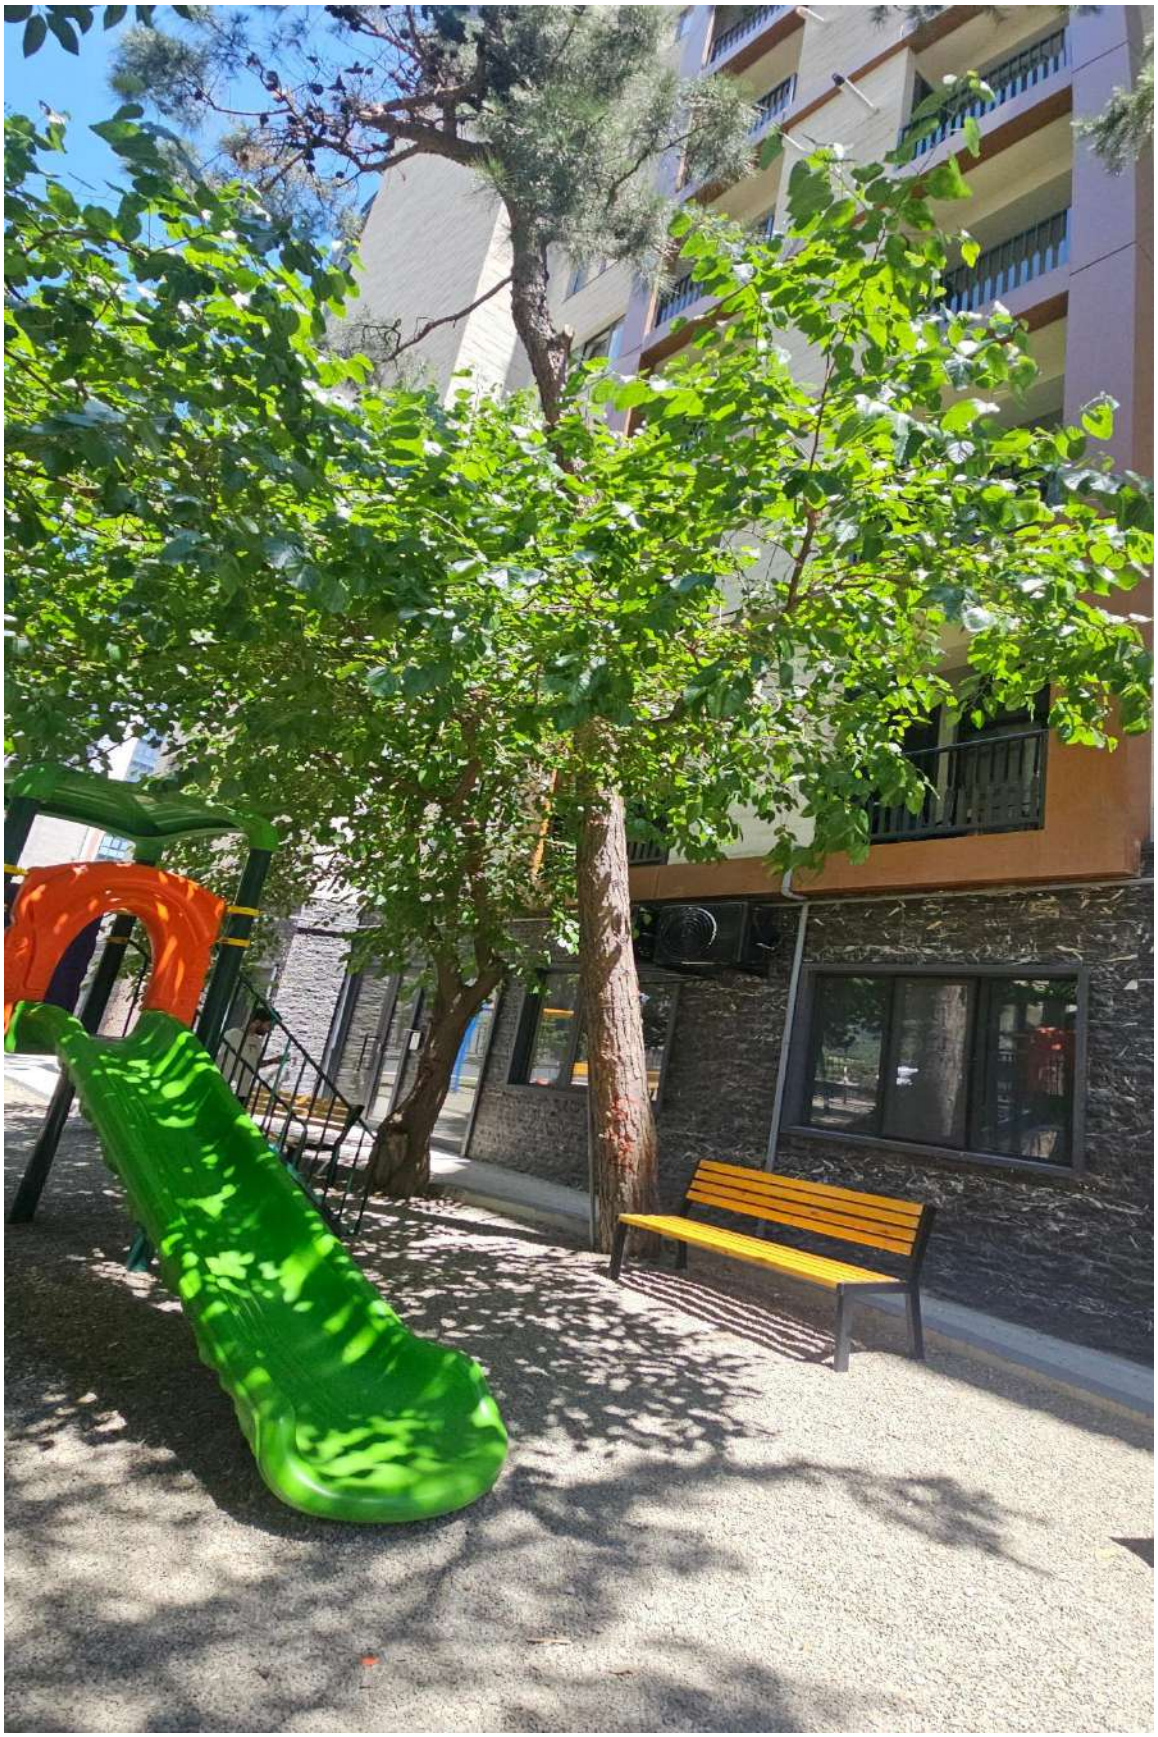

ნარგავი N 53

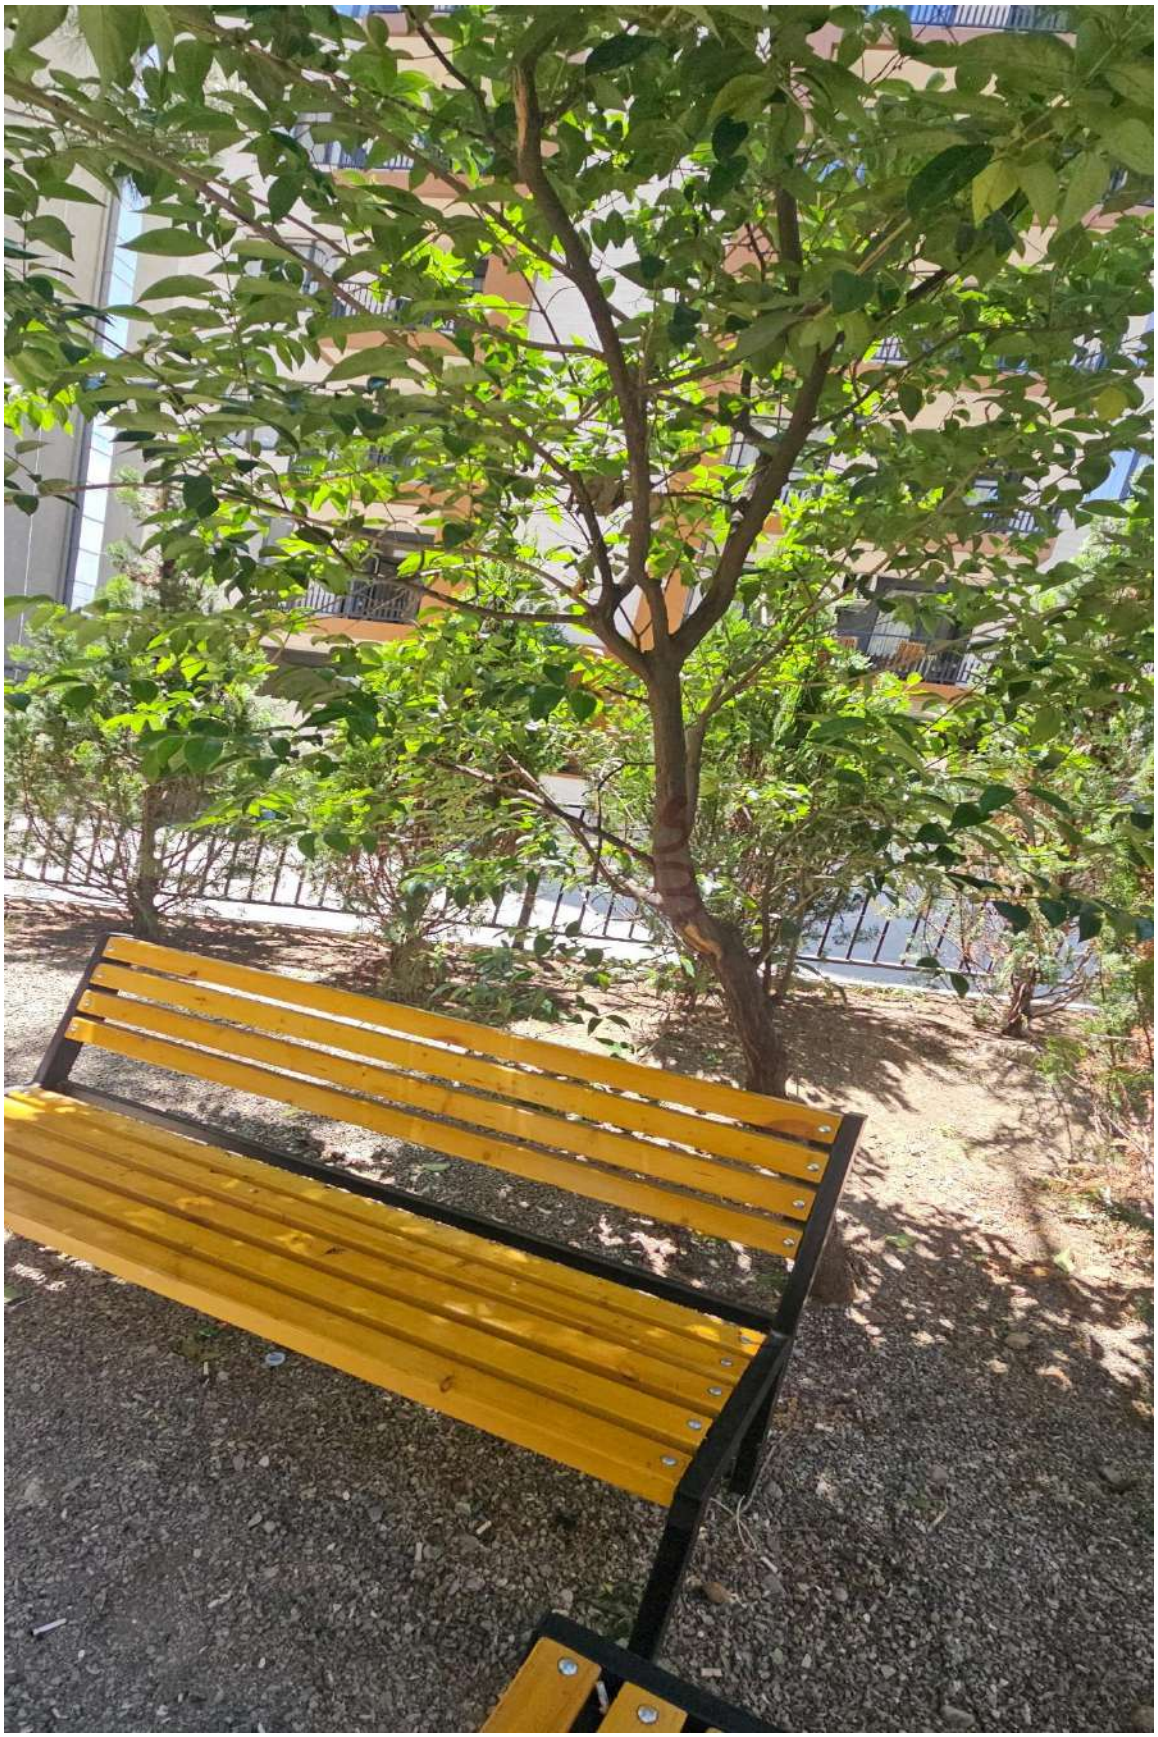

ნარგავი N 54



ნარგავი N 55

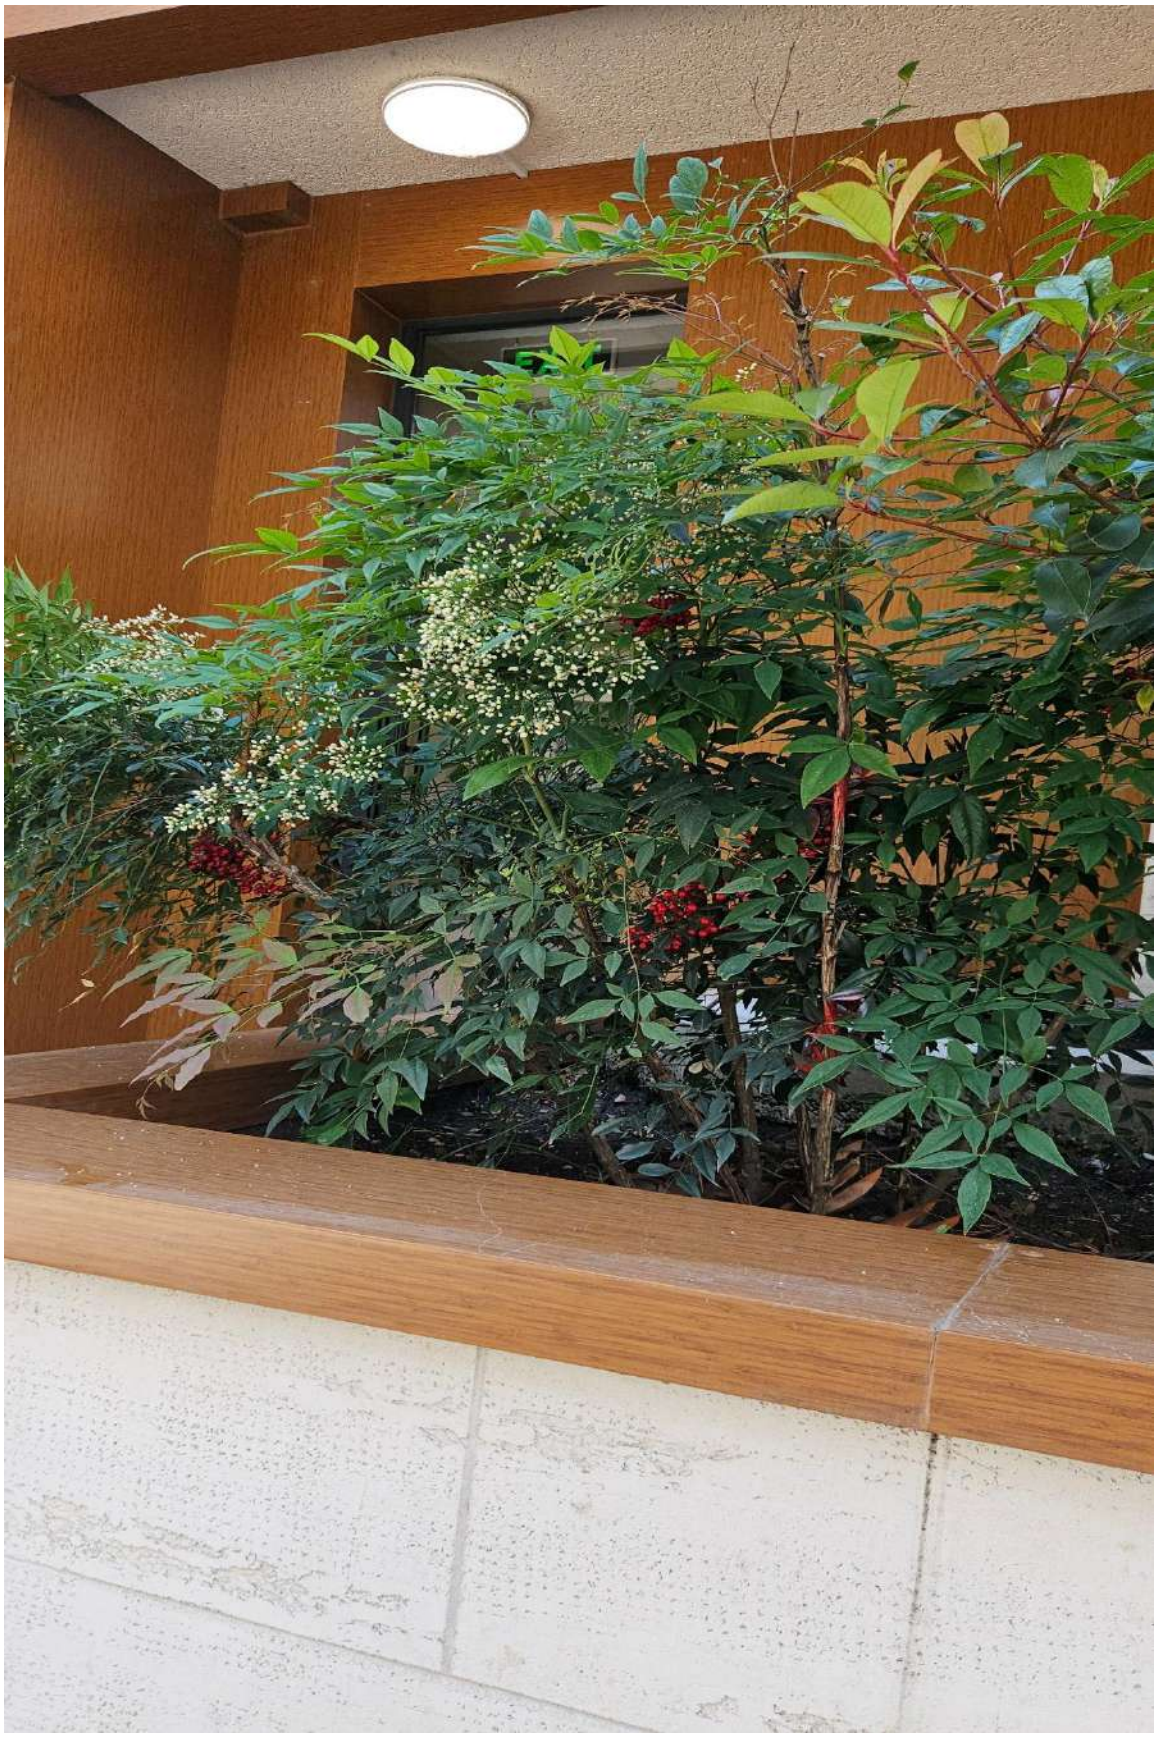

ნარგავი N 56

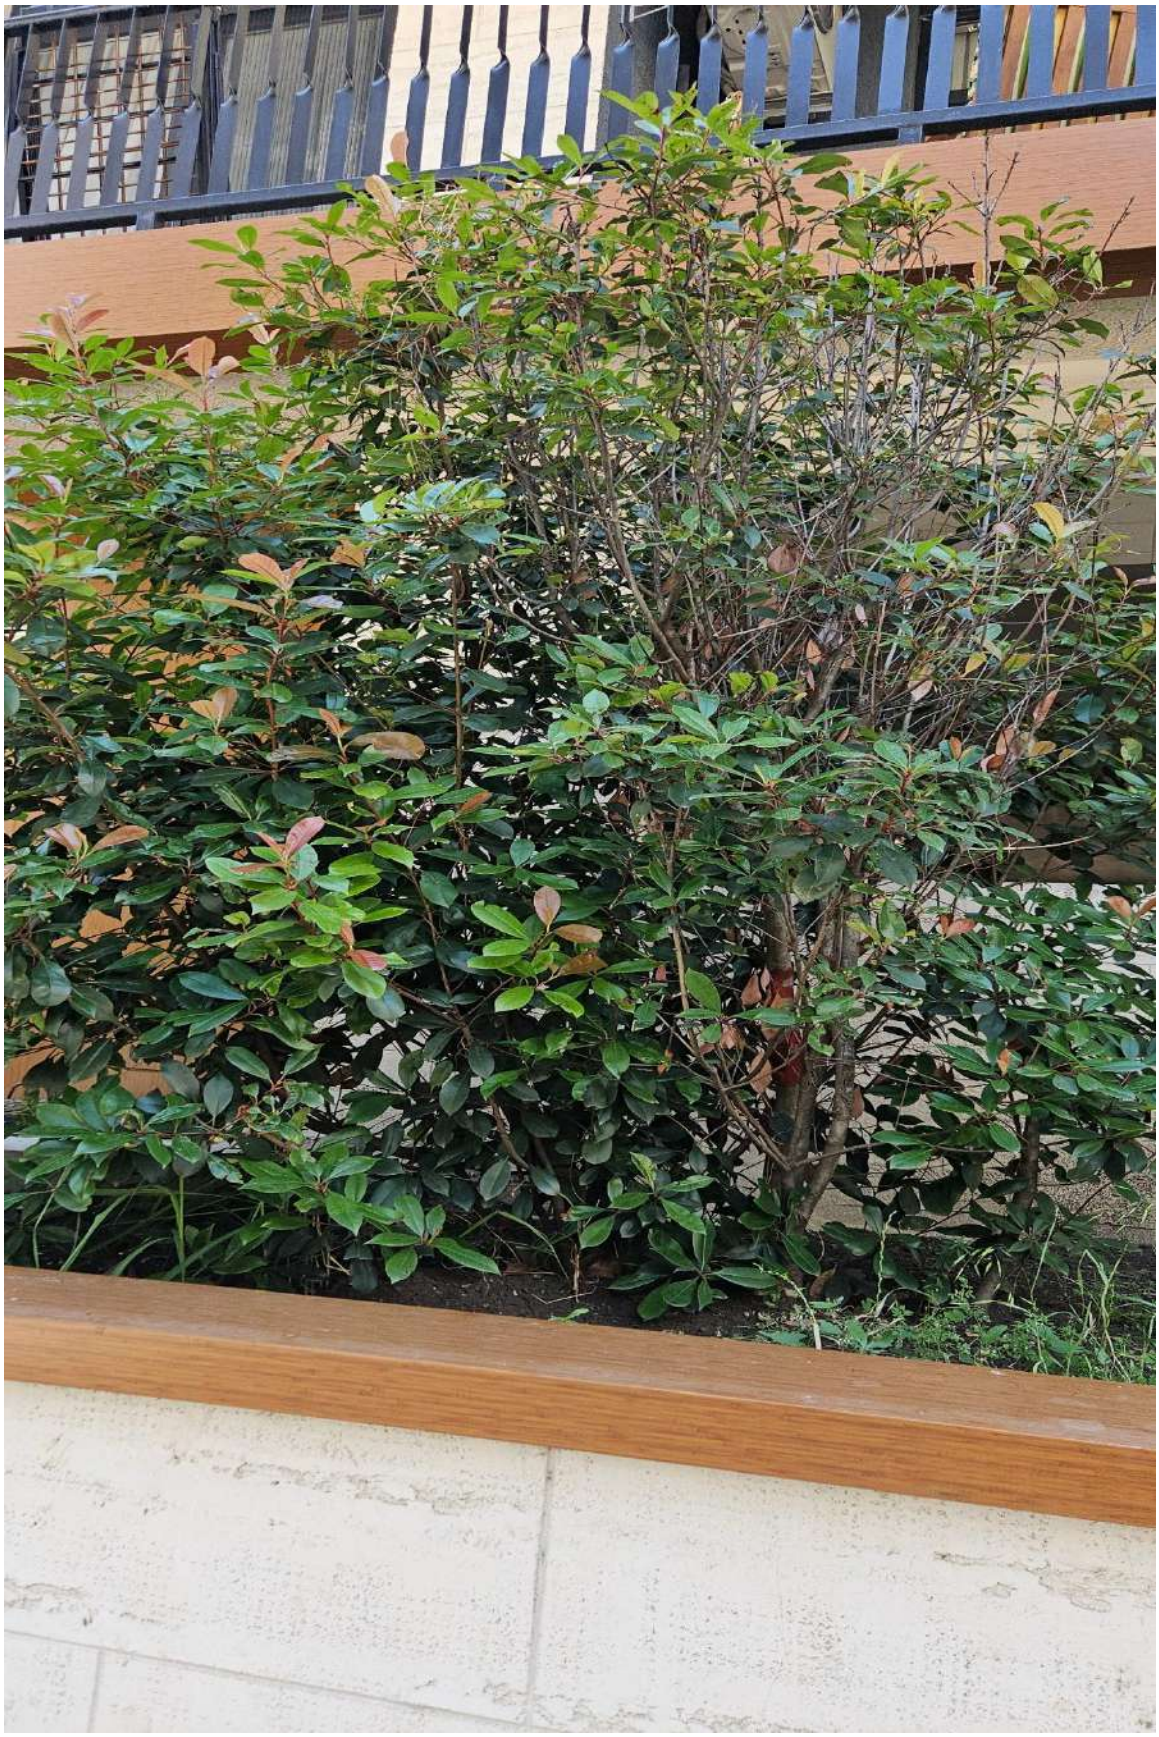

ნარგავი N 57



ნარგავი N 58

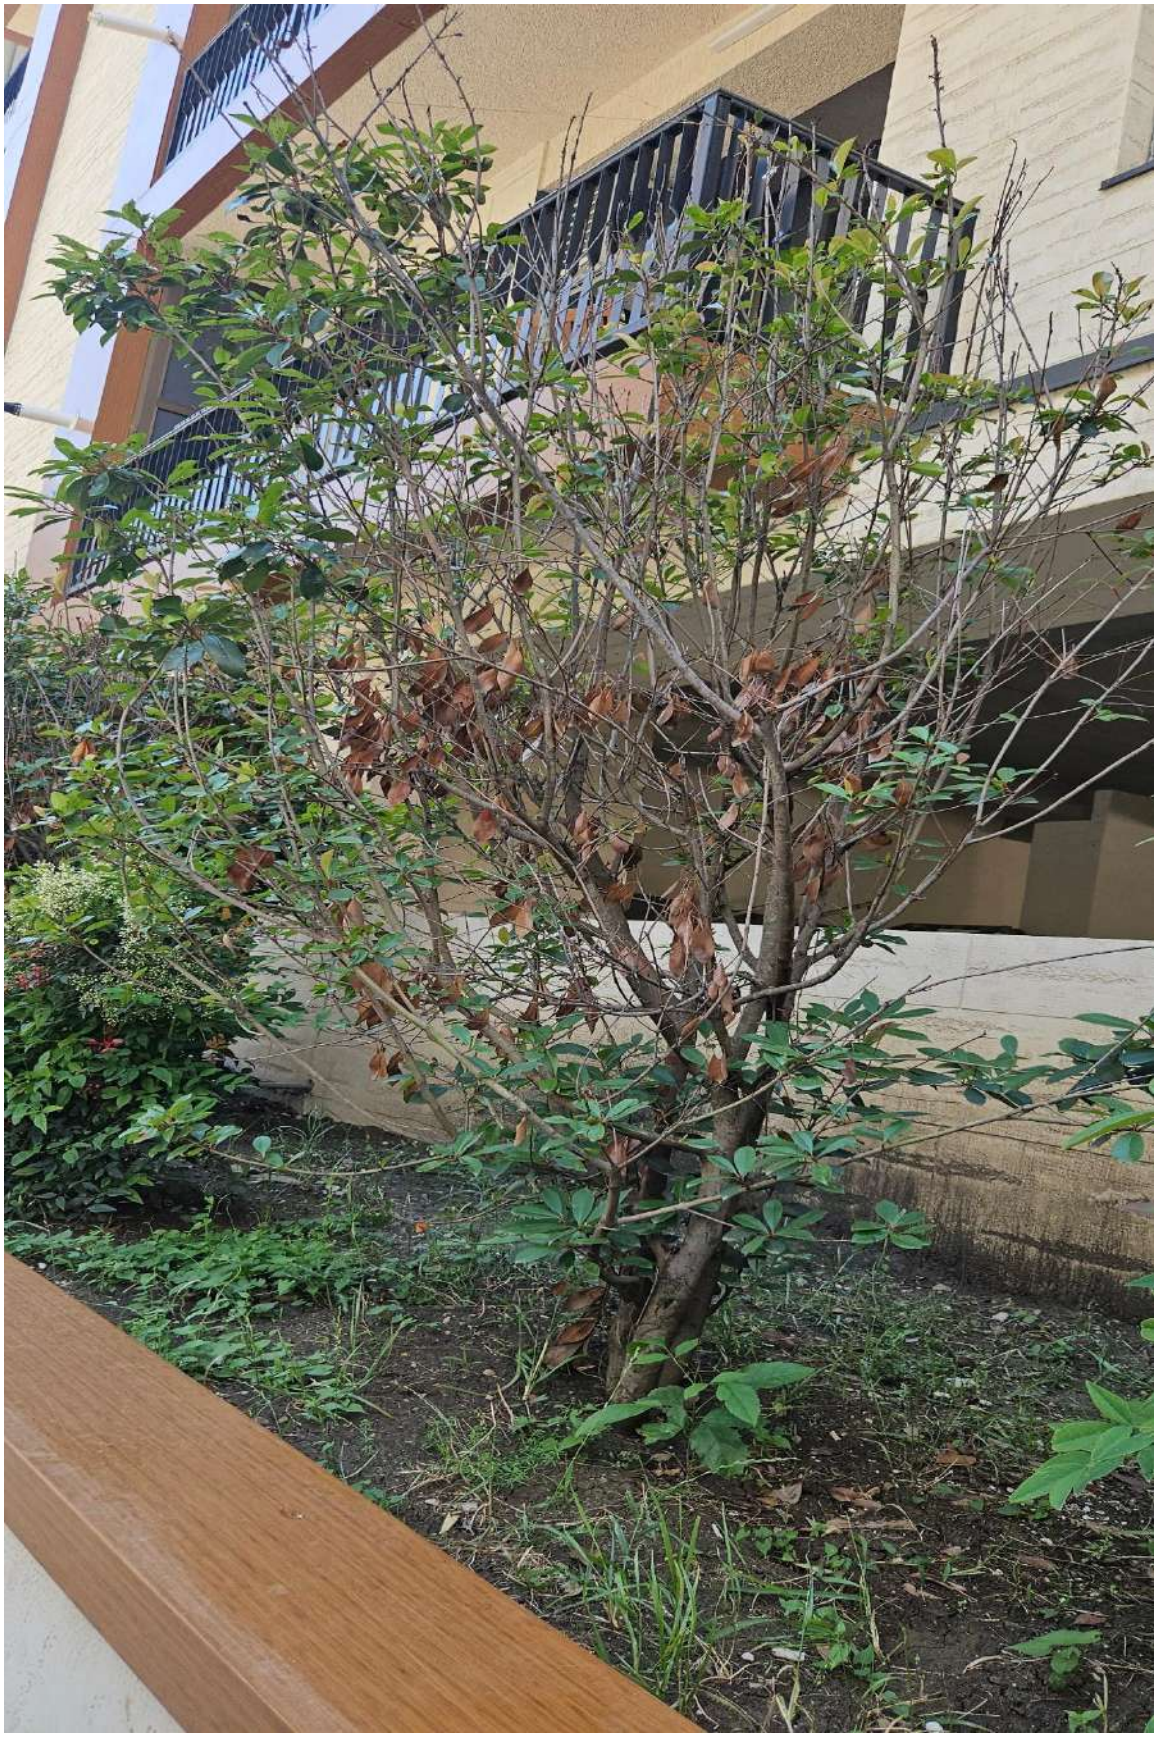

ნარგავი N 59

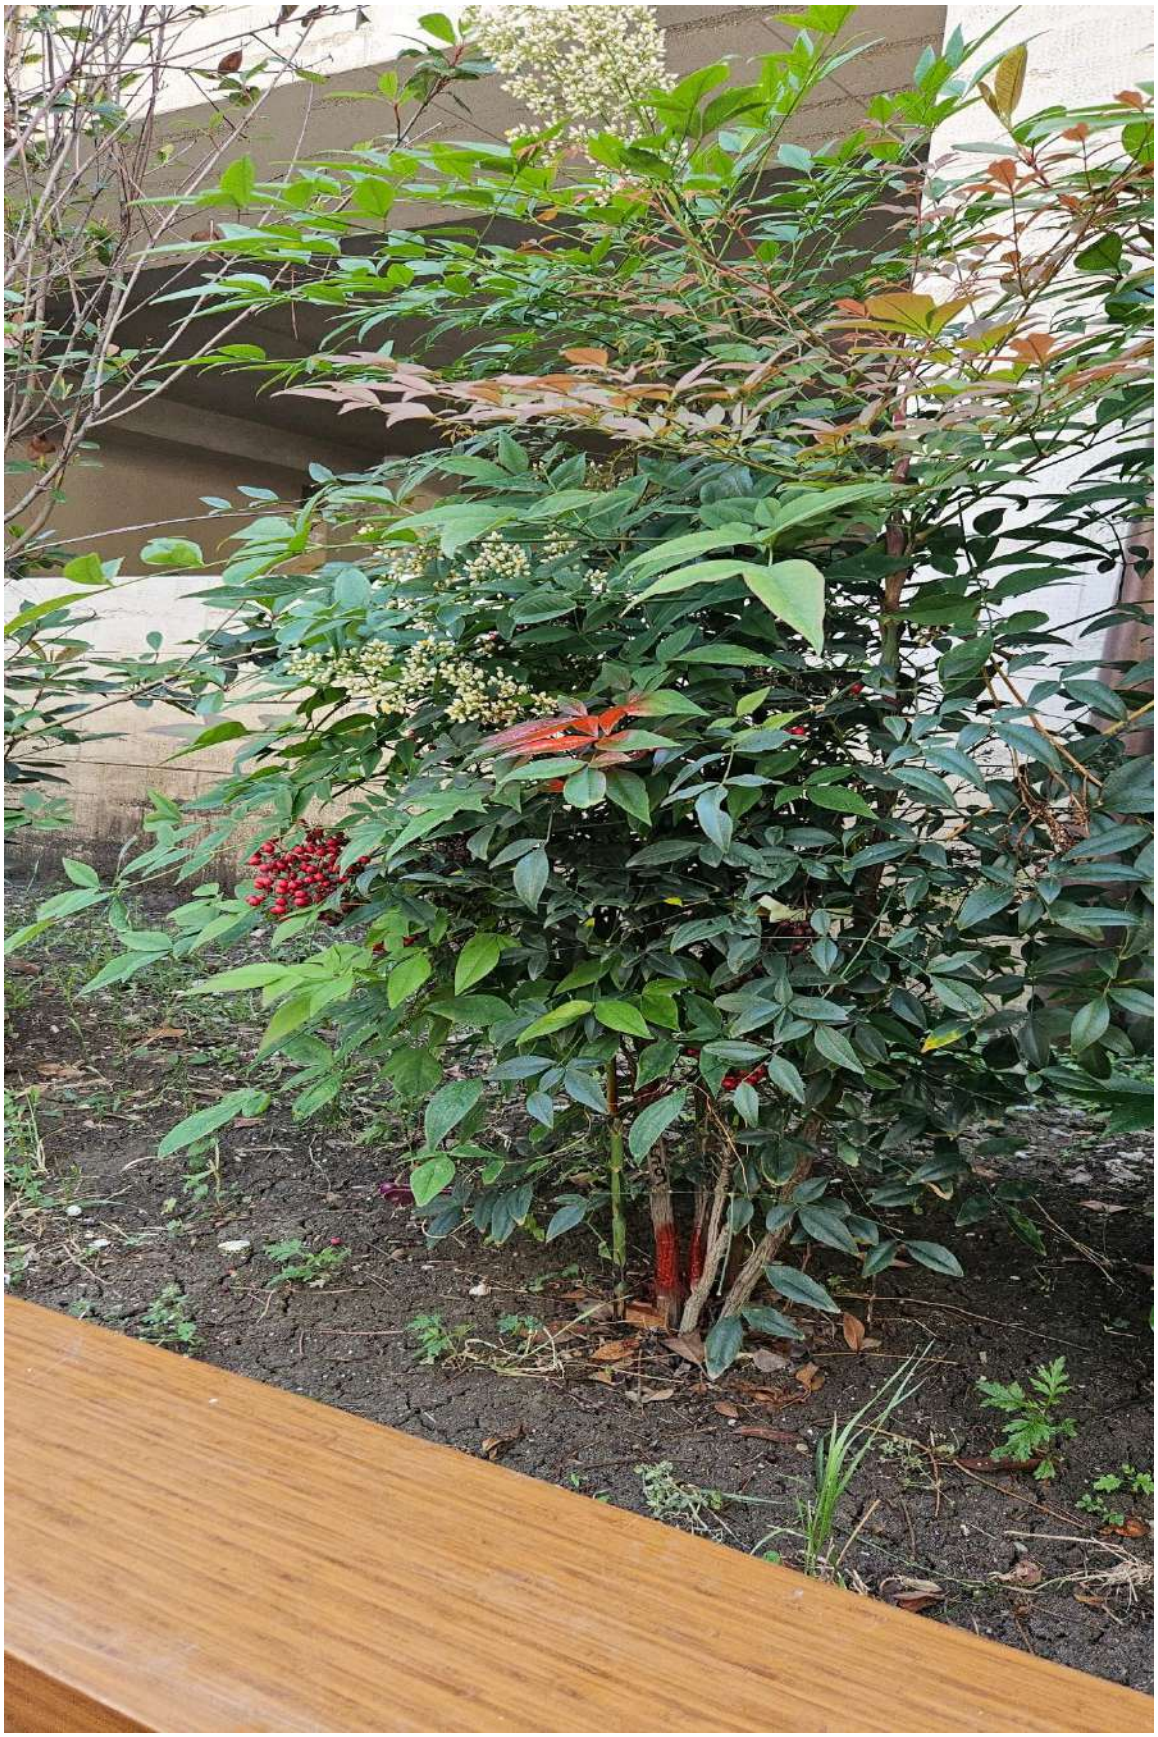

ნარგავი N 60



ნარგავი N 61



ნარგავი N 62



ნარგავი N 63



ნარგავი N 64

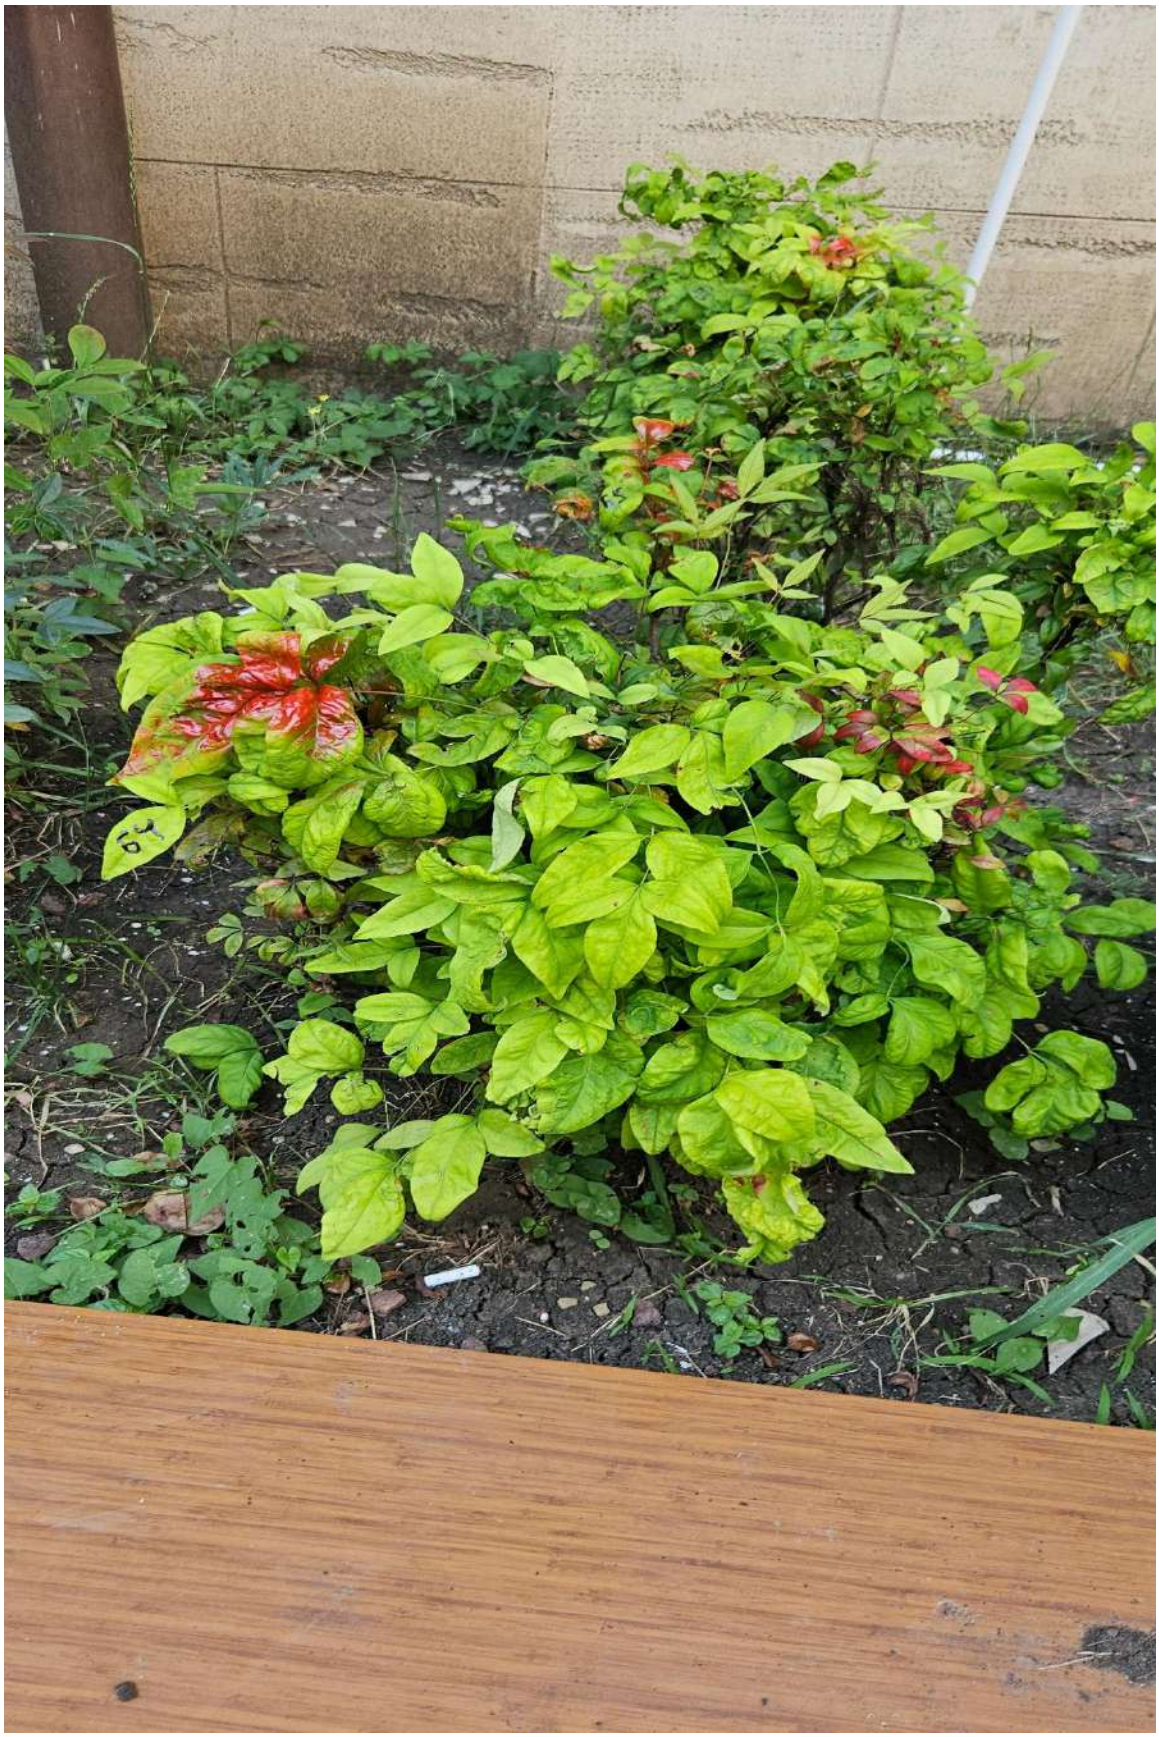

ნარგავი N 65

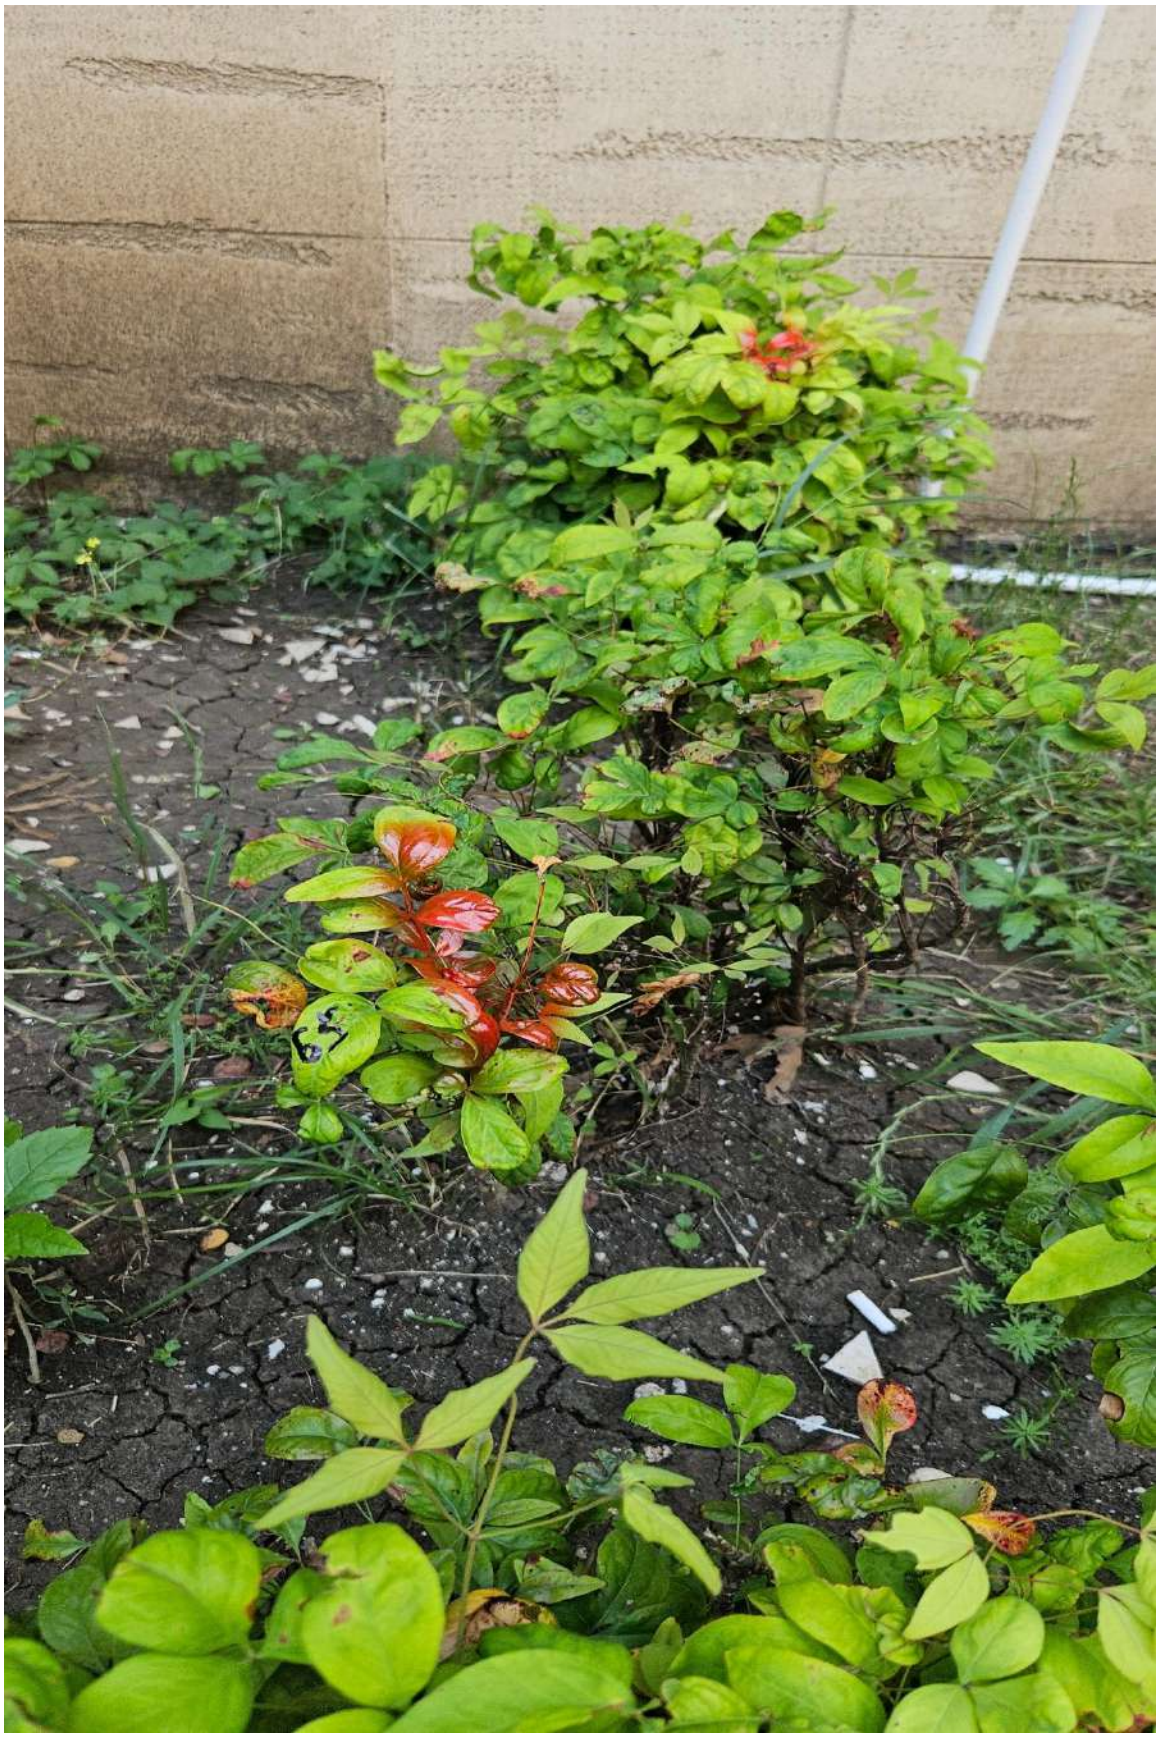

ნარგავი N 66

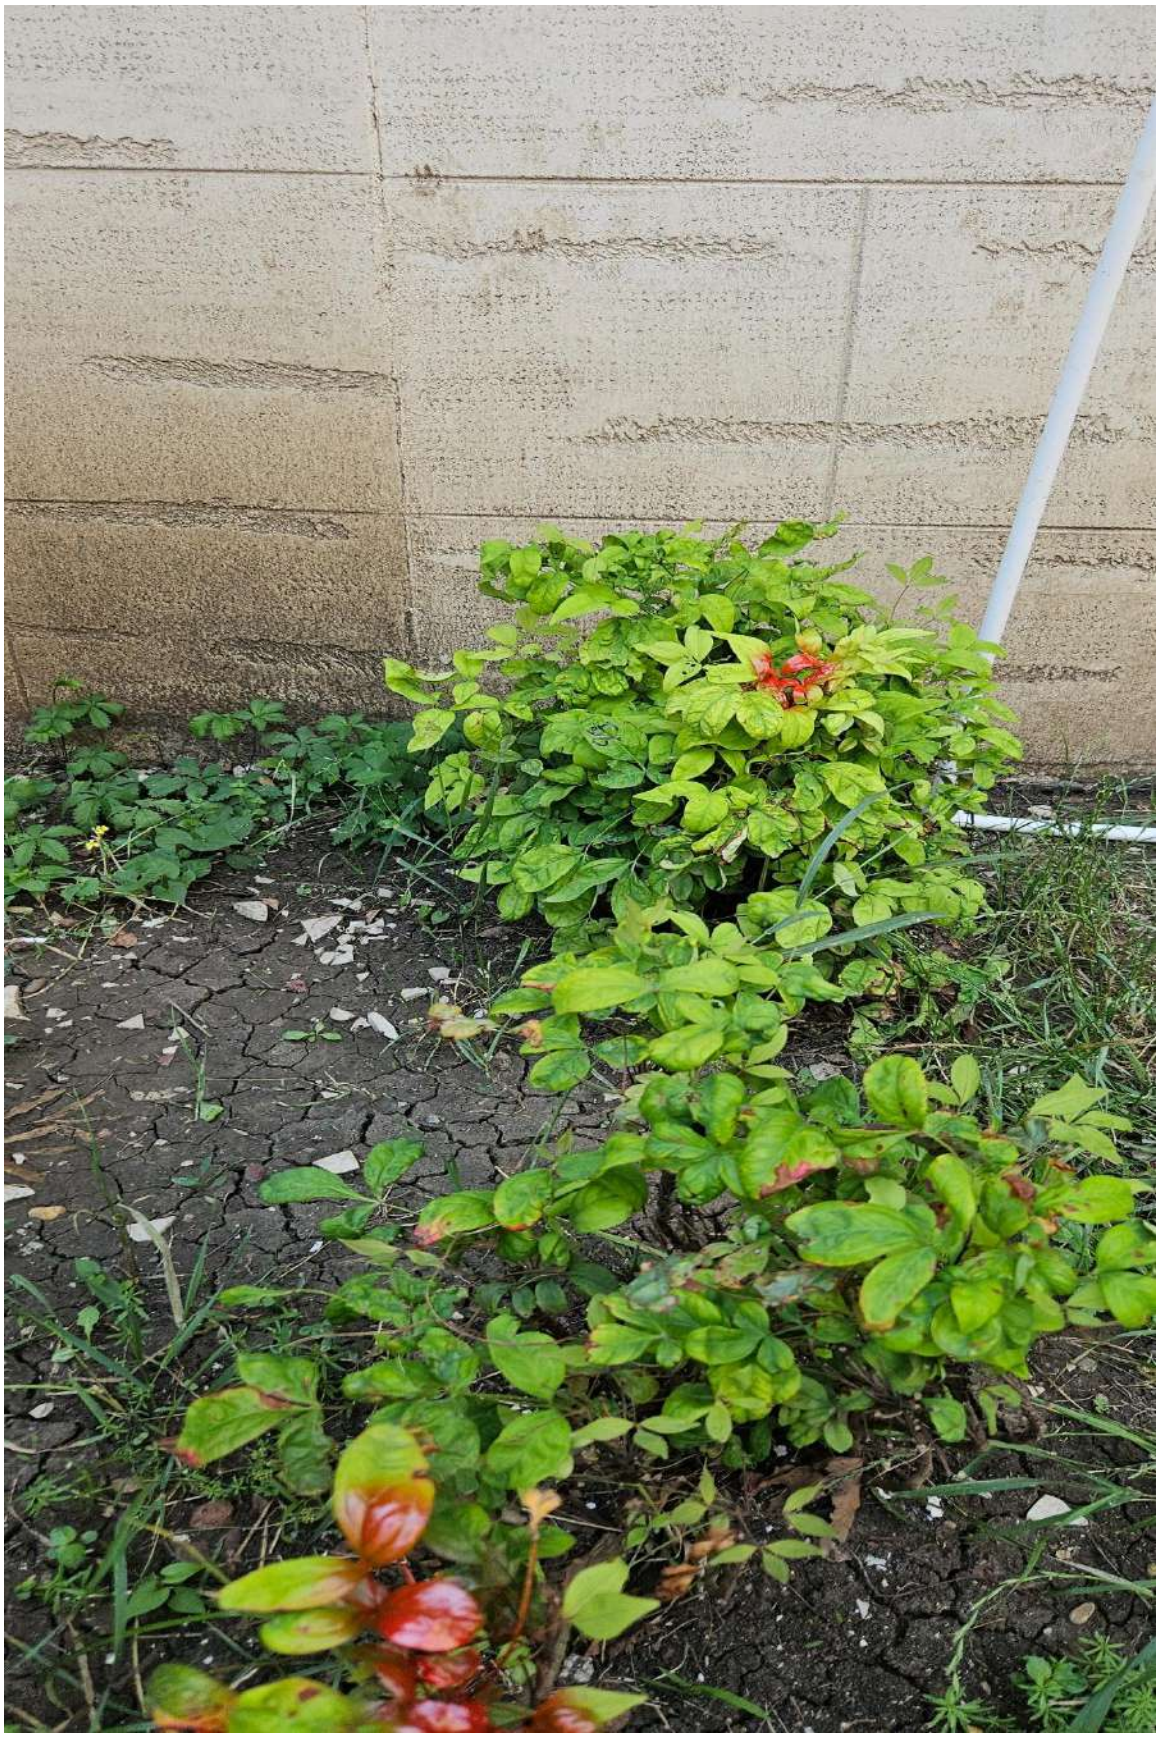

ნარგავი N 67



ნარგავი N 68

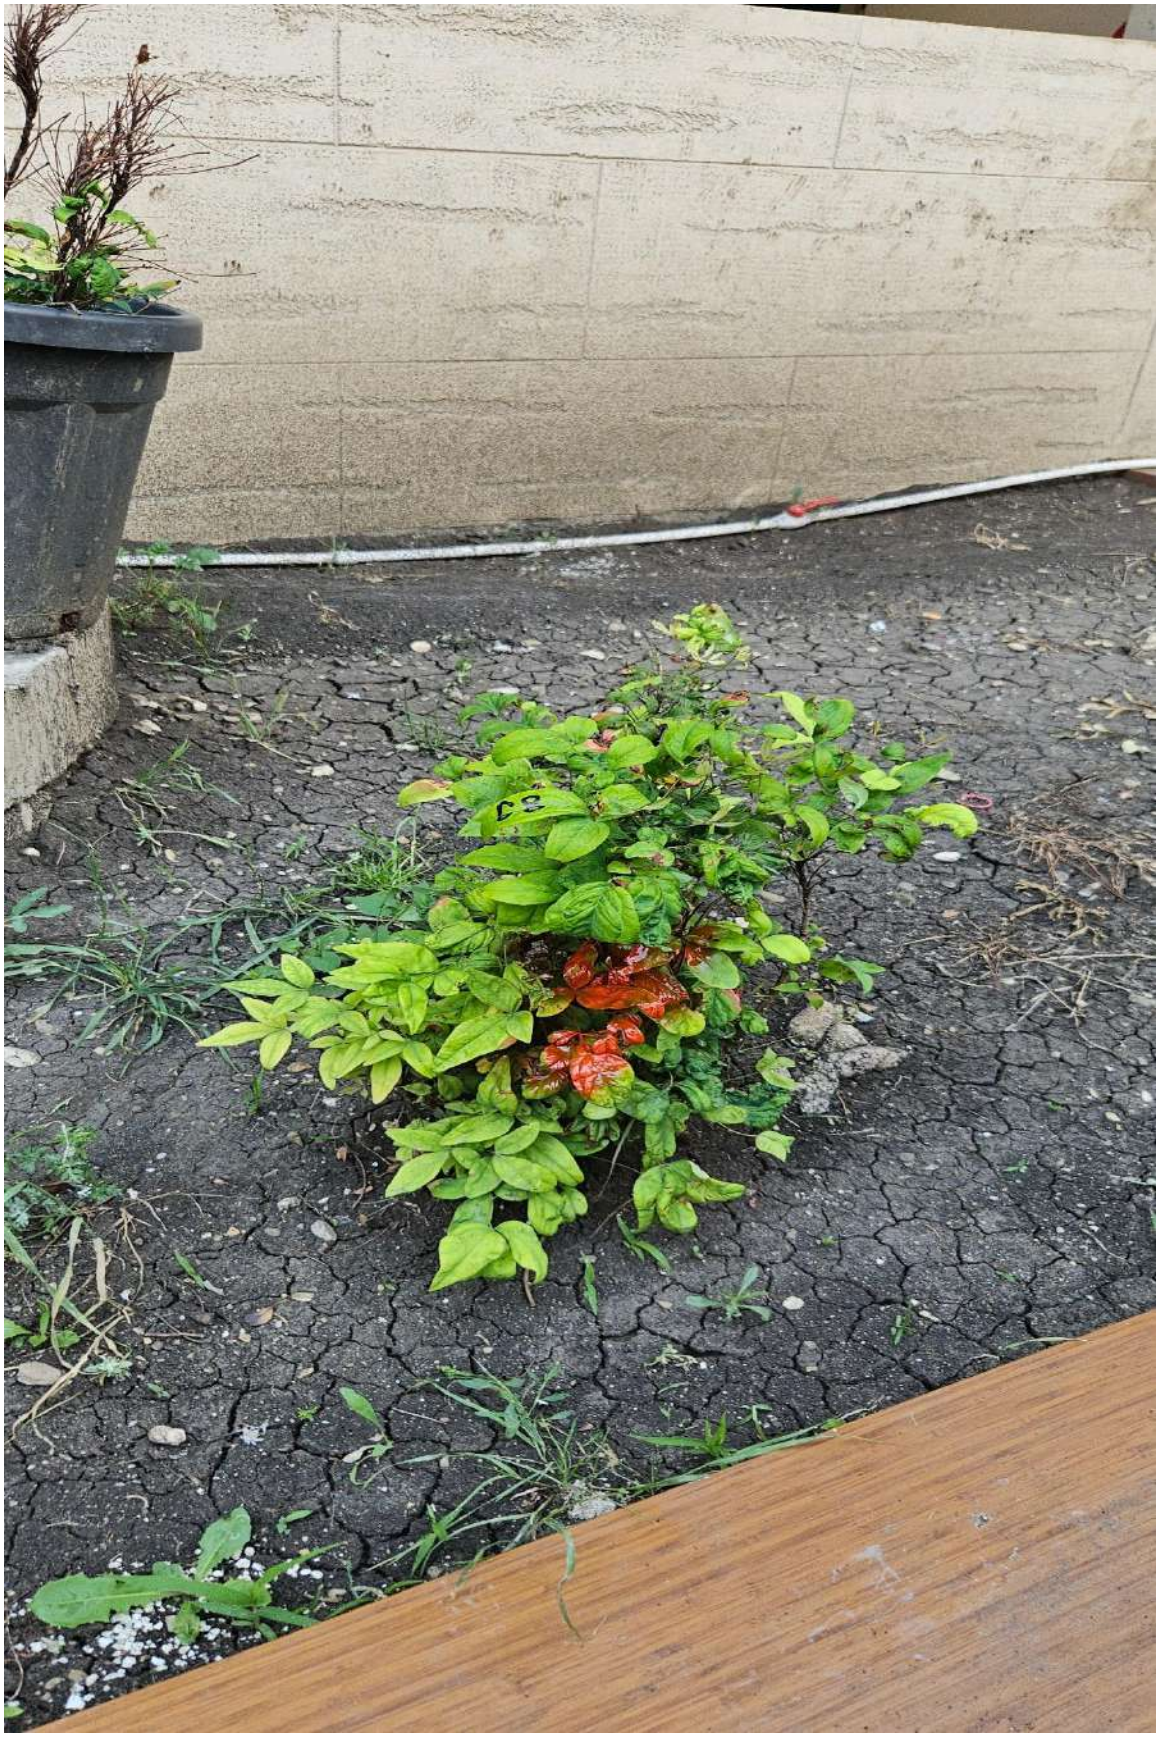

ნარგავი N 69



ნარგავი N 70-200

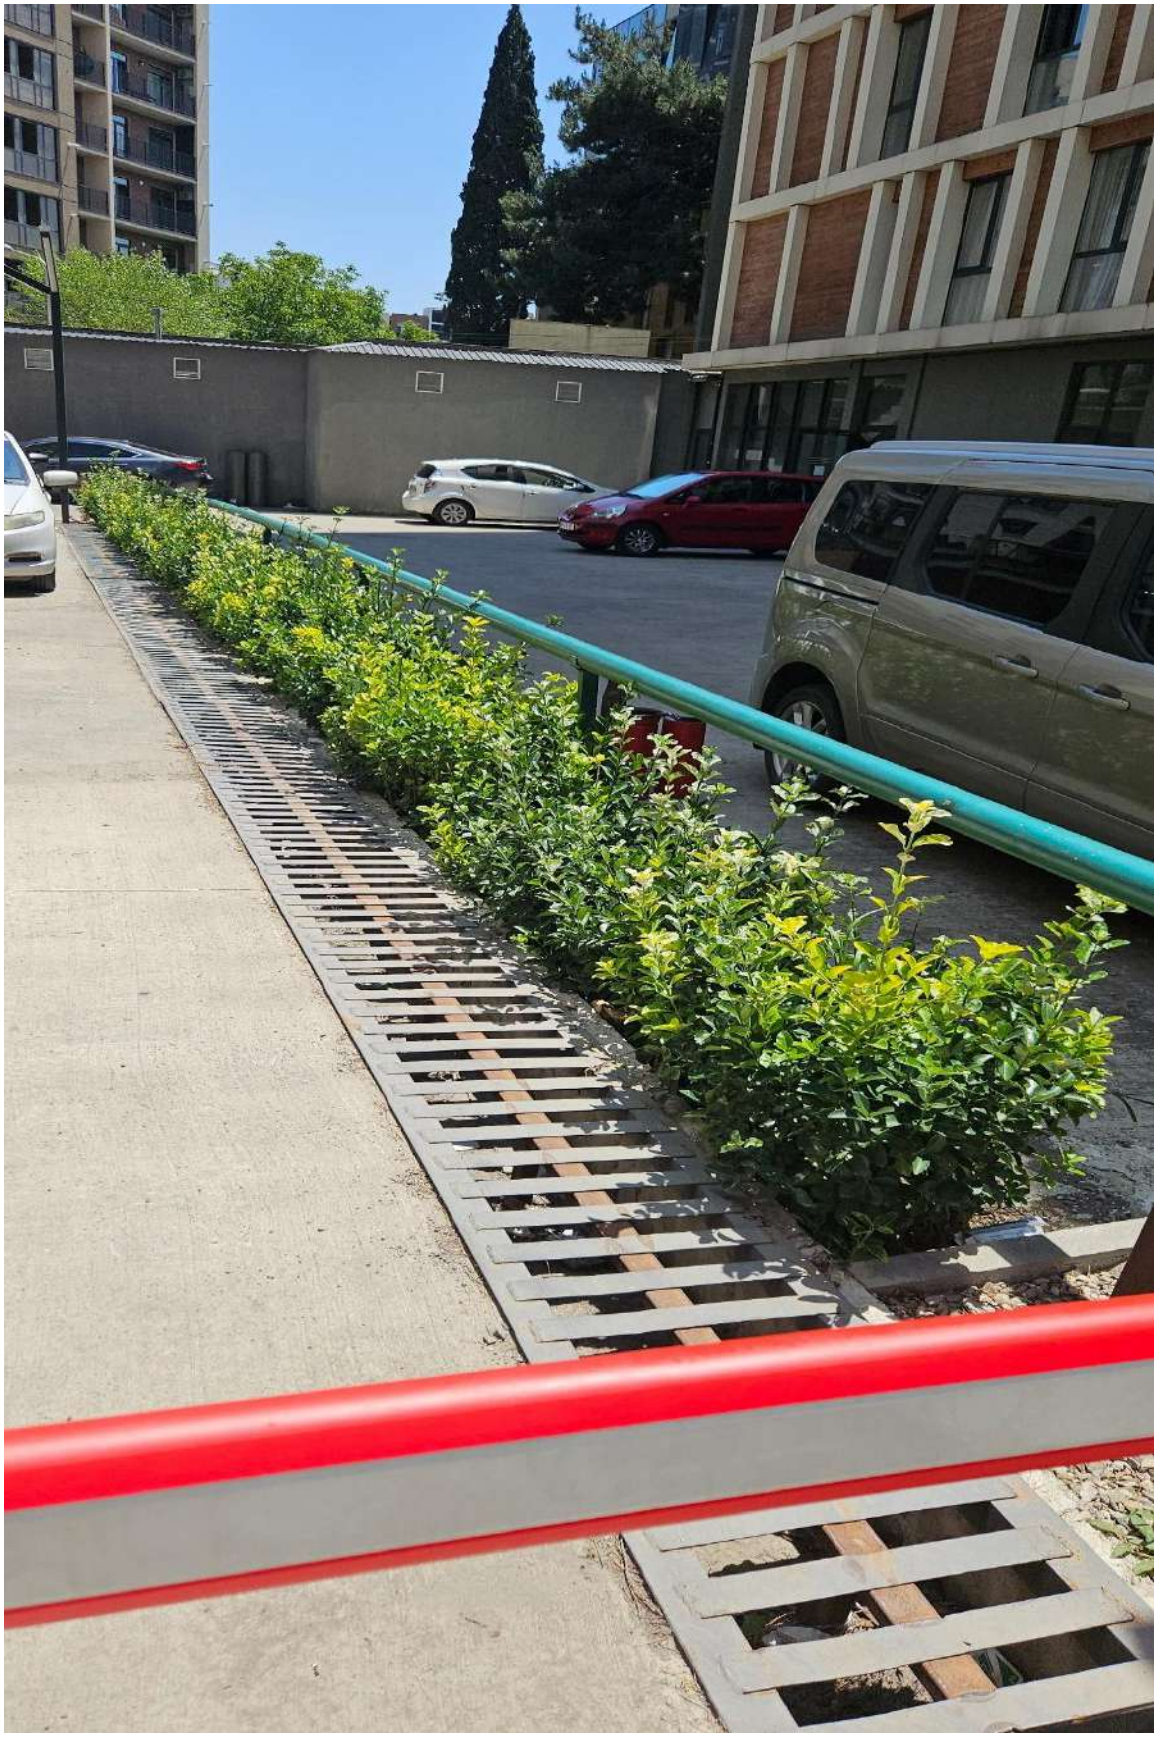

ნარგავი N 70-200

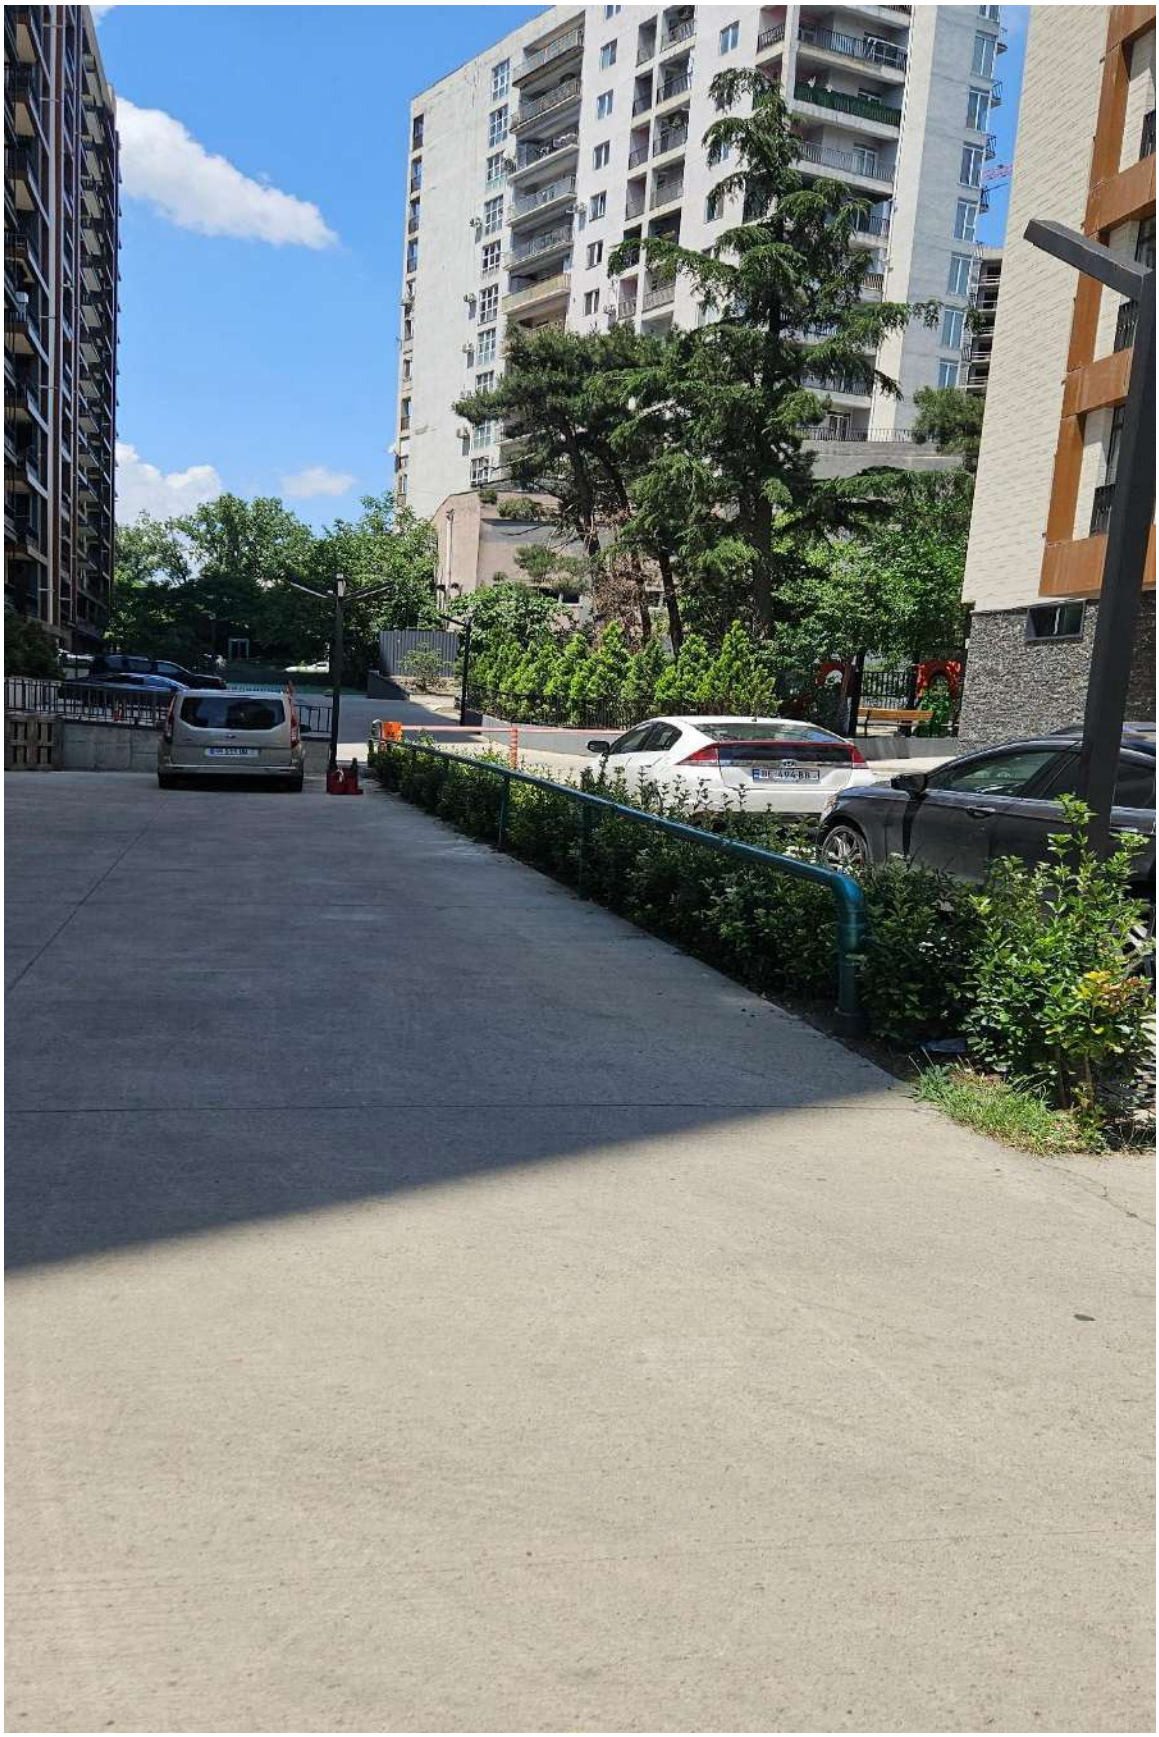

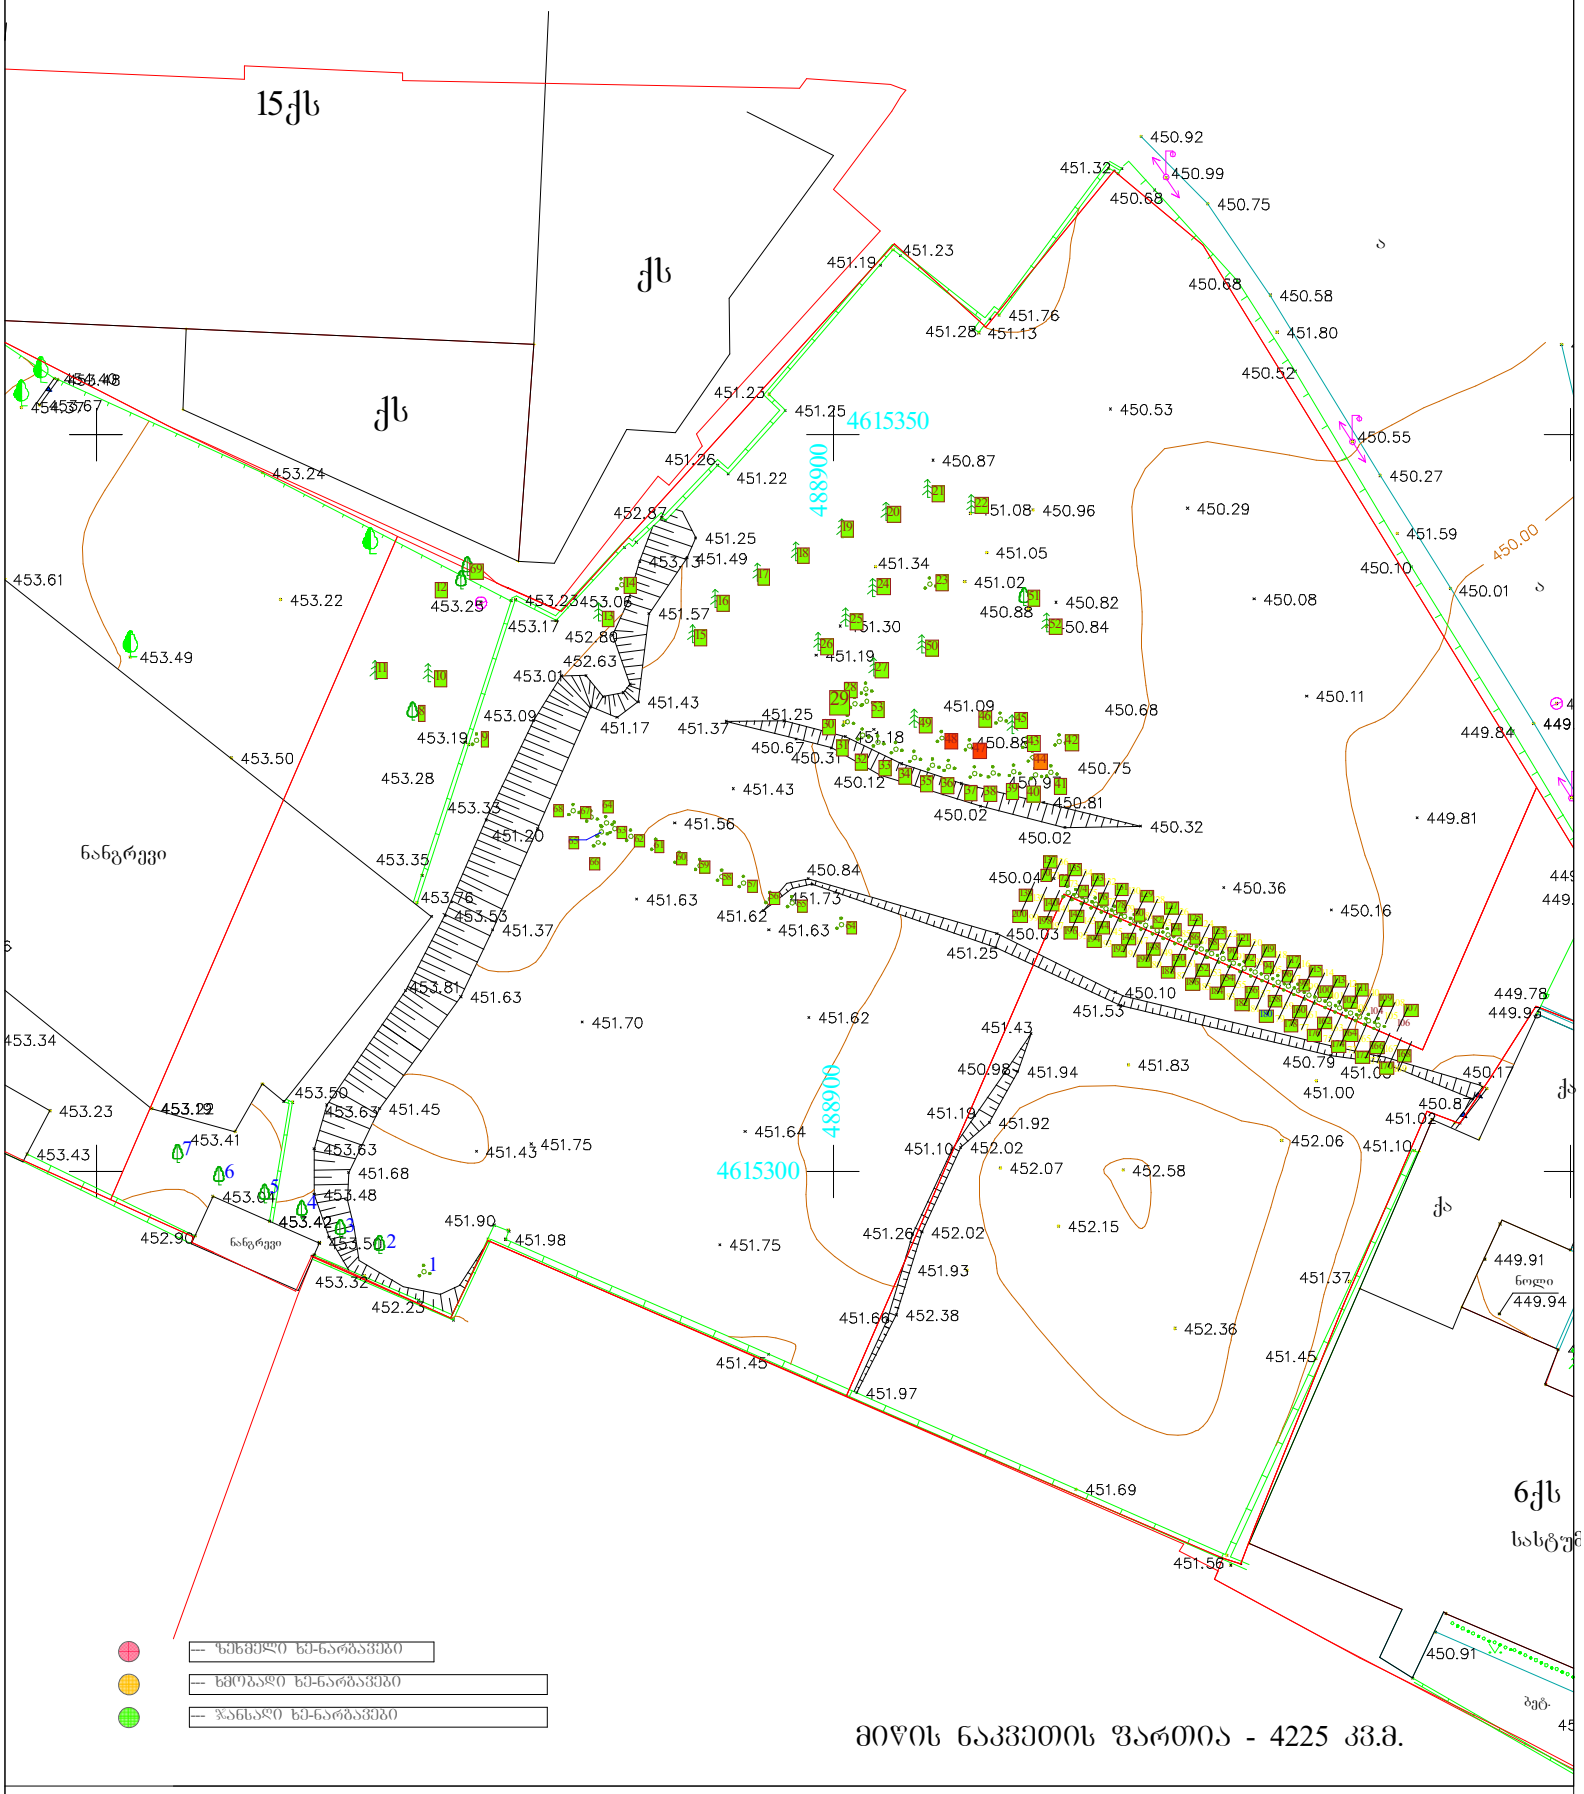

მიწის ნაკვეთის ფართია - 4225 კვ.მ.

მისამართი: ქ. თბილისი, წულუკიძის ქ. №6 ს/კ 01.17.10.008.153

- არასაცხოვრებელი შენობა
- საცხოვრებელი შენობა
- შენებადი ნაგებობა
- ფარდული
- ბორდიური
- ღობე
- კედელი
- რკინიგზა
- მაღალი ძაბვის ელექტრო გადამცემი ხაზი
- ხეები
- სამეთვალყურეო ჭები
- რეზერვუარი
- სატრანსფორმატორო ჯიხური
- რელიეფი
- UTM (საერთაშორისო) სისტემის კოორდინატები

შ.პ.ს. „თამაზი 51“

დირექტორი		თ. მამულაშვილი
შესრულა		თ. მამულაშვილი
მასშტაბი 1:500	გაიცა:	08.08.2020


ნაკვეთის საზღვარი
816
1196
1615180
1488900
ასფალტის საფარი
ბეტონის საფარი
ბეტონის ბორდიური
ბეტონის ბორდიური
ბეტონის ბორდიური
ბეტონის ბორდიური
ბეტონის ბორდიური
ბეტონის ბორდიური
R 3.000
ავტოსადგომი 15 ადგილზე
ავტოსადგომი 15 ადგილზე
ავტოსადგომი 15 ადგილზე

დენდროლოგიური პროექტის საინფორმაციო დაფა

საპროექტო ტერიტორია

მის.: ქალაქი, თბილისი , წულუკიძის ქუჩა #6 ს/კ 01,17,10,008,153

არასასოფლო სამუერნეო, საერთო ფართობი -4225 მ^2

გასამწვანებელი ფართობი - 775.2 მ^2

ნებართვის გამცემი ორგანო: ქ. თბილისისი მუნიციპალიტეტის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური

დენდროლოგიური პროექტის შეთანხმების თარიღი 2026 წელი

დენდროლოგიური პროექტის დასრულების თარიღი: 2029 წელი.

ინფორმაცია მოსაჭრელი და გადასარგავი ხეების შესახებ:

არსებულ ტერიტორიაზე ხე-მცენარების საერთო რაოდენობა შეადგენს 200 ძირს.

მოსაჭრელია სულ ხე-მცენარე სულ 3 ძირი::

აქედან ხმობადი ხე-მცენარეები სულ 1 ძირი:-- N 44.

აქედან ზეხმელი ხე-მცენარეები სულ 2 ძირი: -- N 47.48;

ადგილზე რჩება 29 ხე-მცენარე. N -- 2;3;4;5;6;7;8;10;11;12;13;15;16;17;18;19;20;
21;22;24;25;26;27;45;49;50;51;52;69;

დასარგავია სულ 3 ხე-მცენარე მათ შორის:

1.მჩხვლეტავი ნაძვი-(picea pungens)-2 ძირი.

2. არიზონის კვიპაროზი-(cupressus arizonica)-1 ძირი.

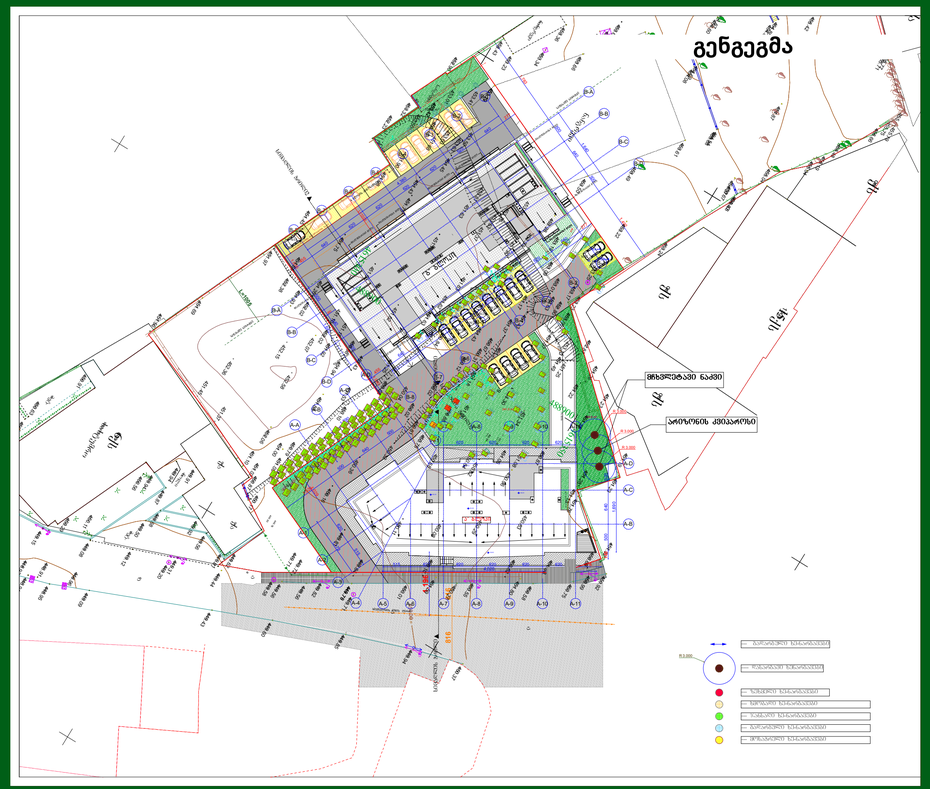

დაასახელება	რაოდენობა	მინიმალური ასაკი (წ)	მინიმალური სიმაღლე (მ)	ღეროს მინიმალური გარშემოწერილობა (სმ)
მჩხვლეტავი ნაძვი (picea pungens)	2	16	3	20
არიზონის კვიპაროზი (cupressus arizonica)	1	12	3	20





ხე-მცენარეების სიმაღლე 3.5 მ.; დაშორება 4 მ.; ღეროს გარშემოწერილობა 20 სმ.

გასაშენებელი ხე-მცენარეების მოვლის ხანგრძლივობა - 3 წელი

გასაშენებელი ხე-მცენარეების მოვლა-პატრონობაზე პასუხისმგებელი პირი:

ზურაბ ახალაია პ/ნ 01701128641
