ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო

წერილის ნომერი: **16-01231243560**
თარიღი: **04/05/2023**

ადრესატი: ნიკოლოზ მუჯირი
პირადი ნომერი: 01008056775
მისამართი: საქართველო, ქალაქი თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზირის IV კვარტალი, კორპუსი 12, ბინა 18

ბატონო ნიკოლოზ,

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტომ განიხილა თქვენი, 2023 წლის 2 მაისის № 01231222066-16 განცხადება, რომელთან დაკავშირებითაც გაცნობებთ შემდეგს:
დაკმაყოფილდეს 2023 წლის 2 მაისის № 01231222066-16 განცხადება და შეთანხმდეს ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, N 116-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 01.72.14.034.972) საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა თანდართულ ბმულზე არსებული დანართის შესაბამისად.

მშენებლობის პერიოდში საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემით გათვალისწინებული სამუშაოები შეთანხმებულია ნებართვის აღებიდან 1 (ერთი) წლის განმავლობაში.

შესასვლელ-გამოსასვლელი გზის მოწყობის სქემით გათვალისწინებული სამუშაოები შეთანხმებულია მშენებლობის დასრულებიდან 5 (ხუთი) დღის განმავლობაში, 00:00-დან 06:00 მდე. ხოლო დღის განმავლობაში უნდა მოიხსნას სქემით გათვალისწინებული ყველა შეზღუდვა.

ასევე გაცნობებთ, რომ საჭიროების შემთხვევაში, სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო იტოვებს უფლებამოსილებას, მოითხოვოს სამუშაოების პერიოდში არსებული სიტუაციის საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემის ალტერნატიული ვარიანტის წარმოდგენა.

სამუშაო ზონის მიმდებარე ტერიტორია სრულად უნდა აღიჭურვოს საგზაო ნიშნებით, შეთანხმებული სქემის შესაბამისად, სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე. სამუშაოების მიმდინარეობის პერიოდში, საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემის მიხედვით გათვალისწინებული საგზაო ნიშნები უნდა განთავსდეს მოძრავ დგარზე, რათა არ დაზიანდეს მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა. ამასთან, განსათავსებელი დროებითი საგზაო ნიშნები დამზადებული უნდა იყოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული სტანდარტების შესაბამისად.

იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოებისათვის საჭირო დროებითი და არსებული საგზაო ნიშნები ეწინააღმდეგება/ხელს უშლის ერთმანეთს, საჭიროა უკვე არსებული საგზაო ნიშნები შეიფუთოს, ხოლო სამუშაოს დასრულებისთანავე დემონტაჟი უნდა გაუკეთდეს დროებით დამონტაჟებულ საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკურ საშუალებებს და ქუჩის სავალი ნაწილი (ყველა შეფუთული ნიშნის ჩათვლით) მოყვანილი იქნას პირვანდელ მდგომარეობაში.

დამატებით გაცნობებთ, რომ თუ მშენებლობის პერიოდში, საპროექტო ტერიტორიის მიმდებარედ, ხორციელდება სხვა სამშენებლო სამუშაოები და დროებითი საგზაო ნიშნები, რომლებიც განთავსებულია სხვა, ნებართვის მქონე, შემსრულებელი კომპანიის მიერ და კვეთს/ეწინააღმდეგება თქვენს მიერ დასამონტაჟებელ საგზაო ნიშნებს, დროებითი საგზაო ნიშნები დაიტანოთ საჭიროებისამებრ და აუცილებლობის შემთხვევაში, სამუშაოები განახორციელოთ უკვე განთავსებული დროებითი საგზაო ნიშნების გამოყენებით. ხოლო, სხვა შემსრულებლის მიერ, სამუშაოების დასრულებისა და ნიშნების დემონტაჟის შემთხვევაში, უზრუნველყოთ თქვენი საგზაო ნიშნების სრულად მონტაჟი, მოცემული პირობების შესაბამისად.

საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემის ცვლილება საჭიროებს შეთანხმებას სააგენტოსთან.
გადაწყვეტილების გასაჩივრება, დაინტერესებული მხარის მიერ, შესაძლებელია ამ გადაწყვეტილების გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერთან (მისამართი: ჟ. შარტავას ქუჩა N7) კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

დანართი: სსიპ - ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს მიერ შეთანხმებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემები იხილეთ თანდართულ ბმულზე :

https://cloud.tbilisi.gov.ge/index.php/s/RFfdVenVAcYSkb3

პატივისცემით,

ვიქტორ წილოსანი

სააგენტოს უფროსი

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი

MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF GEORGIA
PATROL POLICE DEPARTMENT

MIA 5 23 01272698

05/05/2023

მოქ. ნ. მუჯირს
ქ. თბილისი ვაჟა-ფშაველას IV კვ. კორპ. 12, ბინა 18;
თქვენს 2023 წლის 5 მაისის განცხადებაზე

ასლი: საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის
ქ. თბილისის მთავარი სამმართველოს

შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტში განხილულ იქნა თქვენი განცხადება, რომელიც ეხება ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი N 116 ს/კ 01.72.14.034.972-ის მიმდებარედ შესასვლელ–გამოსასვლელი გზის მოწყობის, სამშენებლო დამცავი ღობის განთავსების და არსებული საგზაო/სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ნაკადების მიმართულების საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის წარმოდგენილი სქემების შეთანხმებას.

ვითვალისწინებთ რა, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ტრანსპორტის და ურბანული განვითარების სააგენტოს თანხმობას (წერილის ნომერი 04/05/2023 16-01231243560), შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი ითანხმებს (საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების კუთხით) წარმოდგენილ დროებითი და მუდმივი მოძრაობის ორგანიზაციის სქემებს და არ არის წინააღმდეგი განახორციელოთ სამუშაოები შემდეგი პირობების დაცვით:


- ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხოების მიზნით დამცავი ღობის ფარგლებში მოეწყოს ქუჩის სავალი ნაწილის მხრიდან ქვეითად მოსიარულეთა ბილიკი, ღობე გზის სავალი ნაწილის მხრიდან გადაიხუროს და ღამის საათებში განათდეს;
- სამშენებლო ობიექტზე მისასვლელი გზა (სამუშაოების განხორციელების პროცესში) აღიჭურვოს მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებებით შეთანხმებული სქემების შესაბამისად, ხოლო მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ მოძრაოის ორგანიზების ტექნიკურ საშუალებებს გაუკეთდეს დროებით დემონტაჟი ან შეიფუთოს;
- საგზაო მოძრაობის რეგულირებისთვის და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილების მიზნით სამუშაოების მწარმოებლის მიერ გამოყოფილ იქნეს სპეც. ტანსაცმლით და ალმით აღჭურვილი საჭირო რაოდენობის თანამშრომელი;
- დაცული იქნას გზის სავალი ნაწილის სისაუფთავე, არ დაუშვათ სამშენებლო მასალისა და ტექნიკის გზის სავალ ნაწილზე განთავსება;

0190, თბილისი, ნოე რამიშვილის ქ. №38
№38, Noe Ramishvili St. 0190, Tbilisi, Georgia
ტელ./Tel.: (+995 032) 2 41 42 42
ფაქსი/Fax: (+995 032) 2 41 85 02
E-mail: patrolinfo@mia.gov.ge

- სამუშაოების დასრულებისთანავე ფეხით მოსიარულეთა ბილიკი მოყვანილ იქნას პირვანდელ მდგომარეობაში, დროებითი მოძრაობის რეგულირების ტექნიკურ საშუალებებს გაუკეთდეს დემონტაჟი და გზის მიერთების ადგილები აღიჭურვოს მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებებით შეთანხმებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის სქემების შესაბამისად;
- სამუშაოების დაწყების შესახებ წინასწარ ეცნობოს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს და შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის სამორიგეო ნაწილს (241–85–04; 241–85–05).

მეორე ადრესატს: გთხოვთ, უზრუნველყოთ კონტროლის დაწესება წერილში მითითებულ პირობების შესრულებაზე და მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებების განთავსების მდგომარეობაზე. შეუსრულებლობის შემთხვევაში გაატარეთ ზომები საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 134 მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად.

საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი /
საორგანიზაციო სამმართველო / საგზაო მოძრაობის
ზედამხედველობის განყოფილება
განყოფილების უფროსი
ბარბაქაძე დავით

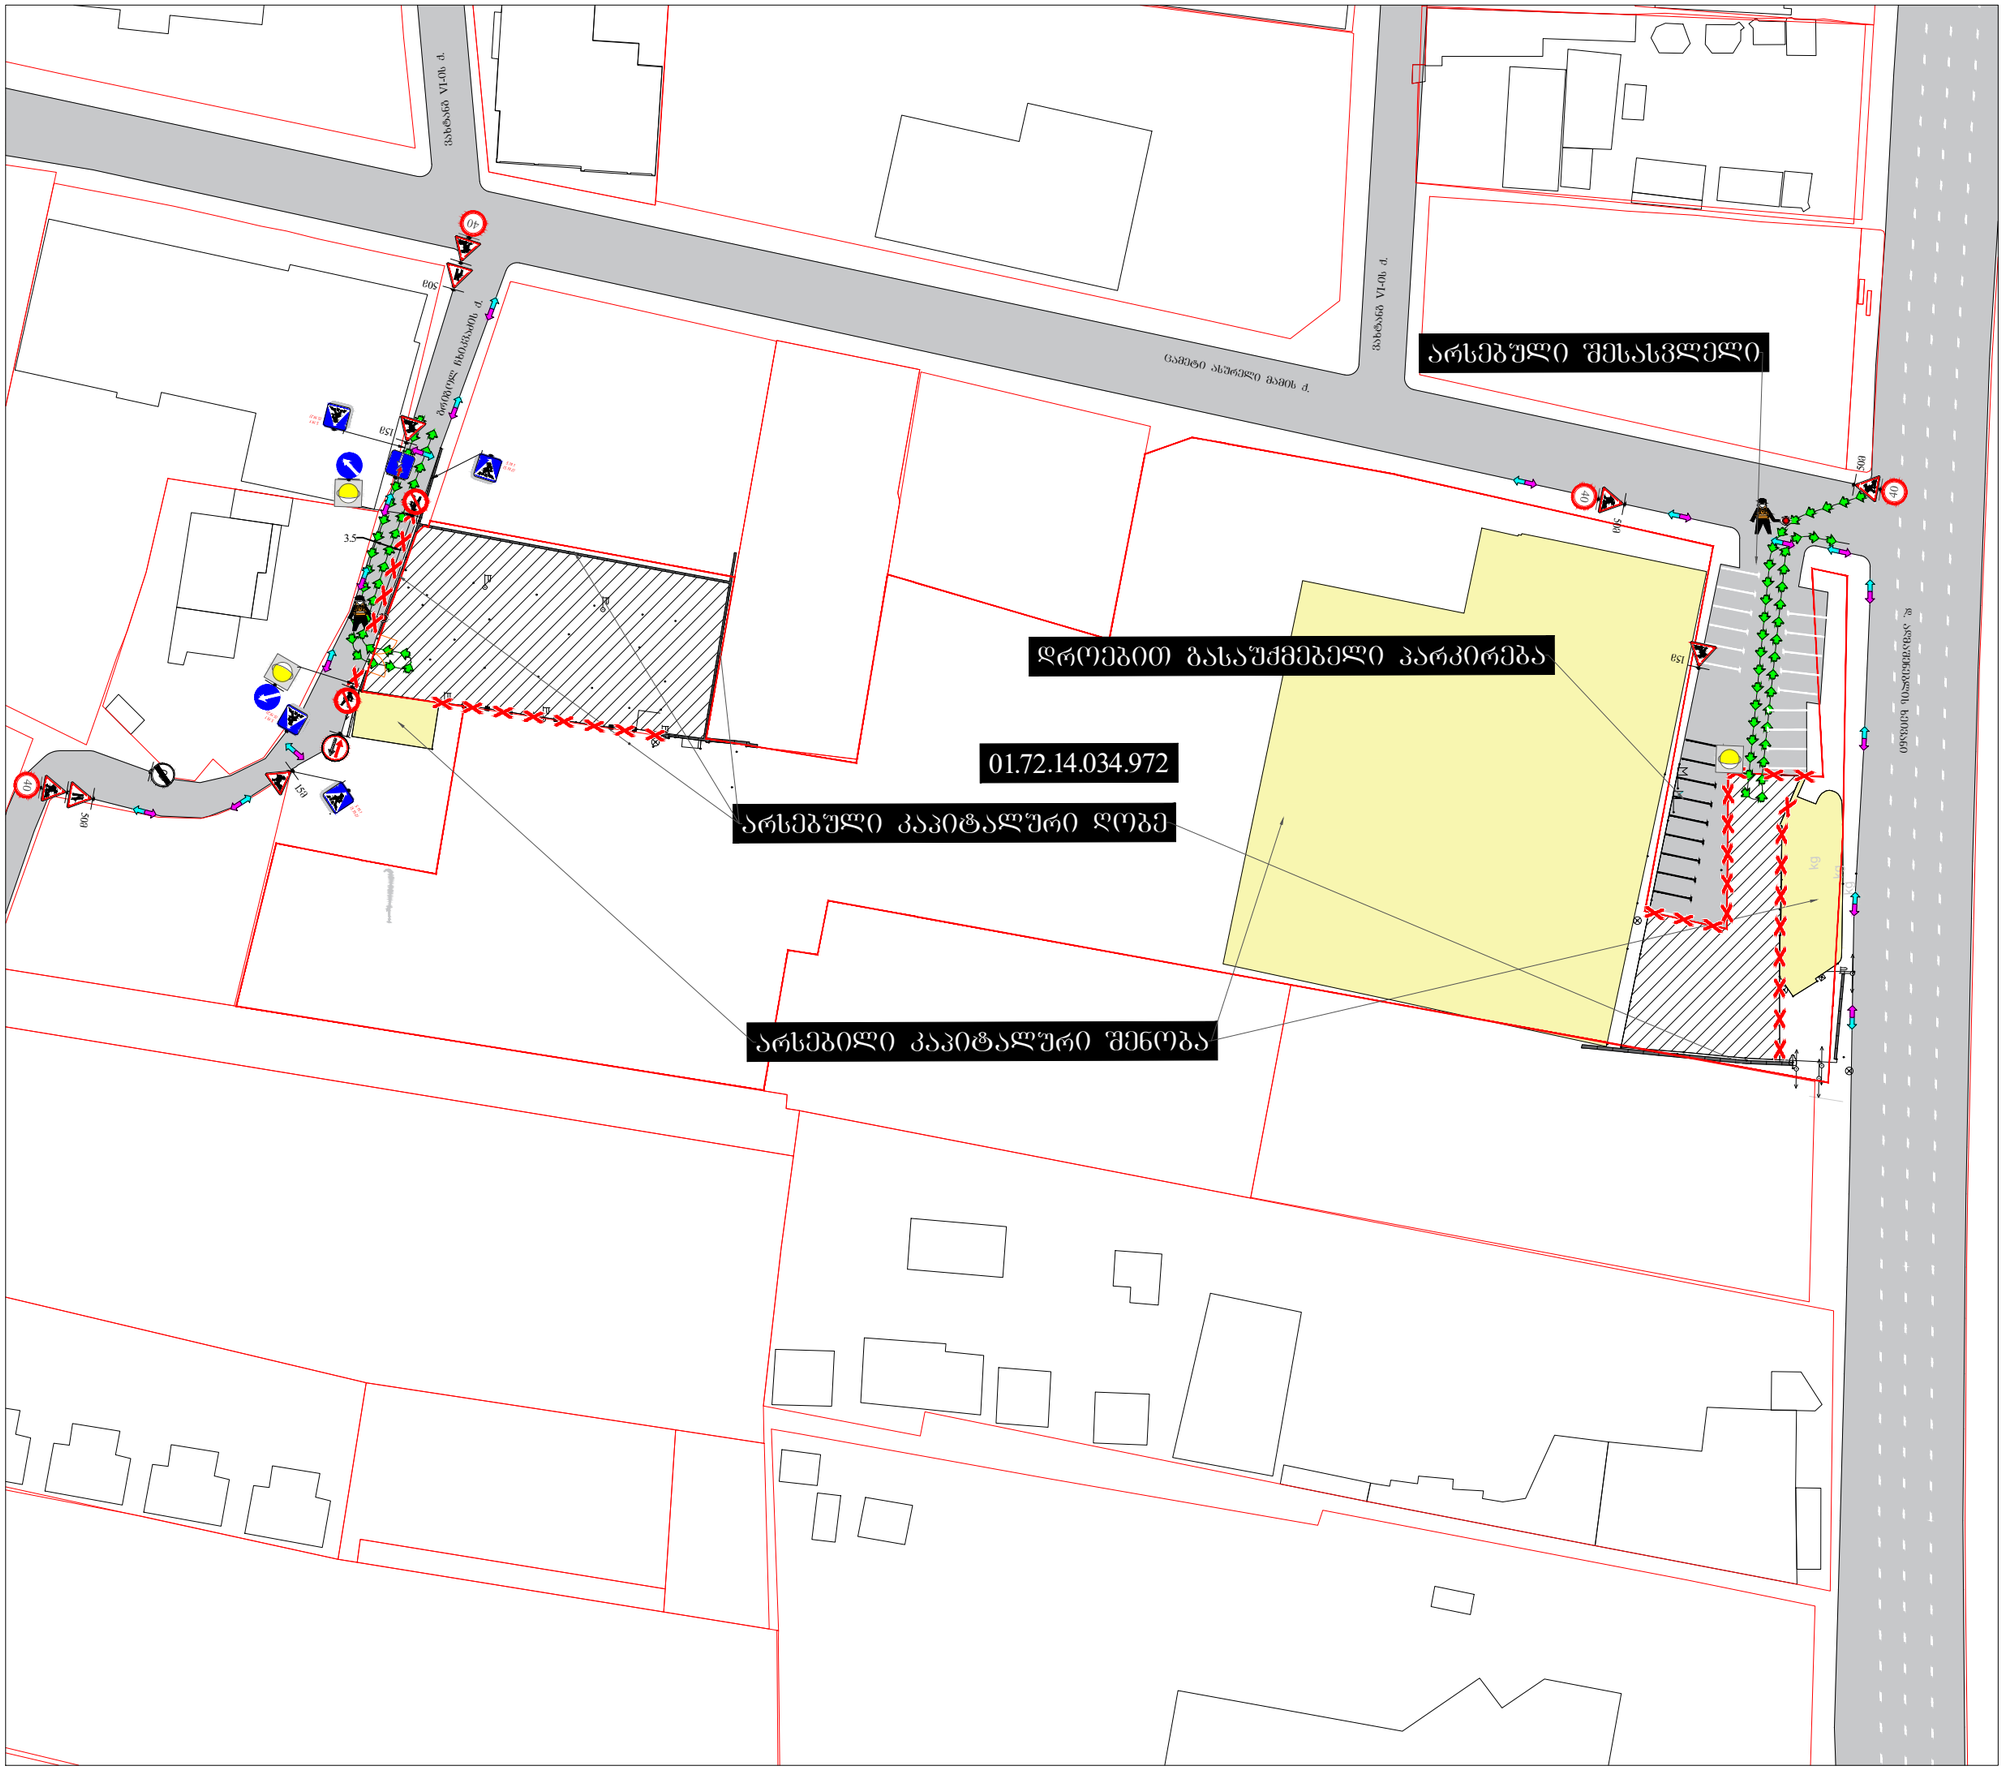

საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა

	მისამართი:
ქ. თბილისი ალმაშენებლის ხეივნის მიმდებარედ (ს.კ. 01.72.14.034.972) საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა. (ღობის მონტაჟი-დემონტაჟი)	
თარიღი: 2023 წელი	მასშტაბი: პირობითი
დამკვეთი:	შპს "არქცენტრი"

შ.პ.ს "STS"
(Smart Transportation Solutions)

შეასრულა: ნიკა სიდამონიძე
ტელ: 598-77-88-48

ტელ: 577 15-55-75 შეამოწმა: ვახტანგ თავდიშვილი
ტელ: 551-14-14-84

საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები

1.21.2-1ც	4.2.2 -1ც
1.21.3- 1ც	5.19.1 - 4ც
1.26 -7ც	5.19.2 - 4ც
2.5-1ც	ცომცომა-3ც
2.6-1ც	
3.10 - 2ც	
3.24 - 4ც	
3.25 - 1ც	
4.2.1 -1ც	

პირობითი აღნიშვნები

ქვეითთა მოძრაობის მიმართულება

საშიშველი ტექნიკის მოძრაობის მიმართულება

ღობური

მედროშე 2 ადამიანი

SMART TRANSPORTATION SOLUTIONS

მშენებლობის ნებართვის აღებიდან სამუშაოები იწარმოებს 1 წლის განმავლობაში. აღნიშნულ პერიოდში მითითებული პარკირების გამოყენება ვერ მოხერხდება.

დროებითი სამშენებლო ღობე

არსებული შესასვლელი

დროებით გასაუქმებელი პარკირება

01.72.14.034.972

არსებული კაპიტალური ღობე

არსებული კაპიტალური შენობა

ვახტანგ VI-ის ქ.

ცამეტი ასურელი მამის ქ.

ვახტანგ VI-ის ქ.

ილიკა ჭავჭავაძის ქ.

ქ. ალიაბადის ხეობაზე

საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა

მისამართი:

ქ. თბილისი ალმაშენებლის ხეივნის მიმდებარედ (ს.კ. 01.72.14.034.972)
საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა.
(მშენებლობის პერიოდი)

თარიღი: 2023 წელი	მასშტაბი: პირობითი
დამკვეთი:	შპს "არქცენტრი"

შ.პ.ს "STS"
(Smart Transportation Solutions)
ტელ: 577 15-55-75

შეასრულა: ნიკა სიდამონიძე
ტელ: 598-77-88-48

შეამოწმა: ვახტანგ თავდიშვილი
ტელ: 551-14-14-84

საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები

1.26 -7ც

ციმციმა-3ც

პირობითი აღნიშვნები

ქვეითთა მოძრაობის მიმართულება


სამშენებლო ტექნიკის მოძრაობის მიმართულება

მეგობრობა 1 ადამიანი


დროებითი სამშენებლო ღობე

საშენებლო ღობე გვერდში

საშენებლო ღობის კვეთი.

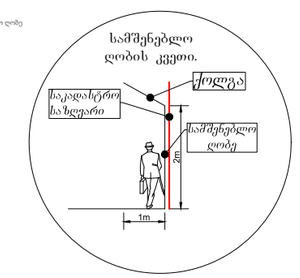

SMART TRANSPORTATION SOLUTIONS

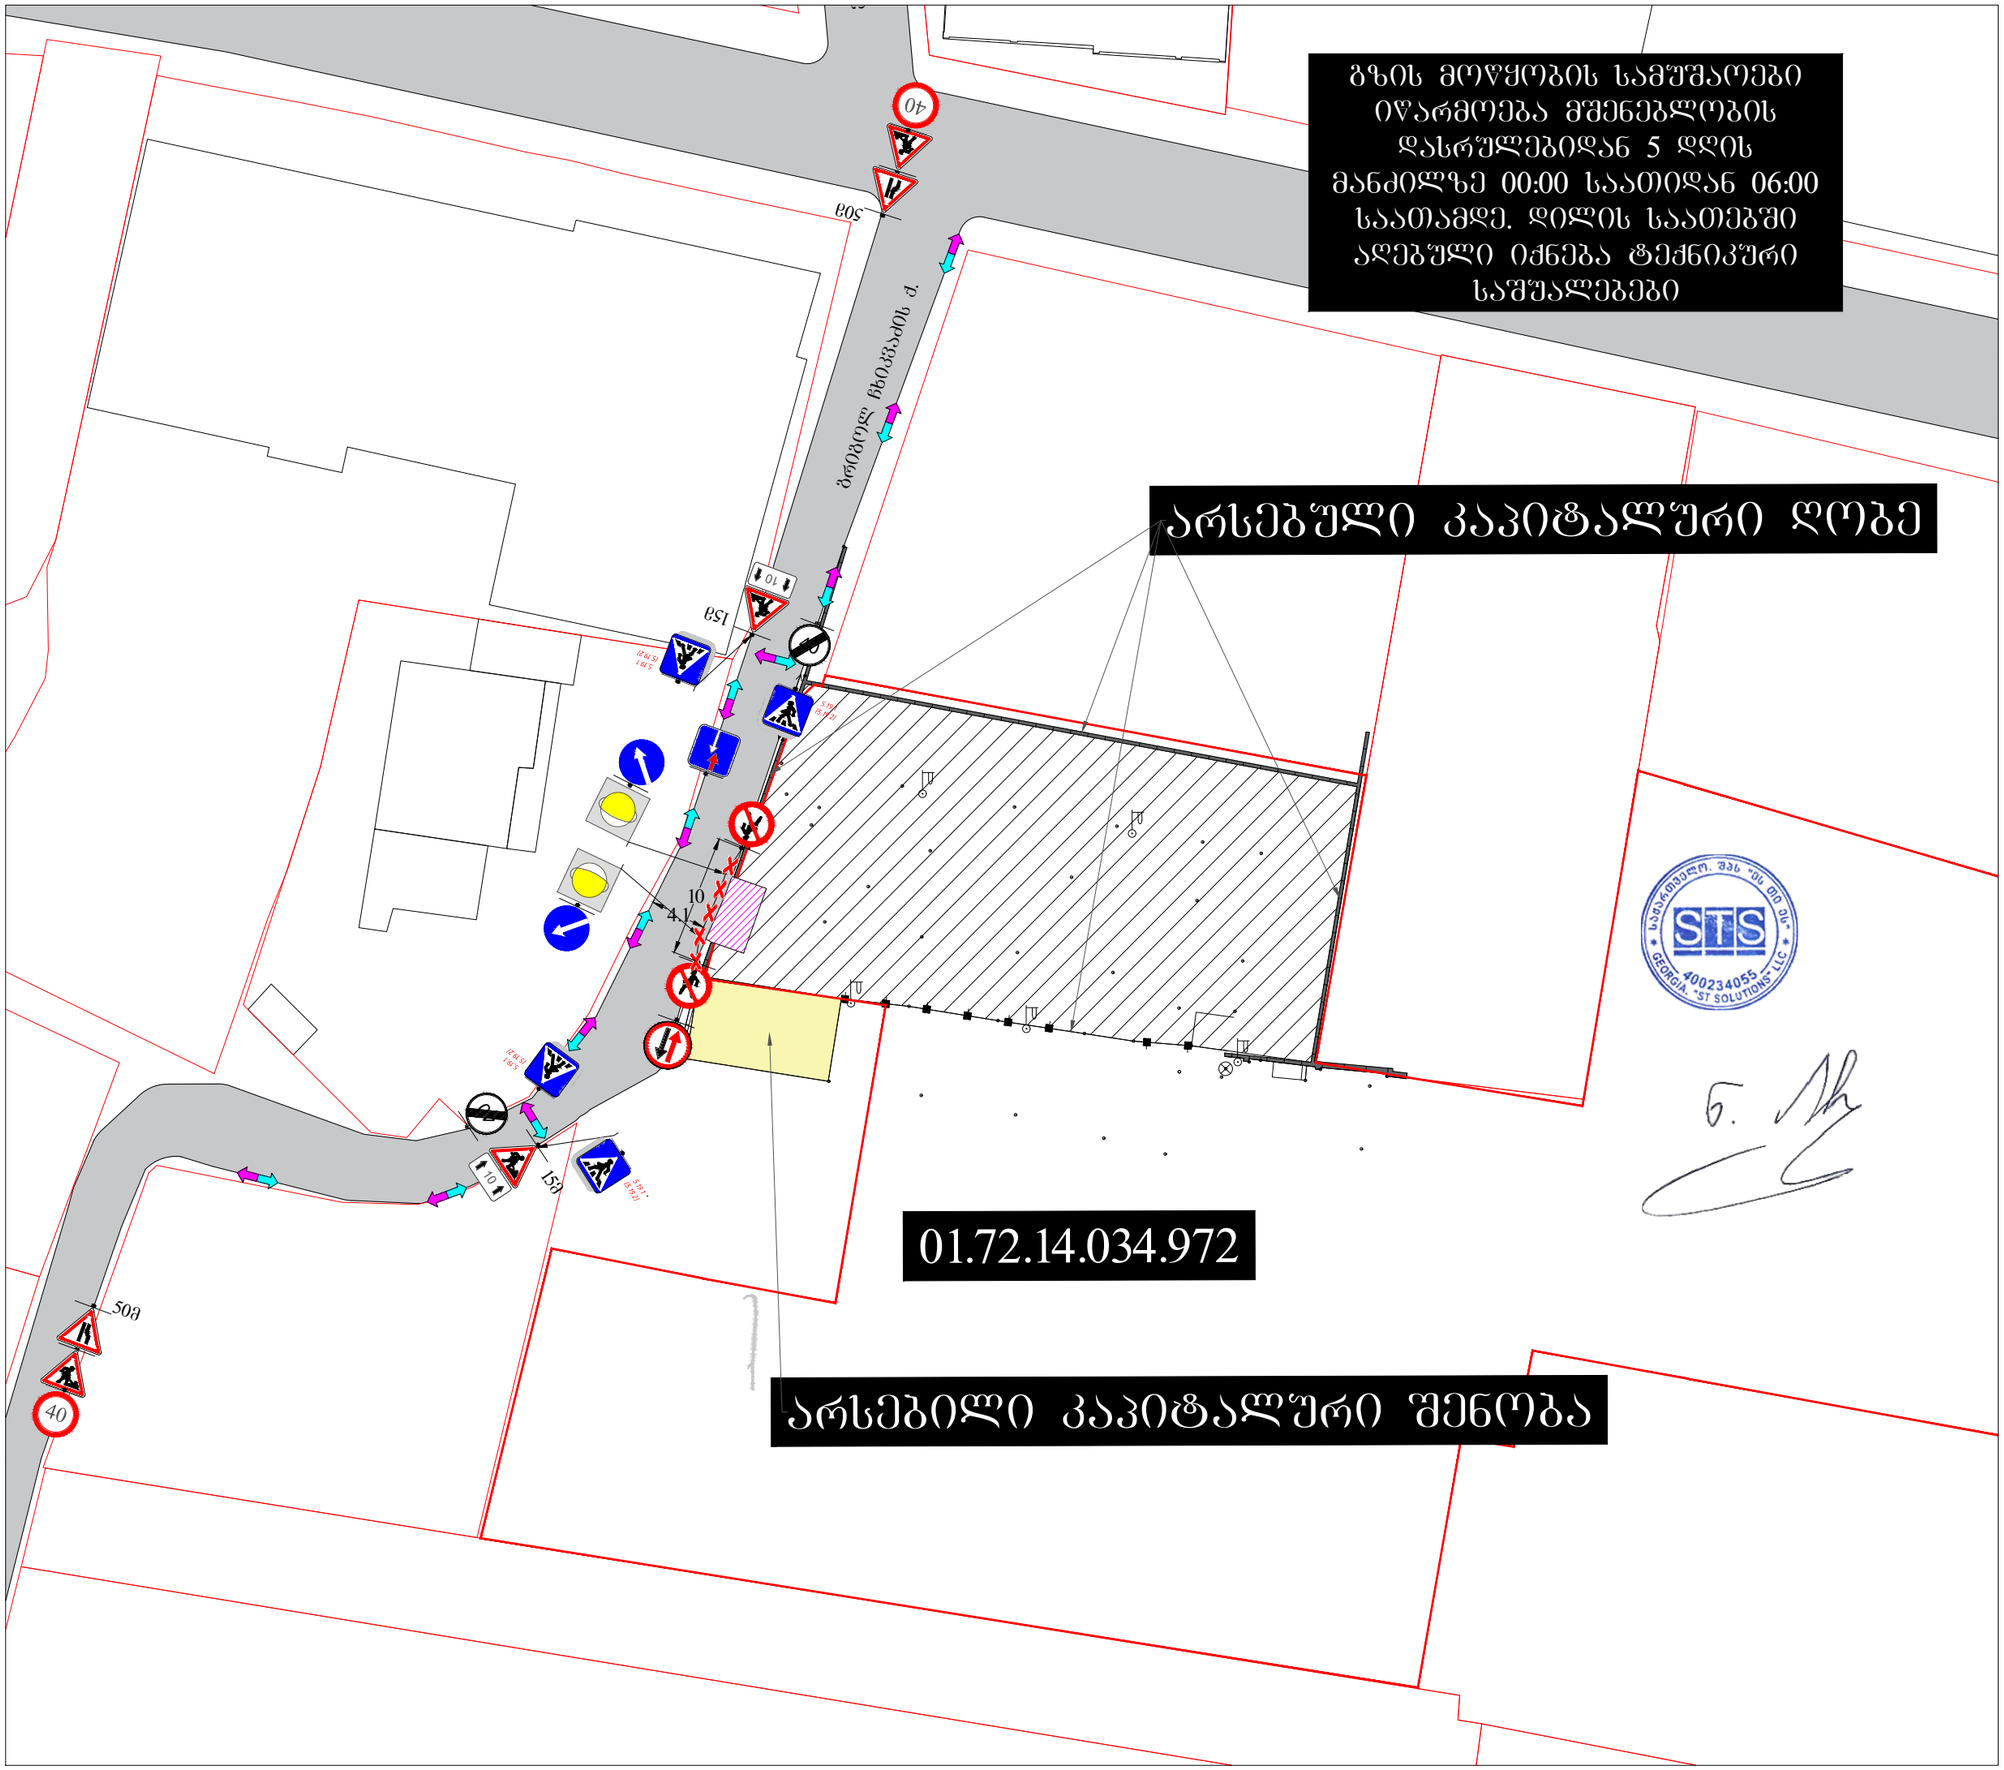

საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა

	მისამართი:
ქ. თბილისი ალმაშენებლის ხეივნის მიმდებარედ (ს.კ. 01.72.14.034.972) საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა. (შესახვევ-გამოსახვევის მოწყობა)	
თარიღი: 2023 წელი	მასშტაბი: პირობითი
დამკვეთი:	შპს "არქცენტრი"

შპს "STS"
(Smart Transportation Solutions)
ტელ: 577 15-55-75

შეასრულა: ნიკა სიდამონიძე
ტელ: 598-77-88-48
შეამოწმა: ვახტანგ თავდიშვილი
ტელ: 551-14-14-84

საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები

1.21.2-1ც	5.19.1 - 4ც
1.21.3- 1ც	5.19.2 - 4ც
1.26 -4ც	8.2.1 - 2ც
2.5-1ც	ციმციმა -2ც
2.6-1ც	
3.10 - 2ც	
3.24 - 2ც	
3.25 - 2ც	
4.2.1 -1ც	
4.2.2 -1ც	

პირობითი აღნიშვნები

მანძილი ელექტროებისაგან ელექტრო საშიშროების ნაკეთის სანიშნის ზონიდან ეკრანი.

ტექნიკის მოძრაობის მიმართულება

ღობეს

შენიშვნა:
დროებითი სქემა შედგენილია "ეროდ 218.6.014-2014" და საქართველოს კანონის საგზაო მოძრაობის შესახებ მოთხოვნების შესაბამისად

1. გაფანტრობილებული ზონის სიგრძე შეადგენს 100 მეტრს.
2. ბუფერული ზონის სიგრძე შეადგენს 15 მეტრს.
3. საცალი ნაწილის დახშული ზოლის სიგანის 0.5 მ და ნაკალის სიმაღლის 20 კმ/სთ შესაბამისი გაფლვების ზონის სიგრძე შესაბამისი საანგარიშო ფორმულის მიხედვით შეადგენს 5 მ-ს.
4. ფუნქციური ზონის სიგრძე შეადგენს 30 მ-ს.
5. ნახაზზე ნაჩვენებია დროებითი საგზაო ნიშნები.
6. სქემაზე დატანილია დროებითი საგზაო მოწყობები.
7. ჯვეთობა ნაკალი მოძრაობა სამუშაოება ვარიოების ზონის მოპირდაპირე მხარეს.

SMART TRANSPORTATION SOLUTIONS

არსებული შესასვლელი

ავტოსადგომის შენობა

01.72.14.034.972

ავტოსადგომზე ასასვლელი პანდუსი

საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა

მისამართი:

ქ. თბილისი ალმაშენებლის ხეივნის მიმდებარედ
(ს.კ. 01.72.14.034.972)
საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა.

თარიღი: 2023 წელი	მასშტაბი: პირობითი
დამკვეთი:	შპს "არქცენტრი"

შ.პ.ს "STS"
(Smart Transportation Solutions)
ტელ: 577 15-55-75

შეასრულა: ნიკა სიდამონიძე
ტელ: 598-77-88-48

შეამოწმა: ვახტანგ თავდიშვილი
ტელ: 551-14-14-84

საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები

2.1- 2ც

2.3- 2ც


4.1.4- 2ც


4.1.5- 2ც

5.19.1 - 10ც

5.19.2 - 10ც

პირობითი აღნიშვნები





შენიშვნა:
პანდუსის პარამეტრები განისაზღვრება 41-ე დაღგენილების ქვეთავი 406 -ის მიხედვით.

STS SMART TRANSPORTATION SOLUTIONS
