მშენებლობის დღიური გრაფიკი – 2014 წ.

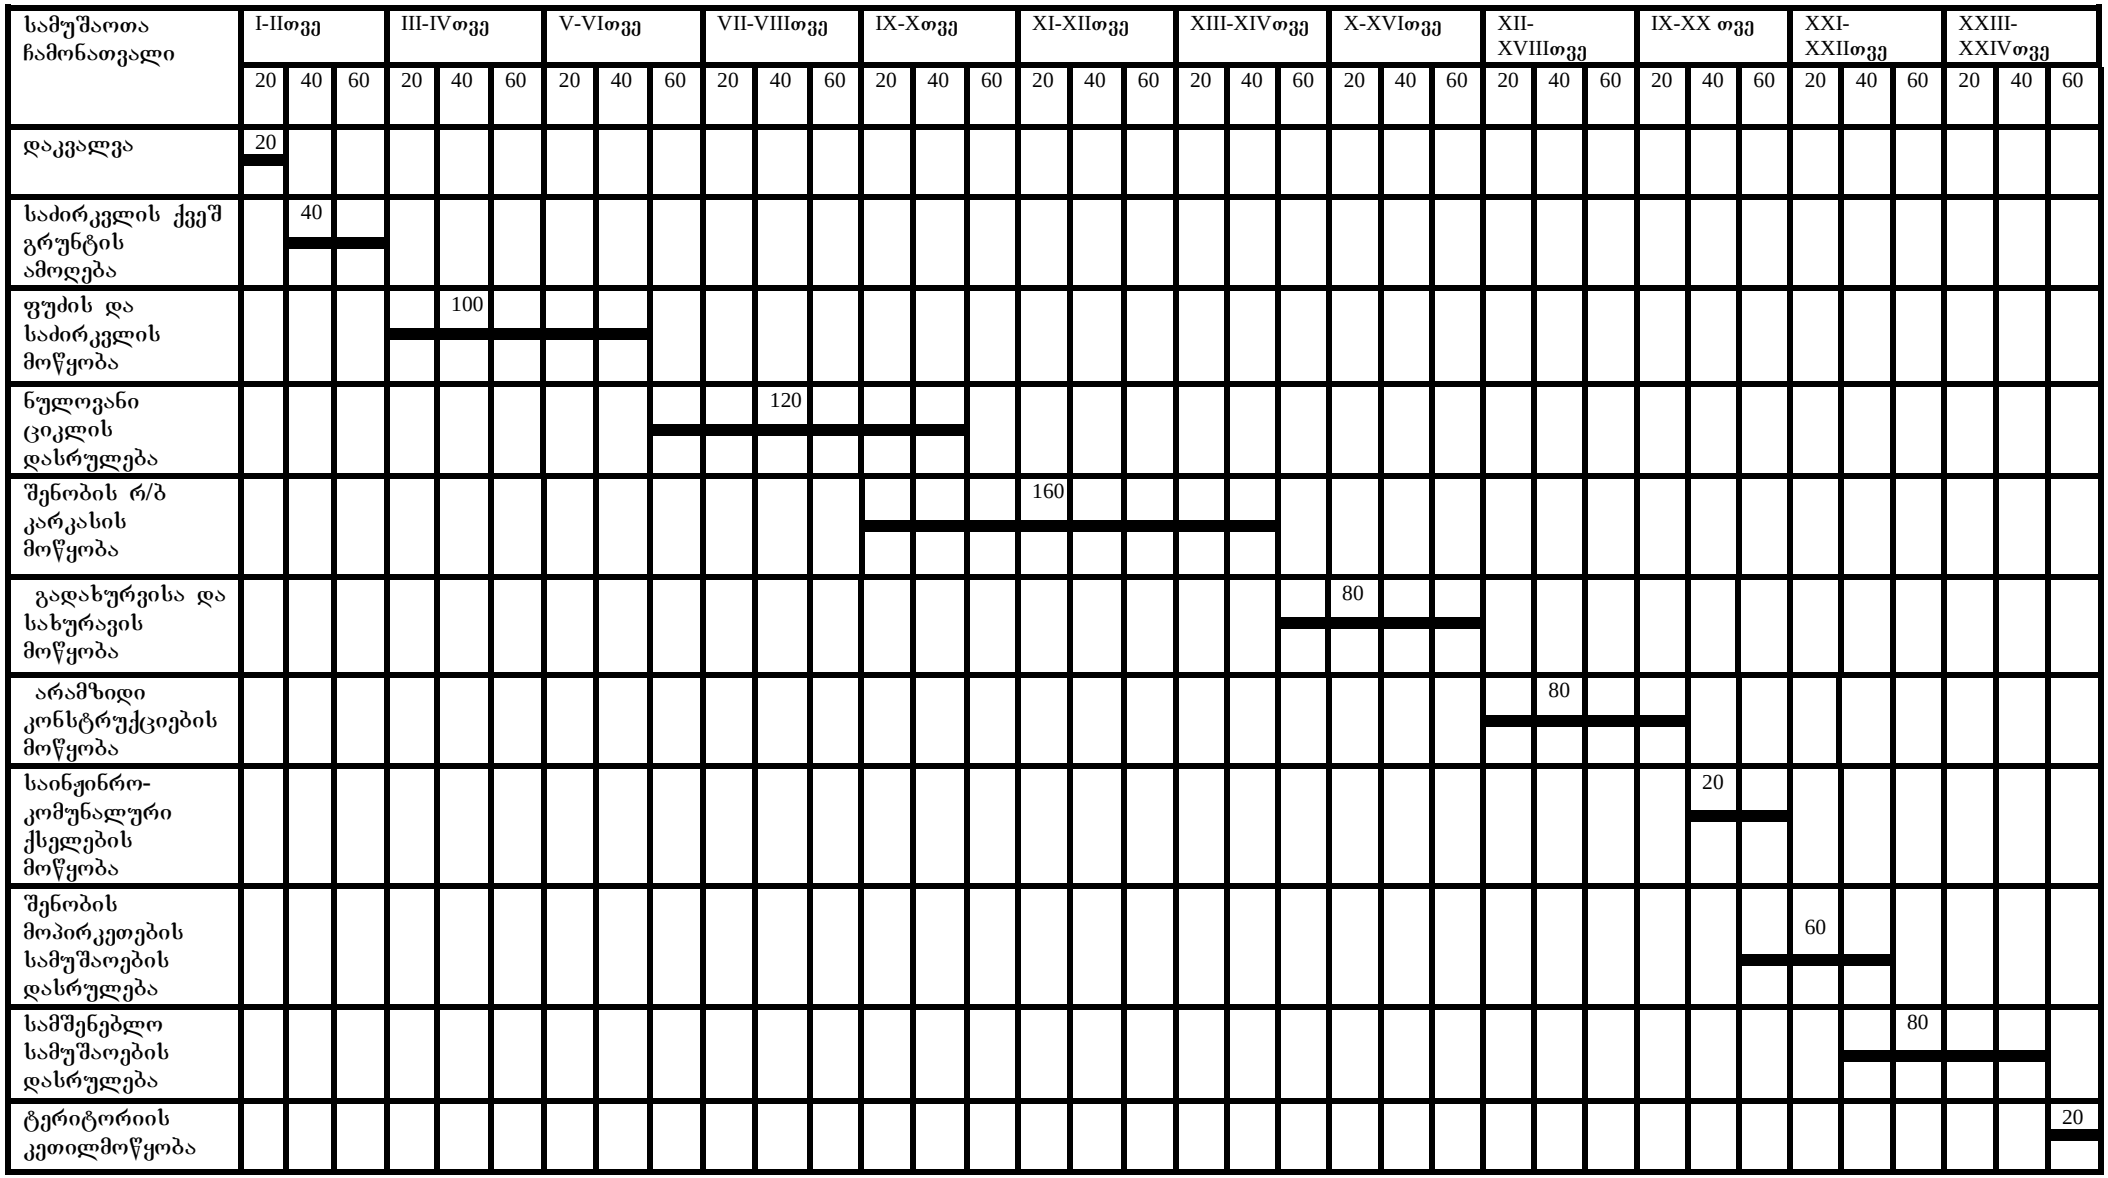

1. დაკვალვა - - - 20 დღე;
2. საძირკვლის ქვეშ გრუნტის ამოღება - -- - 40 დღე
3. ფუძის და საძირკვლის მოწყობა - - - 100 დღე
4. ნულოვანი ციკლის დასრულება - - - 120 დღე
5. შენობის რ/ბ კარკასის მოწყობა - - - 160 დღე
6 გადახურვისა და სახურავის მოწყობა მოწყობა - - - 80 დღე
7. არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა - - - - 80 დღე
8. საინჟინრო-კომუნალური ქსელების მოწყობა - - - 20 დღე
9. შენობის მოპირკეთების სამუშაოების დასრულება - - 60 დღე
10. სამშ. სამუშაოების დასრულება - - - 80 დღე
11. ტერიტორიის კეთილმოწყობა - - - 20 დღე

შეასრულა: ნ. მეტრეველი
