
მ შ ე ნ ე ბ ლ ო ბ ი ს დ ღ ი უ რ ი გ რ ა ფ ი კ ი

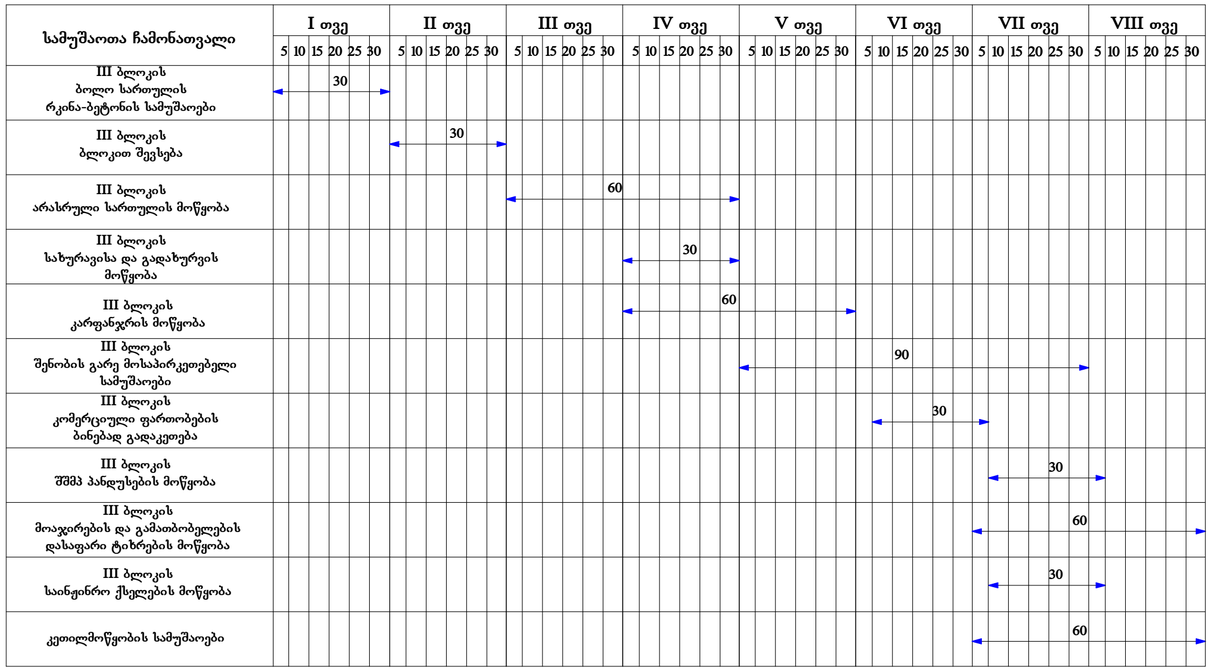

III ბლოკის ბოლო სართულის რკინა-ბეტონის სამუშაოები	----------	30 დღე
III ბლოკის ბლოკით შევსება	----------	30 დღე
III ბლოკის არასრული სართულის მოწყობა	----------	60 დღე
III ბლოკის სახურავისა და გადახურვის მოწყობა	----------	30 დღე
III ბლოკის კარფანჯრის მოწყობა	----------	60 დღე
III ბლოკის შენობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	----------	90 დღე
III ბლოკის კომერციული ფართობების ბინებად გადაკეთება	----------	30 დღე
III ბლოკის შშმპ პანდუსების მოწყობა	----------	30 დღე
III ბლოკის მოაჯირების და გამათბობელების დასაფარი ტიხრების მოწყობა	----------	60 დღე
III ბლოკის საინჟინრო ქსელების მოწყობა	----------	30 დღე
კეთილმოწყობის სამუშაოები	----------	60 დღე

დღიური გრაფიკით მშენებლობის ვადა გათვალისწინებულია 8 თვე

ექსპლიკაცია:

პირობითი ნიშნები:

შენიშვნები:

კომპანიის სახელწოდება

შპს "ლ.ლ. და კომპანია"

არაგიშვილის ქ. 74
თბილისი, საქართველო

დაკვეთის ნომერი

02/2014

პროექტის სახელწოდება

ქ. თბილისი,
კრწანისის, 65-ე სავარო სკოლის მიმდებარედ

ნახაზი

არქიტექტურული ნაწილი.
მშენებლობის დღიური
გრაფიკი

დირექტორი	მ.ლოსაბერიძე
არქიტექტორი	დ.ლოსაბერიძე
არქიტექტორი	ს.გასვიანი

მასშტაბი	სტადია
1:100	ე. პ.

ფურცელი	ფორმატი
26 (26)	A2
