ქ. თბილისში, ურიცკის ქუჩა №24 და №26-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე
(ნაკვეთის №069.018) №3 შენობა-ნაგებობის
სადემონტაჟო სამუშაოების ორგანიზაციის პროექტი

ქ. თბილისში, ურიცკის ქუჩა №24 და №26-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (ნაკვეთის № 069.018) №3 შენობა-ნაგებობის სადემონტაჟო სამუშაოების ორგანიზაციის პროექტი

განმარტებითი ბარათი

აღნიშნული შენობა-ნაგებობა მრავალი წელია პრაქტიკულად მთლიანად დანგრეულია. დარჩენილია მხოლოდ მცირედი ნაწილი (იხ. არსებული სიტუაციის ფოტომასალა).

აღნიშნულიდან გამომდინარე, სადემონტაჟო სამუშაოები ძირითადად მოიცავს ტერიტორიის ნანგრევებისაგან გასუფთავებას.

შენობა-ნაგებობის დარჩენილი ნაწილის დემონტაჟი განხორციელდეს ხელით, ხოლო სამშენებლო ნაგვის გატანა მოხდეს სატვირთო ავტომობილის საშუალებით.

სადემონტაჟო სამუშაოების ხანგრძლივობა განისაზღვროს ერთი თვით.

ქალენდარული გრაფიკი T=1 თვე

№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს ხანგრძლივობა (თვე)			
		I კვირა	II კვირა	III კვირა	IV კვირა
	დროებითი ღობის მოწყობა				
	შენობის დარჩენილი ნაწილის დემონტაჟი				
	სამშენებლო ნაგვის გატანა				
	ტერიტორიის მოსუფთავება				
	სხვადასხვა სამუშაოები				

არსებული სიტუაციის ფოტო





საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

საკადასტრო გეგმა

მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი: *01.16.06.069.018*
განცხადების რეგისტრაციის ნომერი*8820145264*07
მიწის ნაკვეთის ფართობი: *225* კვ.მ.
დანიშნულება: *არასასოფლო-სამეურნეო*
მომზადების თარიღი 02.10.14

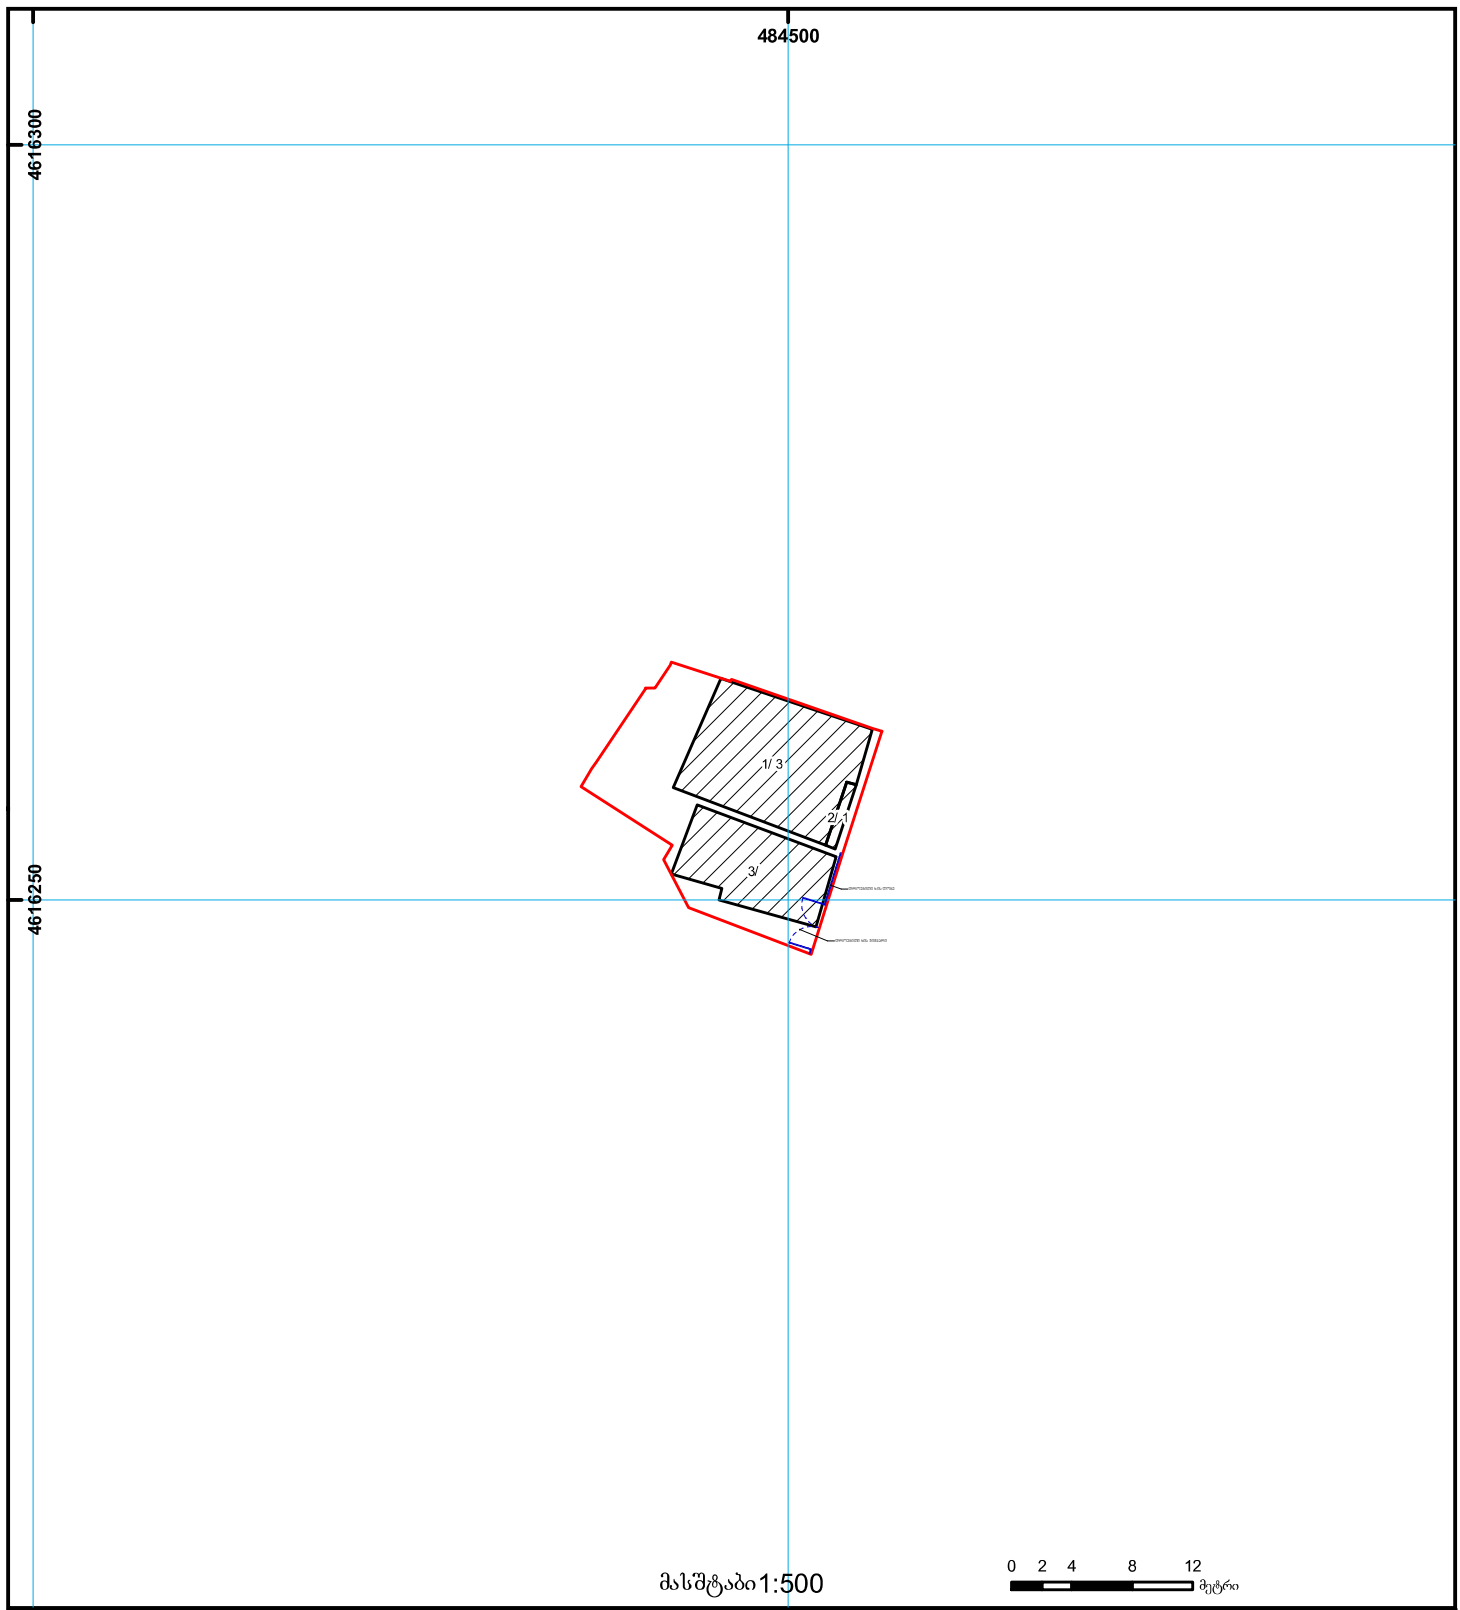

01/2 შენობა-ნაგებობა, პირობითი ნომერი/სართულიანობა
ვალდებულება
ხაზობრივი ნაგებობა
მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი
მშენებარე ნაგებობა
მიწისქვეშა ნაგებობა
0.00 0.00 UTM (საერთაშორისო) სისტემის კოორდ.

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო თბილისი 0102 წმ. ნიკოლოზის/ნ. ჩხეიძის ქ. 2 ტელ.: (995 32) 91 04 27; ფაქსი: (995 32) 91 03 41
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო თბილისი დ. აღმაშენებლის გამზ. 89/24 ტელ: (995 32) 94 13 65
www.napr.gov.ge

სამშენებლო გენ-გეგმა

