სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი

	სამუშაოთა დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდ.	ხანგრძლ. დღე	მუშათა რაოდ.	I თვე						II თვე						III თვე						
						1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	1-5
1	შენობის გრუნტზე დაკვალვა, ძირითადი ღერძების დაფიქსირება	მ²	1000	2	3	3 / 2																		
2	მიწის სამუშაოები (ქვაბულის ამოღება)	მ³	250	6	4		4 / 6																	
3	ფუძის მოწყობის სამუსაოები (მომზადების მოწყობა)	მ³	132	6	6			6 / 5																
4	რკ/ბეტ-ის საძირკვლების მოწყობა (იატაკის ჩათვლით)	მ³	342	40	6							6 / 40												
5	ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის ლითონის კარკასის მოწყობა	ტ	82	45	4																			
6	შემომზუდავი კონსტრუქციების მოწყობა	მ²	4100	60	10																	10 / 60		
7	საინჟინრო (ელექტროტექნიკური) ქსელების მოწყობა	1000 ლარ	-	25	4																			

T=165

მსენებლობის მოსამზადებელი ეტაპის ხანდრძლივობა
3 დღე, ძირითადის კი 162 დღე
მუშა ხელის საშუალო რაოდენობა - 10 კაცი

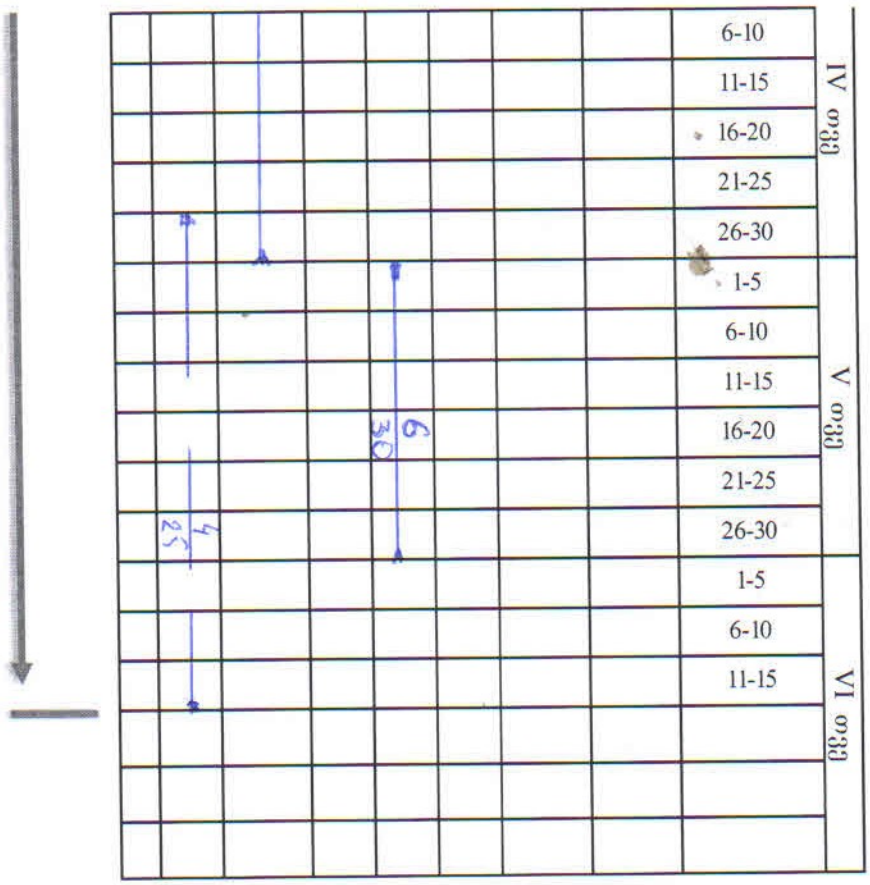
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
IV ов
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
V ов
1-5
6-10
11-15
VI ов
6
30
4
25
