5 1015 202531 5 1015 202530 5 1015 202531 5 1015 202530 5 1015 202531 5 1015 202530 5 1015 202531 5 1015 202530 5 1015 202531 5 1015 202530 5 1015 202531 5 1015 202530

I თვე II თვე III თვე IV თვე V თვე VI თვე VII TveVIII თვე IX თვე X თვე XI თვე XII თვე
სამუშაოთა
ჩამონათვალი

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

სამშენებლო სამუშაოების დღიური გრაფიკი

სამშენებლო სამუშაოების დასრულება ---

14

15

20

რეგისტრაცია

შეამოწმა

არქიტექტორი შ.პ.ს.briksi ვარკეთილი

მრავალფუნქციური შენობა

დირექტორი დამკვეთი # ინვენტარი

საიდენტიფიქაციო #

ფ-ები მაშ-ბი

დაკვეთა

#

#

შეასრულა სტადია მარკა

ქ.თბილისი
ჯავახეთის II-შეს.#1ა დამკვეთი

21

XIIITve XIVTve XV თვე XVITve XVIITve XVIIITve

5 1015 202531 5 1015 202530 5 1015 202531 5 1015 202530 5 1015 202531 5 1015 202530

730 DdRe

16

17

18

19

ზ.გიგაური

XIXTve

5 1015 202530

XXTve

5 1015 202530

XXITve

5 1015 202530

XXIITve

5 1015 202530

XXIIITve

5 1015 202530

XXIVTve

5 1015 202530

შ.პ.ს. ფრიზი

ქთბილისი.ზანდუკელის ქუჩა #1
404863091

22

23

24

25

26

27

28

29

31

32

33

ქვაბულის ამოღება 1-6 და ა-ზ
ღერძებს შორის 5.50 მ-ზე

ხიმინჯების და საძირკვლის ფილის
მოწყობა
1-5 და ა-ე ღერძებს შორის -3.10 ნიშ-ზე

კოლონები და მონოლითური
ფილა -3.10 ნიშნულზე,კდლების
არმირებით

კოლონები და მონოლითური
ფილა 0.00 ნიშნულზე

კოლონები და მონოლითური
ფილა +4.00 ნიშნულზე

კოლონები და მონოლითური
ფილა +7.30 ნიშნულზე

კოლონები და მონოლითური
ფილა +10.60 ნიშნულზე

კოლონები და მონოლითური
ფილა 13.90 ნიშნულზე

კოლონები და მონოლითური
ფილა +17.20 ნიშნულზე

გარე კედლების შევსება
ბლოკით

შიდა ტიხრების მოწყობა

ელექტრო გაყვანილობის და
სანტექნიკის მონტაჟი

შიდა კედლების ლესვა

მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრების
montaji

ავტოფარეხის პანდუსის მოწყონა 1-2,
ა-გ ღერძებში

გარე კომუნიკაციებისა და
კეთილმოწყობის სამუშაოები

გარე კედლების ლესვა-შეღებვა

ფასადებზე აივნის მოპირკეთება
მეტალის მსუბუქი
კონსტრუქციებით.,შეღებვა

ლიფტების მონტაჟი

სახურავის ჰიდროსაიზოლაციო
სამუშაოები

სადარბზოს ლესვა-შეღებვა,

ინჟინერ-მშენებელი არქიტექტორი____________

ტერიტორიის დაკვალვა.

ეზოს კეთილმოწყობა,სამშ.ნაგვის
გატანა.

ზ.გიგაური

ზ.გიგაური

კოლონები და მონოლითური
ფილა +20.50 ნიშნულზე

კოლონები და მონოლითური
ფილა +27.10 ნიშნულზე

კოლონები და მონოლითური
ფილა +23.80 ნიშნულზე

კოლონები და მონოლითური
ფილა +30.40 ნიშნულზე

იატაკების მოჭიმვა

შენობის ხიმინჯების განლაგების სქემა. გეგმა. (მ 1:300)

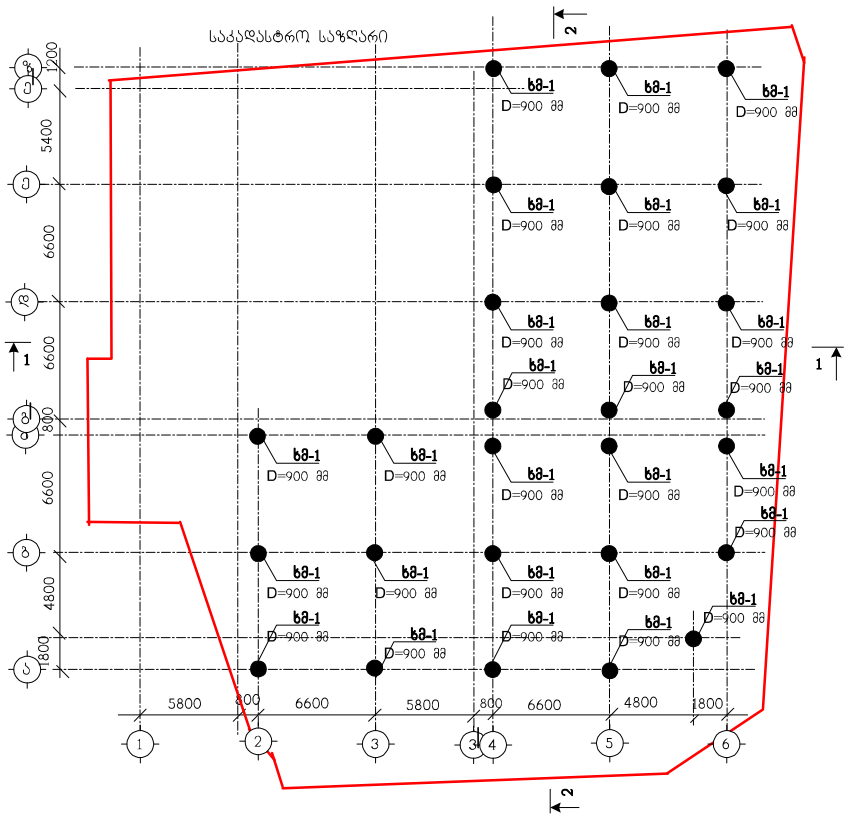

ჭრილი 1-1; მ 1:300

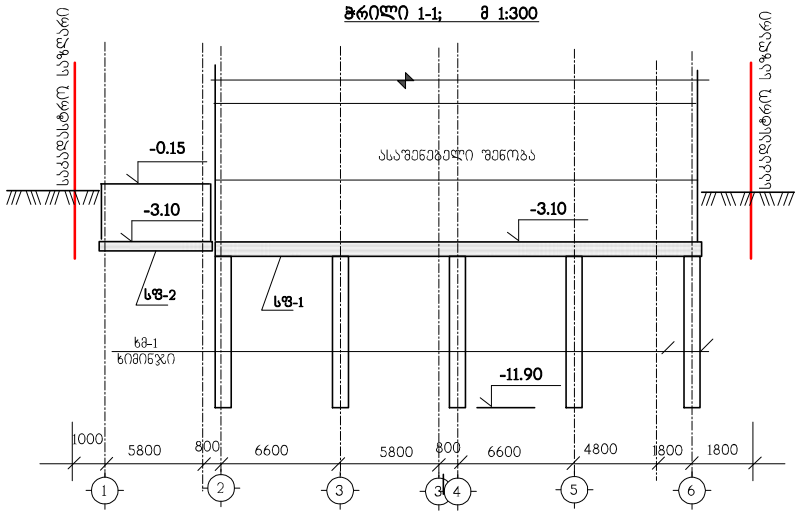

ჭრილი 2-2; მ 1:300

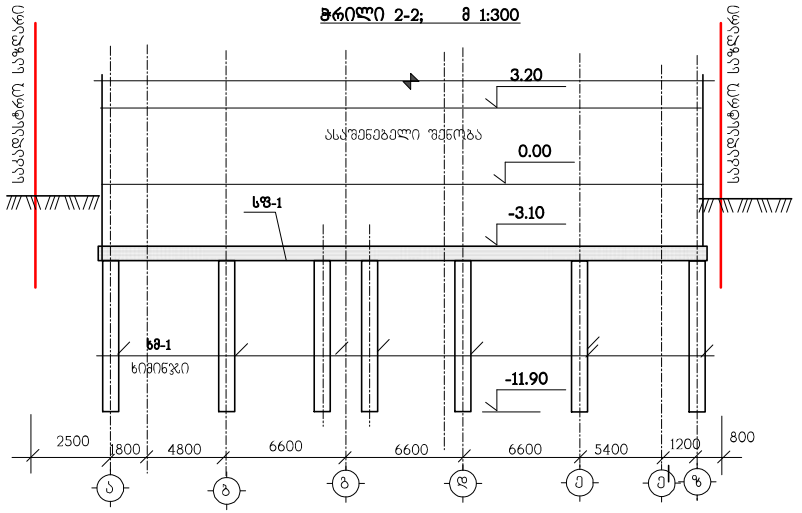

დამფუძნებელი		ზ. გიგაური	დამკვეთი: შ.პ.ს ,,ბრიძსი ვარკეთილი" ქ.თბილისი, ჯავახეთის II შესახვ. №1ა	შ.პ.ს ფრიზი LTD FRIEZE	
პრ.მთ.არქიტ.		ზ. გიგაური			
პრ. მთ.კონსტრ.		გ. გედევანიშვილი	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი	ქ.თბილისი, ზანდუკელის ქ №11	
			კონსტრუქციული ნაწილი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
			შენობის ხიმინჯების განლაგების სქემა. გეგმა. (მ 1:300)	მ.პ		
				დაკვეთა №	მასშტაბი	თარიღი
					1 :150	2016 წ.
