# მშენებლობის დღიური გრაფიკი

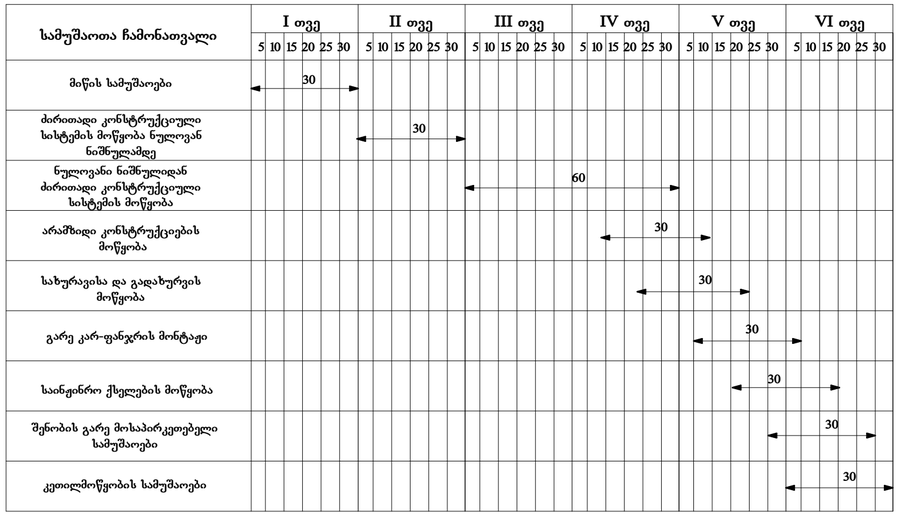


| | | |
|---|---|---|
| მიწის სამუშაოები | ---------- | 30 დღე |
| ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა ნულოვან ნიშნულამდე | ---------- | 30 დღე |
| ნულოვანი ნიშნულიდან ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა | ---------- | 30 დღე |
| არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა | ---------- | 60 დღე |
| სახურავისა და გადახურვის მოწყობა | ---------- | 30 დღე |
| გარე კარ-ფანჯრის მონტაჟი | ---------- | 30 დღე |
| საინჟინრო ქსელების მოწყობა | ---------- | 30 დღე |
| შენობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები | ---------- | 30 დღე |
| კეთილმოწყობის სამუშაოები | ---------- | 30 დღე |

| | | |
|---|---|---|
| ფორმატი A-3 | თბილისი 2012 წ. | |
| | დაკვეთა #13-2012 | |

ექსპლიკაცია:

პირობითი ნიშნები

შენიშვნები:

პროექტში ცვლილებები შეთანხმებული უნდა იქნეს პროექტის ავტორთან და მერიის საქალაქო სამსახურთან.

პროექტის სახელწოდება

ქ.თბილისი. ლუბლიანას ქ. #18/20

თბილისის გულისა და სისხლძარღვთა კლინიკის სასაწყობე შენობა

თბილისის გულისა და სისხლძარღვთა კლინიკა

შპს "ლ.ლ. და კომპანია"

| თანამდებობა | გვარი | ხელმოწერა |
|---|---|---|
| დირექტორი | მ. ლოსაბერძე | |
| პროექტის ავტორი | დ. ლოსაბერძე | |
| | | |
| | | |
| მასშტაბი | 1:100 | მშენებლობის დღიური გრაფიკი |
| თარიღი | 26.10.2012 | |
| სტადია | | ფურცლები / ფურცელი |
| ესკიზი | | 1 / 1 |
